



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti



Contratto di Programma
2022 – 2026
parte Investimenti
Aggiornamento 2025

APPENDICE N. 3
alla Relazione Informativa

"Schede interventi aggiornamento 2025 CdP-I 2022–2026"

Tabella A01-Programmi prioritari ferrovie - Sicurezza, adeguamento a nuovi standard e resilienza al climate change

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma prevede interventi per la gestione/miglioramento della sicurezza in galleria, in adempimento al D.M. MIT 28/10/2005 “Sicurezza nelle gallerie ferroviarie” che prescrive requisiti minimi che, con tempiste di attuazione ben definite dalla norma stessa, devono essere realizzati in tutte le gallerie più lunghe di 500 metri, siano queste di nuova realizzazione (gallerie art. 9 e 10) o esistenti (gallerie art. 11). A seguito dell’emanazione della L 27/2012, che all’art 53 prevede che non possano essere adottati standard di sicurezza più stringenti delle norme europee, il piano di adeguamento ai requisiti minimi per le gallerie in esercizio contemplato dal DM 28/10/2005 è stato sospeso, in quanto la normativa europea (STI-SRT) prevede che solo in fase di lavori di rinnovo/ristrutturazione il Paese membro stabilisca quali requisiti della sti srt debbano essere soddisfatti. In attesa di una armonizzazione della norma nazionale con la norma europea, dal 2012 il Gestore ha avviato un programma di interventi per il miglioramento della sicurezza per le gallerie in esercizio più lunghe di 1.000 metri, secondo la priorità definita attraverso l’analisi di rischio all’uopo predisposta.

Gli interventi prioritari interessano 159 gallerie delle 318 in esercizio di lunghezza superiore a 1000 m che dalle analisi di rischio risultano essere a più alto livello di rischio (gruppi 1 e 2) e si estende anche ad ulteriori gallerie a minore livello di rischio (gruppo 3). Gli interventi sono sia di tipo infrastrutturale che tecnologico. Nello specifico gli interventi in corso/programmati riguardano: A) realizzazione interventi infrastrutturali (segnaletica, corrimano e serbatoi d’acqua agli imbocchi) su 155 gallerie/sequenze di gallerie; B) realizzazione interventi tecnologici (illuminazione di emergenza, MATS) su 153 gallerie/sequenze di gallerie; C) realizzazione della viabilità di accesso agli imbocchi su 98 gallerie/sequenze di gallerie; D) fornitura di mezzi di soccorso APS bimodali ai Comandi Provinciali dei VVF nel cui territorio di competenza ricade almeno 1 galleria di lunghezza superiore a 5000 m; E) fornitura di apparati GSM-R ai Comandi Provinciali dei VVF nel cui territorio di competenza ricade almeno 1 galleria di lunghezza superiore a 1000 m; F) la realizzazione, a seguito della sperimentazione eseguita con successo, dei rilievi automatizzati dei difetti dei rivestimenti delle gallerie. Nell’ambito del programma è inoltre prevista la fornitura di convogli diagnostici multifunzione attrezzati con il sistema di rilievo meccanizzato dei difetti delle gallerie basato su lasercamera, termocamera e lidar e apparati per l’elaborazione dei dati.

Gli interventi interessano l’intero territorio nazionale

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Nel corso del 2024 sono stati realizzati un totale di 30 interventi, così suddivisi:- Area Nord: 10 interventi;- Area Centro: 14 interventi;- Area Sud e Isole: 6 interve

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

-Miglioramento del livello di sicurezza e mitigazione del rischioLe predisposizioni di sicurezza previste:- facilitano l’esodo dei passeggeri dalla galleria in caso di incidente in galleria;- facilitano le operazioni di soccorso per i VV.F. in caso di incidente in galleria.



- Capacità
- Velocità
- Accessibilità
- Regolarità
- Prestazioni (merci)
- Gestione dei rotabili
- Gestione spazi di stazione
- Intermodalità merci
- Intermodalità passeggeri
- Integrazione della rete
- Upgrade e sicurezza
- Efficientamento processi

X

LOCALIZZAZIONE

Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Programma A1004A: Sicurezza in galleria

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Piano miglioramento sicurezza delle gallerie		5.086,65	23,50	0%	0,00	0%	Progettazione
Sicurezza in gallerie AV/AC		490,50	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Realizzazione interventi per gli adeguamenti di sicurezza in galleria tratta AV/AC Bologna - Firenze	J97I11000200001	45,50	20,60	45%	8,48	41%	Realizzazione
GE - Miglioramento sicurezza in galleria	J97D22000310001	26,60	26,60	100%	4,31	16%	Realizzazione
DTEC - Miglioramento sicurezza in galleria	J57B16000260001	24,92	24,92	100%	5,01	20%	Realizzazione
FI - Miglioramento sicurezza in galleria	J87B17000830001	23,46	23,46	100%	11,27	48%	Realizzazione
GE - Miglioramento sicurezza in galleria	J97B17000550001	22,18	22,18	100%	21,03	95%	In ultimazione
Realizzazione interventi per gli adeguamenti di sicurezza in galleria tratta AV/AC Milano - Bologna	J37I11000360001	21,00	21,00	100%	20,90	100%	In ultimazione
RC - Miglioramento sicurezza in galleria	J27B17000400001	19,95	19,95	100%	18,16	91%	In ultimazione
Realizzazione interventi per gli adeguamenti di sicurezza in galleria tratta AV/AC Roma - Napoli	J17I11000450001	15,00	14,00	93%	6,87	49%	Realizzazione
NA - Miglioramento sicurezza in galleria	J97H21000640001	12,82	12,82	100%	11,07	86%	Realizzazione
RC - Miglioramento sicurezza in galleria	J27I12000070001	11,96	11,96	100%	8,07	68%	Realizzazione
BO - Miglioramento sicurezza in galleria	J87D22000450001	8,52	8,52	100%	0,78	9%	Realizzazione
NA - Miglioramento sicurezza in galleria	J97B17000570001	7,41	7,41	100%	7,19	97%	In ultimazione
BO - Miglioramento sicurezza in galleria	J87B17000840001	7,28	7,28	100%	6,53	90%	Realizzazione

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025							
Programma A1004A: Sicurezza in galleria							
TS - Miglioramento sicurezza in galleria	J37D22000140001	6,97	6,97	100%	3,09	44%	Realizzazione
AN - Miglioramento sicurezza in galleria	J87B17000850001	6,55	6,55	100%	5,70	87%	Realizzazione
NA - Miglioramento sicurezza in galleria	J97D22000360001	6,40	6,40	100%	0,10	2%	Progettazione
MI - Miglioramento sicurezza in galleria	J97D22000320001	5,59	5,59	100%	0,31	6%	Realizzazione
Sicurezza gallerie DTEC		5,50	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
RM - Miglioramento sicurezza in galleria	J57D24000000001	5,22	5,22	100%	0,00	0%	Progettazione
VR - Miglioramento sicurezza in galleria	J97D22000340001	5,21	5,21	100%	3,89	75%	Realizzazione
Miglioramento sicurezza in galleria - interventi coordinati dalla sede c.le	J57B16000220001	5,00	5,00	100%	2,07	41%	Realizzazione
NA - Miglioramento sicurezza in galleria	J97F19000080001	4,21	4,21	100%	4,18	99%	In ultimazione
RM - Miglioramento sicurezza in galleria	J57D22000140001	4,08	4,08	100%	0,69	17%	Realizzazione
TO - Miglioramento sicurezza in galleria	J67D22000210001	3,82	3,82	100%	0,00	0%	Progettazione
Miglioramento sicurezza in galleria - interventi coordinati dalla sede c.le	J57108000200001	3,26	3,26	100%	2,78	85%	Realizzazione
AN - Miglioramento sicurezza in galleria	J87F19000170001	3,17	3,17	100%	0,09	3%	Progettazione
NA - Miglioramento sicurezza in galleria	J97F20000110001	3,12	3,12	100%	3,03	97%	In ultimazione
NA - Miglioramento sicurezza in galleria	J97D24000030001	3,02	3,02	100%	2,68	89%	Realizzazione
FI - Miglioramento sicurezza in galleria	J87B13000070001	2,85	2,85	100%	0,19	7%	Realizzazione
RC - Miglioramento sicurezza in galleria	J27D23000040001	2,76	2,76	100%	1,84	67%	Realizzazione
MI - Miglioramento sicurezza in galleria	J97D24000010001	2,71	2,71	100%	1,16	43%	Realizzazione
RC - Miglioramento sicurezza in galleria	J27D25000010001	2,53	2,53	100%	0,00	0%	Progettazione
TO - Miglioramento sicurezza in galleria	J67F19000050001	2,44	2,44	100%	0,19	8%	Realizzazione
GE - Miglioramento sicurezza in galleria	J97D22000350001	2,37	2,37	100%	0,34	14%	Realizzazione
RM - Miglioramento sicurezza in galleria	J57H21000830001	2,22	2,22	100%	0,73	33%	Realizzazione
AN - Miglioramento sicurezza in galleria	J87H21007930001	2,20	2,20	100%	1,79	81%	Realizzazione
VR - Miglioramento sicurezza in galleria	J97D24000040001	2,07	2,07	100%	0,00	0%	Progettazione
MI - Miglioramento sicurezza in galleria	J97B17000560001	1,99	1,99	100%	1,21	61%	Realizzazione
AN - Miglioramento sicurezza in galleria	J87D24000050001	1,99	1,99	100%	0,00	0%	Progettazione
GE - Miglioramento sicurezza in galleria	J97H21015150001	1,86	1,86	100%	1,83	99%	In ultimazione
RM - Miglioramento sicurezza in galleria	J57D22000150001	1,83	1,83	100%	0,07	4%	Realizzazione
VR - Miglioramento sicurezza in galleria	J97F19000090001	1,80	1,80	100%	1,76	98%	In ultimazione
FI - Miglioramento sicurezza in galleria	J87F20000140001	1,76	1,76	100%	0,99	56%	Realizzazione
VR - Miglioramento sicurezza in galleria	J97B17000580001	1,74	1,74	100%	1,59	91%	In ultimazione
RC - Miglioramento sicurezza in galleria	J27D24000020001	1,72	1,72	100%	0,00	0%	Progettazione
Miglioramento sicurezza in galleria - interventi coordinati dalla sede c.le	J57E13000230001	1,70	1,70	100%	0,96	56%	Realizzazione
GE - Miglioramento sicurezza in galleria	J97F20000090001	1,44	1,44	100%	0,28	20%	Realizzazione
TS - Miglioramento sicurezza in galleria	J37D24000010001	1,40	1,40	100%	0,00	0%	Progettazione
NA - Miglioramento sicurezza in galleria	J97D22000330001	1,38	1,38	100%	0,00	0%	Progettazione
RM - Miglioramento sicurezza in galleria	J57D25000010001	1,25	1,25	100%	0,00	0%	Progettazione
RC - Miglioramento sicurezza in galleria	J27D22000050001	1,24	1,24	100%	0,99	80%	Realizzazione
TS - Miglioramento sicurezza in galleria	J37D22000150001	1,12	1,12	100%	0,65	59%	Realizzazione
RC - Miglioramento sicurezza in galleria	J27F19000070001	1,00	1,00	100%	0,44	44%	Realizzazione
TO - Miglioramento sicurezza in galleria	J67B17000620001	0,88	0,88	100%	0,54	62%	Realizzazione
Realizzazione interventi per gli adeguamenti di sicurezza in galleria tratta AV/AC Torino - Milano	J57111000180001	0,80	0,80	100%	0,64	81%	Realizzazione
Miglioramento sicurezza in galleria - interventi coordinati dalla sede c.le	J57112000140001	0,59	0,59	100%	0,46	78%	Realizzazione
VR - Miglioramento sicurezza in galleria	J97D22000370001	0,37	0,37	100%	0,35	92%	In ultimazione
RC - Miglioramento sicurezza in galleria	J27H21000720001	0,30	0,30	100%	0,01	2%	Progettazione
NA - Miglioramento sicurezza in galleria	J24H14000740001	0,11	0,10	97%	0,10	100%	In ultimazione
Sicurezza in galleria - interventi diffusi		5.945,28	360,23	6%	177,39	49%	

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025**Programma A1004B: Risanamento acustico****Tabella A01-Programmi prioritari ferrovie - Sicurezza, adeguamento a nuovi standard e resilienza al climate change****DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI**

Il programma di risanamento acustico prevede interventi diffusi sull'intera rete con l'obiettivo di contenere ed abbattere l'emissione sonora dei rotabili attraverso l'installazione di opere di mitigazione (barriere antirumore) e di interventi diretti sui ricettori. Al fine di ottimizzare la programmazione degli interventi RFI ha redatto, secondo le direttive emanate con il DM Ambiente del 29.11.2000 "Criteri per la predisposizione di piani di contenimento del rumore da parte dei gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture", un Piano di interventi di cui si sta dando progressiva attuazione.

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale

STATO DI ATTUAZIONE*attualità dati: 30/06/2025*

Attualmente sono in progettazione n. 32 interventi, così suddivisi: Abruzzo: 3; Emilia Romagna: 2; Liguria: 10; Lombardia: 3; Marche: 4; Toscana: 7; Trentino Alto Adige: 1; Veneto: 2. Sono in CdS o in affidamento n. 15 interventi, così suddivisi: Abruzzo: 2; Calabria: 2; Emilia Romagna: 1; Lazio: 2; Liguria: 1; Lombardia: 2; Toscana: 4; Trentino Alto Adige: 1. Sono in realizzazione n. 22 interventi, così suddivisi: Abruzzo: 4; Campania: 2; Emilia Romagna: 3; Lazio: 6; Lombardia: 1; Piemonte: 3; Trentino Alto Adige: 2; Veneto: 1.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Adeguamento ad obblighi normativi, riconduzione nei limiti di legge l'esposizione al rumore dei ricettori censiti nel Piano di Risanamento Acustico predisposto da RFI



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici											
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change	Adeguamento a standard tecnici	Sviluppo tecnologico	Sistemi regionali e metropolitani	Potenziamento connessioni merci	Sviluppo corridoi TEN-T	Completamento valichi alpini	Alta Velocità (AV)	
Risanamento acustico - interventi diffusi	X							X														X

QUADRO FINANZIARIO*milioni di euro*

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate							Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
10.604,67	936,48	di cui: 917,21	4,67	0,00	0,00	0,00	14,60	30,00	46,79	9.591,40

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A1004B: Risanamento acustico

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
10.603,63				1,04		10.604,67	Variazione del costo dovuta ad adeguamenti tariffari

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
916,30			-0,85	21,04		936,48	Copertura dei fabbisogni indifferibili connessi alla prosecuzione del programma e per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Risanamento acustico - interventi diffusi	10.604,67	936,48	9.668,19	1.415,76	9.188,90	559,73	338,42	247,63	26,07	17,70	17,05	28,06	31,73	10.254,98
	10.604,67	936,48	9.668,19	1.415,76	9.188,90	559,73	338,42	247,63	26,07	17,70	17,05	28,06	13,18	10.254,98

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Programmazione risanamento acustico e ambientale		8.754,74	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Interventi di risanamento acustico	J19G02000010001	1.793,69	887,39	49%	313,05	35%	Realizzazione
Progettazione interventi di risanamento acustico	J31H01000190001	47,61	47,61	100%	45,67	96%	In ultimazione
Risanamento Acustico Interventi DTC		8,63	1,49	17%	0,00	0%	Progettazione
Risanamento acustico - interventi diffusi		10.604,67	936,48	9%	358,73	38%	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma comprende principalmente le attività di smaltimento dei materiali inquinanti di risulta dei processi di manutenzione dell'infrastruttura (acciaio, rame, traverse, pietrisco, terre di scavo, residui di lavorazioni, ecc) e la bonifica dei siti inquinati. Per i materiali tolti d'opera viene innanzitutto valutato il riuso di quelli ancora in buono stato di conservazione in modo da limitare il prelievo di nuove materie prime. I materiali non reimpiegabili vengono ceduti a terzi, privilegiando le attività che garantiscono il loro recupero. Solo quando anche questa soluzione non è praticabile si procede allo smaltimento.

Le principali attività consistono in: - Smaltimento di pietrisco amiantato - Smaltimento di traverse e legnami impregnati - Bonifica di siti inquinati

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

In corso attività accessorie e di completamento. (programma migrato nel CdP-S).

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Adeguamento ad obblighi normativi- Sostenibilità ambientale



Capacità	
Velocità	
Accessibilità	
Regolarità	
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	X
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici									
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Smaltimento materiali inquinanti e altri obblighi di legge (annualità fino al 2021) - interventi diffusi	X																	X		

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
32,40	32,39	di cui:	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A1004D: Smaltimento materiali inquinanti e altri obblighi di legge (annualità fino al 2021)

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
114,62	-82,23					32,40
Variazione del costo dovuta allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.						

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
114,62	-82,23					32,39

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Smaltimento materiali inquinanti e altri obblighi di legge (annualità fino al 2021) - interventi diffusi	32,40	32,39	0,00	29,55	2,85	29,46	27,83	3,57	1,16	0,60	16,35	4,84	8,18	4,41
	32,40	32,39	0,00	29,55	2,85	29,46	27,83	3,57	1,16	0,60	16,35	4,84	1,46	4,41

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attivo
TO - smaltimento materiali inquinanti	J67D22000110001	11,53	11,53	100%	10,89	94%	In ultimazione
TO - smaltimento materiali inquinanti	J67H21010160001	8,00	8,00	100%	7,93	99%	In ultimazione
VR - smaltimento materiali inquinanti	J97J18000120001	2,50	2,50	100%	2,32	93%	In ultimazione
FI - smaltimento materiali inquinanti	J87F20000080001	2,50	2,50	100%	1,26	50%	Realizzazione
NA - smaltimento materiali inquinanti	J97J18000110001	2,10	2,10	100%	2,01	96%	In ultimazione
GE - smaltimento materiali inquinanti	J97H21017050001	1,64	1,64	100%	1,59	97%	In ultimazione
VE - smaltimento materiali inquinanti	J17J18000630001	1,12	1,12	100%	1,08	96%	In ultimazione
VE - smaltimento materiali inquinanti	J17F19000080001	1,00	1,00	100%	0,23	23%	Realizzazione
PA - smaltimento materiali inquinanti	J67J18000180001	0,90	0,90	100%	0,31	34%	Realizzazione
AN - smaltimento materiali inquinanti	J87F20000250001	0,50	0,50	100%	0,38	77%	Realizzazione
VR - smaltimento materiali inquinanti	J97F20000210001	0,40	0,40	100%	0,16	40%	Realizzazione
TS - smaltimento materiali inquinanti	J37F20000010001	0,20	0,20	100%	0,20	100%	In ultimazione
Smaltimento materiali inquinanti e altri obblighi di legge (annualità fino al 2021) - interventi diffusi		32,40	32,39	100%	28,36	88%	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma è finalizzato all'adeguamento ai moderni standard costruttivi della sovrastruttura ferroviaria per superare i contesti obsoleti della sede. Inoltre l'attuale quadro normativo ha di fatto limitato molto le tecniche disponibili per il trattamento del legno al fine di conferirgli la durabilità richiesta e ciò ne rende difficoltoso e costoso l'approvvigionamento rispetto alle potenziali esigenze. Gli interventi, articolati su un orizzonte di sette anni consistono nell'adeguamento ai moderni standard costruttivi dell'armamento ferroviario (binari e deviatori) nonché nella sostituzione di binari e deviatori posati su traverse in legno. La priorità di intervento è stata determinata tenendo conto della vetustà, del tipo di armamento, e dei volumi di traffico delle linee mentre la capacità produttiva tiene conto della disponibilità dell'infrastruttura in termini di materiali, personale di scorta ed interruzioni necessarie per le lavorazioni (inserimento su Scenario Tecnico).

Le principali attività consistono in: - Sostituzione di binari e deviatori posati su traverse in legno - Adeguamento ai moderni standard costruttivi di binari e deviatori. Gli interventi interessano l'intera rete con priorità assegnate in sede di pianificazione annuale degli interventi in coerenza con: - Vetustà ed obsolescenza - Tipologia della linea - Disponibilità dello scenario tecnico (interruzioni e rallentamenti)

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

In corso attività accessorie e di completamento. (programma migrato nel CdP-S).

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- miglioramento del livello di sicurezza e mitigazione del rischio-Gestione obsolescenza- Sostenibilità ambientale



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica						Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	
Sicurezza armamento (annualità fino al 2021) - interventi diffusi	X				X			X	X	X	X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A1004E: Sicurezza armamento (annualità fino al 2021)

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve			
								Priorità 1	Priorità 2		
914,72	914,72	di cui:	673,14	5,13	0,00	159,76	71,69	5,00	0,00	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						CdP-I agg.2025	Variazione del costo dovuta ad adeguamenti tariffari e allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze		
3.804,44	-2.889,92			0,20			

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
3.804,44	-2.889,92			0,20		914,72
Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)						

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Sicurezza armamento (annualità fino al 2021) - interventi diffusi	914,72	914,72	0,00	896,07	18,64	898,79	867,09	282,60	197,82	281,53	69,53	22,69	155,45	44,20
	914,72	914,72	0,00	896,07	18,64	898,79	867,09	282,60	197,82	281,53	69,53	22,69	16,34	44,20

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
NA Upgrading e miglioramento per la sicurezza dell'infrastruttura	J97G20000070001	182,56	182,56	100%	157,79	86%	Realizzazione
NA Upgrading e miglioramento per la sicurezza dell'infrastruttura	J97F20000020001	117,00	117,00	100%	115,33	99%	In ultimazione
NA Upgrading e miglioramento per la sicurezza dell'infrastruttura	J97J19000070001	77,30	77,30	100%	76,68	99%	In ultimazione
NA Upgrading e miglioramento per la sicurezza dell'infrastruttura	J97D18000010001	58,20	58,20	100%	56,92	98%	In ultimazione
BO - Upgrading e miglioramento per la sicurezza dell'infrastruttura	J87G20000110001	55,01	55,01	100%	54,61	99%	In ultimazione
BO - Upgrading e miglioramento per la sicurezza dell'infrastruttura	J87F20000060001	55,00	55,00	100%	54,55	99%	In ultimazione
TO - Upgrading e miglioramento per la sicurezza dell'infrastruttura	J67G20000010001	48,12	48,12	100%	46,92	97%	In ultimazione
RC Upgrading e miglioramento per la sicurezza dell'infrastruttura	J27H21000680001	42,99	42,99	100%	42,04	98%	In ultimazione
BA Upgrading e miglioramento per la sicurezza dell'infrastruttura	J87J19000060001	40,00	40,00	100%	39,68	99%	In ultimazione
TO - Upgrading e miglioramento per la sicurezza dell'infrastruttura	J67D18000010001	38,30	38,30	100%	37,91	99%	In ultimazione
BA Upgrading e miglioramento per la sicurezza dell'infrastruttura	J87D18000010001	34,00	34,00	100%	33,72	99%	In ultimazione
TO - Upgrading e miglioramento per la sicurezza dell'infrastruttura	J67J19000040001	33,70	33,70	100%	33,45	99%	In ultimazione
NA Upgrading e miglioramento per la sicurezza dell'infrastruttura	J97B17000310001	32,53	32,53	100%	32,11	99%	In ultimazione
VR Upgrading e miglioramento per la sicurezza dell'infrastruttura	J97G20000080001	31,45	31,45	100%	31,28	99%	In ultimazione
GE Upgrading e miglioramento per la sicurezza dell'infrastruttura	J97G20000060001	23,56	23,56	100%	23,19	98%	In ultimazione
GE Upgrading e miglioramento per la sicurezza dell'infrastruttura	J97F20000000001	21,00	21,00	100%	20,91	100%	In ultimazione
TO - Upgrading e miglioramento per la sicurezza dell'infrastruttura	J67B16000130001	16,50	16,50	100%	16,26	99%	In ultimazione
NA Upgrading e miglioramento per la sicurezza dell'infrastruttura	J97B16000220001	7,50	7,50	100%	7,25	97%	In ultimazione
Sicurezza armamento (annualità fino al 2021) - interventi diffusi		914,72	914,72	100%	880,61	96%	

Programma A1004F: Rilievi, progettazioni e interventi di adeguamento a STI Opere d'arte

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale

attualità dati: 30/06/2025

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- X

Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali

X

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A1004F: Rilievi, progettazioni e interventi di adeguamento a STI Opere d'arte

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate									Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatiche di breve			
									Priorità 1	Priorità 2		
1.395,27	163,35	di cui:	162,75	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	19,59	1.171,32	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE						
Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrig	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
1.395,27						1.395,27
Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrig	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
187,03				30,00	-53,67	163,35
Copertura dei fabbisogni indifferibili connessi alla prosecuzione del programma; rimodulazione a favore dell'intervento A1017; ulteriore rimodulazione di risorse nell'ambito degli interventi A01 e A02, come previsto da art. 1 co. 4 del Contratto.						

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Rilievi, progettazioni e interventi di adeguamento a STI Opere d'arte - interventi diffusi	1.395,27	163,35	1.231,91	116,54	1.278,73	92,16	59,30	4,46	4,20	12,41	8,66	14,80	9,46	1.335,11
	1.395,27	163,35	1.231,91	116,54	1.278,73	92,16	59,30	4,46	4,20	12,41	8,66	14,80	15,63	1.335,11

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Adeguamento a STI (primi interventi)		1.250,11	36,51	3%	0,00	0%	Progettazione
AN - Adeguamento a STI	J84E21002850001	27,28	27,28	100%	2,16	8%	Realizzazione
Rilievi opere d'arte e progettazione interventi	J53D21001370001	25,20	17,20	68%	9,32	54%	Realizzazione
BO - Adeguamento a STI	J84G18000190001	20,76	20,76	100%	9,86	48%	Realizzazione
DTEC - Adeguamento a STI	J54G18000190001	18,20	8,20	45%	0,64	8%	Realizzazione
RM - Adeguamento a STI	J54G18000200001	16,94	16,94	100%	13,55	80%	Realizzazione
VR - Adeguamento a STI	J94G18000170001	16,56	16,56	100%	14,00	85%	Realizzazione
TS - Adeguamento a STI	J34G18000210001	7,72	7,72	100%	6,35	82%	Realizzazione
FI - Adeguamento a STI	J84G18000200001	4,60	4,60	100%	4,52	98%	In ultimazione
GE - Adeguamento a STI	J94G18000150001	3,06	3,06	100%	2,21	72%	Realizzazione
MI - Adeguamento a STI	J94G18000160001	1,80	1,80	100%	1,78	99%	In ultimazione
TO - Adeguamento a STI	J64G18000210001	1,10	1,10	100%	1,08	98%	In ultimazione
VE - Adeguamento a STI	J14G18000260001	1,00	1,00	100%	1,00	100%	In ultimazione
PA - Adeguamento a STI	J64G18000200001	0,63	0,63	100%	0,63	100%	In ultimazione
CA - Adeguamento a STI	J74E21000910001	0,31	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Rilievi, progettazioni e interventi di adeguamento a STI Opere d'arte - interventi diffusi		1.395,27	163,35	12%	67,09	41%	

Programma A1006: Soppressione passaggi a livello

Tabella A01-Programmi prioritari ferrovie - Sicurezza, adeguamento a nuovi standard e resilienza al climate change

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma di soppressione P.L. comprende interventi per la realizzazione di opere sostitutive di tutti passaggi a livello ricadenti sulle linee commerciali, sui nodi e anche su alcune linee complementari. Le intersezioni a raso tra le linee ferroviarie e le strade costituiscono infatti punti d'interferenza del traffico spesso all'origine di pesanti anomalie dell'esercizio e, talora, di gravi incidenti anche mortali. Per la definizione del perimetro del programma e la selezione dei P.L. da eliminare sono stati utilizzati i seguenti criteri e priorità previsti nella Legge 354/98: - velocità e frequenza dei convogli ferroviari; - volume medio giornaliero del traffico stradale veicolare; - posti in corrispondenza dell'attraversamento; - P.L. in aree urbane e metropolitane ad alta densità abitativa e di traffico locale; - incidentalità storica del passaggio a livello.

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Nel 2024 sono stati soppressi n. 61 PL così suddivisi: Abruzzo 2; Basilicata: 1; Campania: 6; Emilia Romagna: 6; Lazio: 2; Liguria: 1; Lombardia: 13; Marche: 1; Piemonte: 10; Puglia: 1; Sardegna: 2; Toscana: 5; Umbria: 1; Veneto: 10.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- miglioramento del livello di sicurezza e mitigazione del rischio per eventi legati all'attraversamento a raso dei passaggi a livello- Adeguamento ad obblighi normativi- miglioramento regolarità della circolazione: per tutti i servizi, eliminazione dei ritardi derivanti dai guasti al passaggio al livello soppresso- Eliminazione delle interferenze sia su viabilità pubbliche che in gestione a privati- riduzione tempi di percorrenza: in presenza di passaggi a livello protetti da segnalamento proprio, eliminazione della riduzione di velocità ad esso associata



	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lombardia
Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica											Obiettivi strategici									
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Sviluppo tecnologico	Sistemi regionali e metropolitani	Potenziamento connessioni merci	Sviluppo corridoi TEN-T	Completamento valichi alpini	Alta Velocità (AV)	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Soppressione passaggi a livello linea Milano-Lecco - Sondrio - Tirano	X		X							X				X				X			
Soppressione passaggi a livello - interventi diffusi				X	X									X				X			

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A1006: Soppressione passaggi a livello

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
7.927,79	2.698,98		2.080,57	157,62	81,80	0,00	54,01	324,98	20,00	204,00	5.004,81

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatiIRFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
7.922,37				5,42		7.927,79
						Variazione del costo dovuta ad adeguamenti tariffari

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
2.602,33				85,52	11,14	2.698,98
						Copertura dei fabbisogni indifferibili connessi alla prosecuzione del programma, per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche) e per soccombenze da Collegio Consultivo Tecnico

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Soppressione passaggi a livello - interventi diffusi	7.837,79	2.632,98	5.204,81	2.475,57	5.362,22	2.326,92	1.880,80	1.644,30	43,79	60,17	53,28	66,81	68,42	5.903,94
Soppressione passaggi a livello linea Milano-Lecco - Sondrio - Tirano	90,00	66,00	24,00	36,99	53,01	35,16	4,81	0,00	0,00	0,43	0,96	0,67	5,00	85,43
	7.927,79	2.698,98	5.228,81	2.512,57	5.415,23	2.362,09	1.885,62	1.644,30	43,79	60,60	54,23	67,49	68,02	5.989,36

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Soppressione PL		4.813,82	2,20	0%	0,00	0%	Progettazione
Nuovo Piano Soppressione Passaggi a Livello	J19G01000000001	3.018,97	2.625,78	87%	1.957,92	75%	Realizzazione
Interventi per la soppressione PL in consegna ai privati	J57D17000020001	5,00	5,00	100%	3,23	65%	Realizzazione
Soppressione passaggi a livello - interventi diffusi		7.837,79	2.632,98	34%	1.961,15	74%	
Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38	J84H20000860001	90,00	66,00	73%	8,95	14%	Realizzazione
Soppressione passaggi a livello linea Milano-Lecco - Sondrio - Tirano		90,00	66,00	73%	8,95	14%	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Nell'ambito del Piano della Sicurezza di RFI il progetto prevede la realizzazione di interventi infrastrutturali e sistemi di allarme (reti allarmate per cadute massi) per la mitigazione/risoluzione delle criticità presenti sull'infrastruttura ferroviaria derivanti da fenomeni di dissesto idrogeologico. I punti di maggiore criticità potenziale sono stati individuati attraverso lo studio e la mappatura lungo la rete infrastrutturale delle aree individuate all'interno della banca dati Inventario dei Fenomeni Franosì Italiani (progetto IFFI), dei Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) e dei Piani di gestione rischio alluvioni (PGRA). Tale mappatura ha consentito, mediante la definizione di una specifica metodologia per l'individuazione di un criterio di priorità, la predisposizione di un piano di mitigazione del rischio idrogeologico che comprende anche le situazioni già note al Gestore (Banca dati Punti singolari). Il programma prevede altresì la copertura dei danni cagionati al patrimonio di RFI da calamità naturali ed eventi catastrofici quali alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, verificatisi sul territorio nazionale, non coperti da polizza assicurativa di cui alla L. 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i. e non coperti mediante eventuali finanziamenti ad hoc stanziati in relazione ad eventi specifici

Il programma è articolato in stralci funzionali sulla base della graduatoria di priorità come definita nella nota RFI-DTC-SICS\A011\PI\2014\0001944 che copre tutto il territorio nazionale nei tratti definiti nella mappatura come potenzialmente a rischio idrogeologico. Ad oggi sono stati individuati 3.034 punti singolari per Caduta Massi, Frana, Alluvione ed Erosione Marina e Fluviale. Le attività svolte, riguardano:- Studi, indagini e rilievi;- Progettazioni di interventi mitigativi/risolutivi;- Realizzazione di interventi mitigativi/risolutivi;- Installazione di sistemi di monitoraggio/allarme;- Sperimentazioni. In relazione alla specificità del tratto di infrastruttura esaminato (di estesa chilometrica variabile), tali interventi potrebbero consistere, anche contemporaneamente o in più fasi realizzative, in: sistemazioni idrauliche, barriere paramassi, opere di consolidamento di versanti in frana, reti allarmate, ecc.. Nell'ambito del programma è prevista altresì l'implementazione di una rete di sensori per il monitoraggio diffuso sul territorio che permetta di migliorare ed efficientare la gestione dell'esercizio ferroviario in condizioni di allerta meteo critiche.

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Nel corso del 2024 sono state effettuate n. 90 attività, così suddivise: Abruzzo: 2; Basilicata: 4; Calabria: 4; Campania: 4; Emilia Romagna: 6; Friuli Venezia Giulia: 5; Lazio: 6; Liguria: 5; Lombardia: 1; Marche: 1; Piemonte: 15; Puglia: 3; Sardegna: 13; Sicilia: 2; Toscana: 6; Trentino Alto Adige: 6; Umbria: 1; Valle d'Aosta: 1; Veneto: 5. Nel corso del 2024 sono state effettuate le seguenti attività:- progettazioni e studi di interventi di mitigazione: 61- verifiche di compatibilità idraulica: 81- installazioni di stazioni di monitoraggio idrometrico: 10- installazioni di pluviometri: 52

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- miglioramento del livello di sicurezza e mitigazione del rischio- Miglioramento delle conoscenze sulla fenomenologia del dissesto idrogeologico - Miglioramento performance di circolazione nel progetto si prefigge l'obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza dell'intera rete ferroviaria, rendendo l'infrastruttura maggiormente resiliente agli impatti dei potenziali fenomeni di dissesto idrogeologico generati anche dagli eventi climatici estremi.



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Programma A1013A: Idrogeologia

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Interventi difesa sede da fenomeni dissesto Idrogeologico		842,14	130,00	15%	0,00	0%	Progettazione
Interventi eccezionali climate change		300,00	61,91	21%	0,00	0%	Progettazione
BO - Mitigazione rischio idrogeologico	J87D24000230001	95,66	95,66	100%	35,94	38%	Realizzazione
DTEC - Mitigazione rischio idrogeologico	J97B15000330001	80,99	81,02	100%	48,79	60%	Realizzazione
FI - Mitigazione rischio idrogeologico	J87D24000240001	61,07	61,07	100%	19,14	31%	Realizzazione
CA - Mitigazione rischio idrogeologico	J77D23000020001	38,35	38,35	100%	5,62	15%	Realizzazione
AN - Mitigazione rischio idrogeologico	J87D25000000001	34,62	34,62	100%	0,00	0%	Progettazione
RC - Mitigazione rischio idrogeologico	J27D25000000001	32,36	32,36	100%	0,00	0%	Progettazione
AN - Mitigazione rischio idrogeologico	J87D23000050001	29,38	29,39	100%	14,33	49%	Realizzazione
TO - Mitigazione rischio idrogeologico	J67I18000050001	25,16	25,16	100%	24,98	99%	In ultimazione
GE - Mitigazione rischio idrogeologico	J97D24000120001	24,16	24,16	100%	10,09	42%	Realizzazione
RM - Mitigazione rischio idrogeologico	J57D23000010001	19,49	19,49	100%	17,10	88%	Realizzazione
TO - Mitigazione rischio idrogeologico	J67D24000010001	18,73	18,73	100%	2,83	15%	Realizzazione
AN - Mitigazione rischio idrogeologico	J87D22000040001	18,20	18,20	100%	16,40	90%	In ultimazione

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025							
Programma A1013A: Idrogeologia							
BA - Mitigazione rischio idrogeologico	J87D25000010001	17,86	17,86	100%	0,00	0%	Progettazione
RM - Mitigazione rischio idrogeologico	J57D22000010001	17,59	17,59	100%	16,90	96%	In ultimazione
TO - Mitigazione rischio idrogeologico	J67J19000010001	15,50	15,50	100%	15,24	98%	In ultimazione
RM - Mitigazione rischio idrogeologico	J57D25000000001	15,18	15,18	100%	4,22	28%	Realizzazione
TO - Mitigazione rischio idrogeologico	J67H21000790001	15,10	15,10	100%	10,76	71%	Realizzazione
PA - Mitigazione rischio idrogeologico	J67D24000020001	14,86	14,86	100%	2,30	15%	Realizzazione
TO - Mitigazione rischio idrogeologico	J67D22000030001	13,95	13,95	100%	10,31	74%	Realizzazione
NA - Mitigazione rischio idrogeologico	J97B16000270001	12,87	12,87	100%	12,70	99%	In ultimazione
FI - Mitigazione rischio idrogeologico	J87J19000030001	12,00	12,00	100%	11,52	96%	In ultimazione
BA - Mitigazione rischio idrogeologico	J87D23000070001	11,80	11,80	100%	8,48	72%	Realizzazione
TO - Mitigazione rischio idrogeologico	J67F20000110001	11,60	11,60	100%	11,50	99%	In ultimazione
BO - Mitigazione rischio idrogeologico	J87I18000020001	11,50	11,50	100%	11,39	99%	In ultimazione
NA - Mitigazione rischio idrogeologico	J97D23000030001	11,29	11,29	100%	5,24	46%	Realizzazione
BA - Mitigazione rischio idrogeologico	J87H21001180001	10,76	10,76	100%	10,43	97%	In ultimazione
BA - Mitigazione rischio idrogeologico	J87D22000060001	10,74	10,74	100%	9,79	91%	In ultimazione
NA - Mitigazione rischio idrogeologico	J97I18000070001	10,50	10,50	100%	10,40	99%	In ultimazione
FI - Mitigazione rischio idrogeologico	J87D25000030001	10,30	10,30	100%	0,00	0%	Progettazione
BO - Mitigazione rischio idrogeologico	J87D22000030001	10,27	10,27	100%	7,97	78%	Realizzazione
FI - Mitigazione rischio idrogeologico	J87D22000050001	10,26	10,26	100%	10,16	99%	In ultimazione
BO - Mitigazione rischio idrogeologico	J87D25000020001	9,41	9,41	100%	0,32	3%	Realizzazione
PA - Mitigazione rischio idrogeologico	J67H21000760001	9,39	9,39	100%	7,21	77%	Realizzazione
RC - Mitigazione rischio idrogeologico	J27D22000000001	9,02	9,02	100%	4,98	55%	Realizzazione
MI - Mitigazione rischio idrogeologico	J97I18000040001	9,00	9,00	100%	5,87	65%	Realizzazione
VR - Mitigazione rischio idrogeologico	J97F20000140001	8,75	8,75	100%	8,60	98%	In ultimazione
BA - Mitigazione rischio idrogeologico	J87F20000210001	8,65	8,65	100%	8,61	99%	In ultimazione
VE - Mitigazione rischio idrogeologico		8,52	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
FI - Mitigazione rischio idrogeologico	J87D23000060001	8,50	8,50	100%	0,00	0%	Progettazione
CA - Mitigazione rischio idrogeologico	J77D25000000001	8,50	8,50	100%	0,00	0%	Progettazione
MI - Mitigazione rischio idrogeologico	J97B17000250001	8,33	8,33	100%	6,66	80%	Realizzazione
BO - Mitigazione rischio idrogeologico	J87D23000040001	8,29	8,29	100%	4,53	55%	Realizzazione
FI - Mitigazione rischio idrogeologico	J87H21001170001	8,16	8,16	100%	7,83	96%	In ultimazione
GE - Mitigazione rischio idrogeologico	J97H21000590001	7,91	7,91	100%	4,35	55%	Realizzazione
RC - Mitigazione rischio idrogeologico	J27H21000700001	7,61	7,61	100%	4,35	57%	Realizzazione
VE - Mitigazione rischio idrogeologico	J17D25000000001	7,50	7,50	100%	1,39	18%	Realizzazione
NA - Mitigazione rischio idrogeologico	J97D25000020001	7,48	7,48	100%	0,00	0%	Progettazione
MI - Mitigazione rischio idrogeologico	J97D22000000001	7,10	7,10	100%	3,69	52%	Realizzazione
TS - Mitigazione rischio idrogeologico	J37D22000000001	6,99	6,99	100%	6,28	90%	Realizzazione
GE - Mitigazione rischio idrogeologico	J97D23000020001	6,66	6,66	100%	0,94	14%	Realizzazione
NA - Mitigazione rischio idrogeologico	J97H21000600001	6,52	6,52	100%	4,12	63%	Realizzazione
VR - Mitigazione rischio idrogeologico	J97H21000660001	6,50	6,50	100%	6,26	96%	In ultimazione
NA - Mitigazione rischio idrogeologico	J97B17000280001	6,05	6,05	100%	5,90	98%	In ultimazione
RC - Mitigazione rischio idrogeologico	J27B17000050001	5,95	5,95	100%	4,01	67%	Realizzazione
VR - Mitigazione rischio idrogeologico	J97D22000010001	5,70	5,70	100%	4,35	76%	Realizzazione
VE - Mitigazione rischio idrogeologico	J17D23000010001	5,68	5,68	100%	2,97	52%	Realizzazione
Intervento di difesa del paraggio con opere rigide e morbide (II ipotesi) nel comune di Potenza Picena e Civitanova Marche	E71I23000320009	5,63	5,63	100%	5,63	100%	In ultimazione
NA - Mitigazione rischio idrogeologico	J97F20000160001	5,62	5,62	100%	5,33	95%	In ultimazione
BA - Mitigazione rischio idrogeologico	J87J19000040001	5,50	5,50	100%	5,04	92%	In ultimazione
PA - Mitigazione rischio idrogeologico	J67D22000010001	5,42	5,42	100%	2,55	47%	Realizzazione
CA - Mitigazione rischio idrogeologico	J77D22000000001	5,19	5,19	100%	4,18	81%	Realizzazione
RC - Mitigazione rischio idrogeologico	J27F20000040001	5,15	5,15	100%	3,90	76%	Realizzazione

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A1013A: Idrogeologia

GE - Mitigazione rischio idrogeologico	J97D22000020001	5,14	5,14	100%	3,43	67%	Realizzazione
VR - Mitigazione rischio idrogeologico	J97D23000010001	4,87	4,87	100%	3,18	65%	Realizzazione
NA - Mitigazione rischio idrogeologico	J97D22000030001	4,78	4,78	100%	2,58	54%	Realizzazione
MI - Mitigazione rischio idrogeologico	J87D24000260001	4,50	4,50	100%	0,01	0%	Progettazione
VE - Mitigazione rischio idrogeologico	J17I18000060001	4,50	4,50	100%	4,48	99%	In ultimazione
GE - Mitigazione rischio idrogeologico	J97D25000000001	4,47	4,47	100%	0,00	0%	Progettazione
MI - Mitigazione rischio idrogeologico	J97D25000010001	4,12	4,12	100%	0,00	0%	Progettazione
BO - Mitigazione rischio idrogeologico	J87J19000010001	4,04	4,04	100%	3,75	93%	In ultimazione
VE - Mitigazione rischio idrogeologico	J17F20000030001	3,98	3,98	100%	3,72	93%	In ultimazione
RC - Mitigazione rischio idrogeologico	J27D24000100001	3,53	3,53	100%	1,99	56%	Realizzazione
NA - Mitigazione rischio idrogeologico	J97J19000040001	3,51	3,51	100%	3,50	100%	In ultimazione
VR - Mitigazione rischio idrogeologico	J97J19000020001	3,50	3,50	100%	3,47	99%	In ultimazione
VR - Mitigazione rischio idrogeologico	J97D25000030001	3,46	3,46	100%	0,26	7%	Realizzazione
CA - Mitigazione rischio idrogeologico	J77H21001030001	3,36	3,36	100%	2,67	79%	Realizzazione
VE - Mitigazione rischio idrogeologico	J17D22000000001	3,12	3,12	100%	2,57	82%	Realizzazione
BA - Mitigazione rischio idrogeologico	J87D24000250001	3,09	3,09	100%	1,67	54%	Realizzazione
RC - Mitigazione rischio idrogeologico	J27J19000050001	3,03	3,03	100%	2,27	75%	Realizzazione
RM - Mitigazione rischio idrogeologico	J57D24000110001	2,96	2,96	100%	1,60	54%	Realizzazione
GE - Mitigazione rischio idrogeologico	J97F20000150001	2,92	2,92	100%	2,48	85%	Realizzazione
VE - Mitigazione rischio idrogeologico	J17B17000060001	2,87	2,87	100%	2,84	99%	In ultimazione
CA - Mitigazione rischio idrogeologico	J77J19000010001	2,81	2,81	100%	2,75	98%	In ultimazione
VE - Mitigazione rischio idrogeologico	J17H21000420001	2,78	2,78	100%	2,45	88%	Realizzazione
TS - Mitigazione rischio idrogeologico	J37D23000030001	2,75	2,75	100%	2,69	98%	In ultimazione
PA - Mitigazione rischio idrogeologico	J67D25000000001	2,55	2,55	100%	0,00	0%	Progettazione
MI - Mitigazione rischio idrogeologico	J97H21000650001	2,50	2,50	100%	1,98	79%	Realizzazione
BO - Mitigazione rischio idrogeologico	J87H21001150001	2,21	2,21	100%	2,15	97%	In ultimazione
CA - Mitigazione rischio idrogeologico	J77F20000060001	2,14	2,14	100%	1,04	49%	Realizzazione
VE - Mitigazione rischio idrogeologico	J17J19000000001	2,00	2,00	100%	1,95	97%	In ultimazione
RC - Mitigazione rischio idrogeologico	J27I18000010001	2,00	2,00	100%	0,68	34%	Realizzazione
VR - Mitigazione rischio idrogeologico	J97B16000250001	1,54	1,54	100%	1,49	97%	In ultimazione
RC - Mitigazione rischio idrogeologico	J27D23000000001	1,50	1,50	100%	0,96	64%	Realizzazione
VR - Mitigazione rischio idrogeologico	J97D24000110001	1,35	1,35	100%	1,01	75%	Realizzazione
MI - Mitigazione rischio idrogeologico	J97D23000000001	1,25	1,25	100%	0,19	15%	Realizzazione
MI - Mitigazione rischio idrogeologico	J97J19000010001	1,00	1,00	100%	0,65	65%	Realizzazione
TS - Mitigazione rischio idrogeologico	J37D25000000001	0,75	0,75	100%	0,00	0%	Progettazione
AN - Mitigazione rischio idrogeologico	J27D24000090001	0,46	0,46	100%	0,00	0%	Progettazione
NA - Mitigazione rischio idrogeologico	J97D24000130001	0,20	0,20	100%	0,13	67%	Realizzazione
Idrogeologia - interventi diffusi		2.194,50	1.235,79	56%	560,94	45%	

Tabella A01-Programmi prioritari ferrovie - Sicurezza, adeguamento a nuovi standard e resilienza al climate change

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede la valutazione della vulnerabilità sismica delle opere d'arte e dei fabbricati appartenenti al Sistema di Grande Viabilità Ferroviaria ai sensi dell'OPCM 3274/2003. Per le opere le cui verifiche non sono soddisfatte, è prevista la progettazione e la realizzazione dei necessari interventi di miglioramento sismico. In dettaglio, il progetto consiste nelle seguenti attività: 1) individuazione e censimento delle opere appartenenti al Sistema di Grande Viabilità ferroviaria ai sensi dell'OPCM 3274/2003 (attualmente 6000 ponti e 1000 fabbricati); 2) affidamento ed esecuzione di indagini e rilievi finalizzati alla valutazione della vulnerabilità sismica; 3) verifiche di vulnerabilità sismica delle suddette opere d'arte e fabbricati; 4) progettazione e realizzazione degli interventi di miglioramento rispetto al rischio sismico. Il principale obiettivo è rendere maggiormente resiliente la rete ferroviaria mediante la riduzione della vulnerabilità sismica delle opere d'arte e dei fabbricati appartenenti al Sistema di Grande Viabilità Ferroviaria progettate prima del 1984, per le quali la verifica sismica fornisce esito negativo. Il programma prevede altresì la copertura dei danni cagionati al patrimonio di RFI da calamità naturali ed eventi catastrofici di natura sismica verificatisi sul territorio nazionale, non coperti da polizza assicurativa di cui alla L. 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i. e non coperti mediante eventuali finanziamenti ad hoc stanziati in relazione ad eventi specifici

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Nel 2024 sono stati effettuati n. 27 interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico, così suddivisi:- Area Nord: 1 interventi;- Area Centro: 10 interventi;- Area Sud e Isole: 16 interventi. Proseguono le verifiche di vulnerabilità sismica e i progetti per gli interventi di miglioramento. Sono state avviate le attività di installazione delle stazioni accelerometriche per la realizzazione della rete sismica di RFI e per l'espansione dei sistemi EWS.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- miglioramento del livello di sicurezza e mitigazione del rischio- adeguamento ad obblighi normativi

- Capacità
- Velocità
- Accessibilità
- Regolarità
- Prestazioni (merci)
- Gestione dei rotabili
- Gestione spazi di stazione
- Intermodalità merci
- Intermodalità passeggeri
- Integrazione della rete
- Upgrade e sicurezza
- Efficientamento processi

LOCALIZZAZIONE

Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica					Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto
Sismica - interventi diffusi										

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A1013B: Sismica

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
1.033,06	311,17		304,55	1,16	0,00	0,00	5,46	0,00	6,00	26,70	689,20

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
1.032,89			0,17			1.033,06
						Variazione del costo dovuta ad adeguamenti tariffari
Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
298,74			30,17	-17,74		311,17
						Copertura dei fabbisogni indifferibili connessi alla prosecuzione del programma e per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche); rimodulazione di risorse nell'ambito degli interventi A01 e A02, come previsto da art. 1 co. 4 del Contratto.

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Sismica - interventi diffusi	1.033,06	311,17	721,89	248,96	784,10	201,92	155,03	57,24	18,17	18,96	20,18	17,29	29,40	876,21
	1.033,06	311,17	721,89	248,96	784,10	201,92	155,03	57,24	18,17	18,96	20,18	17,29	25,01	876,21

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Sismica		751,92	30,00	4%	0,00	0%	Progettazione
DTEC - Miglioramento sismico	J57I12000690001	101,10	101,13	100%	89,46	88%	Realizzazione
Estensione verifiche sismiche su opere d'arte e fabbricati	J59F22000120001	40,30	40,30	100%	15,12	38%	Realizzazione
BO - Miglioramento sismico	J81I19000000001	35,07	35,07	100%	18,34	52%	Realizzazione
RC - Miglioramento sismico	J22J19000060001	28,15	28,15	100%	17,65	63%	Realizzazione
Sistema attivo per la mitigazione del rischio sismico	J56C22000300001	17,30	17,30	100%	0,73	4%	Realizzazione
RM - Miglioramento sismico	J52J19000130001	17,11	17,11	100%	9,68	57%	Realizzazione
AN - Miglioramento sismico	J82J19000170001	13,81	13,81	100%	7,02	51%	Realizzazione
VR - Miglioramento sismico	J11G24000000001	9,50	9,50	100%	2,36	25%	Realizzazione
NA - Miglioramento sismico	J92J19000080001	5,10	5,10	100%	2,73	54%	Realizzazione
PA - Miglioramento sismico	J62J19000160001	4,08	4,08	100%	0,31	8%	Realizzazione
TS - Miglioramento sismico	J32J19000150001	2,23	2,23	100%	2,03	91%	In ultimazione
FI - Miglioramento sismico	J82J19000180001	1,65	1,65	100%	0,00	0%	Progettazione
BA - Miglioramento sismico	J82H23000710001	1,31	1,31	100%	0,26	20%	Realizzazione
MI - Miglioramento sismico	J92J19000070001	1,30	1,30	100%	0,00	0%	Progettazione
Verifiche di vulnerabilità sismica, progettazione e relativi interventi di consolidamento sui fabbricati rientranti nel perimetro del Piano stazioni dell'area Nord	J47D22000170001	1,00	1,00	100%	0,00	0%	Progettazione
VE - Miglioramento sismico	J12J19000180001	0,94	0,94	100%	0,51	54%	Realizzazione
TO - Miglioramento sismico	J62J19000170001	0,80	0,80	100%	0,78	98%	In ultimazione
Verifiche di vulnerabilità sismica, progettazione e relativi interventi di consolidamento sui fabbricati rientranti nel perimetro del Piano stazioni dell'area Centro Nord	J87D22000320001	0,20	0,20	100%	0,06	32%	Realizzazione
Verifiche di vulnerabilità sismica, progettazione e relativi interventi di consolidamento sui fabbricati rientranti nel perimetro del Piano stazioni dell'area Centro Sud	J17D22000120001	0,20	0,20	100%	0,00	0%	Progettazione
Sismica - interventi diffusi		1.033,06	311,17	30%	167,05	54%	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma è finalizzato a contrastare il normale fenomeno dell'invecchiamento dell'infrastruttura riducendo gli ammaloramenti ed i degradi progressivi sulle opere, in particolare quelle più vetuste realizzate anche più di 50 anni fa. Gli interventi sono volti a ripristinare la piena efficienza e la funzionalità delle opere permettendo conseguentemente di incrementare sia il livello di sicurezza sia a ridurre le perturbazioni alla regolarità della circolazione (permettendo, ad esempio, la rimozione di riduzioni di velocità e/o le limitazioni di carico eventualmente imposte).

I lavori consistono tipicamente in:- interventi strutturali coinvolgenti le strutture orizzontali, compresi i relativi rivestimenti, consistenti principalmente in consolidamenti, risanamenti conservativi, ripristini, rinforzi strutturali, ivi compresi gli interventi di cucì-scucì delle lesioni o per il ripristino dell'allettamento delle murature, di posa di centinature e l'infissione di tiranti e chiodature, sostituzione di appoggi nonché opere di demolizione e ricostruzione completa o di sostituzione degli impalcati;- interventi strutturali coinvolgenti le strutture verticali, compresi i relativi rivestimenti, le relative fondazioni, rivestimenti, consistenti principalmente in consolidamenti, risanamenti conservativi, ripristini, rinforzi strutturali, ivi compresi gli interventi di cucì-scucì delle lesioni o per il ripristino dell'allettamento delle murature, l'infissione di tiranti e chiodature ed il ripristino dei rostri. - interventi di eliminazione di percolazioni, di ripristino funzionale di parti di impermeabilizzazione deteriorata, nonché interventi di rifacimento /creazione/ sistemazione di opere atte alla regimentazione delle acque e di opere di protezione fluviale (briglie, sottofondazioni, opere di difesa spondale ecc.) o per l'ottemperanza alle prescrizioni delle Autorità di Bacino (ad es. per aumentare la compatibilità idraulica).- sistemazione di approccio o a corredo dell'opera d'arte ed interferenti direttamente con la stabilità quali ad esempio i muri d'ala o andatori e rilevati di approccio. Il programma contempla anche il ricorso all'effettuazione di monitoraggi o rilievi preliminari, propedeutici o funzionali a tali interventi.

Allo stato attuale il Programma è stato articolato con un orizzonte di 5 anni, andando a interessare le opere d'arte che durante le visite periodiche hanno registrato un codice di giudizio maggiore o uguale a 60. Il perimetro può avere variazioni nel tempo in ragione della fisiologica evoluzione degli ammaloramenti in relazione alla vetustà delle opere; infatti, data la natura dinamica dei codici di giudizio attestanti lo stato di conservazione delle opere, attuali codici di giudizio pari o inferiori a 50 potrebbero aumentare a causa dell'insorgere di ulteriori difettosità o dell'evoluzione delle difettosità precedentemente riscontrate.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

In corso attività accessorie e di completamento. (programma migrato nel CdP-S).

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

-Mitigazione del rischio e incremento degli standard di sicurezza della circolazione;-Adeguamento ad obblighi normativi;-Gestione obsolescenza;-mitigazione/eliminazione delle soggezioni di esercizio.



	Capacità
	Velocità
	Accessibilità
	Regolarità
	Prestazioni (merci)
	Gestione dei rotabili
	Gestione spazi di stazione
	Intermodalità merci
	Intermodalità passeggeri
	Integrazione della rete
	Upgrade e sicurezza
	Efficientamento processi

LOCALIZZAZIONE

Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025**Programma A1014: Piano conservazione opere d'arte (annualità fino al 2021)**

GE - Realizzazione interventi di conservazione delle opere d'arte	J97F20000170001	6,65	6,65	100%	6,59	99%	In ultimazione
TS - Realizzazione interventi di conservazione delle opere d'arte	J27H21003100001	6,47	6,47	100%	6,03	93%	In ultimazione
GE - Realizzazione interventi di conservazione delle opere d'arte	J97H21000610001	5,35	5,35	100%	4,05	76%	Realizzazione
VE - Realizzazione interventi di conservazione delle opere d'arte	J17F20000040001	5,27	5,27	100%	4,70	89%	Realizzazione
PA - Realizzazione interventi di conservazione delle opere d'arte	J67F20000130001	3,75	3,75	100%	2,92	78%	Realizzazione
VR - Realizzazione interventi di conservazione delle opere d'arte	J97H21000670001	3,74	3,74	100%	3,16	85%	Realizzazione
VE - Realizzazione interventi di conservazione delle opere d'arte	J17H21000430001	2,97	2,97	100%	2,90	98%	In ultimazione
PA - Realizzazione interventi di conservazione delle opere d'arte	J67H21000770001	2,35	2,35	100%	1,74	74%	Realizzazione
VR - Realizzazione interventi di conservazione delle opere d'arte	J97F20000200001	2,10	2,10	100%	1,76	84%	Realizzazione
BO - Realizzazione interventi di conservazione delle opere d'arte	J87F20000010001	1,74	1,74	100%	1,71	98%	In ultimazione
TS - Realizzazione interventi di conservazione delle opere d'arte	J37F20000070001	1,72	1,72	100%	1,23	72%	Realizzazione
Risanamento strutturale e conservativo del ponte sul fiume Dora Baltea in località S. Anna	J47H20000320001	1,00	1,00	100%	0,00	0%	Progettazione
CA - Realizzazione interventi di conservazione delle opere d'arte	J77F19000070001	0,80	0,80	100%	0,67	84%	Realizzazione
CA - Realizzazione interventi di conservazione delle opere d'arte	J77H21001040001	0,67	0,67	100%	0,49	74%	Realizzazione
RC - Realizzazione interventi di conservazione delle opere d'arte	J27H21000710001	0,48	0,48	100%	0,36	76%	Realizzazione
Piano conservazione opere d'arte (annualità fino al 2021) - interventi diffusi		264,57	264,57	100%	218,01	82%	

Programma A1017: Monitoraggio Infrastruttura

Nuovo inserimento

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale

attualità dati: 30/06/2025

X

Territorio Nazionale

Monitoraggio Infrastruttura - interventi diffusi

milioni di euro

[illegible]

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A1017: Monitoraggio Infrastruttura

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
0,00					300,00	300,00	Avvio di nuove attività in ambito Monitoraggio Infrastrutture e Rilevi Ponti con Droni.

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
0,00					40,74	40,74	Rimodulazione dall'intervento A1004F

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Monitoraggio Infrastruttura - interventi diffusi	300,00	40,74	259,26	19,38	280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	300,00
	300,00	40,74	259,26	19,38	280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Ispezioni con Droni		280,00	20,74	7%	0,00	0%	Progettazione
Monitoraggio infrastruttura	J54J25000060001	20,00	20,00	100%	0,00	0%	Progettazione
Monitoraggio Infrastruttura - interventi diffusi		300,00	40,74	14%	0,00	0%	

Tabella A01-Programmi prioritari ferrovie - Sicurezza, adeguamento a nuovi standard e resilienza al climate change

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'iniziativa consiste nell'analisi della ventosità lungo la infrastruttura ferroviaria nazionale per individuare le tratte maggiormente soggette all'azione dei venti trasversali e definire le azioni da intraprendere che possono essere di tipo infrastrutturale, quali l'installazione di barriere antivento, o di tipo procedurale, quali l'adozione di prescrizioni di esercizio eventualmente basate sull'utilizzo di anemometri. È in corso una prima fase del progetto che interessa le linee AV/AC in esercizio. Il principale obiettivo è aumentare la disponibilità dell'infrastruttura e la resilienza ai fenomeni di vento intensi che possono influire sulla dinamica di marcia e quindi sulla sicurezza dell'esercizio.

Gli interventi sono localizzati sulla rete AV/AC Torino - Salerno e interessano prioritariamente le linee AV Roma-Napoli e Bologna-Firenze

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Nel 2024 sono state realizzate 3,4 km di barriere antivento

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Mitigazione del rischio- Adeguamento ad obblighi normativi



- Capacità
- Velocità
- Accessibilità
- Regolarità
- Prestazioni (merci)
- Gestione dei rotabili
- Gestione spazi di stazione
- Intermodalità merci
- Intermodalità passeggeri
- Integrazione della rete
- Upgrade e sicurezza
- Efficientamento processi

X

LOCALIZZAZIONE

Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica									Obiettivi strategici				
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EELL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Mitigazione effetti venti trasversali - interventi diffusi	X													

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
62,27	52,27	di cui: 51,80	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A2004F: Mitigazione effetti venti trasversali

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
61,80				0,47		62,27
Variazione del costo dovuta ad adeguamenti tariffari						

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
51,80				0,47		52,27
Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)						

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo		Fabbis.	Lavori		Impegni	Pagam.	AI 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
		Risorse		S.a.D.										
Mitigazione effetti venti trasversali - interventi diffusi	62,27	52,27	10,00	45,57	16,70	12,80	9,06	1,01	0,07	0,16	0,53	2,90	5,06	53,24
	62,27	52,27	10,00	45,57	16,70	12,80	9,06	1,01	0,07	0,16	0,53	2,90	4,35	53,24

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Mitigazione degli effetti dei venti trasversali	J64H16000160001	52,27	52,27	100%	12,09	23%	Realizzazione
Venti trasversali		10,00	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Mitigazione effetti venti trasversali - interventi diffusi		62,27	52,27	84%	12,09	23%	

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatiche di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
1.088,60	131,00		131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	70,00	846,60

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE										milioni di euro
Evoluzione Costo										
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025				
339,54			749,06			1.088,60	Variazione del costo dovuta ad avvio di nuove Attività in ambito Cyber ed un primo avvio di attività relative alla protezione cantieri ed alla protezione da indebiti attraversamenti.			

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
90,00				41,00		131,00
Copertura dei fabbisogni indifferibili connessi alla prosecuzione del programma						

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Cyber security - interventi diffusi	1.088,60	131,00	957,60	77,97	1.010,63	17,28	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	5,00	1.080,68
	1.088,60	131,00	957,60	77,97	1.010,63	17,28	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	5,27	1.080,68

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Cyber Security IS e TLC		820,60	41,00	5%	0,00	0%	Progettazione
Protezione infrastruttura		108,00	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Cyber Security per impianti CCS e TLC	J54J23000580001	84,00	84,00	100%	13,51	16%	Realizzazione
Protezione infrastruttura		70,00	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Protezione infrastruttura	J54J25000130001	6,00	6,00	100%	0,00	0%	Progettazione
Cyber security - interventi diffusi		1.088,60	131,00	12%	13,51	10%	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma prevede interventi diffusi di upgrading delle linee degli impianti finalizzati ad adeguarne la dotazione per recepire l'evoluzione programmata del traffico in coerenza con i modelli di esercizio previsti negli accordi con gli EE.LL. e con le imprese ferroviarie, ottimizzare la disponibilità dell'infrastruttura e consentire un migliore sfruttamento delle potenzialità della rete, con positive ricadute sulla regolarità di esercizio, e efficientamento dei processi di manutenzione e governo della circolazione. Si prevede altresì il potenziamento della flotta dei Mezzi d'Opera (MdO) e Treni Diagnostici (TD). Le principali linee di intervento riguardano:- upgrade degli impianti del sottosistema di comando-controllo-segnale (CCS) per gestire l'obsolescenza tecnologica e/o eliminare punti singolari - upgrade dei sistemi del sottosistema energia (ENE), per gestire l'obsolescenza tecnologica e/o superare situazioni puntuali con interventi su sottostazioni elettriche (SSE) e impianti di trazione elettrica (TE), nonché elettrificazione tratte di limitata estesa- interventi hardware e software per la digitalizzazione dei processi di manutenzione e governo della circolazione, efficientamento energetico e sostenibilità- interventi di migrazione al nuovo sistema leC- interventi di potenziamento dei Posti Centrali di Circolazione- Interventi di potenziamento e ammodernamento delle SSE e degli edifici di stazione finalizzati ad accogliere la produzione di energia da fotovoltaico- interventi di potenziamento, acquisto e revamping, della flotta dei MdO e TD.

Tale le iniziative più significative si segnalano:- settore ENE: Upgrade impianti TE e SSE, potenziamento sistemi DOTE- Piano di potenziamento del sistema di trazione elettrica per i treni merci pesanti, con l'obiettivo di aumentare la potenzialità elettrica di 33 linee prioritarie sulle quali intervenire, includendo le principali tratte di valico e di confine per il traffico merci internazionale, per un totale di circa 7200 km.- settore CCS: Potenziamento dei posti centrali per il governo della circolazione e implementazione, implementazione sistemi I&C- interventi di migrazione al nuovo sistema leC- interventi di potenziamento dei Posti Centrali di Circolazione- Digital twin- Technical academy-Sviluppo Posti Centrali Sud (Nuovo Posto Centrale di Reggio Calabria e Upgrading SCCM di Palermo)"- acquisto e revamping MdO e TD

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale

STATO DI ATTUAZIONE*attualità dati: 30/06/2025*

MEZZI Nel corso del 2024 prosegue l'attività di riassetto della flotta in esercizio, sia dei mezzi d'opera che per i veicoli diagnostici. Si riepilogano le principali attività svolte quest'anno suddivise per macro aree:Fornitura ed attrezzaggio MDO-Approvata la progettazione definitiva degli autocarrelli lavori settore armamento da 25 Kv/ca e 3 Kv/cc, con contestuale avvio dell'approntamento delle rispettive TdS;-Completata la fornitura di nr. 15 carri (n. 3 R3 e n. 12 OL2) trasferiti ad ONAI per RO;-Consegnati n. 13 MdO con installazione STB;-Collaudo finale n. 3 carri K12;-Consegnata n. 1 autoscala Tesmec OCPD001.-Approntamento n. 1 Treno bimodale TdS e di n. 1 treno di serie (TT1);-Approntamento n. 2 Autocarrelli bimodali TdS (TT4);-Avviato l'allestimento dei sistemi ausiliari e dei sistemi diagnostici per il treno diagnostico Aiace 2.0 (TT3);-Messa in servizio (settore ARM) del treno diagnostico Diamante 2.0 (TT3);-Approvata la progettazione definitiva dei Convogli Diagnostici Multifunzione (TT2) ed avviato l'approntamento della TdS;-Fornitura n. 4 walking stick.-Fornitura n. 17 kit rerailing;-Costruzione n. 100 pedane PRM da 1 metro.Revamping -Revamping n. 43 mezzi d'opera-Upgrade del sistema TLC del treno diagnostico Aiace Ibrido;-Upgrade del sistema TLC del veicolo diagnostico Aldebaran 2.0;-Ottenimento dell'AlSM del veicolo diagnostico DIC-80.SSE Nel 2024 sono stati avviati n. 2 cantieri ad oggi ancora in corso e per altri 2 cantieri si è in fase di progettazione esecutiva.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Miglioramento dell'affidabilità dell'infrastrutturaEfficientamento produttivoPiano di potenziamento del sistema di trazione elettrica per i treni merci pesanti: Il potenziamento permetterà la circolabilità di treni merci fino a 2.500 tonnellate sulle linee potenziate, garantendo alle IF una maggiore efficienza del servizio e la possibilità di inserire un maggior numero di treni pesanti sulle linee potenziate rispetto alla situazione attuale; Il potenziamento del sotto sistema energia avrà delle ricadute positive su tutto il sistema circolazione grazie alla riduzione dei guastill piano di potenziamento della flotta dei Mezzi d'Opera dei Treni Diagnostici è mirato ad accrescere la capacità produttiva interna; avrà delle ricadute positive aumentando la tempestività degli interventi manutentivi e l'ergonomia dei cantieri finalizzati al mantenimento in efficienza dell'IFN.La realizzazione degli interventi, strettamente correlati all'upgrade tecnologico delle linee regionali, consentirà un incremento del livello di affidabilità e regolarità del servizio con possibile sviluppo di un traffico ad alta frequenza."

Programma A2001B: Tecnologie per la circolazione



	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	X

LOCALIZZAZIONE

Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici									
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Interventi diffusi settore Sicurezza e Segnalamento	X			X	X			X			X					X				
Upgrading/sviluppo parco mezzi di manutenzione				X							X					X				
Upgrading/sviluppo parco mezzi di diagnostica mobile				X							X					X				
Technical Academy				X							X					X				
Sistemi informativi integrati per la gestione della circolazione				X							X					X				
Potenziamento posti centrali				X							X					X				
Piano Regolatore Potenziamento SSE - treni merci pesanti e recupero energia frenatura				X							X					X				
Piano Estensione leC (Informazione e Comunicazione)				X							X					X				
Oneri connessi all'arretratezza tecnologica della rete				X							X					X				
Interventi diffusi settore Energia				X							X					X				
Digitalizzazione dei processi, efficientamento produttivo e sostenibilità				X							X					X				
ACC Internalizzati	X																			
Upgrading ERTMS rete AV																				

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
9.055,39	3.689,28	di cui:	3.582,63	2,11	2,50	40,53	8,56	52,95	707,38	507,71	4.151,02

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A2001B: Tecnologie per la circolazione

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrig	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	Variazione del costo dovuta a adeguamenti tariffari, ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (aggiunto CUP J56J16000460001 da riga A2011, aggiunto CUP J80D16000030005 da riga A2010, aggiunto CUP J58E22000260001 da riga P055_A; spostato CUP J51E17000190001 nella riga A2010, spostato CUP J57B15000010005 in A2009). Variazione del costo dovuta allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.
8.609,53	-32,01	476,23		1,64		9.055,39	

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrig	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	Copertura dei fabbisogni indifferibili connessi principalmente al proseguimento degli interventi:- Upgrading/sviluppo parco mezzi di diagnostica mobile;- Upgrading/sviluppo parco mezzi di manutenzione;- Interventi diffusi Energia;- Technical Academy;- ACC internalizzati;- Potenziamento posti centrali.Ulteriore copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche) e con risorse proprie della Società per interventi non rientranti nel Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria; rimodulazione di risorse nell'ambito degli interventi A01 e A02, come previsto da art. 1 co. 4 del Contratto.
3.059,59	-32,01	311,40		47,92	302,38	3.689,28	

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Altre
Upgrading ERTMS rete AV	440,00	10,50	429,50	267,07	172,93	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	440,00
ACC Internalizzati	617,36	418,45	198,91	397,59	219,77	375,78	325,07	143,05	28,05	46,72	36,49	37,22	29,40	286,86
Interventi diffusi settore Sicurezza e Segnalamento	1.214,11	780,03	434,08	670,23	543,88	607,56	557,70	351,37	40,82	45,54	55,17	34,52	60,28	654,69
Interventi diffusi settore Energia	1.599,20	487,12	1.112,08	148,62	1.450,58	104,67	48,38	6,70	2,95	8,99	7,44	5,56	8,47	1.548,25
Piano Regolatore Potenziamento SSE - treni merci pesanti e recupero energia frenatura	422,01	83,50	338,51	217,95	204,05	32,33	7,37	0,00	0,00	0,00	0,08	2,58	5,00	413,60
Potenziamento posti centrali	851,56	143,78	707,78	120,55	731,00	40,78	15,85	0,00	0,00	0,00	0,08	0,78	5,00	834,21
Upgrading/sviluppo parco mezzi di manutenzione	2.177,69	1.049,50	1.128,19	447,27	1.730,43	507,14	357,78	270,03	58,56	63,77	39,74	13,67	52,35	1.715,07
Upgrading/sviluppo parco mezzi di diagnostica mobile	590,54	494,72	95,82	435,83	154,71	331,00	65,47	8,75	12,40	10,32	5,72	16,70	5,00	504,95
Oneri connessi all'arretratezza tecnologica della rete	19,39	19,39	0,00	0,00	19,39	19,39	0,00	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Piano Estensione leC (Informazione e Comunicazione)	782,00	20,00	762,00	16,52	765,48	8,39	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	781,87
Digitalizzazione dei processi, efficientamento produttivo e sostenibilità	163,33	133,29	30,04	23,75	139,58	95,92	79,52	12,60	11,77	16,51	17,34	13,53	17,60	83,44
Sistemi informativi integrati per la gestione della circolazione	12,70	2,00	10,70	1,43	11,27	1,61	1,10	0,00	0,00	0,00	0,17	0,14	5,00	11,69
Technical Academy	165,50	47,00	118,50	3,16	162,34	5,85	5,29	0,00	0,00	0,42	1,05	2,36	5,00	160,23
	9.055,39	3.689,28	5.366,11	2.749,98	6.305,41	2.133,41	1.463,93	811,89	154,55	192,27	163,28	127,05	171,47	7.434,87

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Internalizzazione tecnologie ACC	J56J16000460001	417,36	413,45	99%	342,37	83%	Realizzazione
Tecnologie per la circolazione		200,00	5,00	3%	0,00	0%	Progettazione
ACC Internalizzati		617,36	418,45	68%	342,37	82%	
Upgrading tecnologico AV/AC Milano - Bologna	J34J25000040001	175,00	3,50	2%	0,00	0%	Progettazione
Upgrading tecnologico AV/AC Bologna - Firenze	J94J25000010001	165,00	3,50	2%	0,00	0%	Progettazione
Upgrading tecnologico AV/AC TO - MI e Treviglio - Brescia	J54J25000070001	100,00	3,50	4%	0,00	0%	Progettazione
Upgrading ERTMS rete AV		440,00	10,50	2%	0,00	0%	
Rinnovo tecnologie obsolete		470,87	40,97	9%	0,00	0%	Progettazione
Upgrading e rinnovo impianti tecnologici diffusi	J57B16000430009	305,84	301,20	98%	214,60	71%	Realizzazione

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025							
Programma A2001B: Tecnologie per la circolazione							
Rinnovo per obsolescenza di impianti di stazione, distanziamento, telecomando e di rilevazione temperatura boccole, nonché realizzazione sistemi di diagnostica	J57110000430001	137,00	137,00	100%	135,65	99%	In ultimazione
Attrezzaggi tecnologici linee e impianti intera rete - TO	J21H03000140021	52,40	52,40	100%	51,81	99%	In ultimazione
Attrezzaggi tecnologici linee e impianti intera rete - AN	J21H03000140001	31,79	31,79	100%	20,03	63%	Realizzazione
Attrezzaggi tecnologici linee e impianti intera rete - RM	J21H03000140011	29,20	29,20	100%	21,84	75%	Realizzazione
Tecnologie per la sicurezza	J56E19000070009	25,43	25,43	100%	7,74	30%	Realizzazione
Riduzione dei rischi di interazione Catenaria/Pantografo	J50F22000020001	23,00	23,00	100%	7,51	33%	Realizzazione
Riconfigurazione impianti SCMT - Milano	J37I06000170001	19,99	19,99	100%	19,34	97%	In ultimazione
Attrezzaggi tecnologici linee e impianti intera rete - MI	J54E21000750001	13,88	13,88	100%	13,63	98%	In ultimazione
Riconfigurazione impianti SCMT - Bari	J47I06000110001	12,93	12,93	100%	9,76	76%	Realizzazione
Riconfigurazione impianti SCMT - Bologna	J27I06000050001	10,91	10,91	100%	10,90	100%	In ultimazione
Attrezzaggi tecnologici linee e impianti intera rete - FI	J87H21004090001	10,52	10,52	100%	9,59	91%	In ultimazione
Riconfigurazione impianti SCMT - Ancona	J27I07000000001	7,80	7,50	96%	4,61	61%	Realizzazione
Attrezzaggi tecnologici linee e impianti intera rete - NA	J97H21002300001	7,02	7,02	100%	6,46	92%	In ultimazione
Attrezzaggi tecnologici linee e impianti intera rete - RC	J21H03000140041	6,83	6,83	100%	5,72	84%	Realizzazione
Riconfigurazione impianti SCMT - Roma	J17I07000000001	6,26	8,52	100%	6,26	73%	In ultimazione
Attrezzaggi Tecnologici Linee ed Impianti Intera Rete: Interventi di Efficientamento ed Upgrading della Rete per Sicurezza e Obblighi di Legge	J47J18000310001	6,00	6,00	100%	5,67	95%	In ultimazione
Attrezzaggi tecnologici linee e impianti intera rete - GE	J97B17000510001	6,00	6,00	100%	5,89	98%	In ultimazione
Attrezzaggi tecnologici linee e impianti intera rete - MI	J97D22000090001	5,00	5,00	100%	2,52	50%	Realizzazione
Manutenzione straordinaria e adeguamento agli obblighi di legge	J57D24000070001	4,80	4,80	100%	0,01	0%	Progettazione
Attrezzaggi tecnologici linee e impianti intera rete - VE	J14E21001750001	4,55	4,55	100%	4,28	94%	In ultimazione
Attrezzaggi tecnologici linee e impianti intera rete - PA	J67H21004990001	4,50	4,50	100%	2,88	64%	Realizzazione
Attrezzaggi tecnologici linee e impianti intera rete - BA	J47H21002070001	2,51	2,51	100%	2,32	92%	In ultimazione
Rinnovo/upgrade tecnologico dell'attuale sistema di distanziamento blocco conta assi (BCA) delle linee Benevento - Avellino/Caserta, Vairano C./Rocca D'Evandro - Venafro	J36I18000030001	2,50	2,50	100%	1,25	50%	Realizzazione
Attrezzaggi tecnologici linee e impianti intera rete - TS	J64G18000150001	2,10	2,10	100%	1,96	93%	In ultimazione
Riconfigurazione impianti SCMT - Napoli	J67I07000010001	1,86	1,86	100%	1,21	65%	Realizzazione
Investimenti Direzione Sanità		0,90	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Acquisto materiali d'inventario per obblighi di legge e produttività	J80D16000030005	0,60	0,60	100%	0,26	43%	Realizzazione
Iniziative HR		0,60	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Attrezzaggi tecnologici linee e impianti intera rete - GE	J97H21001500001	0,52	0,52	100%	0,00	0%	Progettazione
Interventi diffusi settore Sicurezza e Segnalamento		1.214,11	780,03	64%	573,71	74%	
Rinnovo tecnologie obsolete		1.352,51	301,92	22%	0,00	0%	Progettazione
Piano Upgrading SSE	J54H16000770001	100,50	109,80	100%	50,41	46%	Realizzazione
Potenziamento SSE e stazioni per autoproduzione da Fonti Rinnovabili		74,80	10,00	13%	0,00	0%	Progettazione
Adeguamento e potenziamento del sottosistema strutturale energetico - ambito TO	J64J24000060001	12,65	12,65	100%	6,66	53%	Realizzazione
Adeguamento e potenziamento del sottosistema strutturale energetico - ambito GE	J94J24000010001	7,40	7,40	100%	0,00	0%	Progettazione
Adeguamento e potenziamento del sottosistema strutturale energetico - ambito RC	J24J24000110001	6,80	6,80	100%	0,00	0%	Progettazione
Adeguamento e potenziamento del sottosistema strutturale energetico - ambito VE	J14J24000010001	6,30	6,30	100%	4,18	66%	Realizzazione
Energy		6,00	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Adeguamento e potenziamento del sottosistema strutturale energetico - ambito BO	J84J24000120001	5,55	5,55	100%	2,17	39%	Realizzazione
Adeguamento e potenziamento del sottosistema strutturale energetico - ambito FI	J84J24000130001	5,30	5,30	100%	0,00	0%	Progettazione
Adeguamento e potenziamento del sottosistema strutturale energetico - ambito AN	J84J24000100001	4,30	4,30	100%	0,11	3%	Progettazione
Adeguamento e potenziamento del sottosistema strutturale energetico - ambito MI	J94J24000020001	3,85	3,85	100%	0,73	19%	Realizzazione
Adeguamento e potenziamento del sottosistema strutturale energetico - ambito PA	J64J24000050001	3,40	3,40	100%	1,40	41%	Realizzazione
Impianti fotovoltaici per l'energia di alimentazione delle stazioni	J58E22000260001	3,00	3,00	100%	1,17	39%	Realizzazione
Adeguamento e potenziamento del sottosistema strutturale energetico - ambito NA	J94J24000030001	2,60	2,60	100%	0,12	5%	Realizzazione
Adeguamento e potenziamento del sottosistema strutturale energetico - ambito RM	J54J24000080001	2,60	2,60	100%	0,01	1%	Progettazione
Adeguamento e potenziamento del sottosistema strutturale energetico - ambito TS	J34J24000020001	1,05	1,05	100%	0,14	13%	Realizzazione
Adeguamento e potenziamento del sottosistema strutturale energetico - ambito BA	J84J24000110001	0,30	0,30	100%	0,00	0%	Progettazione
Adeguamento e potenziamento del sottosistema strutturale energetico - ambito VR	J94J24000040001	0,30	0,30	100%	0,00	0%	Progettazione

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025							
Programma A2001B: Tecnologie per la circolazione							
Interventi diffusi settore Energia		1.599,20	487,12	30%	67,10	14%	
Potenziamento del sistema di trazione elettrica per treni merci pesanti e recupero energia di frenatura	J14E22000000001	234,46	83,50	36%	10,65	13%	Realizzazione
Upgrading a 3KVCC		187,55	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Piano Regolatore Potenziamento SSE - treni merci pesanti e recupero energia frenatura		422,01	83,50	20%	10,65	13%	
Tecnologie per la circolazione		723,11	41,73	6%	0,00	0%	Progettazione
Sviluppo Posti Centrali Sud	J16G21003640001	73,70	57,30	78%	8,62	15%	Realizzazione
Sviluppo Posti Centrali Centro	J86G21006210001	31,75	21,75	69%	12,29	57%	Realizzazione
Upgrading dei posti Centrali linea Adriatica	J67D24000030001	20,00	20,00	100%	0,04	0%	Progettazione
Sviluppo Posti Centrali Nord	J46G21003990001	3,00	3,00	100%	1,35	45%	Realizzazione
Potenziamento posti centrali		851,56	143,78	17%	22,31	16%	
Rinnovo parco mezzi d'opera per manutenzione	J50D16000050001	1.864,13	890,00	48%	357,54	40%	Realizzazione
Revamping dei mezzi d'opera e della diagnostica	J50D17000020001	313,56	159,50	51%	117,55	74%	Realizzazione
Upgrading/sviluppo parco mezzi di manutenzione		2.177,69	1.049,50	48%	475,08	45%	
Acquisto treni e locomotive di manovra per la diagnostica	J50D17000010001	590,54	494,72	84%	108,55	22%	Realizzazione
Upgrading/sviluppo parco mezzi di diagnostica mobile		590,54	494,72	84%	108,55	22%	
Analisi operativa del processo di valorizzazione delle attività e dei beni	J52J19000140001	85,29	85,29	100%	76,42	90%	Realizzazione
Rinnovo tecnologie obsolete		62,30	32,30	52%	0,00	0%	Progettazione
Water Management	J54G18000210009	10,94	10,90	100%	9,71	89%	Realizzazione
CN MOST SPOKE 4 - AUTOR	B83D21014280004	3,40	3,40	100%	0,30	9%	Realizzazione
Investimenti CN-MOST Radar in banda X	B83D21014280004	1,15	1,15	100%	0,00	0%	Progettazione
CN MOST SPOKE 4 - SAFER	B83D21014280004	0,24	0,24	100%	0,24	98%	In ultimazione
Digitalizzazione dei processi, efficientamento produttivo e sostenibilità		163,33	133,29	82%	86,67	65%	
Oneri connessi all'arretratezza tecnologica della rete		19,39	19,39	100%	19,39	100%	In ultimazione
Oneri connessi all'arretratezza tecnologica della rete		19,39	19,39	100%	19,39	100%	
Tecnologie per la circolazione		762,00	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Potenziamento IaP Intera Rete	J51G22000180001	20,00	20,00	100%	1,35	7%	Realizzazione
Piano Estensione IeC (Informazione e Comunicazione)		782,00	20,00	3%	1,35	7%	
O.L. e sicurezza per esercizio ferroviario		9,00	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Obblighi di legge DCI	J57D25000070001	1,70	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Obblighi di legge DCI	J57H21000760001	1,42	1,42	100%	1,15	81%	Realizzazione
Obblighi di legge DCI	J57D23000030001	0,35	0,35	100%	0,11	33%	Realizzazione
Obblighi di legge DCI	J57D24000040001	0,23	0,23	100%	0,00	0%	Progettazione
Sistemi informativi integrati per la gestione della circolazione		12,70	2,00	16%	1,26	63%	
Rinnovo tecnologie obsolete		123,50	5,00	4%	0,00	0%	Progettazione
Technical Academy	J66E19000030009	36,50	36,50	100%	3,45	9%	Realizzazione
Technical Academy - Digital Learning	J51E20000200009	5,50	5,50	100%	2,10	38%	Realizzazione
Technical Academy		165,50	47,00	28%	5,55	12%	

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025
Programma A2004A: Interventi tecnologici per il miglioramento della sicurezza della circolazione

Tabella A02-Programmi prioritari ferrovie - Sviluppo tecnologico

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi consistono nell' upgrading degli impianti tecnologici per protezione della marcia dei treni, già installati sul 100% della rete in esercizio, finalizzati al miglioramento delle funzionalità e alla gestione dell'obsolescenza tecnologica. L'SCMT, installato su oltre 13.100 km di Rete, consente di "proteggere" il treno dal superamento di segnali restrittivi o dal mancato rispetto dei limiti di velocità. Il sistema consente la trasmissione automatica in cabina di guida di tutte le informazioni necessarie alla condotta in sicurezza dei treni. La relazione terra/bordo è realizzata tramite la trasmissione digitale discontinua delle caratteristiche della linea ad un sistema di bordo che elabora i dati ricevuti e li confronta con i valori ammessi, monitora il treno misurando la velocità istante per istante, interviene sulla frenatura non appena la marcia del treno si discosta da quella che garantirebbe la sicurezza, interviene automaticamente nel caso di superamento di segnale restrittivo. L'SSC, installato su oltre 2.700 km di Rete ha la finalità di elevare gli standard di sicurezza della circolazione sulle linee tradizionali non dotate di sistema SCMT. Risulta applicabile su linee diesel sia a semplice che a doppio binario, la cui velocità massima non supera 150 Km/h e prevede le seguenti funzioni: frenatura di emergenza in caso di mancato rispetto di segnale restrittivo, controllo della velocità (tramite sistema odometrico di bordo e GPS), sistema di autodiagnostica via GSM-R. Nell'ambito del programma sono inoltre compresi piccoli interventi di interfacciamento con i sistemi di gestione delle linee recentemente attrezzate con il moderno sistema ERTMS, attivo su oltre 700 km di rete. Inoltre nell'ambito del programma rientra l'attrezzaggio con dispositivi di controllo funghi (DCF), un sistema meccanico di sicurezza che garantisce le corrette quote tra ago e contrago per i deviatori di tangente 0,074 e 0,094, fornendo un ulteriore controllo della manovra. I deviatori con tangente 0,074 e 0,094 sono 6771 di cui 5000 da realizzare in arco di piano. L'iniziativa è in accordo con le direttive ANSFISA per incrementare lo standard di sicurezza della manovra di deviatoio. Il programma comprende altresì ulteriori interventi tecnologici (attrezzaggio con sistemi REDI (Relè a Disco Elettronico), TDS (Trasmissione Dati in Sicurezza), ACBT (Autoregolazione dei Circuiti di Binario Tradizionali), protezione dei movimenti da/per parchi-scali-raccordi) atte a gestire/mitigare i fattori di rischio in attuazione delle disposizioni normative in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria.

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Nel 2024 sono stati effettuati principalmente n. 521 interventi di attrezzaggio con DCF

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Miglioramento della sicurezza e omogeneizzazione dell'attrezzaggio tecnologico delle linee degli impianti. In particolare migrazione da SSC a SCMT consentirà: aumento della sicurezza nel trasporto ferroviario, tramite l'introduzione della funzionalità di protezione delle manovre, l'incremento della protezione dei passaggi a livello, la disponibilità della funzione di protezione del massa assiale, il calcolo a bordo della velocità di rilascio e la progressiva sostituzione dei giunti meccanici con giunti elettrici che, per limiti tecnologici, non possono essere sviluppati sui sistemi in uso sulla rete nazionale (Classe B SCMT e SSC); Sviluppo dell'interoperabilità, i cui vantaggi sono prevalentemente connessi ad una riduzione di tempo di attraversamento delle frontiere e che costituiscono un fattore rilevante nel miglioramento dell'interconnessione tra reti nazionali e reti regionali; Aumento della flessibilità e dell'efficienza nell'implementazione di modifiche al layout di stazione in fase di upgrade tecnologico con ACC, grazie alla semplificazione tecnologica e normativa apportata dal sistema ERTMS



Capacità	
Velocità	
Accessibilità	
Regolarità	
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	X
Upgrade e sicurezza	X
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A2004A: Interventi tecnologici per il miglioramento della sicurezza della circolazione

	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change	Adeguamento a standard tecnici	Sviluppo tecnologico	Sistemi regionali e metropolitani	Potenziamento connessioni merci	Sviluppo corridoi TEN-T	Completamento valichi alpini	Alta Velocità (AV)
Intervento / Opere funzionali																					
Interventi tecnologici per il miglioramento della sicurezza della circolazione - Interventi diffusi																					

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2			
2.386,63	1.296,42	di cui: 1.295,86	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	6,00	130,00	954,21		

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
2.222,19	-236,76		401,20			2.386,63

Variazione di costo relativa allo spostamento in tabella C dei progetti ultimate e ad un incremento di costo relativo agli interventi di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di sistemi e apparecchiature relative al sottosistema strutturale Comando Controllo Segnalamento.

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
1.480,09	-236,76	-0,09			53,17	1.296,42

Copertura dei fabbisogni indifferibili connessi principalmente al proseguimento di interventi di modifiche SCMT, protezione movimenti da e per Parchi-Scali-Raccordi con SCMT, sistema integrativo di controllo deviatoi, V438 - CdB con conta-assi; rimodulazione di risorse nell'ambito degli interventi A01 e A02, come previsto da art. 1 co. 4 del Contratto.

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Interventi tecnologici per il miglioramento della sicurezza della circolazione - Interventi diffusi	2.386,63	1.296,42	1.090,22	1.206,05	1.180,58	1.113,77	1.045,90	878,37	39,13	49,47	32,38	31,50	61,85	1.326,22
	2.386,63	1.296,42	1.090,22	1.206,05	1.180,58	1.113,77	1.045,90	878,37	39,13	49,47	32,38	31,50	29,56	1.326,22

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Sistema controllo marcia treno - 3a fase		709,06	26,00	4%	0,00	0%	Progettazione
Protezione cantieri e mezzi d'opera		401,20	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Sistema di supporto alla condotta del treno	J11J05000060001	348,16	344,75	99%	340,50	99%	In ultimazione
Tecnologie per la sicurezza settore IS	J56C17000070001	342,24	342,24	100%	234,57	69%	Realizzazione
SCMT - realizzazione nuovi sviluppi	J31H03000340001	220,78	220,57	100%	208,74	95%	In ultimazione
SCMT - SST: realizzazione sottosistema di terra	J41H02000080061	186,88	186,88	100%	180,48	97%	In ultimazione
Interventi Tecnologici - Atto di Indirizzo MIT (SCMT)	J57111000210001	112,83	111,24	99%	62,59	56%	Realizzazione
Interventi Tecnologici - Atto di Indirizzo MIT (SSC e diagnostica SSC)	J57111000200001	44,53	43,81	98%	32,56	74%	Realizzazione
Tecnologie per la sicurezza settore IS - PA	J67D22000240001	4,65	4,65	100%	4,09	88%	Realizzazione
Tecnologie per la sicurezza settore IS - FI	J87D22000490001	4,14	4,14	100%	2,90	70%	Realizzazione
Tecnologie per la sicurezza settore IS - BA	J87D22000470001	3,33	3,33	100%	0,94	28%	Realizzazione
Tecnologie per la sicurezza settore IS - CA	J77D22000090001	1,89	1,89	100%	1,40	74%	Realizzazione

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025**Programma A2004A: Interventi tecnologici per il miglioramento della sicurezza della circolazione**

Tecnologie per la sicurezza settore IS - MI	J97D22000400001	1,84	1,84	100%	1,68	91%	In ultimazione
Tecnologie per la sicurezza settore IS - GE	J97D22000390001	1,50	1,50	100%	0,65	43%	Realizzazione
Tecnologie per la sicurezza settore IS - VE	J17D22000170001	1,15	1,15	100%	1,07	93%	In ultimazione
Tecnologie per la sicurezza settore IS - RM	J57D22000190001	0,90	0,90	100%	0,72	80%	Realizzazione
Tecnologie per la sicurezza settore IS - RC	J27D22000140001	0,60	0,60	100%	0,23	39%	Realizzazione
Tecnologie per la sicurezza settore IS - BO	J87D22000480001	0,50	0,50	100%	0,42	83%	Realizzazione
Tecnologie per la sicurezza settore IS - TS	J37D22000180001	0,44	0,44	100%	0,25	58%	Realizzazione
Interventi tecnologici per il miglioramento della sicurezza della circolazione - Interventi diffusi		2.386,63	1.296,42	54%	1.073,79	83%	

Tabella A02-Programmi prioritari ferrovie - Sviluppo tecnologico

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi consistono nell'attrezzaggio della rete con impianti tecnologici atti a rilevare anomalie del materiale rotabile in circolazione sulla rete. In particolare: 1) impianti di Rilevamento Termico Boccole (RTB) e Rilevamento Termico Ruote Frenate (RTF), che consentono il controllo termico a distanza delle boccole dei rotabili, segnalando situazioni immediatamente pericolose per la sicurezza di marcia quali il surriscaldamento degli assi ed il blocco dei freni; 2) sistemi di pesatura dinamica dei rotabili, che sono in grado di rilevare il carico che grava su ogni singola ruota di un convoglio in transito, di evidenziare gli sbilanciamenti longitudinali e trasversali a cui sono soggette le sale e i carrelli e di generare allarmi dovuti al superamento di soglie di tolleranza; 3) Portali Multifunzione, che integrano i sistemi di pesatura con la rilevazione di incrementi di temperatura e principi di incendio e di ingombri oltre la sagoma di libero transito.

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Nel 2024 sono stati installati n.13 nuovi impianti di rilevamento termico boccole e upgradati n. 23 RTB.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Miglioramento dei livelli di sicurezza e mitigazione del rischio- Adeguamento ad obblighi normativi

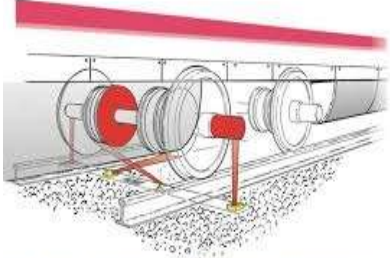

Capacità

Velocità

Accessibilità

Regolarità

Prestazioni (merci)

Gestione dei rotabili

Gestione spazi di stazione

Intermodalità merci

Intermodalità passeggeri

Integrazione della rete

Upgrade e sicurezza

Efficientamento processi

X

LOCALIZZAZIONE

Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EELL	Accordi Internazionali	Interventi commissariati PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani
Sistemi di Rilevazione Termica Boccole (RTB) e Rilevazione Ruote Frenate (RRF) - Interventi diffusi	X													X	
Sistemi di rilevazione squilibrio carichi verticali (pese statiche e dinamiche) - Interventi diffusi	X														X
Portali Multifunzione - Interventi diffusi	X														X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A2004B: Sistemi di Rilevamento Termico Boccole e Controllo Squilibrio Carichi Verticali

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve			
								Priorità 1	Priorità 2		
787,28	525,78	di cui:	525,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,50	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatiIRFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
787,28						787,28

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
484,28				33,50	8,00	525,78
Copertura dei fabbisogni indifferibili connessi principalmente al proseguimento dell'attrezzaggio della rete con impianti tecnologici atti a rilevare anomalie del materiale rotabile in circolazione sulla rete; in particolare tramite impianti di Rilevamento Termico Boccole (RTB); rimodulazione di risorse nell'ambito degli interventi A01 e A02, come previsto da art. 1 co. 4 del Contratto.						

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
			Fabbis.											Oltre
	Costo	Risorse		Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Sistemi di Rilevazione Termica Boccole (RTB) e Rilevazione Ruote Frenate (RRF) - Interventi diffusi	715,81	484,90	230,91	507,88	207,93	371,12	339,12	263,36	14,93	19,13	11,10	14,26	21,42	373,66
Sistemi di rilevazione squilibrio carichi verticali (pese statiche e dinamiche) - Interventi diffusi	32,97	2,38	30,59	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	32,97
Portali Multifunzione - Interventi diffusi	38,50	38,50	0,00	35,32	3,18	36,11	34,70	29,39	2,61	0,62	1,24	0,83	5,92	3,59
	787,28	525,78	261,50	543,20	244,08	407,24	373,82	292,74	17,54	19,75	12,34	15,10	19,59	410,22

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Interventi Tecnologici - Atto di Indirizzo MIT (RTB)	J57111000220001	314,40	246,00	78%	158,30	64%	Realizzazione
R.T.B. Fase nuovo piano regolatore generale	J311H02000040001	205,40	205,40	100%	195,46	95%	In ultimazione
Programma RTB		196,01	33,50	17%	0,00	0%	Progettazione
Sistemi di Rilevazione Termica Boccole (RTB) e Rilevazione Ruote Frenate (RRF) - Interventi diffusi		715,81	484,90	68%	353,77	73%	
Pese dinamiche		32,97	2,38	7%	0,00	0%	Progettazione
Sistemi di rilevazione squilibrio carichi verticali (pese statiche e dinamiche) - Interventi diffusi		32,97	2,38	7%	0,00	0%	
Portali Multifunzionali	J57110000230001	38,00	38,00	100%	35,49	93%	In ultimazione
Tecnologia sicurezza (apparato controllo rotabili)		0,50	0,50	100%	0,00	0%	Progettazione
Portali Multifunzione - Interventi diffusi		38,50	38,50	100%	35,49	92%	

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A2004C: Sistemi per la protezione dei passaggi a livello

Tabella A02-Programmi prioritari ferrovie - Sviluppo tecnologico

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi sono finalizzati alla gestione/mitigazione del rischio connesso all'attraverso dei binari in presenza di barriere chiuse:- attrezzaggi dei passaggi a livello pubblici con tecnologie, basati su sistemi a tecnologia laser o radar e denominati dispositivi di Protezione Automatica Integrativa (PAI-PL), per il rilevamento della presenza di ostacoli (veicoli stradali) che possono essere presenti sull'attraversamento a barriere chiuse con invio comando di arresto del treno- attrezzaggi dei passaggi a livello con sistemi di Pedali Elettronici (PEPL) per controllare in sicurezza sia la manovra sia la liberazione dei passaggi a livello per eliminare la possibilità di apertura anticipata delle barriere del passaggio a livello; l'apertura è condizionata dalla liberazione di un Circuito di Binario ad Audio Frequenza in corrispondenza dell'attraversamento del passaggio a livello, in aggiunta al tradizionale rilevamento del passaggio treno con il pedale di liberazione- grembiali per impedire l'attraversamento pedonale a barriere chiuse- parziale automazione dei PL privati.Gli interventi sono coordinati con il Piano di soppressione dei passaggi a livello e mirano al miglioramento dei livelli di incidentalità e di regolarità di esercizio.

Gli interventi sono diffusi nel territorio nazionale e interessano prioritariamente i PL con maggior traffico veicolare individuati ad esito di analisi di rischio

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Nel 2024 sono stati effettuati n. 84 interventi, così suddivisi:Abruzzo: 3, Calabria: 4; Campania: 4; Emilia Romagna: 9; Friuli Venezia Giulia: 1; Lazio: 3; Liguria: 2; Lombardia: 13; Marche: 2; Piemonte: 1; Puglia: 6; Sardegna: 3; Sicilia: 9; Toscana: 10; Trentino Alto-Adige: 1; Veneto: 13.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Miglioramento dei livelli di sicurezza e mitigazione del rischio- Adeguamento ad obblighi normativi- regolarità di esercizio



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MINS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Sistemi per la protezione dei passaggi a livello - interventi diffusi								X	X	X										X	

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A2004C: Sistemi per la protezione dei passaggi a livello

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
2.264,32	633,99		597,96	18,00	0,00	0,00	18,03	0,00	0,00	58,42	1.571,91

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatiIRF è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
2.264,32						2.264,32

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
382,02				150,00	101,98	633,99
Copertura dei fabbisogni indifferibili connessi principalmente al proseguimento di interventi finalizzati alla gestione/mitigazione del rischio connesso all'attraverso dei binari in presenza di barriere chiuse: in particolare l'installazione di PAI-PL, Pr-PLp, e trasformazioni PL; rimodulazione di risorse nell'ambito degli interventi A01 e A02, come previsto da art. 1 co. 4 del Contratto.						

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Sistemi per la protezione dei passaggi a livello - interventi diffusi	2.264,32	633,99	1.630,32	529,09	1.735,22	344,76	269,09	104,18	26,71	23,28	23,00	33,02	13,69	1.994,03
	2.264,32	633,99	1.630,32	529,09	1.735,22	344,76	269,09	104,18	26,71	23,28	23,00	33,02	60,10	1.994,03

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Incremento sicurezza e regolarità Passaggi a Livello		1.721,91	91,58	5%	0,00	0%	Progettazione
Interventi per incremento sicurezza e regolarità PL	J54B13001100001	542,41	542,41	100%	286,09	53%	Realizzazione
Sistemi per la protezione dei passaggi a livello - interventi diffusi		2.264,32	633,99	28%	286,09	45%	

Tabella A02-Programmi prioritari ferrovie - Sviluppo tecnologico

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma comprende misure atte a gestire/mitigare i fattori di rischio in attuazione delle disposizioni normative in materia di sicurezza della circolazione quali sistemi di diagnostica, fissa e mobile, tecnologicamente avanzati, in grado di acquisire automaticamente i parametri dell'infrastruttura.

Le principali attività interessano :-installazione sistemi di diagnostica fissa/predittiva per impianti di segnalamento sulla infrastruttura ferroviaria (ACC/RTB/PL/CM/ACEI/Alimentazioni). È previsto l'attrezzaggio di 825 impianti di segnalamento con diagnostica.-Attrezzaggio dei treni con sistemi di diagnostica impresenziata per la misura dei parametri caratteristici della geometria del binario sulle linee di IV classe nelle DTP di Cagliari, Palermo e Torino. In una prima fase un investimento è previsto l'attrezzaggio di circa 18 veicoli e circa 15 punti di taratura lungo linea per la copertura di circa 1.200 km di binario.

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Nel corso del 2024 sono stati attivati 50 enti diagnostici.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Miglioramento dei livelli di sicurezza e mitigazione del rischio- Miglioramento dell'affidabilità dell'infrastruttura- Ottimizzazione delle attività manutentive attraverso politiche di tipo predittivo

**LOCALIZZAZIONE**

Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO**Priorità programmatica****Obiettivi strategici**

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica																			Obiettivi strategici		
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change	Adeguamento a standard tecnici	Sviluppo tecnologico	Sistemi regionali e metropolitani	Potenziamento connessioni merci	Sviluppo corridoi TEN-T	Completamento valichi alpini	Alta Velocità (AV)	
Sistemi per la diagnostica dell'infrastruttura - interventi diffusi	X																					X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
363,72	198,52	di cui: 198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,00	39,38	119,82

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A2004D: Sistemi per la diagnostica dell'infrastruttura

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
332,86	-10,40		41,27			363,72	Variazione di costo relativa allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati e ad un incremento di costo relativo alle Tecnologie.

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
189,41	-10,40				19,52	198,52	Copertura dei fabbisogni indifferibili connessi principalmente al proseguimento di interventi finalizzati a gestire/mitigare i fattori di rischio in attuazione delle disposizioni normative in materia di sicurezza della circolazione, tramite, ad esempio, i Dispositivi di Controllo Giunto Meccanico (DCGM) e enti diagnosticati (ACC/RTB/PL/ACEI/Alimentazione).

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Sistemi per la diagnostica dell'infrastruttura - interventi diffusi	363,72	198,52	165,20	127,37	236,36	66,31	62,77	41,49	0,91	2,40	5,24	3,48	20,90	301,55
	363,72	198,52	165,20	127,37	236,36	66,31	62,77	41,49	0,91	2,40	5,24	3,48	8,66	301,55

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Diagnostica impresenziata		232,33	67,55	29%	0,00	0%	Progettazione
Sviluppo e realizzazione diagnostica centralizzata enti IS	J51E17000360001	131,39	130,97	100%	64,29	49%	Realizzazione
Sistemi per la diagnostica dell'infrastruttura - interventi diffusi		363,72	198,52	55%	64,29	32%	

Tabella A02-Programmi prioritari ferrovie - Sviluppo tecnologico

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma comprende misure atte a gestire/mitigare i fattori di rischio in attuazione delle disposizioni normative in materia di sicurezza della circolazione emanate da ANSFISA. In particolare l'obiettivo è quello di eliminare i contesti dichiarati obsoleti dal Decreto 4/2012 art.3 comma 2 di ANSFISA.

Le principali realizzazioni, in parte già concluse, riguardano l'upgrade tecnologico dei sistemi di blocco sulle linee delle DTP di Milano, Genova e Bari attrezzate con Blocco Elettrico Manuale e Blocco Telefonico (tratta Gorizia - Nova Gorica), le linee esercite in Dirigenza Unica e le stazioni con segnali semaforici di protezione. Si prevedono oltre il 2023 ulteriori 10 Interventi di Dismissione contesti obsoleti sui seguenti impianti: Cisano, Ambivere, Terno, Calusco, Paderno, Celano, Collarme, Carrito – Ortona, Cocullo e Anversa

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

A Dicembre 2024 è stato dismesso il BEM sulla tratta Ambivere – Ponte San Pietro.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Miglioramento dei livelli di sicurezza e mitigazione del rischio- Miglioramento dell'affidabilità dell'infrastruttura



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici											
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change	Adeguamento a standard tecnici	Sviluppo tecnologico	Sistemi regionali e metropolitani	Potenziamento connessioni merci	Sviluppo corridoi TEN-T	Completamento valichi alpini	Alta Velocità (AV)	
Dismissione contesti di esercizio obsoleti - interventi diffusi	X																					X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
170,00	170,00	di cui: 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A2004E: Dismissione contesti di esercizio obsoleti

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
170,00						170,00

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
170,00						170,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Dismissione contesti di esercizio obsoleti - interventi diffusi	170,00	170,00	0,00	169,54	0,46	136,23	132,58	99,63	16,51	8,24	1,08	5,84	26,02	38,08
	170,00	170,00	0,00	169,54	0,46	136,23	132,58	99,63	16,51	8,24	1,08	5,84	0,62	38,08

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Dismissione contesti obsoleti	J24H16000310001	170,00	170,00	100%	133,31	78%	Realizzazione
Dismissione contesti di esercizio obsoleti - interventi diffusi		170,00	170,00	100%	133,31	78%	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma consiste in una serie di interventi mirati all'individuazione di soluzioni tecnologiche atte a gestire/mitigare i fattori di rischio correlati alla sicurezza della circolazione e/o dell'esercizio ferroviario, a volte anche in attuazione di nuove disposizioni normative.

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Sono in corso di realizzazione, tra gli altri, i seguenti interventi:- Sistema statico integrato per comando/controllo e Protezione PL;- Nuovo sistema di manovra Multipunto;- Un sistema di monitoraggio di frana con fibra ottica presso il sito di Petacciato sulla linea Adriatica;- Un sistema di monitoraggio geoelettrico di un versante sulla linea AV/AC Roma - Napoli.Si è conclusa l'implementazione del sistema di Early Warning Sismico sulla linea AV/AC Roma -Napoli.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Miglioramento dei livelli di sicurezza e mitigazione del rischio- Adeguamento ad obblighi normativi

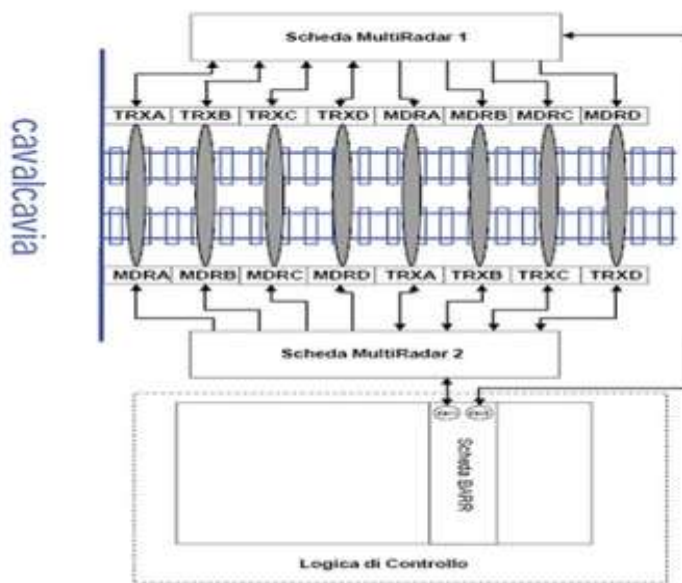

	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Interventi infrastrutturali e tecnologici per la sicurezza - interventi diffusi	X																				X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
162,30	62,64	di cui: 62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	99,66

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A2004G: Interventi infrastrutturali e tecnologici per la sicurezza

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
162,30						162,30

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
63,30					-0,66	62,64	Rimodulazione di risorse nell'ambito degli interventi A01 e A02, come previsto da art. 1 co. 4 del Contratto.

PIANO DELLA SPESA

	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Interventi infrastrutturali e tecnologici per la sicurezza - interventi diffusi	162,30	62,64	99,66	55,46	106,84	31,33	24,84	10,56	1,24	1,98	2,13	4,34	5,98	137,18
	162,30	62,64	99,66	55,46	106,84	31,33	24,84	10,56	1,24	1,98	2,13	4,34	4,87	137,18

AVANZAMENTO PROGRAMMA

	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Sperimentazione nuove tecnologie		101,57	10,91	11%	0,00	0%	Progettazione
Attrezzaggi/adequamenti tecnologici innovativi	J54B13001090001	45,50	36,50	80%	18,95	52%	Realizzazione
Attrezzaggi/adequamenti innovativi per il sotto sistema infrastruttura	J54C19000270001	15,23	15,23	100%	7,59	50%	Realizzazione
Interventi infrastrutturali e tecnologici per la sicurezza - interventi diffusi		162,30	62,64	39%	26,55	42%	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma di investimento riguarda lo sviluppo e l'upgrading - su scala nazionale - della rete radio per la trasmissione mobile fonia/dati tra personale e impianti di terra e personale e impianti a bordo dei treni sia in regime di circolazione normale che in situazioni di anomalità ed emergenza rispondente ai nuovi standard europei. Il programma prevede la progressiva introduzione del nuovo sistema di comunicazione radiomobile ferroviario interoperabile FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) in tecnologia 5G in sostituzione del GSM-R (2G), con interventi di phase-out dell'attuale tecnologia e rinnovo delle piattaforme tecnologiche HW e SW della rete, sia di accesso radio sia di core network (BTS, BSC, MSC R4, IN, HLR, nodi GPRS, sistemi di O&M).

Ulteriori interventi riguardano la realizzazione della Nuova Rete Dati geografica di RFI prevedono l'installazione di apparati di rete in circa 1700 siti dislocati lungo tutta l'infrastruttura ferroviaria nazionale, propedeutica all'implementazione di ERTMS. Nell'ambito del programma è altresì previsto lo sviluppo delle reti 4G/5G lungo le linee ferroviarie (all'aperto e in galleria) per rendere disponibile lungo le linee ferroviarie (all'aperto e in galleria) una copertura radio allo stato dell'arte delle reti pubbliche, affidabile e rispondente ai più elevati standard di qualità per i passeggeri dei treni e per i servizi ferroviari ma anche per la predisposizione per lo sfruttamento da parte degli operatori di telefonia mobile. Il programma prevede inoltre la realizzazione della rete VOIP a larga scala, il rinnovo della rete di Sincronizzazione ed il rinnovo della copertura GSM-R in galleria.

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Per quanto riguarda la Nuova Rete Dati nel 2024 si è provveduto alla consegna lavori per i primi 3.724 km di rete da servire con DWDM, alla consegna delle prestazioni di Progettazione Esecutiva di ulteriori 4.704 km di rete da servire con DWDM e all'incarico di PD per i restanti 2.598 km di rete da servire con DWDM. È in corso di predisposizione il Bando di Gara dell'Accordo Quadro per la realizzazione della rete IP-MPLS sull'intera rete nazionale. Inoltre, nel corso dell'anno 2024 sono state completate le seguenti attività: - Modernizzazione Rete GSM-R: sono state installate 26 BTS MR10 in sostituzione delle obsolete BTS Legacy e realizzati i BSC di Milano, Bologna, Napoli e Roma; - Rete di sincronismo: completata la Progettazione della nuova rete di sincronismo; - Sviluppo reti 4G: ultimate le attività di upgrade tecnologico da 3G a 4G in tutte le gallerie dell'AV. - VoIP: è stata completata la realizzazione della tecnologia VoIP nella DOIT di Torino e sono state quasi concluse le progettazioni per le DOIT di Verona, Firenze e Bari.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- adeguamento delle reti GSM-R e TLC agli ultimi standard al fine di garantire il pieno sviluppo di ERTMS nel rispetto dei piani condivisi con l'UE - digitalizzazione dell'infrastruttura ferroviaria; - abilitazione allo sviluppo di nuovi servizi e modelli di gestione e monitoraggio dei processi ferroviaria - attivazione di nuovi servizi e applicazioni innovative (Big Data/Analytics/Business Intelligent); - integrazione delle reti tecnologiche (ad esempio reti CCS, energia, TVCC, cyber security, ecc.); - utilizzo di un'unica rete di trasmissione dei dati per tutti i servizi tecnologici; - supporto alle politiche di monitoraggio, diagnostica e manutenzione verso logiche IoT; - recepimento requisiti di Cyber Security by design.

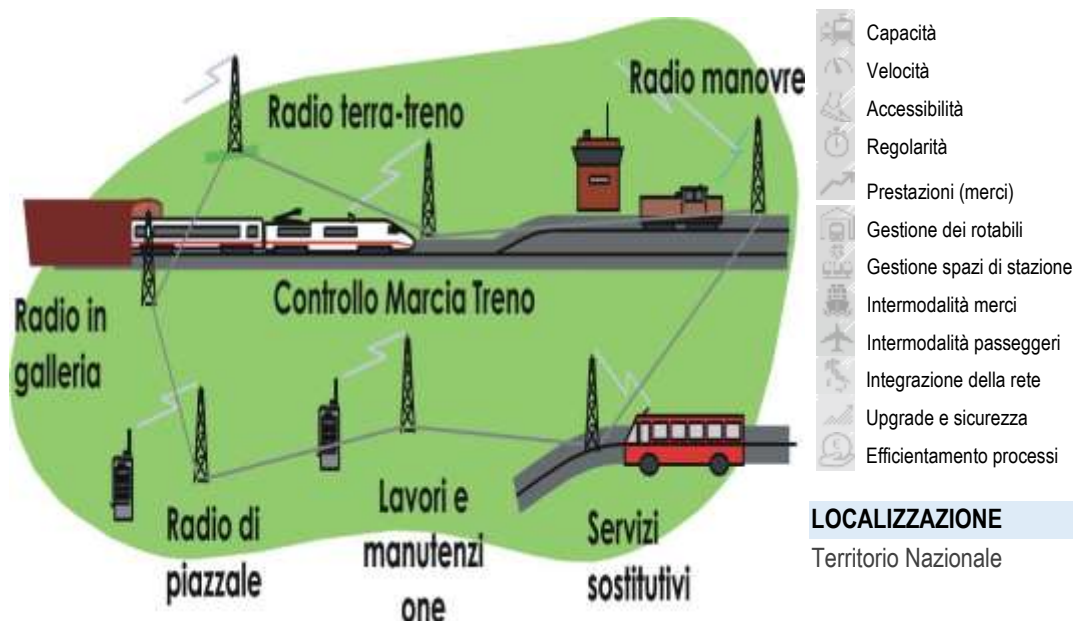

X

LOCALIZZAZIONE

Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A2005: Telecomunicazioni e GSM-R

	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF		Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																						
Nuova Rete di Trasmissione Dati RFI			X	X			X				X					X		X				
Telecomunicazioni e GSM-R - interventi diffusi										X								X				
Reti di telecomunicazione radiomobile (Gigabit rail)										X								X				

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatiche di breve			
									Priorità 1	Priorità 2		
2.055,43	307,51		307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	175,00	1.562,92	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE										milioni di euro
Evoluzione Costo										
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025				
2.096,21			-40,78			2.055,43	Variazione di costo per riduzione del perimetro del programma Reti di telecomunicazione radiomobile (Gigabit Rail) ai soli interventi di competenza del gestore dell'IFN.			

Evoluzione coperture finanziarie											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025					
267,51				40,00		307,51	Copertura dei fabbisogni indifferibili connessi alla prosecuzione del programma				

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	AI 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Telecomunicazioni e GSM-R - interventi diffusi	308,43	112,01	196,42	79,72	228,71	78,16	41,70	0,00	0,10	3,96	4,47	10,63	5,00	266,67
Reti di telecomunicazione radiomobile (Gigabit rail)	1.527,00	62,50	1.464,50	585,37	941,63	16,44	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.525,30
Nuova Rete di Trasmissione Dati RFI	220,00	133,00	87,00	187,30	32,70	76,99	22,32	0,00	0,00	0,03	1,61	0,93	5,00	195,30
	2.055,43	307,51	1.747,92	852,38	1.203,05	171,59	66,96	0,00	0,10	3,99	6,08	11,56	46,43	1.987,27

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Upgrading sistemi di telecomunicazioni		199,13	2,71	1%	0,00	0%	Progettazione
Potenziamento tecnologico sistemi TLC	J56I18000040001	109,30	109,30	100%	51,36	47%	Realizzazione
Telecomunicazioni e GSM-R - interventi diffusi		308,43	112,01	36%	51,36	46%	
Reti di telecomunicazione radiomobile		939,80	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Gigabit Rail & Road	J54J23000750001	587,20	62,50	11%	5,02	8%	Progettazione
Reti di telecomunicazione radiomobile (Gigabit rail)		1.527,00	62,50	4%	5,02	8%	
Nuova Rete di Trasmissione Dati di RFI	J56E19000260009	220,00	133,00	60%	30,00	23%	Realizzazione
Nuova Rete di Trasmissione Dati RFI		220,00	133,00	60%	30,00	23%	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Le attività consistono nella realizzazione, su scala prototipale, di impianti e sistemi ferroviari di nuova concezione a supporto di tutti i processi aziendali ed in particolare della circolazione e della manutenzione. Il programma comprende anche tutte le attività di certificazione e definizione degli standard dei sistemi e prodotti sviluppati e la sperimentazione in campo grazie anche al circuito di test di Bologna San Donato.

Tra le principali attività in corso si segnalano sistemi per la diagnostica integrata dell'infrastruttura su Rete 5G/satellite e sensoristica ad alta sostenibilità ambientale, sistemi di distanziamento ad alta disponibilità e che possano sfruttare reti di Telecomunicazione di ultima generazione e la realizzazione di un insieme di Laboratori con funzione di Dimostratori tecnologici di tutti i sistemi a tecnologia innovativa, lo sviluppo di Piattaforme proprietarie di RFI per l'integrazione di sistemi di segnalamento e applicazioni di tecniche di intelligenza artificiale per il controllo della Rete. Tra le principali attività da sviluppare si segnalano l'attrezzaggio IOT della Rete Ferroviaria con sensoristica innovativa low-power, l'utilizzo di sensoristica innovativa in Fibra Ottica per monitoraggio intelligente del binario, la sperimentazione di veicoli a guida autonoma URV (Unmanned Railway Vehicle) dedicate alle attività di ispezione e monitoraggio dell'infrastruttura e di mezzi leggeri a guida autonoma come ROBIN (Railway Object Inspector), la realizzazione di piattaforme in Realtà Virtuale/Realtà Aumentata per la formazione del personale di manutenzione e circolazione. Si segnalano inoltre gli sviluppi strategici per l'azienda: 1. Piattaforma ACC di RFI, che deve essere aggiornata agli standard europei di interoperabilità, a valle della gap analysis in corso rispetto alle specifiche di interfaccia EULYNX2. Sistema SIPAC (protezione tecnologica cantieri in stazioni equipaggiate con ACC/ACCM)3. Sistema Interruzione Dinamica (protezione tecnologica cantieri in linee a semplice binario per impianti equipaggiati con ACEI e CTC)4. TINO/URV per il monitoraggio lato security delle linee AV5. Sistema EVC (apparato di bordo ERTMS) destinato ai locomotori di manovra.6. MISTRAL Implementazione del sistema di diagnostica di ERTMS denominato MISTRAL 2.0 per linee convenzionali. 7. HD ERTMS – Implementazione delle logiche di interlocking geometrico su ACCM Roma Ostiense - Roma Monte Mario.

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Le principali attività in corso riguardano: 1) Piattaforma ACC di RFI: Prototipazione prima versione HW e SW completata nel corso del 2023 (al netto del sistema integrato di diagnostica), Integrazione della prima versione HW+SW completata a fine anno 2023, Verifica e Validazione avviata per Kernel e Middleware SW della piattaforma e per parti del QL. Nel 2024 sono state completati gli esemplari di serie di tutte le schede elettroniche, eccetto la scheda PFC (Power Factor Corrector), sono stati realizzati gli esemplari di serie dell'armadio di Posto Centrale e di Banco Operatore ed è stato completato il progetto della versione di serie dell'armadio di Posto Periferico. È stato realizzato il primo prototipo di sistema di manutenzione e diagnostica, sono stati certificati Kernel e Middleware SW in ambito SIPAC/Interruzione Dinamica con ottime possibilità di riuso in ambito della Piattaforma ACC di RFI; sono state avviate le attività negoziali per la Certificazione delle schede di Interfaccia al Piazzale (parte del Posto Periferico) con conclusione prevista non prima di fine 2026; è in fase conclusiva la gap analysis nei confronti delle specifiche EULYNX di interfaccia tra sottosistemi, che si concluderà a fine 2025; ad essa seguirà l'adeguamento alle specifiche stesse. Definizione della tratta sperimentale per la Piattaforma ACC di RFI: è stato deciso di non realizzare l'impianto sulla linea Ferrara-Ravenna, ma si è scelto di installare il nuovo sistema sul Circuito Sperimentale di San Donato, gestito da R&S con inizio previsto entro il 2025; le attività sono in corso; è stato proposto di impiegare la Piattaforma RFI a San Donato come Trial Site in ambito Europe's Rail per il collaudo di soluzioni CCS aderenti al System Pillar e per l'armonizzazione delle soluzioni CCS proposte. 2) 3) SIPAC e Protezione Interruzioni: Prototipazione completata per entrambi i sistemi nel 2023; Verifica e Validazione: precedenza data a SIPAC; certificazione completata a fine 2024 per PG ed AG di SIPAC e per le prime 2 AS (Imperia e Pesaro); richiesta di AMIS depositata per Imperia a fine 2024 e prevista in Q1 2025 per Pesaro. È stata avviata una seconda fase di certificazione a seguito delle osservazioni di ANSFISA, che si concluderà in Q4 2025 con l'attivazione di Imperia. Pertanto si prevede per Pesaro l'attivazione in Q3 2026, per Bussoleno (ACC MerMec) a Q4 2026, per San Marcellino (ACC Hitachi) in Q1 2027 e Ronchi Nord (ACC Bombardier) in Q4 2027. Certificazione di Protezione Interruzioni e sperimentazione sulla tratta Poggibonsi-Badesse della linea Empoli-Siena (Interruzione Dinamica) previste in Q3 2026. 4) TINO (Train for INspection Of railway lines – precedentemente noto come URV Unmanned Railway Vehicle): Completata la meccanica del veicolo con l'installazione della carena. Effettuate nel 2024 le prime prove in campo presso il Circuito di San Donato, con segnalamento ERTMS L1 provvisorio. Sono in corso di completamento delle funzioni accessorie ed il sistema di visione, in collaudo da inizio 2025 e tuttora in corso con pieno successo; è stato avviato Organismo Tecnico per analisi di rischio prove su infrastruttura nazionale; il processo di verifica e validazione, certificazione ed omologazione del veicolo presso il RUMO e successivamente RVL sarà avviato nel 2026; seguirà un prototipo industrializzato per la produzione di serie e il relativo aggiornamento dei certificati. 5) Sistema EVC (apparato di bordo ERTMS): prototipazione HW e SW in complete nel 2024; integrazione su target prevista per il 2025. Progetto HW in corso di completamento entro Q3 2025. 6) MISTRAL: realizzate le prime due applicazioni su tratte con ERTMS sovrapposto Novara-Rho e Monza-Chiasso. In fase di aggiudicazione Accordo Quadro per un secondo fornitore di sonde del Sistema Periferico di MISTRAL 2.0. Prevista l'implementazione di ulteriori due applicazioni di MISTRAL 2.0 su altrettante linee in occasione della migrazione ad ERTMS stand alone. Previsto upgrade funzionale del sistema MISTRAL in uso su rete AV. In corso le attività per migrazione della connettività tra apparati MISTRAL su rete IPMPLS. 7) HD ERTMS: realizzata la specifica dei requisiti di dettaglio e completato lo sviluppo delle logiche in ambiente di laboratorio comprensivo delle attività di V&V. In corso le valutazioni da parte di DTC. Per l'implementazione in campo sulla applicazione specifica Roma Ostiense - Roma Monte Mario si attende il completamento delle attività su ACCM Modulo D relative a PP-ACC di Roma Tuscolana.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Incremento prestazionale della rete- Riduzione interventi/ oneri manutentivi- Accrescimento know how tecnologico, anche attraverso l'internalizzazione.

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A2008: Sviluppo tecnologie innovative



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

	Allegato MIMS al DEF Tavoli tecnici di ascolto Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE UE - workplan corridoi TEN-T AQ per l'utilizzo della capacità Fondo Sviluppo e Coesione Accordi EE.LL. Accordi Internazionali Interventi commissariati PNRR	Coesione sociale e territoriale Accessibilità e qualità stazioni Resilienza al climate change Adeguamento a standard tecnici Sviluppo tecnologico Sistemi regionali e metropolitani Potenziamento connessioni merci Sviluppo corridoi TEN-T Completamento valichi alpini Alta Velocità (AV)
Intervento / Opere funzionali			
Interventi diffusi - sviluppo tecnologie		X	X
Interventi diffusi - innovazione		X	X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Totale Risorse	Sezione 1 - Opere in corso finanziate						Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
589,41	260,41 di cui:	230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	42,83	8,11	278,06

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
589,41						589,41

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
260,41						260,41

PIANO DELLA SPESA

Quadro finanziario ed economico

OGV

Produzione

	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Interventi diffusi - sviluppo tecnologie	327,07	127,60	199,47	110,90	216,17	87,62	73,15	53,84	6,06	6,09	3,36	2,33	8,42	252,99

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A2008: Sviluppo tecnologie innovative

Interventi diffusi - innovazione	262,34	132,80	129,54	86,95	175,38	84,04	68,93	43,98	7,10	5,39	4,10	4,25	15,56	192,53
----------------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	------	------	------	------	-------	--------

	589,41	260,41	329,00	197,85	391,56	171,66	142,08	97,82	13,16	11,48	7,46	6,58	7,38	445,52
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	------	------	------	--------

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Ricerca e sviluppo tab 5 - TEC		201,35	1,89	1%	0,00	0%	Progettazione
Sviluppi per Tecnologie IS,TE,TLC	J54C14000040001	34,21	34,21	100%	20,45	60%	Realizzazione
H.D.T.S. (High Density Traffic System)	J37I11000050001	28,00	28,00	100%	21,03	75%	Realizzazione
Sviluppi per Tecnologie ERTMS	J54C14000050001	26,25	26,25	100%	9,36	36%	Realizzazione
Sviluppi per Sottosistema Infrastruttura	J11J05000010001	23,33	23,33	100%	15,88	68%	Realizzazione
Realizzazione del SST-SCMT su linee afferenti tratte AV/AC	J31C05000000001	12,00	12,00	100%	7,06	59%	Realizzazione
Studi e prototipi di componenti per sistemi di sicurezza	J31H92000050421	1,93	1,93	100%	1,82	94%	In ultimazione
Interventi diffusi - sviluppo tecnologie		327,07	127,60	39%	75,60	59%	
Ricerca e sviluppo		146,05	23,52	16%	0,00	0%	Progettazione
Sviluppo Laboratori	J31H92000050311	36,47	29,47	81%	20,03	68%	Realizzazione
Circuito test San Donato	J54J18000010001	34,40	34,40	100%	29,02	84%	Realizzazione
Dimostratori tecnologici	J86J17000630009	26,55	26,55	100%	15,45	58%	Realizzazione
Sviluppo piattaforme di RFI - Hardware e Software	J51E20000240001	16,50	16,50	100%	5,49	33%	Realizzazione
Sviluppo Sistema a radar coerenti	J51J20000160001	1,37	1,37	100%	1,02	75%	Realizzazione
Acquisti a rimpiazzo per ricerca e sviluppo	J50J21000040001	0,50	0,50	100%	0,41	81%	Realizzazione
Acquisti a rimpiazzo per ricerca e sviluppo	J50H19000040001	0,50	0,50	100%	0,49	98%	In ultimazione
Interventi diffusi - innovazione		262,34	132,80	51%	71,91	54%	

Tabella A02-Programmi prioritari ferrovie - Sviluppo tecnologico

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma prevede la realizzazione e l'upgrading di sistemi di videosorveglianza-videoanalisi, controllo degli accessi, antintrusione, sistemi di protezione passiva di sicurezza attiva finalizzati alla protezione del personale nonché la tutela dell'infrastruttura, del patrimonio societario e del Know-how aziendale da atti vandalici, sabotaggi e furti. Il programma copre inoltre le esigenze specialistiche di Struttura e gli obblighi di legge della Polizia Ferroviaria (DPR 753/80).

Gli interventi sono funzionali all'incremento dei livelli di sicurezza percepiti in stazione, attraverso la realizzazione di impianti di video sorveglianza (TVCC), Tornelli e SEM. In particolare nel prossimo decennio è previsto il completamento dell'attrezzaggio con le suddette implementazioni tecnologiche su circa il 50% delle stazioni.

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Le principali attività eseguite hanno riguardato la Standardizzazione dei sistemi di gestione TVCC a livello nazionale (Unica Piattaforma di Video Management System). Principali criticità riscontrate e che hanno comportato un rallentamento dei lavori sono da attribuire prevalentemente a: difficoltà approvvigionamento materiali tecnologici, ritardi nella consegna dei cantieri dovuti alla necessità di integrare il numero di telecamere per una migliore protezione degli asset. Sta proseguendo l'implementazione delle TVCC nelle stazioni del territorio nazionale in particolare sul circuito Olimpiadi. Tornelli/gate sono ad oggi presenti nelle stazioni di Roma Termini, Milano Centrale, Firenze S. Maria Novella, Napoli Centrale e Venezia S. Lucia e in fase di attivazione nella stazione di Torino P.N.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione/protezione del personale, degli asset e del know how aziendale da rischi e danneggiamenti legati a cause esterne all'azienda.



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EELL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Piano impianti integrati di security, esigenze specialistiche e gli obblighi di legge della Polizia Ferroviaria									X		X				X
Sperimentazioni settore Security											X				X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A2009: Security

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatiche di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
821,52	455,43		394,99	6,00	0,00	0,00	7,50	46,94	0,00	47,44	318,64

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo							Variazione del costo dovuta allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati e ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (aggiunti CUP J57B16000350001, J51E17000160001, J51E17000170001, J51E17000140001, J54H17000260001, J51B21001200001 da riga P055_A, CUP J51D18000080001 da riga A2010, CUP J57B15000010005 da riga A2001B). Inoltre, il Programma è stato ampliato includendo una nuova iniziativa dedicata principalmente all'ambito Security Stazioni (TVCC, SEM e Tornelli).
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
460,66	-10,60	220,36	152,59			821,52	

Evoluzione coperture finanziarie							Copertura dei fabbisogni indifferibili connessi all'avvio degli interventi in ambito Security Stazioni (TVCC, SEM e Tornelli) e necessari a garantire la sicurezza ad esempio per eventi impattanti quali Giubileo ed Olimpiadi
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
225,66	-10,60	223,36	-123,00	140,01		455,43	

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Altre
Piano impianti integrati di security, esigenze specialistiche e gli obblighi di legge della Polizia Ferroviaria	816,91	450,83	366,08	357,51	459,40	390,89	348,59	184,39	24,38	32,74	36,48	42,79	33,41	462,80
Sperimentazioni settore Security	4,61	4,60	0,01	1,20	3,41	3,35	2,38	0,73	0,09	0,09	0,04	0,02	5,73	1,93
	821,52	455,43	366,09	358,71	462,81	394,24	350,97	185,12	24,47	32,84	36,51	42,81	35,05	464,73

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Ammodernamento infrastrutturale piano sicurezza		230,93	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Ammodernamento Infrastrutturale Piano Sicurezza	J31H03000320001	175,56	175,56	100%	145,74	83%	Realizzazione
Security Stazioni (SEM e Tornelli)		147,15	12,00	8%	0,00	0%	Progettazione
Easy Station - TPL miglioramento della funzionalità e del decoro delle stazioni	J57B16000350001	84,09	84,09	100%	72,09	86%	Realizzazione
Smart Station - Tornelli 2.0	J54H17000260001	63,50	63,50	100%	54,65	86%	Realizzazione
Wi Life Station	J51E17000170001	32,50	32,50	100%	29,47	91%	In ultimazione
Efficientamento Energetico	J57B15000010005	29,30	29,30	100%	26,41	90%	In ultimazione
Manutenzione Straordinaria ed Implementativa per impianti di security e TVCC realizzati su scala nazionale	J57B16000280001	10,00	10,00	100%	8,55	86%	Realizzazione
Tornelli 2.0	J51E17000140001	6,56	6,56	100%	6,27	96%	In ultimazione
Manutenzione Straordinaria ed Implementativa per impianti di security e TVCC realizzati su scala nazionale	J57D22000050001	6,50	6,50	100%	1,32	20%	Realizzazione
Manutenzione Straordinaria ed Implementativa per impianti di security e TVCC realizzati su scala nazionale	J57I12000720001	6,00	6,00	100%	5,40	90%	Realizzazione
SEM e diagnostica di stazione	J51E17000160001	6,00	6,00	100%	5,34	89%	Realizzazione
Manutenzione Straordinaria ed Implementativa per impianti di security e TVCC realizzati su scala nazionale	J54D21000030001	5,00	5,00	100%	2,82	56%	Realizzazione
Attrezzaggio SEM	J51B21001200001	4,92	4,92	100%	4,72	96%	In ultimazione
Manutenzione Straordinaria ed Implementativa per impianti di security e TVCC realizzati su scala nazionale	J57F19000020001	3,40	3,40	100%	2,22	65%	Realizzazione
Manutenzione Straordinaria ed Implementativa per impianti di security e TVCC realizzati su scala nazionale	J57D25000060001	2,00	2,00	100%	0,00	0%	Progettazione
Sistema integrato di videosorveglianza	J51D18000080001	1,50	1,50	100%	0,98	65%	Realizzazione
Acquisti a rimpiazzo Polfer	J50D16000040001	1,50	1,50	100%	1,42	94%	In ultimazione
Acquisti a rimpiazzo Polfer	J50I21000010001	0,50	0,50	100%	0,02	4%	Realizzazione

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A2009: Security

Piano impianti integrati di security, esigenze specialistiche e gli obblighi di legge della Polizia Ferroviaria		816,91	450,83	55%	367,41	81%	
Innovazione tecnologica - area Security	J51G17000010001	4,61	4,60	100%	2,69	59%	Realizzazione
Sperimentazioni settore Security		4,61	4,60	100%	2,69	59%	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli investimenti del programma hanno come obiettivi generali il miglioramento delle prestazioni, la sicurezza e lo sviluppo di nuove funzionalità. Oltre agli investimenti per sviluppo di software relativi alla ottimizzazione della circolazione o di riconversione dei processi aziendali, in esso rientrano anche applicativi per la gestione di componenti innovativi del sistema ferroviario, delle stazioni, dei nuovi sistemi di diagnostica e degli aspetti ambientali e per l'assistenza alle persone a ridotta mobilità.

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Le principali attività in corso riguardano:1) la realizzazione dell'infrastruttura necessaria all'implementazione di una piattaforma di containerizzazione che ospiterà i workload applicativi del sistema Timetable and capacity Redesign/Temporary Capacity Restriction. 2) l'avvio della progettazione Timetable and capacity Redesign (Timetabling and capacity redesign), che prevede, attraverso l'opportuna implementazione dei sistemi nazionali dei gestori infrastruttura e delle imprese ferroviarie, il miglioramento del processo di creazione dell'orario ferroviario sia a livello nazionale che a livello internazionale prendendo in considerazione in anticipo quelle che sono le restrizioni di capacità della linea e le richieste commerciali da parte delle imprese ferroviarie.3) rinnovamento tecnologico che consente il superamento delle obsolescenze di tutta la piattaforma RETEBLU.4) rinnovo del front end e all'introduzione di migliorie funzionali della piattaforma Piattaforma Integrata Circolazione volto al superamento dell'obsolescenza.5) Realizzazione degli stream Minerva OPI e Minerva AFC.6) Gestione obsolescenze.7) Piattaforma 3DExperience di Dassault Systemes) con la quale sarà sviluppato, nell'ambito del Tavolo di Miglioramento Continuo, il progetto Digital Twin - Pilota.8) E' stata avviata la modellazione informativa (modellazione BIM) del sito pilota per il Progetto "Digital Twin - Pilota", relativo all'intera linea ferroviaria Roma - Firenze (DD).

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

I principali benefici si possono così riassumere:-Realizzazione del disegno completo dei processi del Target Operating Model per abilitare l'introduzione di innovazioni e ampliamenti funzionali in ottica di superamento dell'obsolescenza tecnologica e applicativa delle diverse piattaforme as-is;- Costituzione della Common Platform dell'ambito "Traffic" e la realizzazione delle soluzioni digitali verticali che abilitino e accelerino un percorso organico e sostenibile di trasformazione digitale dei processi;- Clusterizzazione delle scelte di circolazione in ottica di ottimizzazione e gestione della riallocazione della circolazione in caso di ritardo;- Focalizzazione dell'attenzione degli operatori sugli aspetti di sicurezza in caso di degrado;- Fornitura di dati oggettivi agli stakeholder interni ed esterni per le scelte di circolazione, contenzioso, per sistemi di regolazione, per i sistemi di comando e per il controllo dei sistemi di campo;- Definizione di input per la redazione del progetto orario, sulla base delle risultanze oggettive di gestione circolazione;- Ottimizzazione dei processi di gestione della manutenzione e della circolazione sull'intera rete ferroviaria, attraverso una gestione integrata e centralizzata di dati e informazioni, derivanti soprattutto da sistemi di diagnostica predittiva e monitoraggio avanzato, sfruttando i vantaggi e le logiche del Digital Twin.

			Capacità	
			Velocità	
			Accessibilità	X
			Regolarità	X
			Prestazioni (merci)	
			Gestione dei rotabili	
			Gestione spazi di stazione	
			Intermodalità merci	
			Intermodalità passeggeri	
			Integrazione della rete	X
			Upgrade e sicurezza	X
			Efficientamento processi	X

LOCALIZZAZIONE

Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A2010: Sistemi Informativi

	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																					
Sistemi Informativi - interventi diffusi								X									X				
Digital twin																					

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatiche di breve				
								Priorità 1	Priorità 2			
1.052,22	443,03	di cui:	429,05	0,00	0,00	0,00	7,09	6,90	5,00	115,93	488,25	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE							milioni di euro
Evoluzione Costo							
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
594,07	-34,37	82,80	409,95			1.052,22	Variazione del costo dovuta allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati e ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (aggiunto CUP J51E17000190001 da riga A2001B, spostato CUP J51D18000080001 in riga A2009 e CUP J80D16000030005 in riga A2001B). Inoltre, il Programma è stato ampliato con nuove iniziative come il progetto TP TM (realizzazione di una piattaforma digitale per la gestione dei processi E2E di Traffic Management e Traffic Planning) , il Programma Minerva, il Programma P&C, il Programma di Refoundation (finalizzato a contrastare le obsolescenze applicative e infrastrutturali).

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
334,22	-34,37	82,80		2,90	57,49	443,03
Copertura dei fabbisogni indifferibili connessi all'avvio di nuovi programmi rilevanti per RFI finalizzati a: - ridisegnare, in ottica di trasformazione digitale, i processi end-to-end di Traffic Planning e Traffic Management al fine di realizzare la piattaforma digitale di gestione a supporto di tali ambiti; - ottimizzazione e armonizzazione dei processi e dei sistemi di Gruppo, supportati prevalentemente dalla tecnologia SAP; - definizione e attuazione del nuovo modello di controllo societario di Gruppo con adeguamento dei relativi sistemi in ambito; - realizzare iniziative al fine di contrastare le obsolescenze applicative e infrastrutturali.Ulteiore copertura con risorse proprie della Società per interventi non rientranti nel Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria						

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam. Al	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Digital twin	387,80	98,99	288,81	85,64	302,16	79,14	64,34	32,08	8,92	16,44	10,62	9,17	13,20	309,79
Sistemi Informativi - interventi diffusi	664,42	344,05	320,37	84,62	579,79	190,96	161,67	65,30	14,64	16,49	15,35	24,07	23,25	504,76
	1.052,22	443,03	609,18	170,26	881,96	270,11	226,01	97,38	23,56	32,93	25,97	33,24	24,58	814,56

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Interventi IT – Direzione Tecnica		298,50	9,69	3%	0,00	0%	Progettazione
Sistema MUIF: infrastruttura georeferenziata	J51E17000190001	84,90	84,90	100%	77,93	92%	In ultimazione
Gestione Informativa Digitale BIM	J51G24000210001	4,40	4,40	100%	0,92	21%	Realizzazione
Digital twin		387,80	98,99	26%	78,85	80%	
Sistemi informativi circolazione		391,45	79,97	20%	0,00	0%	Progettazione

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A2010: Sistemi Informativi

Rinnovo tecnologico applicativi Area Commerciale	J51B21002480001	30,70	30,70	100%	14,90	49%	Realizzazione
Nuove architetture ICT Sistemi di Informazione e Comunicazione	J54F12000030001	17,63	17,63	100%	12,66	72%	Realizzazione
Evoluzioni applicative ICT Area Commerciale	J51I20000050001	14,44	14,44	100%	12,11	84%	Realizzazione
Sistema di gestione manutenzione sul campo I-MAN	J51E17000600001	13,48	5,95	44%	5,24	88%	Realizzazione
Nuovo modello contabile e di controllo	J51E17000030001	13,20	13,20	100%	12,18	92%	In ultimazione
Evoluzione dei sistemi IT per l'Infrastruttura RFI	J51G25000040001	12,78	12,78	100%	0,00	0%	Progettazione
Evoluzione dei sistemi IT per l'Infrastruttura RFI	J51G22000130001	11,72	11,72	100%	7,35	63%	Realizzazione
Supervisione e Regolazione	J51E17000230001	10,90	10,90	100%	7,61	70%	Realizzazione
Rightsizing PS2 - revisione della gestione operativa dei progetti	J51D18000130001	10,66	10,66	100%	10,02	94%	In ultimazione
Evoluzione sistema di gestione finanziaria degli investimenti	J51E17000580001	8,78	8,78	100%	8,75	100%	In ultimazione
Adeguamento tariffe RFI e progetti tipologici	J54F12000000001	8,13	8,73	100%	6,72	77%	Realizzazione
Upgrade tecnologico del Sistema InRete	J51E17000180001	7,69	7,69	100%	7,69	100%	In ultimazione
Innovazione Digitale settore Ingegneria	J51B21003600001	7,40	4,15	56%	1,87	45%	Realizzazione
Sistema di Analytics per la manutenzione	J51D18000140001	7,39	7,39	100%	5,24	71%	Realizzazione
Operation IT	J51E17000340001	6,38	6,38	100%	5,74	90%	Realizzazione
RFI-RINF - Registro delle Infrastrutture Ferroviarie di RFI S.p.A.	J54F12000050001	5,48	5,48	100%	4,03	73%	Realizzazione
Virtual Assistant per le persone a Ridotta Mobilità	J51E17000150001	5,25	5,25	100%	2,98	57%	Realizzazione
Evoluzione dei sistemi IT per l'Infrastruttura RFI	J52J20000120001	4,50	4,50	100%	4,46	99%	In ultimazione
Energy Management Information System (EMIS)	J54C14000000001	4,33	4,33	100%	2,65	61%	Realizzazione
Sistema Rilevazione Presenze e Controllo Accessi	J59B09000080001	4,17	4,17	100%	4,17	100%	In ultimazione
Sistemi applicativi Settore Sanitario	J51E17000330005	4,00	4,00	100%	3,24	81%	Realizzazione
Interventi di manutenzione evolutiva dei sistemi informativi RFI	J51G24000070001	3,74	3,74	100%	1,34	36%	Realizzazione
Interventi area tecnologica	J51D18000170001	3,50	3,50	100%	1,50	43%	Realizzazione
Evoluzione dei sistemi IT per l'Infrastruttura RFI	J51B21003120001	3,50	3,50	100%	3,27	93%	In ultimazione
Sistema geologia	J57I12000250001	3,37	3,37	100%	1,43	42%	Realizzazione
Sistema Prescrizioni Movimento 2.0	J51E17000270001	3,25	3,25	100%	2,05	63%	Realizzazione
Programma P&C - Planning & Control	J51G24000220001	3,01	3,01	100%	0,49	16%	Realizzazione
Acquisti a rimpiazzo di materiale d'inventario per obblighi di legge e produttività Roma D.G.	J50F24000010001	3,00	3,00	100%	1,35	45%	Realizzazione
Implementazioni Sistemi IT - area Security	J51E17000280001	2,96	2,96	100%	1,80	61%	Realizzazione
Servizi analitici per la circolazione	J51J20000060001	2,95	2,95	100%	1,80	61%	Realizzazione
Sistemi ICT Terminali Italia	J51E20000210001	2,80	2,80	100%	2,31	83%	Realizzazione
Advanced Traffic Management System (ATMS)	J51G22000010001	2,00	2,00	100%	0,48	24%	Realizzazione
Implementazioni Sistemi e Soluzioni IT Area Investimenti	J51G24000120001	2,00	2,00	100%	0,91	46%	Realizzazione
Innovazione Digitale settore Sicurezza di Produzione	J51G25000010001	2,00	2,00	100%	0,00	0%	Progettazione
Evoluzioni sistemi e soluzioni IT aree acquisti, pianificazione strategica e amministrazione e controllo di RFI - area AFC	J51B21001650001	1,93	1,93	100%	1,64	85%	Realizzazione
Sistema di Gestione Rete Cavi a Fibre Ottiche	J51G22000070001	1,85	1,85	100%	0,19	10%	Realizzazione
Evoluzione Sistemi e Soluzioni IT Area Supporto	J51B21003430001	1,75	1,75	100%	0,85	49%	Realizzazione
GAMOC - Gestione accentrata monitoraggio oli combustibili	J51D18000190001	1,47	1,47	100%	0,68	46%	Realizzazione
Implementazioni Sistemi e Soluzioni IT Area Investimenti	J51G23000040001	1,40	1,40	100%	1,11	79%	Realizzazione
Evoluzioni sistemi e soluzioni IT aree acquisti, pianificazione strategica e amministrazione e controllo di RFI - area AFC	J51G23000030001	1,23	1,23	100%	0,76	62%	Realizzazione
Piattaforma sicurezza ferroviaria	J51E17000350001	1,19	1,19	100%	1,19	100%	In ultimazione
Implementazioni Sistemi e Soluzioni IT Area Investimenti	J51G22000020001	1,10	1,10	100%	0,92	84%	Realizzazione
Evoluzioni sistemi e soluzioni IT aree acquisti, pianificazione strategica e amministrazione e controllo di RFI - area AB	J51G22000100001	1,06	1,06	100%	0,02	2%	Progettazione
Interventi di manutenzione evolutiva dei sistemi informativi RFI	J51G23000020001	1,05	1,05	100%	0,66	63%	Realizzazione
Interventi IT per Adeguamento compliance regolatoria	J51I19000140001	1,00	1,00	100%	0,20	20%	Realizzazione
Evoluzione sistemi e soluzioni IT - area DAI	J51I19000110001	0,97	0,97	100%	0,61	63%	Realizzazione
Evoluzioni sistemi e soluzioni IT aree acquisti, pianificazione strategica e amministrazione e controllo di RFI - area AB	J51B21001550001	0,95	0,95	100%	0,54	57%	Realizzazione
Nuovo Sistema Gestione Disegni Apparecchi del Binario	J51D18000120001	0,94	0,94	100%	0,90	96%	In ultimazione
Evoluzioni sistemi e soluzioni IT aree acquisti, pianificazione strategica e amministrazione e controllo di RFI - area AFC	J51B22000090001	0,94	0,94	100%	0,91	97%	In ultimazione

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025**Programma A2010: Sistemi Informativi**

Piattaforma per la gestione integrata dei materiali da scavo e altri materiali prodotti dalle attività di cantiere	J51G25000030001	0,90	0,90	100%	0,00	0%	Progettazione
Evoluzioni applicative area Sicurezza Circolazione	J51B21002490001	0,90	0,90	100%	0,38	42%	Realizzazione
Portale OdMetrics RFI	J51B21002360001	0,70	0,75	100%	0,74	99%	In ultimazione
Evoluzioni sistemi e soluzioni IT aree acquisti, pianificazione strategica e amministrazione e controllo di RFI - area AFC	J51G24000160001	0,68	0,68	100%	0,46	68%	Realizzazione
Implementazioni Sistemi e Soluzioni IT Area Investimenti	J51J21000040001	0,61	0,61	100%	0,58	96%	In ultimazione
Evoluzioni sistemi e soluzioni IT aree acquisti, pianificazione strategica e amministrazione e controllo di RFI - area audit	J51I19000100001	0,60	0,60	100%	0,59	98%	In ultimazione
Sistemi IT trasversali di RFI	J51G24000100001	0,60	0,60	100%	0,00	0%	Progettazione
Evoluzioni sistemi e soluzioni IT aree acquisti, pianificazione strategica e amministrazione e controllo di RFI - area AB	J51I19000130001	0,54	0,54	100%	0,49	90%	In ultimazione
Portale OdMetrics RFI	J51G24000290001	0,41	0,37	89%	0,00	0%	Progettazione
Evoluzione Sistemi e Soluzioni IT Area Supporto	J51D18000160001	0,36	0,36	100%	0,30	85%	Realizzazione
Evoluzioni sistemi e soluzioni IT aree acquisti, pianificazione strategica e amministrazione e controllo di RFI - area ac	J51I19000120001	0,34	0,34	99%	0,14	42%	Realizzazione
Implementazioni Sistemi di Asset Management	J51G22000120001	0,34	0,34	100%	0,00	0%	Progettazione
Evoluzioni sistemi e soluzioni IT aree acquisti, pianificazione strategica e amministrazione e controllo di RFI - area AFC	J51I19000040001	0,10	0,10	98%	0,10	100%	In ultimazione
Sistemi Informativi - interventi diffusi		664,42	342,75	52%	173,29	51%	

Tabella A02-Programmi prioritari ferrovie - Sviluppo tecnologico

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma consiste nell'upgrading degli attuali sistemi di sicurezza e segnalamento allo standard ERTMS, con interventi di rinnovo/upgrade degli Apparat Centrali (ACC/ACC-M), potenziamento degli impianti GSM-R già realizzati e l'estensione della rete GSM-R e implementazione ai sistemi di gestione della circolazione (SCC/SCC-M). Inoltre il programma comprende investimenti per integrazioni tra sistemi tecnologici di rete convenzionale e di rete AV, innovazioni tecnologiche per sistemi ed impianti elettrici, altri miglioramenti tecnologici minori.

Gli interventi riguardano sia il completamento dell'attrezzaggio ERTMS sovrapposto al sistema di segnalamento nazionale sulle tratte prioritarie dei core-corridor individuati dalla Commissione Europea nel Reg. UE 2017/6 "Breakthrough Program" (sul corridoio Reno-Alpi le tratte Chiasso-Milano e Milano-Genova, sul corridoio Mediterraneo le tratte Novara-Venezia Mestre-Villa Opicina, sul corridoio Scandinavia-Mediterraneo la tratta Brennero-Verona) che gli interventi contenuti nel National Implementation Plan NIP ERTMS notificato dal MIT alla CE a dicembre 2024, in particolare gli interventi di implementazione dell'ERTMS con dismissione contestuale del sistema di segnalamento nazionale attualmente in realizzazione con fondi PNRR su 2.785 Km di linee della rete centrale, globale ed off-ten, con l'obiettivo finale di estendere l'implementazione ERTMS all'intera infrastruttura ferroviaria italiana entro il 2041. Tale strategia italiana richiede un intervento realizzativo ed organizzativo Terra-Bordo (GI/IIFF) per cui è previsto l'adeguamento di tutti i Tipi di Veicoli circolanti in Italia al sistema ERTMS in accordo al NIP.

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Con la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo dell'8 dicembre u.s. è stato approvato il nuovo PNRR che prevede per ERTMS 1.400 km di linea completati entro giugno 2025 e un Target finale di 2.785 km a giugno 2026. Sono state ultimate le Progettazioni di Base di tutte le linee ricadenti nel perimetro PNRR, sono stati stipulati il 100% dei Contratti Applicativi di Progettazione Previsti, il 100% dei Contratti Applicativi di fornitura Previsti, il 100% dei Contratti Applicativi di esecuzione Parziale previsti e il 100 % dei Contratti Applicativi di Esecuzione. Per quanto riguarda il rinnovo/ristrutturazione dei Sottosistemi di Bordo sono stati contrattualizzati il 37% dei tipi di veicolo.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Aumento della sicurezza nel trasporto ferroviario, tramite l'introduzione della funzionalità di protezione delle manovre, l'incremento della protezione dei passaggi a livello, la disponibilità della funzione di protezione del massa assiale, il calcolo a bordo della velocità di rilascio e la progressiva sostituzione dei giunti meccanici con giunti elettrici che, per limiti tecnologici, non possono essere sviluppati sui sistemi in uso sulla rete nazionale (Classe B SCMT e SSC)- Aumento della velocità, attraverso il miglioramento delle prestazioni in relazione alle velocità supportate, che consente di operare ad una velocità massima di 500 km/h e un aumento della velocità sulle linee in BCA (Blocco Conta Assi) ad oggi vincolata a 150 km/h, qualora l'infrastruttura lo permetta- Sviluppo dell'interoperabilità, i cui vantaggi sono prevalentemente connessi ad una riduzione di tempo di attraversamento delle frontiere e che costituiscono un fattore rilevante nel miglioramento dell'interconnessione tra reti nazionali e reti regionali - Aumento della flessibilità e dell'efficienza nell'implementazione di modifiche al layout di stazione in fase di upgrade tecnologico con ACC, grazie alla semplificazione tecnologica e normativa apportata dal sistema ERTMS - Apertura all'utilizzo di nuove tecnologie integrabili con ERTMS previste dal programma di ricerca Shift2Rail. Ad esempio, le applicazioni satellitari di posizionamento (GNSS) attraverso la costellazione Europea Galileo, dove l'Italia è al momento leader- Riduzione dei costi di manutenzione grazie ai risparmi nei costi di installazione dei segnali luminosi e cavi - non necessari con ERTMS livello 2/3 e alla migliore performance delle apparecchiature elettroniche utilizzate- Aumento dell'efficienza energetica attraverso l'uso dell'ATO, che in esercizio insieme all'ERTMS garantiscono un risparmio energetico medio contenuto nel range del 10%

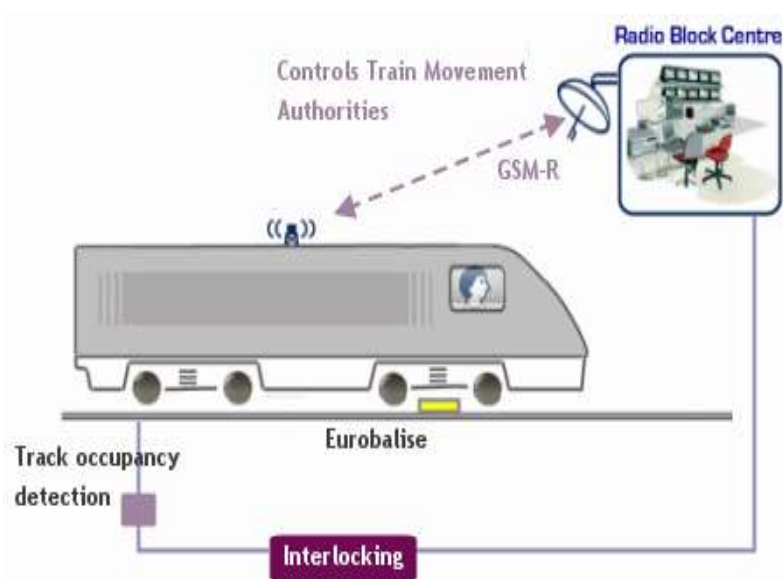

	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	X
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	X

LOCALIZZAZIONE

Piemonte
Lombardia
Emilia Romagna

Programma A2011: Programma nazionale ERTMS

Toscana
Umbria
Lazio
Campania
Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

	Priorità programmatica							Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EELL	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Altri Provedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni
Intervento / Opere funzionali												
Programma nazionale ERTMS - Attrezzaggio intera rete (< 2026)	X		X	X			X			X		X
Upgrade tecnologico linea DD Firenze-Roma 1^ fase	X					X	X			X		
Programma nazionale ERTMS - Breakthrough Program CNC			X	X			X	X		X		X
Interventi pregressi			X	X			X	X		X		X
Programma nazionale ERTMS - Attrezzaggio intera rete (> 2026)			X	X			X			X		X

QUADRO FINANZIARIO

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR	Altro UE	Altro	Priorità 1	Priorità 2	
						nuovi progetti	(CEF/TEN, PON-FESR)	(EELL, Terzi, autofinanziamento)			
12.686,63	3.869,24		1.607,82	22,02	0,00	2.148,28	91,12	0,00	1.010,78	482,26	7.324,35

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

Evoluzione Costo							CdP-I agg.2025	Variazione del costo dovuta ad adeguamenti tariffari e ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (spostato CUP J56J16000460001 nella riga A2001B).
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze			
13.251,44		-586,82		22,02		12.686,63		
Evoluzione coperture finanziarie							CdP-I agg.2025	Copertura dei fabbisogni indifferibili connessi all'avvio delle attività ERTMS e per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche). Ulteriore copertura mediante impiego del Fondo di Salvaguardia degli interventi cofinanziati da UE ed EELL
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni			
3.880,22		-421,86	-2,38	340,54	72,72	3.869,24		

PIANO DELLA SPESA

	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione					
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Upgrade tecnologico linea DD Firenze-Roma 1^ fase	397,58	397,58	0,00	359,00	38,58	346,33	289,64	169,04	34,62	26,72	37,09	21,42	43,82
Programma nazionale ERTMS - Breakthrough Program CNC	307,40	307,76	-0,36	260,03	47,37	216,20	139,60	47,21	13,37	18,25	21,03	21,79	16,27
Programma nazionale ERTMS - Attrezzaggio intera rete (< 2026)	3.968,68	3.098,10	870,58	3.467,11	501,56	2.231,56	441,61	0,00	1,19	8,47	31,71	192,97	5,00

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A2011: Programma nazionale ERTMS

Programma nazionale ERTMS - Attrezzaggio intera rete (> 2026)	7.993,08	45,91	7.947,17	2,00	7.991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	7.993,08
Interventi pregressi	19,90	19,90	0,00	16,89	3,01	14,15	14,97	12,85	0,37	0,58	0,19	0,15	5,00	5,76
	12.686,63	3.869,24	8.817,39	4.105,03	8.581,61	2.808,24	885,82	229,10	49,54	54,01	90,03	236,33	333,54	11.694,07

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Corridoio ERTMS Mediterraneo - ex D	J87I09000000001	121,20	121,56	100%	58,19	48%	Realizzazione
Completamento della Rete Radio GSM-R e dei sistemi di comunicazione connessi	J56H18000100009	69,84	69,84	100%	27,38	39%	Realizzazione
Corridoio ERTMS Reno-Alpi - ex A	J87I10000920001	55,17	55,17	100%	34,46	62%	Realizzazione
Corridoio ERTMS Scandinavo-Mediterraneo - ex B	J96C17000000001	35,00	35,00	100%	11,62	33%	Realizzazione
Adeguamento ad ERTMS nelle linee di confine	J87I07000000001	26,19	26,19	100%	15,84	60%	Realizzazione
Programma nazionale ERTMS - Breaktrough Program CNC		307,40	307,76	100%	147,49	48%	
Upgrading linea DDma Firenze-Roma	J44H14000090005	397,58	397,58	100%	316,02	79%	Realizzazione
Upgrade tecnologico linea DD Firenze-Roma 1^ fase		397,58	397,58	100%	316,02	79%	
Upgrading multi-tecnologico ERTMS - Linee NA - AN - BA	J54E21003600001	866,86	570,48	66%	145,62	26%	Realizzazione
Upgrading multi-tecnologico ERTMS - Prime Applicazioni Generiche	J54E21003620001	527,29	506,46	96%	188,17	37%	Realizzazione
Upgrading multi-tecnologico ERTMS - Sicilia	J24E21001490001	506,59	281,82	56%	86,85	31%	Realizzazione
Upgrading multi-tecnologico ERTMS - Milano	J24E21001480001	349,88	326,52	93%	38,02	12%	Realizzazione
Upgrading multi-tecnologico ERTMS - Linee RC e Sardegna	J54E21003610001	344,23	290,30	84%	67,54	23%	Realizzazione
Upgrading multi-tecnologico ERTMS - Linee Roma	J54E21003590001	320,87	215,19	67%	35,21	16%	Realizzazione
Upgrading multi-tecnologico ERTMS - Linee Genova - Torino	J64E21001610001	312,28	201,01	64%	31,91	16%	Realizzazione
Upgrading multi-tecnologico ERTMS - Linee Firenze	J74E21001450001	280,23	274,62	98%	37,16	14%	Realizzazione
Programma nazionale ERTMS	J56E20000080009	178,94	178,94	100%	63,12	35%	Realizzazione
Upgrading multi-tecnologico ERTMS - Linee Nord Est	J34E21001820001	176,39	158,65	90%	37,69	24%	Realizzazione
Upgrading multi-tecnologico ERTMS - Linea Palermo - Catania tratta Caltanissetta - Xirbi - Bicocca	J64E21001620001	84,11	84,11	100%	3,24	4%	Realizzazione
Integrazione Terra - Bordo ERTMS	J54J25000090001	21,00	10,00	48%	0,01	0%	Progettazione
Programma nazionale ERTMS - Attrezzaggio intera rete (< 2026)		3.968,68	3.098,10	78%	734,55	24%	
Programma nazionale ERTMS		7.991,08	40,71	1%	0,00	0%	Progettazione
Introduzione PK145 sui PI di Interconnessione/Innesti linea AV/AC	J54J25000080001	2,00	5,20	100%	0,00	0%	Progettazione
Programma nazionale ERTMS - Attrezzaggio intera rete (> 2026)		7.993,08	45,91	1%	0,00	0%	
Aggiornamento ERTMS/ETCS Linee AV/AC Roma - Napoli	J17I10002790001	19,90	19,90	100%	14,15	71%	Realizzazione
Interventi pregressi		19,90	19,90	100%	14,15	71%	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il Piano prevede che le stazioni vengano ripensate con l'obiettivo di esprimere appieno il potenziale di nodo trasportistico e polo di servizi, integrate nel contesto urbano di inserimento e capaci di influire positivamente sulla riqualificazione dei territori e ha come obiettivi qualificanti l'incremento del livello di connettività con il trasporto pubblico locale, la sharing mobility e la mobilità attiva, il miglioramento dell'accessibilità interna alle stazioni, la crescita di attrattività, funzionalità, qualità e sicurezza degli spazi interni ed esterni, il potenziamento dell'infomobilità e del wayfinding fuori e dentro la stazione. Gli interventi sono finalizzati a: - riqualificazione architettonica, impiantistica e strutturale con il miglioramento della qualità e del comfort, tramite una ridistribuzione logica degli spazi, un uso mirato di materiali, illuminazione e arredi, la riqualificazione delle aree verdi, l'estensione delle aree pedonali;- riqualificazione funzionale, con individuazione di nuovi spazi e servizi;- miglioramento dell'accessibilità, in particolare per le persone a ridotta mobilità (ascensori, rampe, scale mobili, percorsi PRM, illuminazione, innalzamento marciapiedi...);- upgrading dei sistemi di Informazione al Pubblico e di assistenza ai passeggeri;- miglioramento delle condizioni di vivibilità e sicurezza percepita. Tutti gli interventi sono inoltre orientati a conseguire obiettivi di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico, attraverso l'adozione di protocolli internazionali per la valutazione delle performance energetiche e ambientali degli edifici e più in generale dei territori, il monitoraggio e la gestione dei consumi energetici, l'ottimizzazione delle prestazioni.

Gli interventi interessano il fabbricato viaggiatori, le banchine, pensiline, i sottopassi e i relativi ambiti di accesso (rampe, scale, ascensori, ecc.), ma anche i piazzali antistanti la stazione e le aree limitrofe, in asset RFI, che ne costituiscono accesso e sono finalizzati a:• miglioramento dell'accessibilità, in particolare per le persone a ridotta mobilità (ascensori, rampe, scale mobili,• percorsi PMR, illuminazione, innalzamento marciapiedi, ecc.);• upgrading dei sistemi di Informazione al Pubblico e di assistenza ai passeggeri;• miglioramento del comfort e della qualità architettonica (spazi di transito e attesa, servizi igienici, ecc.);• riqualificazione funzionale, con individuazione di nuovi spazi e servizi;• miglioramento delle condizioni di sicurezza e vivibilità di aree interne ed esterne. Tutti gli interventi sono orientati a conseguire obiettivi di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico, attraverso l'adozione di protocolli internazionali per la valutazione delle performance energetiche e ambientali degli edifici e più in generale dei territori, il monitoraggio e la gestione dei consumi energetici, quindi l'ottimizzazione delle prestazioni.

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

A livello complessivo sono attualmente in corso n. 143 interventi, così suddivisi: Abruzzo: 4; Basilicata: 2; Calabria: 5; Campania: 18; Emilia-Romagna: 15; Friuli-Venezia Giulia: 5; Lazio: 17; Liguria: 7; Lombardia: 11; Marche: 8; Piemonte: 8; Puglia: 7; Sardegna: 3; Sicilia: 5; Toscana: 10; Trentino-Alto Adige: 2; Umbria: 4; Veneto: 12. Relativamente alle STI-PRMA al 2024 sono state rese accessibili 222 stazioni così suddivise: Abruzzo: 5, Basilicata: 2, Calabria: 3, Campania: 20, Emilia-Romagna: 27, Friuli Venezia Giulia: 2, Lazio: 39, Liguria: 9, Lombardia: 33, Marche: 4, Piemonte: 15, Puglia: 7, Sardegna: 8, Sicilia: 10, Toscana: 19, Trentino Alto Adige: 5, Umbria: 2, Valle d'Aosta: 1, Veneto: 11.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Interventi volti al potenziamento dell'accessibilità e dell'attrattività della stazione, nonché al suo efficientamento energetico, per soddisfare le esigenze di mobilità delle persone negli spostamenti quotidiani ed aumentare la connettività e l'integrazione della rete di spostamenti con mezzi pubblici sul territorio, contribuendo ad uno sviluppo sostenibile ed inclusivo.



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	X
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	X
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P055_A: Piano integrato Stazioni

	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change	Adeguamento a standard tecnici	Sviluppo tecnologico	Sistemi regionali e metropolitani	Potenziamento connessioni merci	Sviluppo corridoi TEN-T	Completamento valichi alpini	Alta Velocità (AV)
Intervento / Opere funzionali																					
Riqualificazione funzionale e adeguamento dell'accessibilità dei fabbricati e delle aree antistanti di stazione; Riqualificazione degli elementi infrastrutturali connessi con l'accessibilità ai marciapiedi ferroviari, prolungamento sottopassi e tornelli;	X	X					X	X		X	X						X				X
Innalzamento/prolungamento dei marciapiedi e IAP di stazione								X	X		X						X				X
Adeguamento del sistema di accessibilità di stazione che richiedono un nuovo assetto del piano del ferro								X									X				X

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2		
6.629,05	2.573,70	di cui:	2.159,81	114,49	12,50	217,80	0,50	68,59	308,17	430,14	3.317,05

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE							milioni di euro
Evoluzione Costo							
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
6.831,03	-10,00	-192,56		0,59		6.629,05	Variazione di costo dovuta a adeguamenti tariffari, allo spostamento in tabella C dei progetti ultimate e ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (spostati CUP J57B16000350001, J51E17000160001, J51E17000170001, J51E17000140001, J54H17000260001, J51B21001200001 in riga A2009 e CUP J58E22000260001 spostato in riga A2001B).

Evoluzione coperture finanziarie							
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
2.601,58	-10,00	-195,18	-8,85	117,75	68,39	2.573,70	Copertura dei fabbisogni indifferibili connessi agli extraoneri degli appalti in corso, per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche), per copertura con Fondo di Salvaguardia (NA026) per interventi precedentemente finanziati da risorse da UE e EELL e per copertura di impegni assunti con EELL

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Adeguamento del sistema di accessibilità di stazione che richiedono un nuovo assetto del piano del ferro	135,70	43,00	92,70	12,49	123,21	9,90	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	135,43
Innalzamento/prolungamento dei marciapiedi e IAP di stazione	1.552,59	659,91	892,68	603,32	949,28	601,63	556,04	358,73	53,55	39,76	32,26	43,33	60,62	995,02
Riqualificazione funzionale e adeguamento dell'accessibilità dei fabbricati e delle aree antistanti di stazione; Riqualificazione degli elementi infrastrutturali connessi con l'accessibilità ai marciapiedi ferroviari, prolungamento sottopassi e tornelli;	4.940,76	1.870,79	3.069,98	1.437,99	3.502,77	1.311,10	987,47	478,90	64,54	83,27	58,51	102,05	107,65	3.962,93
	6.629,05	2.573,70	4.055,36	2.053,79	4.575,26	1.922,63	1.543,86	837,63	118,09	123,03	90,76	145,38	220,77	5.093,38

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Configurazione planimetrica dei marciapiedi di ridotte dimensioni		100,00	7,30	7%	0,00	0%	Progettazione
nuovo accesso del piano del ferro	J64J25000080001	14,42	14,42	100%	0,00	0%	Progettazione
Adeguamento del sistema di accessibilità di stazione che richiedono un nuovo assetto del piano del ferro - area Centro Nord	J27D23000020001	10,40	10,40	100%	1,59	15%	Realizzazione

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P055_A: Piano integrato Stazioni

Adeguamento del sistema di accessibilità di stazione che richiedono un nuovo assetto del piano del ferro - area Centro Sud	J17D22000100001	8,50	8,50	100%	0,25	3%	Progettazione
Adeguamento del sistema di accessibilità di stazione che richiedono un nuovo assetto del piano del ferro - area Nord	J47D22000150001	2,38	2,38	100%	0,00	0%	Progettazione
Adeguamento del sistema di accessibilità di stazione che richiedono un nuovo assetto del piano del ferro		135,70	43,00	32%	1,84	4%	
Innalzamento/prolungamento dei marciapiedi e IAP di stazione		914,33	20,73	2%	0,00	0%	Progettazione
Easy Station - TPL miglioramento interventi di upgrading alle banchine	J54H14000570001	500,13	501,05	100%	454,83	91%	In ultimazione
Easy Station - TPL miglioramento sistemi di informazione al pubblico	J54H14000580001	127,48	127,48	100%	108,68	85%	Realizzazione
Upgrade sistemi Informazione al pubblico Passante ferroviario di Napoli e tratte antenna	J26I18000030001	7,50	7,50	100%	6,78	90%	In ultimazione
Prolungam. marciapiedi e IAP di Stazione	J34J24000320001	3,15	3,15	100%	0,00	0%	Progettazione
Innalzamento/prolungamento dei marciapiedi e IAP di stazione		1.552,59	659,91	43%	570,29	86%	
Riqualificazione e adeguamento accesso ai fabbricati e aree di stazione, deploy, wi-life e SEM		3.211,75	151,65	5%	0,00	0%	Progettazione
Easy Station - TPL miglioramento accessibilità ed O.L	J54H14000590001	552,17	551,55	100%	494,33	90%	Realizzazione
Miglioramento delle funzionalità e del decoro delle 620 stazioni	J54H14000550001	351,71	350,66	100%	297,43	85%	Realizzazione
Riqualificazione funzionale, miglioramento accessibilita' e intermodalita' stazioni del sud	J64E21002290008	188,74	188,74	100%	61,03	32%	Realizzazione
Riqualificazione funzionale e adeguamento dell'accessibilità dei fabbricati e delle aree antistanti di stazione, deploy Wi-life e deploy SEM - area Centro Nord	J87D22000140001	92,04	87,04	95%	27,01	31%	Realizzazione
Riqualificazione aree esterne in asset	J57J19000030001	85,57	85,53	100%	52,29	61%	Realizzazione
Riqualificazione funzionale e adeguamento dell'accessibilità dei fabbricati e delle aree antistanti di stazione, deploy Wi-life e deploy SEM - area Nord	J47D22000100001	85,18	85,18	100%	26,24	31%	Realizzazione
Riqualificazione funzionale e adeguamento dell'accessibilità dei fabbricati e delle aree antistanti di stazione, deploy Wi-life e deploy SEM - area Centro Sud	J17D22000080001	63,68	63,53	100%	21,13	33%	Realizzazione
Riqualificazione degli elementi infrastrutturali connessi con l'accessibilità ai marciapiedi ferroviari, prolungamento sottopassi e tornelli - area Centro Nord	J87D22000130001	56,80	56,80	100%	24,38	43%	Realizzazione
Riqualificazione degli elementi infrastrutturali connessi con l'accessibilità ai marciapiedi ferroviari, prolungamento sottopassi e tornelli - area Nord	J47D22000090001	51,45	51,45	100%	24,93	48%	Realizzazione
Innalzamento/prolungamento dei marciapiedi e IAP di stazione - area Nord	J47D22000160001	50,24	50,25	100%	17,19	34%	Realizzazione
Riqualificaz. aree stazione deploy, SEM	J54J24000850001	31,11	31,11	100%	0,19	1%	Progettazione
Riqualificazione degli elementi infrastrutturali connessi con l'accessibilità ai marciapiedi ferroviari, prolungamento sottopassi e tornelli - area Centro Sud	J17D22000070001	30,30	30,30	100%	8,62	28%	Realizzazione
Innalzamento/prolungamento dei marciapiedi e IAP di stazione - area Centro Nord	J87D22000310001	28,10	28,10	100%	14,22	51%	Realizzazione
Riqualificazione elementi infrastruttura	J54J24000390001	18,84	15,82	84%	0,52	3%	Progettazione
Potenziamento e Restyling Stazioni Ferroviarie all'interno dei crateri del sisma - Marche	J62C21002550008	14,80	14,80	100%	4,02	27%	Realizzazione
Innalzamento/prolungamento dei marciapiedi e IAP di stazione - area Centro Sud	J17D22000110001	7,84	7,84	100%	0,26	3%	Realizzazione
Potenziamento e Restyling Stazioni Ferroviarie all'interno dei crateri del sisma - Lazio	J22C21002500008	5,50	5,50	100%	1,98	36%	Realizzazione
Potenziamento e Restyling Stazioni Ferroviarie all'interno dei crateri del sisma - Umbria	J62C21002560008	5,00	5,00	100%	2,60	52%	Realizzazione
Opere di connessione tra il capolinea della metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno e la Stazione FS di Seregno	J21G24000010002	5,00	5,00	100%	0,00	0%	Progettazione
Interventi in variante per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria a scavalco di Sesto San Giovanni	F41I20000030007	2,50	2,50	100%	0,00	0%	Progettazione
Busa di Vigonza e Vigonza - Pianiga	E41B19000650002	2,43	2,43	100%	0,23	10%	Realizzazione
Riqualificazione funzionale e adeguamento dell'accessibilità dei fabbricati e delle aree antistanti di stazione; Riqualificazione degli elementi infrastrutturali connessi con l'accessibilità ai marciapiedi ferroviari, prolungamento sottopassi e tornelli;		4.940,76	1.870,79	38%	1.078,60	58%	

Tabella A03-Programmi prioritari ferrovie - Accessibilità stazioni

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma è finalizzato allo sviluppo, alla riqualificazione, all'accessibilità e all'efficientamento energetico di singole stazioni, nodi ferroviari che svolgono funzione di Hub della mobilità ovvero linee metropolitane da potenziare/riqualificare per garantirne la rinnovata centralità come nodo trasportistico e polo di servizi, con un progetto omogeneo che garantisca coerenza e riconoscibilità, integrato nel contesto urbano di riferimento.

Il programma prevede interventi di ampio respiro per il potenziamento e sviluppo e/o la riqualificazione funzionale di stazioni di particolare rilevanza, nonché la realizzazione di nuove stazioni/fermate: interventi strategici per migliorare l'accessibilità al trasporto ferroviario e con ricadute sul territorio, spesso integrati in un contesto più ampio di rigenerazione urbana e del sistema di mobilità.

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Sono attualmente in corso o pianificate nel breve periodo, attività di progettazione o realizzazione per 37 Hub e nuove stazioni/fermate, così territorialmente suddivise: Calabria: 4; Campania: 4; Emilia Romagna: 1; Friuli Venezia Giulia: 1; Lazio: 4; Liguria: 3; Lombardia: 5; Puglia: 4; Sicilia: 6; Veneto: 5.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Il programma complessivo degli interventi mira a coniugare gli obiettivi programmatici di RFI con quelli delle amministrazioni locali (Comuni e Regioni) coinvolte nella gestione del territorio, nonché con gli obiettivi e i piani strategici di altre società del Gruppo eventualmente interessate alla riqualificazione e valorizzazione del contesto di inserimento, promuovendo uno sviluppo più equilibrato e sostenibile del territorio e valorizzando la stazione come hub intermodale integrata all'interno della pianificazione urbana della mobilità.



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	X
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lombardia
Lazio
Puglia
Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

PNRR	Interventi commissariati	Accordi internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MMS al DEF
------	--------------------------	------------------------	----------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	---------------------------	---------------------

Obiettivi strategici

Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
--------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Intervento / Opere funzionali

City Hub, linee metropolitane e nuove stazioni/fermate sud (PNRR)

X

X

X

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P237: City Hub, linee metropolitane e nuove stazioni/fermate

City Hub, linee metropolitane e nuove stazioni/fermate	X	X	X	X
Milano Greco Pirelli (convenzione comune di Milano)		X		X
Bari Centrale: nuovo parco urbano (PINQUA) - interventi RFI		X		X

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
1.663,83	751,44	di cui:	592,05	0,00	0,00	124,63	2,29	32,47	57,88	235,09	619,43

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE											milioni di euro
Evoluzione Costo											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025					
1.408,60			255,24			1.663,83	L'incremento di costo è relativo all'aumento di perimetro fisico per l'introduzione di nuove stazioni, ad approfondimenti progettuali ed all'applicazione delle nuove tariffe.				

Evoluzione coperture finanziarie											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025					
738,71			-86,40	36,99	62,14	751,44	Copertura dei fabbisogni indifferibili connessi agli extraoneri degli appalti in corso e a impegni con EELL. Rimodulazione di risorse per 10,68 M€ a favore della fermata di Firenze Guidoni (intervento P076); copertura con Fondo di Salvaguardia (NA026) per interventi precedentemente finanziati da risorse da UE e EELL				

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Bari Centrale: nuovo parco urbano (PINQUA) - interventi RFI	10,20	10,20	0,00	7,43	2,77	2,52	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	5,00	7,68
Milano Greco Pirelli (convenzione comune di Milano)	11,36	11,36	0,00	0,00	11,36	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	11,35
City Hub, linee metropolitane e nuove stazioni/fermate sud (PNRR)	132,62	132,62	0,00	106,78	25,84	73,91	16,98	0,00	0,00	0,00	1,70	7,41	5,00	117,04
City Hub, linee metropolitane e nuove stazioni/fermate	1.509,65	597,25	912,40	1.110,41	399,24	84,77	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	5,00	1.481,25
	1.663,83	751,44	912,40	1.224,62	439,21	171,75	54,32	0,00	0,00	0,00	1,70	12,52	32,29	1.617,31

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Bari Centrale: nuovo parco urbano e rinnovamento delle aree esterne	J91G21000010001	10,20	10,20	100%	2,52	25%	Realizzazione
Bari Centrale: nuovo parco urbano (PINQUA) - interventi RFI		10,20	10,20	100%	2,52	25%	
Stazione Milano Greco Pirelli - nuovo Hub di connessione urbana e mobilità sostenibile	B47D22000130006	11,36	11,36	100%	2,40	21%	Realizzazione
Milano Greco Pirelli (convenzione comune di Milano)		11,36	11,36	100%	2,40	21%	
Progettazione e Realizzazione Hub urbani e linee metropolitane per lo sviluppo della mobilità sostenibile	J31B21003960001	132,62	132,62	100%	29,72	22%	Realizzazione
City Hub, linee metropolitane e nuove stazioni/fermate sud (PNRR)		132,62	132,62	100%	29,72	22%	
City Hub e linee metropolitane area Nord	J41G22000090001	662,96	306,52	46%	19,53	6%	Progettazione
City Hub e linee metropolitane area Centro Sud	J11G22000080001	548,94	243,95	44%	26,53	11%	Realizzazione
Hub Stazioni		242,23	2,80	1%	0,00	0%	Progettazione
City Hub e linee metropolitane area Centro Nord	J81G22000260001	33,40	29,50	88%	1,91	6%	Realizzazione
City Hub e linee metropolitane	J91G25000040001	22,13	14,48	65%	0,00	0%	Progettazione
City Hub, linee metropolitane e nuove stazioni/fermate		1.509,65	597,25	40%	47,97	8%	

Programma P264: Digitalizzazione stazioni

Tabella A03-Programmi prioritari ferrovie - Accessibilità stazioni

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Interventi volti a realizzare il "Digital Twin" della stazione che includono la digitalizzazione georiferita degli asset, lo sviluppo e l'acquisizione di dati per la piattaforma di gestione dei dati e lo sviluppo degli altri sistemi IT afferenti le stazioni

Campagne di rilievo, acquisizione dati e sviluppo software

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

E' stata completata la fase 1 di sviluppo della piattaforma di gestione dati e la progettazione della fase 2 dello sviluppo della stessa. Sono stati inoltre acquisiti tramite Holding i dati relativi al Registro delle Imprese e agli spostamenti tracciati con celle telefoniche. Ad oggi sono state rilevate circa 400 stazioni da inserire sulla piattaforma. Il programma è in corso di proseguimento.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Aumento della conoscenza relativa agli asset di stazione e sviluppo delle capacità di analisi e gestione delle stazioni

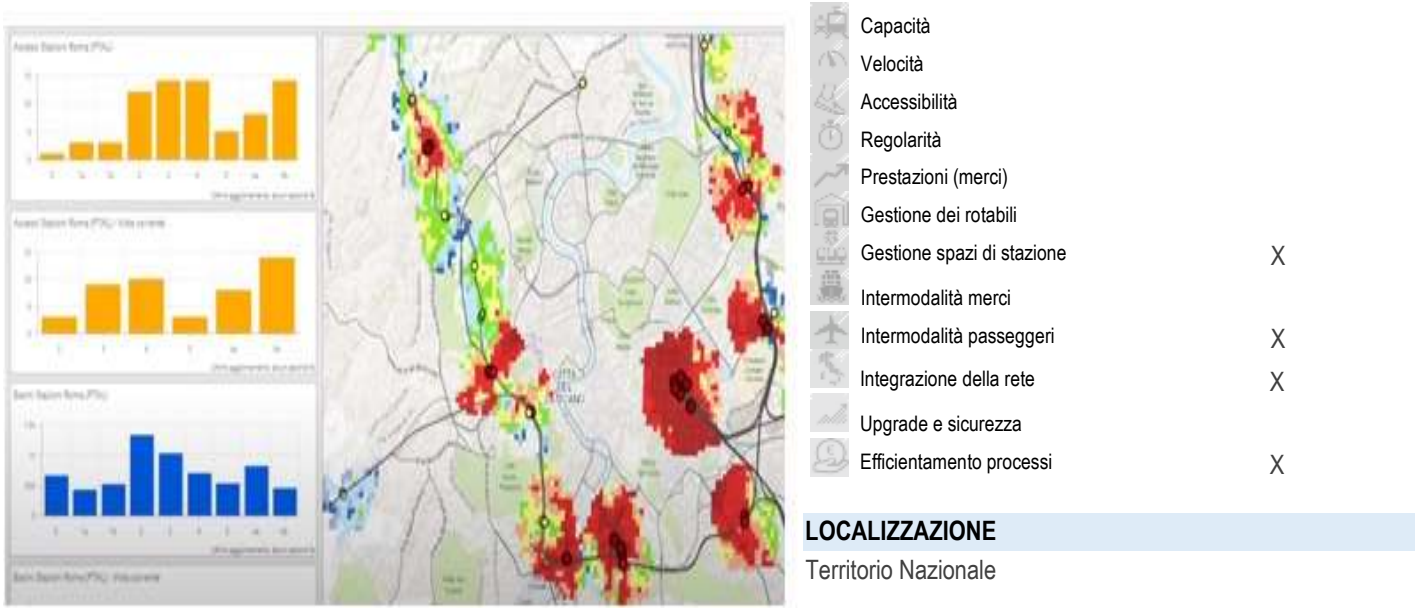

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Digitalizzazione stazioni				X					X		X						X				

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate							Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
70,75	26,15	di cui: 26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	38,60	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P264: Digitalizzazione stazioni

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
21,15			49,60			70,75
Incremento delle stime di costo dovuta all'estensione del perimetro a più di 2000 stazioni per la prosecuzione delle attività già avviate.						

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
11,15				15,00		26,15
Copertura dei fabbisogni indifferibili connessi alla prosecuzione delle campagne di rilievo per la realizzazione del "Digital Twin" delle Stazioni necessario per la gestione dell'asset (razionalizzazione dei costi derivanti dai piani di manutenzione e servizi, analisi puntuale dei ricavi da contratti di locazione, puntuale attribuzione degli oneri agli occupanti degli spazi di competenza, ecc.)						

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Digitalizzazione stazioni	70,75	26,15	44,60	6,34	64,41	9,26	3,02	0,00	0,00	0,35	0,15	0,00	5,00	67,61
	70,75	26,15	44,60	6,34	64,41	9,26	3,02	0,00	0,00	0,35	0,15	0,00	2,64	67,61

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Digitalizzazione Stazioni		60,00	15,40	26%	0,00	0%	Progettazione
Innovazione Digitale settore Stazioni	J54J24000020001	9,00	9,00	100%	5,26	58%	Realizzazione
Piattaforma di analisi del territorio per lo sviluppo dei servizi di stazione	J51I20000060001	1,75	1,75	100%	0,68	39%	Realizzazione
Digitalizzazione stazioni		70,75	26,15	37%	5,94	23%	

Nuovo inserimento

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'iniziativa propone il potenziamento delle stazioni e fermate ferroviarie di minore rilevanza trasportistica, rispetto a quelle comprese nel Piano Integrato Stazioni, che sono utilizzate dal 90% dei viaggiatori dell'intera rete Nazionale, e che hanno tuttavia rilevanza territoriale dal punto di vista dell'attrattività ai fini turistici o della fruizione del patrimonio storico-culturale locale. L'iniziativa si impegna ad incrementare l'attrattività di queste stazioni, a renderle accessibili alle persone a mobilità ridotta ed a migliorarne l'interscambio con il sistema del trasporto pubblico locale ai fini dello sviluppo del territorio di appartenenza che può necessitare di una riqualificazione funzionale diffusa e di una migliore integrazione dei diversi sistemi di mobilità.

L'iniziativa prevede i seguenti interventi:- il miglioramento dell'accessibilità per le persone a ridotta mobilità, attraverso l'inserimento di ascensori o rampe, l'innalzamento dei marciapiedi e l'inserimento di percorsi tattili per disabili visivi;- il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di vivibilità delle aree di stazione, ad esempio attraverso l'incremento degli impianti di videosorveglianza, miglioramento ed illuminazione dei percorsi pedonali, etc...;- l'incremento del decoro degli spazi interni ed esterni di stazione;- il miglioramento dell'intermodalità e dell'interscambio con il trasporto pubblico locale;- l'introduzione di servizi informativi sul territorio di riferimento per migliorare la conoscenza del patrimonio storico-culturale e la fruizione turistica.

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Intervento non finanziato

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Il programma di investimento è volto a garantire:- il miglioramento dell'accessibilità per le persone a ridotta mobilità;- Il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di vivibilità delle aree di stazione;- l'incremento del decoro degli spazi interni ed esterni di stazione;- il miglioramento dell'intermodalità e dell'interscambio con il trasporto pubblico locale;- l'introduzione di servizi informativi sul territorio di riferimento per migliorare la conoscenza del patrimonio storico-culturale e la fruizione turistica.



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	X
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	X
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Allegato MMS al DEF
Tavoli tecnici di ascolto
Altri Provvedimenti*
Cofinanziamenti UE
UE - workplan corridoi TEN-T
AQ per l'utilizzo della capacità
Fondo Sviluppo e Coesione
Accordi EE.LL.
Accordi internazionali
Interventi commissariati
PNRR

Obiettivi strategici

Coesione sociale e territoriale
Accessibilità e qualità stazioni
Resilienza al climate change
Adeguamento a standard tecnici
Sviluppo tecnologico
Sistemi regionali e metropolitani
Potenziamento connessioni merci
Sviluppo corridoi TEN-T
Completamento valichi alpini
Alta Velocità (AV)

Intervento / Opere funzionali

Potenziamento delle stazioni e fermate minori

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P271: Potenziamento delle stazioni e fermate minori

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatIRFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo							L'iniziativa propone lo sviluppo ed il potenziamento delle stazioni e fermate ferroviarie esistenti situate nei nodi metropolitani di Roma, Milano, Firenze, Torino e Genova, di minore rilevanza trasportistica rispetto alle Grandi Stazioni di arrivo dei principali vettori ferroviari di lunga percorrenza e considerate alternative o secondarie rispetto a queste.
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
0,00					900,00	900,00	

Evoluzione coperture finanziarie						CdP-I agg.2025
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	
0,00						0,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Potenziamento delle stazioni e fermate minori	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	900,00
	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Nodi metropolitani		900,00	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Potenziamento delle stazioni e fermate minori		900,00	0,00	0%	0,00	0%	

Tabella A04-Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione turistica delle ferrovie minori

Interventi diffusi intera rete

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma mira alla salvaguardia e alla valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico. Gli interventi consistono sostanzialmente in attività di adeguamento delle dotazioni di sicurezza e ripristino dei tracciati ferroviari, delle stazioni e delle relative opere d'arte e pertinenze per consentire la circolazione di mezzi rotabili storici e turistici abilitati.

Le tratte ferroviarie ad uso turistico di competenza RFI individuate nell'allegato 1 del Decreto Interministeriale n. 146 del 17/05/2022 sono le seguenti:- Sulmona-Castel di Sangro- Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio- Sacile-Gemona- Palazzolo-Paratico- Castel di Sangro- Carpinone- Ceva-Ormea- Alcantara-Randazzo- Agrigento Bassa-Porto Empedocle- Noto-Pachino- Asciano-Monte Antico- Civitavecchia- Capranica-Orte- Fano-Urbino- Fabriano-Pergola- Asti-Chivasso - Castagnole delle Lanze-Mortara- Alba-Nizza Monferrato - Novara-Varallo Sesia- Cuneo-Mondovì- Sicignano-Lagonegro- Rocchetta-Gioia del Colle.

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Sono stati avviati e proseguono gli interventi mirati alla riattivazione ai fini turistici e per alcune anche ai fini commerciali, su tutte le linee turistiche individuate nell'allegato 1 del Decreto Interministeriale n. 146 del 17/05/2022

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Salvaguardia e valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico in coerenza con quanto previsto nel piano strategico di sviluppo del turismo in Italia.



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Piemonte
Lombardia
Toscana
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Sicilia
Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P214: Valorizzazione turistica delle ferrovie minori

	PNRR	Accordi Internazionali Interventi commissariati	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	UE - workplan corridoi TEN-T AQ per l'utilizzo della capacità	Cofinanziamenti UE	Altri Provedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF		Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																				
Valorizzazione turistica delle ferrovie minori: Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio; Benevento - Boscoredole	X		X	X					X						X					
Valorizzazione turistica delle ferrovie minori: Sulmona-Castel di Sangro-Carpinone	X		X						X						X					
Valorizzazione turistica delle ferrovie minori: Rocchetta-Gioia del Colle	X		X						X						X					
Valorizzazione turistica delle ferrovie minori: Palazzolo-Paratico	X		X						X						X					
Valorizzazione turistica delle ferrovie minori: Ceva-Ormea; Asti-Chivasso; Castagnole delle Lanze-Mortara; Alba-Nizza Monferrato; Novara-Varallo Sesia	X		X						X						X					
Valorizzazione turistica delle ferrovie minori: Asciano-Monte Antico	X		X						X						X					
Valorizzazione turistica delle ferrovie minori: Alcantara-Randazzo fino a Motta Camastra; Agrigento Bassa-Porto Empedocle; Noto-Pachino	X		X						X						X					
Valorizzazione turistica delle ferrovie minori - interventi diffusi			X						X						X					

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatiche di breve				
								Priorità 1	Priorità 2			
468,65	316,26	di cui:	278,73	2,53	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	129,99	22,39	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE										
Evoluzione Costo										
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari e allo spostamento in tabella c dei progetti ultimati.			
480,61	-14,30			2,33		468,65				
Evoluzione coperture finanziarie										
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	Riduzione delle risorse del Piano Nazionale Complementare di competenza del MIT; copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)			
340,61	-14,30		-12,38	2,33		316,26				

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Valorizzazione turistica delle ferrovie minori - interventi diffusi	216,16	76,47	139,69	50,49	165,67	59,36	38,19	14,06	0,60	4,35	23,54	10,74	6,52	160,14
Valorizzazione turistica delle ferrovie minori: Rocchetta-Gioia del Colle	39,35	38,08	1,27	37,17	2,18	36,26	30,92	0,00	0,00	0,00	2,02	15,17	5,00	9,81
Valorizzazione turistica delle ferrovie minori: Asciano-Monte Antico	12,00	11,61	0,39	11,63	0,37	11,59	8,27	0,00	0,00	0,00	3,61	1,92	5,00	3,80
Valorizzazione turistica delle ferrovie minori: Alcantara-Randazzo fino a Motta Camastra; Agrigento Bassa-Porto Empedocle; Noto-Pachino	59,00	53,46	5,54	54,42	4,58	45,18	22,47	0,00	0,00	0,00	1,42	6,92	5,00	40,62

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025															
Programma P214: Valorizzazione turistica delle ferrovie minori															
Valorizzazione turistica delle ferrovie minori: Ceva-Ormea; Asti-Chivasso; Castagnole delle Lanze-Mortara; Alba-Nizza Monferrato; Novara-Varallo Sesia	50,14	48,40	1,74	45,95	4,19	42,43	36,18	4,50	0,00	0,00	2,32	16,08	5,25	14,31	
Valorizzazione turistica delle ferrovie minori: Palazzolo-Paratico	4,00	2,85	1,15	3,88	0,12	1,66	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	
Valorizzazione turistica delle ferrovie minori: Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio; Benevento - Boscoredole	77,00	74,71	2,28	73,30	3,70	73,45	67,85	27,61	6,67	9,43	3,76	11,45	10,62	9,93	
Valorizzazione turistica delle ferrovie minori: Sulmona-Castel di Sangro-Carpinone	11,00	10,69	0,31	10,56	0,44	10,96	10,58	0,00	0,00	0,00	8,69	1,67	5,00	0,38	
	468,65	316,26	152,38	287,39	181,26	280,89	214,83	46,16	7,28	13,79	45,35	63,94	49,13	242,99	

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Ammodernamento Infrastrutturale - DPROD		144,96	9,07	6%	0,00	0%	Progettazione
Binari senza tempo - Trieste	J37B17000690001	18,20	18,20	100%	17,87	98%	In ultimazione
Binari senza tempo - AN	J87H21000910001	16,45	16,45	100%	12,90	78%	Realizzazione
Binari senza tempo - PA	J67H21002920001	12,10	12,10	100%	11,52	95%	In ultimazione
Binari senza tempo - FI	J87H21002870001	8,80	8,80	100%	7,23	82%	Realizzazione
Binari senza tempo - MI	J97H21002670001	8,45	4,65	55%	2,06	44%	Realizzazione
Binari senza tempo - AN	J87D22000270001	7,00	7,00	100%	5,48	78%	Realizzazione
Binari senza tempo - FI	J87D23000130001	0,20	0,20	100%	0,17	84%	Realizzazione
Valorizzazione turistica delle ferrovie minori - interventi diffusi		216,16	76,47	35%	57,23	75%	
Linee turistiche - ambito PA	J67H21005710001	59,00	53,46	91%	28,62	54%	Realizzazione
Valorizzazione turistica delle ferrovie minori: Alcantara-Randazzo fino a Motta Camastra; Agrigento Bassa-Porto Empedocle; Noto-Pachino		59,00	53,46	91%	28,62	54%	
Linee turistiche - ambito FI	J57H21003100001	12,00	11,61	97%	8,60	74%	Realizzazione
Valorizzazione turistica delle ferrovie minori: Asciano-Monte Antico		12,00	11,61	97%	8,60	74%	
Interventi per il ripristino a fini turistico - naturali della storica tratta ferroviaria Avellino rocchetta S. Antonio - I FASE	J34H17000850001	34,16	34,16	100%	30,04	88%	Realizzazione
Programma d'intervento necessario alla riapertura funzionale in trazione diesel, in chiave turistica, della linea Benevento-Pietrelcina	J14H17000890001	23,00	23,00	100%	21,31	93%	In ultimazione
Linee turistiche - ambito NA	J67H21005720001	19,84	17,56	88%	17,56	100%	Realizzazione
Valorizzazione turistica delle ferrovie minori: Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio; Benevento - Boscoredole		77,00	74,71	97%	70,71	95%	
Linee turistiche - ambito TO	J67H21005700001	31,63	29,89	94%	26,17	88%	Realizzazione
Binari senza tempo - Torino	J67D17000020001	18,51	18,51	100%	11,81	64%	Realizzazione
Valorizzazione turistica delle ferrovie minori: Ceva-Ormea; Asti-Chivasso; Castagnole delle Lanze-Mortara; Alba-Nizza Monferrato; Novara-Varallo Sesia		50,14	48,40	97%	37,98	78%	
Linee turistiche - ambito MI	J87H21005340001	4,00	2,85	71%	0,78	27%	Realizzazione
Valorizzazione turistica delle ferrovie minori: Palazzolo-Paratico		4,00	2,85	71%	0,78	27%	
Linee turistiche - ambito BA	J37H21004410001	31,35	30,08	96%	27,74	92%	Realizzazione
Binari senza tempo - Bari	J37D23000080001	8,00	8,00	100%	5,69	71%	Realizzazione
Valorizzazione turistica delle ferrovie minori: Rocchetta-Gioia del Colle		39,35	38,08	97%	33,43	88%	
Linee turistiche - ambito AN	J17H21002490001	11,00	10,69	97%	10,62	99%	In ultimazione
Valorizzazione turistica delle ferrovie minori: Sulmona-Castel di Sangro-Carpinone		11,00	10,69	97%	10,62	99%	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento fa parte del Programma Regionale Mobilità e Trasporti della Regione Lombardia, nonché dell'«Intesa sulle strategie e sulle modalità per lo sviluppo del SFR passeggeri, del trasporto merci e degli standard qualitativi per l'interscambio modale» sottoscritta tra RFI e Regione Lombardia a dicembre 2016.

L'intervento consiste nel raddoppio, per fasi, della linea Ponte S. Pietro - Bergamo - Montello (sviluppo complessivo di circa 19 km). La 1^a fase prevede i seguenti principali interventi: •Lotto 1: Raddoppio linea ferroviaria da Curno a Bergamo, sistemazione del PRG di Ponte S. Pietro, viabilità Bergamo - Montello, SSE Ambivere Mapello; •Lotto 2: Completamento del raddoppio da Curno a Bergamo fino alla pk 0+923 con interventi ai ponti di Via dei Caniana e Via San Bernardino; •Realizzazione del nuovo ACC di Bergamo; •Suppressione passaggi a livello di via Moroni e via Pizzo Recastello in Comune di Bergamo e relative viabilità sostitutive. Il tracciato è prevalentemente in rilevato e trincea, la linea sarà gestita tramite ACC-M. I lavori saranno realizzati in interruzione di esercizio. La 2^a fase prevede la realizzazione del raddoppio della tratta Bergamo - Montello con soppressione di tutti i passaggi a livello. Il tracciato è prevalentemente in rilevato e trincea, la linea sarà gestita tramite ACC-M. Il progetto prevede inoltre il riassetto del piano del ferro della stazione di Bergamo per consentire la compatibilità con altri progetti di potenziamento delle tratte afferenti quali il raddoppio Ponte San Pietro - Bergamo - Montello ed il nuovo collegamento ferroviario con l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio.

Sotto il profilo planimetrico, l'intervento, la cui estensione complessiva ammonta a circa 19 chilometri, prevede il raddoppio in affiancamento stretto alla linea esistente, senza pertanto variazioni di tracciato lungo l'intera estesa. Il raddoppio è previsto in sinistra o in destra, a seconda delle necessità funzionali e delle condizioni al contorno.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•Raddoppio Bergamo-Montello Fase 1: Lotto 1 e 2. In data 07/08/2023 sono state consegnate le prestazioni all'Appaltatore. Sono stati consegnati i lavori di parte A relativi alle opere di viabilità alternativa del PL di Via Fermi in Comune di Curno. Nel mese di marzo 2025 è stato stipulato il 2° AIM che prevede la suddivisione della Parte B in B1 e B2; la parte B1 è stata verificata e approvata e in data 14/03/2025 è avvenuta la consegna dei lavori. Attualmente è in corso di ultimazione la consegna degli elaborati del PE di parte B2 da parte dell'Appaltatore, nonché la verifica degli elaborati già consegnati. ACC di Bergamo. In data 19/05/2023 è avvenuta la consegna delle prestazioni all'appaltatore, ultimata la progettazione esecutiva e nel mese di novembre 2024 sono stati consegnati i lavori, attualmente in corso. SSE Ambivere + Rinnovo TE Ambivere-Ponte S. Pietro. L'attivazione è avvenuta in data 17/12/2024. •Raddoppio Bergamo-Montello Fase 2: Il 29/09/2023 il PFTE revisionato è stato trasmesso al CSLLPP a seguito delle integrazioni richieste è pervenuto il parere in data 01/10/2024. Attualmente in corso le analisi rispetto al parere ricevuto e la predisposizione della documentazione per avvio della VIA. •PRG di Bergamo. In data 19/05/2023 sono state consegnate le prestazioni all'appaltatore. Il 12/02/2024 è stata attivata la cosiddetta «Fase-2», ossia la configurazione di interruzione parziale della Stazione di Bergamo (due binari tronchi ad Ovest per l'attestamento delle relazioni da/per Treviglio e un binario tronco ad Est per l'attestamento delle relazioni da/per Montello). Ultimata la Progettazione Esecutiva, in data 28/05/2024 è avvenuta la consegna dei lavori delle opere di parte A (demolizioni, BOE e realizzazione del passaggio pedonale a raso provvisorio). La chiusura del sottopasso di stazione, con l'attivazione del passaggio pedonale a raso provvisorio, è avvenuta nel mese di gennaio 2025. Per le restanti opere di parte B è stata effettuata la consegna dei lavori a Marzo 2025.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Incremento di capacità dagli attuali 4 treni/h (nei due sensi di marcia) a 10 treni/h per direzione; Incremento dei servizi nell'ambito del nodo di Bergamo; Aumento della regolarità della circolazione grazie anche alla soppressione dei passaggi a livello. L'intervento PRG di Bergamo permetterà di aumentare la capacità dell'impianto in coerenza con l'incremento dei volumi di traffico attesi secondo l'Accordo Quadro tra RFI e Regione Lombardia. La realizzazione di nuovi itinerari in stazione percorribili a 60 km/h permetterà di ridurre le interferenze tra le principali relazioni, garantendo il mantenimento e miglioramento degli indici di regolarità a seguito dell'incremento di traffico. L'adeguamento dei marciapiedi e dell'accessibilità in generale permetterà di gestire l'incremento del numero di viaggiatori atteso a seguito del potenziamento dei servizi ferroviari, attraverso una migliore gestione dei flussi ambito stazione ed una riduzione dei tempi di incarrozzamento.

Progetto 0366A: Potenziamento linea Ponte S.Pietro-Bergamo-Montello



	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	X
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lombardia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MINS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Intervento / Opere funzionali															
Raddoppio Bergamo-Curno, ACC Bergamo, PRG e ACC Ponte S.Pietro	X	X				X									
Raddoppio Bergamo-Montello		X				X									
PRG Bergamo						X									

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
795,91	364,96	di cui: 364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	79,35	351,60

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo							Incremento di costo dovuto ad affinamenti progettuali eseguiti in fase di Progettazione Esecutiva determinata anche dalle richieste pervenute dagli enti interessati dalle soluzioni progettuali relativamente all'opera sostitutiva per la soppressione del PL di Fermi e adeguamento della viabilità a Curno.
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
716,56			79,35			795,91	
Evoluzione coperture finanziarie							Copertura appalto in corso per maggiori costi emersi ad esito della PE
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
357,46				7,50		364,96	
PIANO DELLA SPESA			Quadro finanziario ed economico		OGV		Produzione

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0366A: Potenziamento linea Ponte S.Pietro-Bergamo-Montello

	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Bergamo-Curno, ACC Bergamo, PRG e ACC Ponte S.Pietro	363,48	284,13	79,35	222,84	140,65	156,17	17,46	2,54	1,71	0,54	0,01	4,66	6,50	342,33
Raddoppio Bergamo-Montello	330,60	0,00	330,60	316,47	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	330,60
PRG Bergamo	101,83	80,83	21,00	71,05	30,78	65,10	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	5,00	87,00
	795,91	364,96	430,95	610,36	185,56	221,28	34,05	2,54	1,71	0,54	0,01	7,41	23,78	759,93

CRONOPROGRAMMA

	CUP	Stato attuativo	Iter procedurale											
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Raddoppio Bergamo-Curno, ACC Bergamo, PRG e ACC Ponte S.Pietro	J64H17000140001	Realizzazione	1-2018	3-2026	9-2018	12-2022	-	-	-	-	-	-	12-2026	
Raddoppio Bergamo-Montello	J64H17000140001	Iter autorizzativo	3-2021	12-2025	-	-	-	-	12-2025	10-2026	10-2026	6-2033	2-2034	
PRG Bergamo	J14E21003970001	Realizzazione	7-2021	5-2022	6-2022	12-2026	-	-	10-2026	6-2027	6-2023	12-2029	12-2029	

	Priorità strategici	Obiettivi strategici
	Allegato MMS al DEF Tavoli tecnici di ascolto Altri Provvedimenti* Cofinanziamenti UE UE - workplan corridoio TEN-T AQ per l'utilizzo della capacità Fondo Sviluppo e Coesione Accordi EE.LL. Accordi internazionali Interventi commissariati PNRR	Coesione sociale e territoriale Accessibilità e qualità stazioni Resilienza al climate change Adeguamento a standard tecnici Sviluppo tecnologico Sistemi regionali e metropolitani Potenziamento connessioni merci Sviluppo corridoi TEN-T Completamento valichi alpini Alta Velocità (AV)
Intervento / Opere funzionali		
Interventi nella stazione di Centallo e progettazione raddoppio Fossano-Cuneo	X	X

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 1357: Potenziamento Fossano-Cuneo

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
23,38	21,49		21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
23,38						23,38

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
21,49						21,49

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Interventi nella stazione di Centallo e progettazione raddoppio Fossano-Cuneo	23,38	21,49	1,89	20,15	3,23	6,31	6,08	5,66	0,00	0,00	0,04	0,39	5,00	17,24
	23,38	21,49	1,89	20,15	3,23	6,31	6,08	5,66	0,00	0,00	0,04	0,39	0,04	17,24

CRONOPROGRAMMA

	CUP		Stato attuativo				Iter procedurale							
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.	
							Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
Interventi nella stazione di Centallo e progettazione raddoppio Fossano-Cuneo	J11H03000100001	Realizzazione	6-2004	12-2012	1-2005	7-2026	9-2007	12-2012	12-2008	5-2027	6-2009	9-2028	10-2028	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento fa parte del Programma Regionale Mobilità e Trasporti della Regione Lombardia, nonché dell'«Intesa sulle strategie e sulle modalità per lo sviluppo del SFR passeggeri, del trasporto merci e degli standard qualitativi per l'interscambio modale» sottoscritta tra RFI e Regione Lombardia a dicembre 2016. L'intervento prevede la realizzazione del raddoppio nella tratta Piadene-Mantova (34 km). Il progetto sarà realizzato in parte in variante rispetto al tracciato esistente, con distanza dall'asse attuale di circa 20 mt e in parte in sede con interruzione dell'esercizio ferroviario. In particolare, per la 1^a fase è prevista l'interruzione totale della tratta Bozzolo-Mantova.

L'intervento consiste nel raddoppio della linea Piadene-Mantova, così dettagliato:- il raddoppio della tratta Piadene - Mantova. In una prima fase verrà realizzato il nuovo tracciato a semplice binario tra Piadene e Bozzolo e il raddoppio tra Bozzolo e Mantova. Verrà poi completato il raddoppio tra Piadene e Bozzolo;- l'adeguamento della tratta agli standard prestazionali previsti per il traffico merci, garantendo una categoria di carico assiale D4 (senza limitazioni), una codifica per il trasporto combinato P/C80 e un modulo di 750m (nelle stazioni di Marcaria e Bozzolo);- la realizzazione di interventi di PRG nelle stazioni di Piadene, Marcaria, Bozzolo e Mantova, con la velocizzazione a 60 km/h dei principali itinerari di stazione e il miglioramento dell'accessibilità mediante l'adeguamento a standard dei marciapiedi (lunghezza 250m e altezza 55cm) e la realizzazione di nuovi sottopassi di stazione, ove non già presenti;- la trasformazione dell'attuale stazione di Castellucchio in fermata con l'adeguamento a standard dei marciapiedi (lunghezza 250m e altezza 55cm) e la realizzazione di un nuovo sottopasso;- l'upgrading tecnologico degli impianti di linea e di stazione mediante la realizzazione di un nuovo sistema ACC-M/SCC-M che permetterà la gestione della circolazione del Posto Centrale di Milano G.P.;- la soppressione diffusa dei passaggi a livello, pubblici e privati, nella tratta Codogno-Mantova.

L'opera si sviluppa nella bassa pianura lombarda, ad una quota compresa tra i 60 e i 20 metri s.l.m. andando da ovest verso est. Lo sviluppo dell'intera tratta è di circa 90 km. L'obiettivo commerciale, alla base di questi interventi, è creare le condizioni per l'incremento della regolarità sulla relazione regionale Milano – Mantova ed un suo successivo potenziamento per arrivare alla frequenza di un treno/h per direzione. La linea ha anche un interesse merci, legato non solo alla presenza degli impianti industriali raccordati di cui il principale è Cava Tigozzi, ma anche al fatto che tale linea fa parte del corridoio alternativo al Mediterraneo.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Ad inizio agosto 2023 sono state consegnate le prestazioni all'Appaltatore. Il contratto prevede la suddivisione delle opere in parte A e parte B. Il progetto esecutivo di parte A è stato approvato a marzo 2024 e contestualmente sono stati avviati i relativi lavori. Il progetto esecutivo di parte B è stato approvato per fasi a maggio 2024 e agosto 2024 con consegna dei rispettivi lavori alle medesime date. Ad oggi è completata la rimozione del binario esistente tra Bozzolo e Mantova, avviata la realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello e del nuovo rilevato ferroviario. Sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo ponte sull'Oglio. A dicembre 2023 è stata avviata l'attività negoziale per la realizzazione delle opere sostitutive per la soppressione dei due PL (alla pk 4+258 e alla pk 5+865 della Linea Codogno-Cremona-Mantova) in Comune di Maleo (finanziati nell'ambito della 1^a fase). Ultimata l'attività negoziale, a settembre 2024 sono state consegnate le prestazioni all'Appaltatore. È tuttora in corso la redazione della progettazione esecutiva.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Incremento della capacità sulla tratta da 4 treni/h nei due sensi di marcia a 10 treni/h per direzione e contestuale aumento del livello di regolarità dei servizi;Potenziamento dei collegamenti regionali come previsto in Accordo Quadro.

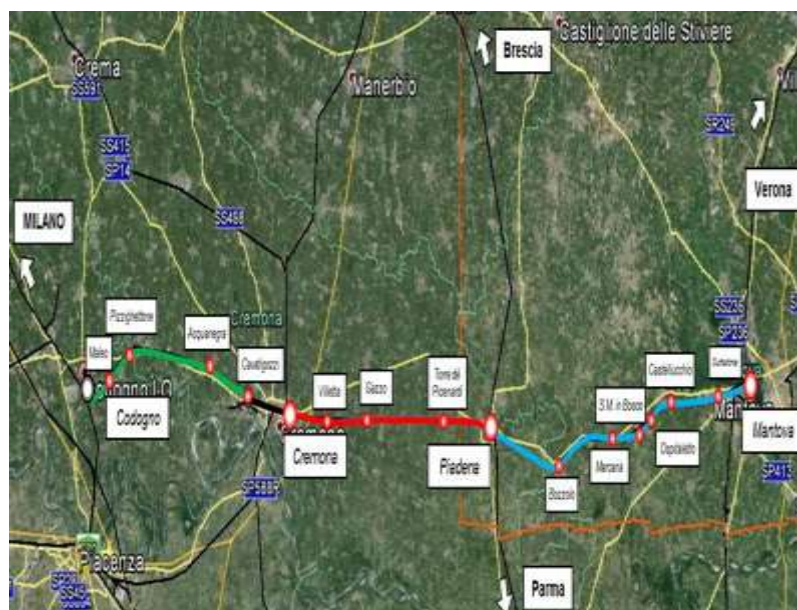

	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lombardia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Tabella A05-Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali

Bacini Nord ovest

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento fa parte del Programma Regionale Mobilità e Trasporti della Regione Lombardia, nonché dell'«Intesa sulle strategie e sulle modalità per lo sviluppo del SFR passeggeri, del trasporto merci e degli standard qualitativi per l'interscambio modale» sottoscritta tra RFI e Regione Lombardia a dicembre 2016. L'intervento di 2^a fase prevede la realizzazione del raddoppio nella tratta Codogno – Piadena (50 km).

Nelle successive fasi funzionali è previsto il raddoppio nelle tratte Codogno - Cavatigozzi e Cremona - Piadena. Gli interventi del raddoppio consentiranno a regime l'aumento della regolarità della circolazione, la riduzione dei tempi di percorrenza e l'incremento della capacità sull'intera linea che permetterà l'introduzione sia di un nuovo modello di esercizio potenziato per i servizi passeggeri di medio e breve raggio che per i servizi merci. Sarà inoltre migliorata la fruibilità degli impianti da parte dei viaggiatori.

L'opera si sviluppa nella bassa pianura lombarda, ad una quota compresa tra i 60 e i 20 metri s.l.m. andando da ovest verso est. Lo sviluppo dell'intera tratta è di circa 90 km. L'obiettivo commerciale, alla base di questi interventi, è creare le condizioni per l'incremento della regolarità sulla relazione regionale Milano – Mantova ed un suo successivo potenziamento per arrivare alla frequenza di un treno/h per direzione. La linea ha anche un interesse merci, legato non solo alla presenza degli impianti industriali raccordati di cui il principale è Cava Tigozzi, ma anche al fatto che tale linea fa parte del corridoio alternativo al Mediterraneo.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

A maggio 2023 è stato ultimato l'aggiornamento della Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica. A luglio 2023 è stato avviato il Dibattito Pubblico, conclusosi a giugno 2024 con la pubblicazione del Dossier conclusivo da parte di RFI. Nel mese di febbraio è stato avviato l'adeguamento del PFTE ad esito del Dibattito Pubblico.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Incremento della capacità sulla tratta da 4 treni/h nei due sensi di marcia a 10 treni/h per direzione e contestuale aumento del livello di regolarità dei servizi; Potenziamento dei collegamenti regionali come previsto in Accordo Quadro.

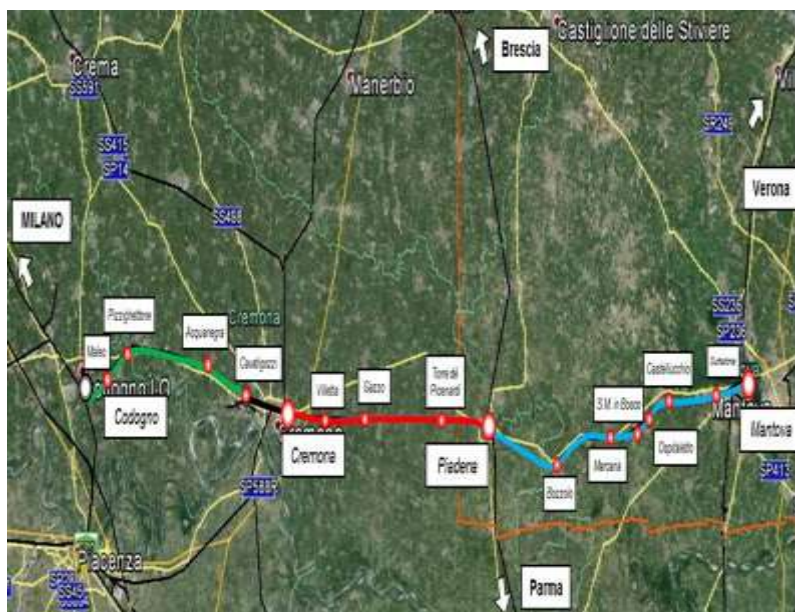

Capacità	X
Velocità	
Accessibilità	
Regolarità	X
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lombardia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica					Obiettivi strategici				
	PNRR	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF
Raddoppio Codogno-Cava Tigozzi e Cremona-Piadena	X				X				X	

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto I178B: Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova 2^ fase

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve			
								Priorità 1	Priorità 2		
1.310,92	0,00	di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,92	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
1.310,92						1.310,92

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
0,00						0,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Codogno-Cava Tigozzi e Cremona-Piadena	1.310,92	0,00	1.310,92	587,13	723,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.310,92
	1.310,92	0,00	1.310,92	587,13	723,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,92

CRONOPROGRAMMA														
CUP	Stato attuativo				Iter procedurale									
	Progettazione	-	9-2026	-	Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione	
					Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine
Raddoppio Codogno-Cava Tigozzi e Cremona-Piadena	J84H17000930009	Progettazione	-	9-2026	-	-	-	-	-	-	10-2026	7-2027	7-2027	7-2039

Tabella A05-Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali

Bacini Nord ovest

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede il potenziamento, per fasi funzionali, della linea Brescia – San Zeno – Ghedi (con soppressione di tutti i PL) ed è finalizzato all’incremento della capacità e della regolarità.

L’intervento, che si sviluppa per circa 15 km, può essere diviso in più fasi funzionali, a seconda degli obiettivi di servizio che si possono conseguire:Fase 1: raddoppio della tratta Brescia-San Zeno, elettrificazione della tratta San Zeno-Ghedì, realizzazione della nuova fermata di Brescia Porta Cremona, interventi al PRG di Brescia.Fase 2: raddoppio della tratta San Zeno-Ghedì e alternative di tracciato del nuovo collegamento con l'aeroporto di Montichiari e con l'abitato di Montichiari (nuova fermata aeroporto e nuova fermata Fiera)L'intervento comprende il rinnovo degli apparati centrali di stazione ed il potenziamento prestazionale della linea.L'intervento comprende altresì la soppressione di due passaggi a livello in Comune di Brescia che verrà realizzata anticipatamente rispetto alle opere di cui sopra.

Lombardia

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

In data 31/07/2024 è stata ultimata la PFTE della tratta Brescia - S.Zeno, comprensiva degli interventi di soppressione PL in Comune di Brescia (Via Cremona e Via della Ziziola), per quest’ultimi sono in corso interlocuzioni con gli EELL sulle soluzioni sviluppate nella PFTE.Per la tratta S. Zeno – Ghedi è stata ultimata la PFTE per la soppressione dei PL nei Comuni di Montirone e Ghedi mentre è in corso la PFTE per il raddoppio della tratta S. Zeno-Ghedì.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Incremento capacità della tratta Brescia-Ghedì da 4 treni/h a 10 treni/h per direzione;- Miglioramento della qualità e regolarità della circolazione.- Introduzione nuovi servizi nel Nodo di Brescia. - Adeguamento a modulo 750 metri di San Zeno e Montirone, in cui sono presenti raccordi industriali.



LEGENDA

PRIMA FASE - Tratta Brescia - Montichiari Aeroporto

SECONDA FASE - Tratta Montichiari Aeroporto - Montichiari Fiera

CARATTERISTICHE PRIMA FASE

- Raddoppio tratta Brescia - San Zeno
- Elettrificazione e potenziamento tratta San Zeno - Ghedi
- Nuova linea a singolo binario tratta Ghedi - Montichiari aeroporto
- Nuova stazione Montichiari Aeroporto
- Soppressione di circa 13 PL e un nuovo PRG degli impianti di Brescia, San Zeno, Montirone e Ghedi
- CVI: 180 MK

CARATTERISTICHE SECONDA FASE

- Nuova linea a singolo binario tratta Montichiari aeroporto - Montichiari Fiera
- Nuova stazione Montichiari Fiera
- CVI: 40 MK

	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lombardia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi internazionali	Accordi E.E.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza ai climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Adeguamento nodo di Brescia e potenziamento collegamento Brescia-S.Zeno-Ghedì						X				X	X										X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto I182: Adeguamento nodo di Brescia e potenziamento collegamento Brescia-S.Zeno-Ghedì

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
781,53	40,00		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,53	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
450,00			331,53			781,53
Variazione del costo per l'aggiornamento del quadro economico ad esito del Progetto di fattibilità tecnico economica per la tratta Brescia – San Zeno e all'aggiornamento del valore delle opere per la tratta San Zeno - Ghedi.						

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
40,00						40,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Adeguamento nodo di Brescia e potenziamento collegamento Brescia-S.Zeno-Ghedì	781,53	40,00	741,53	4,51	777,02	5,23	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	780,78
	781,53	40,00	741,53	4,51	777,02	5,23	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	780,78

CRONOPROGRAMMA														
					Stato attuativo									
					CUP	Iter procedurale								
						Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Nego.		Esecuzione Funzionalità
						Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio Fine
Adeguamento nodo di Brescia e potenziamento collegamento Brescia-S.Zeno-Ghedì					J24J23000040008	Progettazione	3-2022	7-2026	-	7-2026	-	8-2025	7-2027	2-2026 1-2034 7-2034

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025
Progetto P123: Elettificazione Ivrea-Aosta e adeguamento linea Chivasso - Aosta

Tabella A05-Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali
Bacini Nord ovest

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede l'elettificazione della tratta Ivrea-Aosta e interventi infrastrutturali negli impianti lungo l'intera linea.

Adeguamento stazioni Il progetto prevede interventi infrastrutturali negli impianti lungo l'intera linea per l'efficientamento degli incroci, attraverso il conseguimento dei movimenti contemporanei tra treni e la velocizzazione degli itinerari di stazione, e il contestuale miglioramento dell'accessibilità in stazione attraverso nuovi sottopassi/sovrappassi e innalzamento marciapiedi nelle località di Nus, Hone Bard, Montanaro e Strambino. È previsto inoltre il completo rinnovo tecnologico del sistema di protezione della marcia treno sulla tratta Ivrea - Aosta e le prime valutazioni sugli interventi alle opere d'arte per l'innalzamento della velocità massima del tracciato. Elettificazione Ivrea-Aosta Il progetto prevede l'elettificazione a 3 kV cc della linea ferroviaria Ivrea-Aosta che si estende per 66,2 km ed è inserito nell'Accordo Quadro che RFI ha stipulato con Regione Valle d'Aosta. Il progetto prevede: • la realizzazione di nuove sottostazioni elettriche alimentate a media tensione a 15 kV; • la posa in opera della linea di contatto con contestuale adeguamento delle opere d'arte e gallerie presenti per l'alloggiamento della stessa; • l'adeguamento delle stazioni lungo la tratta mediante elettificazione di tutti i binari di circolazione e la realizzazione dei portali estremi di stazione per il sezionamento rispetto alla linea; • la realizzazione degli apparati di telecomando per la gestione operativa a distanza della Trazione Elettrica (DOTE).

Gli interventi si sviluppano lungo la linea ferroviaria, a semplice binario, Chivasso Aosta (regioni Piemonte e Val d'Aosta) . La lunghezza della linea è di circa a 98 km di cui i primi 48 km in territorio della Regione Piemonte ed i successivi 50 km nella Regione Val d'Aosta .

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Adeguamento stazioni- Approvata la Progettazione Esecutiva, in data 28/08/2024 sono stati consegnati i lavori, attualmente in corso.- I lavori relativi al sistema della marcia treno (SCMT) per la tratta Ivrea– Aosta sono riprogrammati in relazione alla chiusura della linea al traffico nel periodo fine 2023-fine 2026 per i lavori di elettificazione. Il sistema SCMT sarà attivato alla riapertura al traffico della linea nel 2026. - Sono in corso valutazioni (pre fattibilità) sugli interventi alle opere d'arte per l'istituzione del rango C sulla linea Chivasso – Aosta. Elettificazione Ivrea-Aosta Approvata la Progettazione esecutiva, in data 28/06/2024 sono stati consegnati i lavori, attualmente in corso.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Miglioramento della regolarità ed efficientamento nella gestione della circolazione, miglioramento dell'accessibilità alle stazioni. Ammissibilità per le Imprese Ferroviarie all'impiego di materiale rotabile completamente elettrico, in alternativa/sostituzione degli attuali treni diesel e bimodali circolanti sul percorso Aosta-Torino, caratterizzato da maggiori disponibilità in termini di capienza e prestazioni generali maggiori. Sostenibilità ambientale: riduzione dell'inquinamento ambientale e di emissioni.



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Piemonte
Val d'Aosta

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P123: Elettificazione Ivrea-Aosta e adeguamento linea Chivasso - Aosta

	PNRR	Accordi Internazionali Interventi commissariati	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF		Alta Velocità (AV)	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																				
Elettificazione Ivrea-Aosta e Velocizzazione impianti e soppressione PL linea Chivasso-Aosta	X				X				X							X				

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve			
								Priorità 1	Priorità 2		
171,86	171,85	di cui:	75,25	0,00	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,02	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
171,99			-0,12			171,86
Variazione di costo per l'ottimizzazione delle risorse finanziarie sul programma						
Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigge	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
171,99					-0,14	171,85
Rimodulazione della copertura su interventi parzialmente finanziati a favore di ulteriori fabbisogni maggiormente prioritari						

PIANO DELLA SPESA

	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	AI 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Elettificazione Ivrea-Aosta e Velocizzazione impianti e soppressione PL linea Chivasso-Aosta	171,86	171,85	0,02	127,10	44,76	129,51	15,20	0,00	0,02	1,08	3,62	3,37	5,00	157,49
	171,86	171,85	0,02	127,10	44,76	129,51	15,20	0,00	0,02	1,08	3,62	3,37	6,30	157,49

CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA													
CUP	Stato attuativo	Iter procedurale											
		Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Elettrificazione Ivrea-Aosta e Velocizzazione impianti e soppressione PL linea Chivasso-Aosta	Realizzazione	12-2020	7-2021	10-2020	12-2022	-	-	12-2022	8-2023	5-2021	7-2026	12-2026	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma prevede il potenziamento tecnologico ed infrastrutturale delle linee interessate dal traffico regionale. Gli interventi infrastrutturali tipicamente prevedono la velocizzazione degli itinerari deviati, le condizioni impiantistiche per la realizzazione dei movimenti contemporanei nelle sedi di incrocio sul semplice binario, la realizzazione di sottopassi e l'adeguamento dei marciapiedi. Dal punto di vista tecnologico generalmente è previsto il rinnovo del sistema di distanziamento, la realizzazione di nuovi apparati ed un nuovo sistema di supervisione e regolazione della circolazione e l'adeguamento dei sistemi di Informazione al Pubblico. E' prevista inoltre l'elettificazione di tratte a trazione diesel, e interventi diffusi sulla sede e sulla sovrastruttura ferroviaria per omogeneizzare le caratteristiche prestazionali delle linee e gestire obsolescenza e punti singolari. Gli interventi, oltre che da necessità interne legate al miglioramento della gestione della circolazione ferroviaria, derivano dai Tavoli Tecnici di Ascolto che RFI ogni anno organizza con gli stakeholder, da Accordi/Protocolli sottoscritti con gli EE.LL., nonché dagli Accordi Quadro sottoscritti per l'allocazione della capacità.

Le principali realizzazioni riguardano: A) upgrading della linea Milano-Lecco-Tirano: interventi puntuali di efficientamento della configurazione dei binari di stazione (PRG), tra i quali realizzazione e/o adeguamento del sottopasso, adeguamento marciapiedi, velocizzazione itinerari deviati e condizioni impiantistiche per movimenti contemporanei. Gli interventi prioritari riguardano gli impianti di Mandello e Lierna, che si integrano con quelli già avviati di Bellano e Ponte in Valtellina. È prevista la soppressione di alcuni PL presenti sulla linea, la cui individuazione va concordata tra RFI e gli EELL. Sono previsti anche interventi di potenziamento sulla tratta Milano – Lecco funzionali anche alla relazioni da/per la Valtellina. B) Elettificazione Como-Molteno-Lecco: elettrificazione della tratta a semplice binario Albate – Molteno – Lecco, di estesa pari a 36,77 km, e può essere suddiviso nelle due fasi funzionali: Albate – Molteno, di estesa pari a 22,06 km; Molteno – Lecco, di estesa pari a 14,71 km. La tratta Como – Albate è già elettrificata. Adeguamento della sagoma della tratta Merone – Molteno – Lecco al fine di consentire la circolabilità del materiale rotabile di nuova generazione, secondo il modello di esercizio condiviso con Regione Lombardia. C) Upgrading linea Acqui T./Alessandria-Ovada-Genova: interventi diffusi di rinnovo/upgrade su tutta la linea; sistemazione definitiva della frana di Mele con realizzazione galleria artificiale e PRG della stazione di Mele; interventi diffusi per miglioramento delle condizioni di accessibilità negli impianti (Prasco Cremolino, Genova Costa di Sestri Ponente, Campoligure Masone); restyling fabbricati di stazione a Genova Costa di Sestri, Campoligure Masone, Rossiglione, Prasco Cremolino D) variante galleria Bastardo linea pontremolese: nuova galleria in variante di tracciato con annesso adeguamento del tracciato ferroviario esistente ubicata in un versante instabile con più fronti di frana e caratterizzata da fenomeni franosi E) Elettificazione Biella - Santhià: adeguamento della SSE Santhià e realizzazione nuova SSE Biella S.Paolo; upgrade tecnologico a sistema di controllo della marcia del treno (SCMT). Altri interventi tra cui il potenziamento tecnologico e infrastrutturale della linea Carmagnola - San Giuseppe di Cairo con rinnovo degli apparati tecnologici di linea e di stazione (ACC-M/SCC-M) e soppressione di alcuni passaggi a livello e la realizzazione della stazione di Bergamo Ospedale e soppressione di PL in via M.king.

Gli interventi interessano l'intero territorio delle regioni Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia e Liguria

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

A) Interventi puntuali di potenziamento Milano – Lecco – Sondrio – Tirano (PRG sedi di incrocio) Ardenno e San Pietro Berbenno: interventi conclusi nel 2024; Lierna: intervento avviato e attivazione prevista per dicembre 2025; Mandello: intervento avviato e attivazione prevista per dicembre 2025; Tirano: intervento concluso; Colico: intervento avviato e attivazione prevista per settembre 2025. B) Elettificazione Como - Molteno - Lecco Lotto 1 tratta Albate-Molteno Ad Aprile 2023 è stata ultimata la Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica. Ad Agosto 2023 è stata avviato l'iter autorizzativo, in data 21/01/2025 Regione Lombardia ha trasmesso il proprio parere relativamente al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA decretandone l'esclusione. In data 17/02/2025 è pervenuto il Decreto conclusivo del MASE. È in corso di ultimazione la CdS. Lotto 2 tratta Molteno-Lecco È stato consegnato l'adeguamento della PFTE il 13/12/2024 ed è attualmente in corso la predisposizione della documentazione necessaria per l'avvio della procedura di assoggettabilità a VIA. C) Upgrading linea Ovada Ultimato il rinnovo dell'armamento per cui nel settembre 2023 è stata conclusa una prima fase relativa alla tratta tra Borzoli e Mele, a Giugno 2024 sono stati avviati i lavori della 2ª fase nella tratta Campoligure-Rossiglione-Ovada, conclusi nel dicembre 2024. A Febbraio 2024 è stato avviato l'iter autorizzativo relativo alla realizzazione della galleria artificiale di Mele, concluso in data 28/01/2025. Per gli interventi di Prasco Cremolino sono in corso i lavori relativi al sottopasso di stazione, in data 28/03/2025 sono stati aggiudicati i lavori dell'appalto multidisciplinare, è in corso la stipula dei contratti applicativi per le attività tecnologiche (TE, IS, LFM). È stata ultimata la progettazione relativa alle modifiche del PRG di Campo Ligure, il 25/02/2025 è intervenuta la determina conclusiva della Conferenza di Servizi. È in corso la progettazione di fattibilità tecnico – economica per i restanti interventi relativi alla viabilità correlata alla soppressione dei PL nel Comune di Mele nonché agli interventi di restyling delle stazioni. D) Upgrading linea Pontremolese La revisione della Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica relativa alla Variante di tracciato si è conclusa a Dicembre 2022, a seguito della quale sono emerse le criticità. Secondo gli ultimi studi geologici, che sono stati fatti in ambito di approfondimento delle indagini per lo sviluppo della soluzione identificata, hanno evidenziato la presenza di sostanze pericolose e di minerali amiantiferi, con conseguenti elevatissimi costi di smaltimento. Il quadro descritto dello stato attuale potrebbe determinare una rivalutazione per il proseguimento delle attività. E' stato avviato lo sviluppo di una PFTE (tramite AQ Progettazione esterno) per una 2ª Soluzione di variante di tracciato e risultano in corso gli interventi per la messa in sicurezza della galleria esistente. Già adeguati i marciapiedi a Collecchio. Prevista l'attivazione del modulo a Berceto nel 2023. Progettazione Definitiva in corso per la variante di galleria «Bastardo». E) Elettificazione Biella - Santhià Sostituzione SSC con SCMT - Attivata. Elettificazione ed SSE - Attivata con Circolare Territoriale TO 7/2022 del 12/06/2022

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Sviluppo del traffico Regionale e Miglioramento dei livelli di servizio e di sicurezza dell'infrastruttura A) Gli interventi di PRG degli impianti consentiranno, insieme agli altri investimenti già previsti a Bellano e Ponte in Valtellina, l'istituzione di un servizio Milano – Tirano ogni 30',

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P198: Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord ovest

garantendo contestualmente l'aumento della regolarità su tutta la lineaB) consentirà di istituire nuovi servizi ad oggi non esistenti, tra cui prolungamento su Lecco dei treni provenienti dalla Svizzera ed oggi attestati a Como ovvero servizi promiscui tra rete RFI e rete elettrificata FNM (Milano – Asso), la cui interconnessione avviene nella stazione di Merone e utilizzo della linea anche da treni merci tra Chiasso e Lecco, i quali attualmente utilizzano il percorso via Seregno – Carnate.C) Upgrading linea Ovada: Nuovi itinerari in stazione di Mele e incremento del numero di movimenti contemporanei ammissibili in impianto, diminuendo i ritardi derivanti dalle conflittualità fra itinerari di stazione; Incremento dell'accessibilità negli impianti negli impianti di Prasco Cremolino, Genova Costa di Sestri Ponente, Campoligure Masone, Rossiglione.D) Variante Bastardo linea Pontremolese: eliminazione delle attuali limitazioni alla circolazione treni, con conseguente miglioramento della regolarità per riduzione dei minuti di ritardo derivanti dai rallentamenti attivi nella tratta (fino a $v = 10 \text{ km/h}$). Non essendo, inoltre, più necessari interventi di consolidamento è garantita la continuità dell'esercizio ferroviario.



	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	X
	Gestione spazi di stazione	X
	Intermodalità merci	X
	Intermodalità passeggeri	X
	Integrazione della rete	X
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Piemonte
Val d'Aosta
Lombardia
Liguria
Emilia Romagna

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Upgrading linea Ovada	X						X	X			X				X						
Piano Olimpiadi - interventi regione Lombardia								X	X							X					
Upgrading linea Pontremolese (variante galleria Bastardo)							X								X						
Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord ovest - interventi diffusi							X								X						
Stazione di Bergamo (piastra)							X									X					
Nuove stazioni - Area nord-ovest e Tirrenica							X									X					
Interventi comune di Mantova							X									X					
Fermata Bergamo Ospedale							X									X					

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P198: Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord ovest

Elettrificazione Como - Molteno - Lecco	X	X	X
Elettrificazione Biella - Santhià	X	X	X
Nuova fermata Monza Est - Parco			

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatiche di breve				
								Priorità 1	Priorità 2			
1.443,98	759,71	di cui:	708,95	18,01	0,00	21,39	0,00	11,36	4,00	54,68	625,59	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE											milioni di euro
Evoluzione Costo											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025					
1.467,10	-23,13					1.443,98	Variazione di costo relativa allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.				

Evoluzione coperture finanziarie											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025					
795,23	-23,13		-13,30	5,90	-4,99	759,71	Copertura dei fabbisogni indifferibili connessi all'avvio di interventi richiesti dalle IF per l'allungamento dei marciapiedi di stazione; ulteriore copertura con risorse proprie della Società per interventi non rientranti nel Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria; riduzione delle risorse Olimpiadi 2026				

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Nuova fermata Monza Est - Parco	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,50
Piano Olimpiadi - interventi regione Lombardia	213,67	207,67	6,00	156,53	57,15	175,32	126,60	0,00	0,00	0,00	25,61	43,73	5,00	92,39
Fermata Bergamo Ospedale	13,00	13,00	0,00	9,80	3,20	9,25	4,51	3,10	0,00	0,01	0,01	0,38	5,03	8,22
Elettrificazione Como - Molteno - Lecco	167,07	97,87	69,20	17,06	150,01	4,02	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,33	5,00	164,07
Interventi comune di Mantova	52,12	52,12	0,00	45,01	7,11	11,04	7,99	0,00	0,00	0,00	0,45	4,50	5,00	44,40
Elettrificazione Biella - Santhià	12,70	12,70	0,00	11,69	1,01	12,53	12,26	0,10	2,33	8,59	1,44	0,06	5,10	0,17
Upgrading linea Ovada	84,40	84,40	0,00	65,42	18,98	33,99	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	5,00	66,98
Upgrading linea Pontremolese (variante galleria Bastardo)	43,01	43,01	0,00	25,22	17,80	8,62	7,42	0,00	0,00	0,00	2,76	2,59	5,00	35,60
Nuove stazioni - Area nord-ovest e Tirrenica	12,10	12,10	0,00	11,59	0,51	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	12,10
Stazione di Bergamo (piastra)	3,59	3,59	0,00	0,71	2,88	3,36	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	5,00	0,54
Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord ovest - interventi diffusi	835,81	233,24	602,57	169,76	666,06	171,85	159,56	23,87	11,58	67,49	43,34	6,87	10,21	676,72
	1.443,98	759,71	684,27	512,78	931,20	430,00	339,90	27,07	13,91	76,09	73,61	68,71	76,90	1.107,68

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Realizzazione fermata Monza Est - Parco	B51J20000110002	6,50	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Nuova fermata Monza Est - Parco		6,50	0,00	0%	0,00	0%	
Olimpiadi Invernali 2026 - ambito MI	J84J24000020001	180,00	174,00	97%	134,10	77%	Realizzazione
Interventi di potenziamento Milano – Lecco – Sondrio – Tirano	J84H20000850001	33,67	33,67	100%	6,61	20%	Realizzazione
Piano Olimpiadi - interventi regione Lombardia		213,67	207,67	97%	140,71	68%	
Fermata Bergamo ospedale	J14H17000110001	13,00	13,00	100%	4,78	37%	Realizzazione
Fermata Bergamo Ospedale		13,00	13,00	100%	4,78	37%	
Elettrificazione Como - Molteno - Lecco	J84E21002910001	167,07	97,87	59%	3,75	4%	Progettazione
Elettrificazione Como - Molteno - Lecco		167,07	97,87	59%	3,75	4%	

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025**Programma P198: Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord ovest**

Soppressione PL nel Comune di Mantova	J61G22000030001	52,12	52,12	100%	8,17	16%	Realizzazione
Interventi comune di Mantova		52,12	52,12	100%	8,17	16%	
Elettrificazione Biella - Santhià	J64C19000280001	12,70	12,70	100%	12,53	99%	In ultimazione
Elettrificazione Biella - Santhià		12,70	12,70	100%	12,53	99%	
Potenziamento Linea Acqui Terme / Alessandria - Ovada - Genova	J94J22000320001	84,40	84,40	100%	17,46	21%	Realizzazione
Upgrading linea Ovada		84,40	84,40	100%	17,46	21%	
Upgrading Infrastrutturale della Linea Pontremolese	J84E21003810001	43,01	43,01	100%	7,78	18%	Realizzazione
Upgrading linea Pontremolese (variante galleria Bastardo)		43,01	43,01	100%	7,78	18%	
Realizzazione di nuove LdS	J54J24000400001	6,10	6,10	100%	0,00	0%	Progettazione
Realizzazione di nuove LdS e modifica di quelle esistenti Area Nord-Ovest	J54J23000720001	6,00	6,00	100%	0,00	0%	Progettazione
Nuove stazioni - Area nord-ovest e Tirrenica		12,10	12,10	100%	0,00	0%	
Stazione di Bergamo	J14J22000080001	3,59	3,59	100%	3,14	87%	Realizzazione
Stazione di Bergamo (piastra)		3,59	3,59	100%	3,14	87%	
Upgrading bacini nord ovest		640,47	45,16	7%	0,00	0%	Progettazione
MI - upgrading linee viaggiatori	J97I17000070001	120,17	120,17	100%	119,86	100%	In ultimazione
TO - Interventi diffusi di potenziamento tecnologico ed infrastrutturale linee regionali	J66J17000400001	47,32	47,32	100%	29,12	62%	Realizzazione
TO - upgrading linee viaggiatori	J67I18000040001	11,33	11,33	100%	10,35	91%	In ultimazione
Acquisti a rimpiazzo - PERS		7,26	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Liberazione immobili - TO	J67B14000120005	5,00	5,00	100%	1,74	35%	Realizzazione
Acquisti materiali inventario per obblighi di legge e produttività	J50F25000000001	1,55	1,55	100%	0,21	13%	Realizzazione
Acquisti Materiali Inventario per Obblighi di Legge e Produttività	J37I12000230001	1,55	1,55	100%	0,97	62%	Realizzazione
Acquisti a rimpiazzo di Materiali d'inventario per Obblighi di Legge e Produttività Direzione Commerciale Esercizio Rete	J50D17000030001	0,60	0,60	100%	0,28	47%	Realizzazione
Acquisti materiali inventario per obblighi di legge e produttività	J50F24000000001	0,56	0,56	100%	0,15	26%	Realizzazione
Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord ovest - interventi diffusi		835,81	233,24	28%	162,67	70%	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Le opere prioritarie consistono nella progettazione di un nuovo Ponte sul fiume Adda e del raddoppio della tratta Paderno – Calusco, all'interno della quale è incluso il ponte.Tale progettazione va ad inquadrarsi nell'ambito di una più ampia ipotesi progettuale di raddoppio dell'intera tratta Carnate – Ponte San Pietro.

Lombardia

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

In riferimento al nuovo ponte sul fiume Adda, è stato ultimato ad agosto 2023 il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali.In data 22/05/2025 è stato avviato il Dibattito Pubblico.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Incremento della capacità sulla tratta e contestuale aumento del livello di regolarità dei servizi;- Aumento della regolarità della circolazione grazie anche alla soppressione dei passaggi a livello.



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lombardia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica								Obiettivi strategici			
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	
Variente ponte ferroviario Paderno d'Adda												X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
674,00	90,00	di cui: 90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	584,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P233: Potenziamento Carnate - Ponte S.Pietro 1^ fase

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrig	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
350,00			324,00			674,00	Aggiornamento dei quadri economici, ad esito del progetto di fattibilità tecnico economica per il nuovo ponte di Paderno d'Adda

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrig	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
90,00						90,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Variante ponte ferroviario Paderno d'Adda	674,00	90,00	584,00	0,00	674,00	0,75	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	5,00	673,27
	674,00	90,00	584,00	0,00	674,00	0,75	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,05	673,27

CRONOPROGRAMMA

		Stato attuativo				Iter procedurale										
		CUP		Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità		
				Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine			
Variante ponte ferroviario Paderno d'Adda		J34J23000040001	Progettazione	1-2023	-	10-2025	6-2027	-	-	-	-	-	-	12-2030		

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede:la realizzazione di una nuova bretella di collegamento tra le linee Verona – Brennero e Fortezza-San Candido. L'intervento ha origine alla progressiva 193+850 della linea Brennero e termina alla progressiva 5+600 della linea Fortezza-San Candido. In corrispondenza dell'innesto verrà realizzata la fermata di Naz-Sciaves. la sistemazione a PRG di Bressanone che risulta necessaria per poter garantire, secondo il modello di esercizio previsto, l'attestamento e la ribattuta dei servizi sia in direzione Bolzano che in direzione Brennero.lo spostamento della fermata di Varna (attualmente dismessa) dalla progressiva 192+197 alla progressiva 191+770 della linea del Brennero, ed adeguamento della stessa agli standard RFI.

L'intervento relativo al PRG di Bressanone si sviluppa nell'areale ferroviario della stazione in ambito urbano, mentre la nuova bretella che si sviluppa a Nord di Bressanone verso la Val Pusteria in territorio tipicamente pedemontano, è prevista con tratti all'aperto in rilevato e in galleria naturale per sottopassare l'autostrada del Brennero A22. E' previsto anche un ponte sul fiume Isarco che nell'area di progetto scorre incassato all'interno di falesie molto acclivi.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•PRG Bressanone:In data 18/12/2022 è stata attivata la fase 0 del PRG di Bressanone.In data 14/12/2023 sono state avviate le attività propedeutiche ai lavori consistenti nella cantierizzazione, BOE e risoluzione delle interferenze.In data 06/12/2024 è stata approvata la Progettazione Esecutiva e sono stati consegnati i lavori.Sono attualmente in corso le lavorazioni riguardanti: realizzazione dei plinti di fondazione dei pali TE; opere provvisorie utili al prolungamento dei tombini e sottopassi esistenti; risoluzione delle interferenze. •Variante di Riga:In data 01/07/2024 è avvenuta la consegna dei lavori delle Opere di Parte A.In data 30/09/2024 è avvenuta la consegna dei lavori delle Opere di Parte B.Sono attualmente in corso le lavorazioni riguardanti: gli imbocchi della galleria Olimpia; la galleria artificiale in sottoattraversamento dell'Autostrada A22; i piazzali tecnologici; il nuovo ponte ad arco sul fiume Isarco; la galleria in ingresso alla nuova fermata di Naz Sciaves; il sottopasso scatolare per l'attraversamento di A22 e della linea del Brennero; la realizzazione del tratto in variante della Val Pusteria•Fermata di Varna:In data 18/10/2023 è stato avviato il PFTE. Attualmente l'attività è sospesa in attesa della condivisione della soluzione con gli Enti Locali.Sono in corso dei tavoli tecnici con gli enti interessati per la condivisione di una soluzione progettuale al fine di poter procedere al successivo sviluppo del PFTE.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

L'intervento consentirà di prolungare i servizi sulla stazione di Bolzano provenienti dalla Val Pusteria con l'obiettivo di un servizio tra Bressanone e Bolzano con frequenza a 30' e con incremento a 15' nelle ore di punta. Inoltre consentirà una riduzione dei tempi di viaggio sul collegamento Bolzano – Val Pusteria e un incremento dell'accessibilità grazie alle nuove fermate di Varna e Naz-Sciaves.



	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	X
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Trentino Alto Adige

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto I172: Variante di Riga

	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change	Adeguamento a standard tecnici	Sviluppo tecnologico	Sistemi regionali e metropolitani	Potenziamento connessioni merci	Sviluppo corridoi TEN-T	Completamento valichi alpini	Alta Velocità (AV)
Intervento / Opere funzionali																					
PRG Bressanone e altre opere propedeutiche							X		X	X											
Variante di Riga e fermata di Sciaves							X		X		X										
Fermata di Varna							X		X												

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2		
251,23	251,23	di cui:	188,23	0,00	49,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatiIRFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
251,23						251,23

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
251,23						251,23

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
PRG Bressanone e altre opere propedeutiche	52,85	52,85	0,00	45,82	7,03	37,11	7,19	0,15	0,76	1,75	2,09	0,33	5,15	44,81
Variante di Riga e fermata di Sciaves	195,59	195,59	0,00	165,59	30,00	170,79	10,11	0,41	1,44	0,58	0,25	2,45	5,41	182,76
Fermata di Varna	2,79	2,79	0,00	2,70	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,79
	251,23	251,23	0,00	214,11	37,11	207,89	17,31	0,55	2,20	2,34	2,34	2,78	10,65	230,36

CRONOPROGRAMMA													
CUP	Stato attuativo				Iter procedurale								
					Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Funzionalità
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	
PRG Bressanone e altre opere propedeutiche	J34G18000150001	Realizzazione	-	-	12-2019	12-2022	-	-	12-2022	12-2023	5-2023	5-2028	5-2028
Variante di Riga e fermata di Sciaves	J34G18000150001	Realizzazione	-	12-2022	12-2019	12-2022	-	-	12-2022	4-2024	6-2023	7-2027	11-2026
Fermata di Varna	J34G18000150001	Progettazione	-	-	10-2023	6-2026	-	-	-	-	-	-	10-2026

Tabella A05-Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali

Bacini Nord est

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento prevede il raddoppio ferroviario della tratta Maerne – Castelfranco della 1^ fase di attuazione SFMR, tra le progressive km 7+600 e km 31+725, appartenente alla linea Venezia SL – Bassano del Grappa. I territori interessati dall'intervento sono Maerne di Martellago, Salzano, Noale, Trebaseleghe, Piombino Dese, Resana e Castelfranco Veneto.

Il progetto comprende lo sviluppo di tutte le opere per la realizzazione del secondo binario, dei corrispondenti adeguamenti impiantistici, degli adeguamenti di fermata e stazioni, della risoluzione delle interferenze con viabilità e reti tecnologiche per la soppressione dei PL privati, che non sono compatibili con una linea ferroviaria a due binari. Il progetto comprende gli impianti di alimentazione elettrica (TE), di segnalamento (IS) e telecomunicazione (TLC), prevede inoltre sia interventi di adeguamento di opere esistenti (opere d'arte ed impianti, deviazioni del tracciato ferroviario, etc.) che di interventi di nuova realizzazione.

L'intervento interessa la linea a semplice binario Maerne-Castelfranco e prevede la realizzazione di un raddoppio in affiancamento al binario esistente, l'adeguamento delle opere d'arte su tutta la tratta, la realizzazione delle barriere per la mitigazione del rumore e la soppressione della stazione di Piombino Dese con la contestuale realizzazione di una nuova fermata. Lo scopo dell'intervento è quello di aumentare la potenzialità della linea ad oggi satura dal punto di vista del traffico.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Ad Aprile 2023 è stato ultimato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, la relativa verifica si è conclusa nel mese di Agosto 2023. Sono in corso le attività propedeutiche per l'avvio del Dibattito Pubblico.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Incremento di capacità e di regolarità. Creazione di nuovo tratto di itinerario merci.



	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Veneto

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Raddoppio Maerne-Castelfranco Veneto	X				X											X					

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto I183: Raddoppio Maerne-Castelfranco Veneto

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatorie di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
831,87	11,10		11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,77

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
831,87						831,87

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
11,10						11,10

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Maerne-Castelfranco Veneto	831,87	11,10	820,77	795,01	36,87	2,41	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	829,46
	831,87	11,10	820,77	795,01	36,87	2,41	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	829,46

CRONOPROGRAMMA														
CUP	Stato attuativo					Iter procedurale								
	CUP	Progettazione	Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
			6-2022	4-2027	-	-	-	-	6-2027	2-2028	3-2028	5-2034	7-2031	
Raddoppio Maerne-Castelfranco Veneto	J14J22000350001	Progettazione	6-2022	4-2027	-	-	-	-	6-2027	2-2028	3-2028	5-2034	7-2031	

Progetto I184: Potenziamento Padova-Castelfranco

Tabella A05-Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali

Bacini Nord est

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento prevede l'adeguamento a doppio binario dell'attraversamento ferroviario del fiume Brenta, sulla linea Padova - Castelfranco, nella parte attualmente a singolo binario compresa tra la stazione di Vigodarzere e l'autostrada A4, per un'estensione dell'intervento di circa 1,9 km. La soluzione che sarà adottata per l'attraversamento del fiume Brenta è quella di un ponte a doppio binario ad arco metallico avente luce unica di 100 mt. Il nuovo binario pari e il binario esistente traslato (binario dispari) si innesteranno rispettivamente al I e II binario della stazione di Vigodarzere. Nell'ambito del progetto è previsto anche l'adeguamento degli impianti tecnologici e dell'attuale stazione di Vigodarzere.

L'intervento interessa il tratto di linea a semplice binario tra Vigodarzere e Padova C.le e prevede la realizzazione di una piccola variante di tracciato, adiacente all'esistente, comprensiva di un nuovo ponte a doppio binario a unica campata. L'intervento va a rimuovere l'esistente collo di bottiglia presente sulla linea Padova-Castelfranco.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Relativamente all'Appalto di opere civili e armamento: in data 18/01/2023 sono stati consegnati i lavori, attualmente in corso la realizzazione. Si è proceduto alla Consegna delle Prestazioni per la parte IS, ACC e SCC ai relativi appaltatori. In data 24/10/2024 sono stati consegnati i lavori dell'ACC di Vigodarzere.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Incremento di capacità (da 8 a 10 treni/h per direzione) Aumento regolarità della linea, grazie all'eliminazione dell'unico tratto di linea a semplice binario.

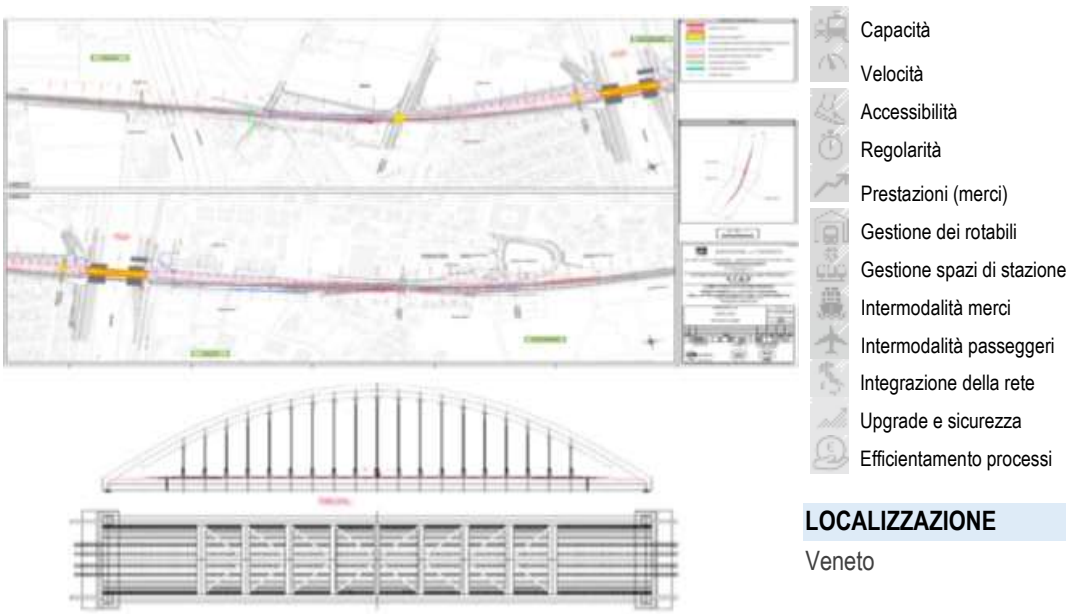

LOCALIZZAZIONE

Veneto

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EELL	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Linea Padova-Vigodarzere: raddoppio ponte sul Brenta					X	X				X				X	

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Progetto I184: Potenziamento Padova-Castelfranco

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
48,00				0,06		48,06	Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
48,00				0,06		48,06	Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)

CRONOPROGRAMMA

	CUP	Stato attuativo	Iter procedurale											
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Finalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Linea Padova-Vicodardzere: raddoppio ponte sul Brenta	J24D20000010001	Realizzazione	-	-	10-2021	5-2024	-	-	6-2021	10-2022	1-2023	8-2026	2-2026	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede l'elettificazione delle seguenti tratte: Fase 1 a - Conegliano – Vittorio Veneto; Fase 1 b - Castelfranco – Montebelluna e Camposampiero – Cittadella – Bassano. Fase 2 a - Vittorio Veneto – Ponte nelle Alpi – Belluno e opere propedeutiche all'elettificazione della tratta Montebelluna – Belluno; Fase 2 b - Montebelluna – Feltre – Belluno; Fase 2 c - Treviso - Montebelluna .

Nell'ambito del medesimo progetto dovranno essere adeguate le sottostazioni elettriche esistenti (Conegliano Veneto e Castelfranco Veneto) e realizzata ex Novo una sottostazione Elettrica a Bassano del Grappa, Nove, Ponte nella Alpi, Montebelluna , Alano e Sedico inoltre sarà sviluppata la progettazione relativa all'elettificazione della tratta Ponte nelle Alpi – Calalzo di Cadore.

L'intervento interessa le linee, ad oggi non elettrificate, dell'alto Veneto, in particolare, le linee che attraversano a nord le provincie di Padova, Treviso, Vicenza e Belluno. In alcune tratte verranno adeguate le sagome delle gallerie per garantire il franco minimo per realizzare l'elettificazione. L'intervento ha lo scopo di realizzare collegamenti diretti con mezzi elettrici da e per Venezia-Padova verso Bassano, Montebelluna e Belluno

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•Elettificazione anello del bellunese (fasi 1a-1b-2a):Tratta V. Veneto-Ponte nelle Alpi-Belluno: Attivazione conseguita a Maggio 2021

Castelfranco – Montebelluna e Camposampiero – Cittadella – Bassano: Attivazione conseguita nel 2020•Elettificazione anello del bellunese (fasi 2b-2c):Montebelluna – Feltre – Belluno e Treviso - Montebelluna: Sono in corso di realizzazione gli interventi per l' elettificazione.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Gli interventi consentiranno di servire le relazioni con materiale adeguato alla frequentazione con treni diretti evitando così rotture di carico con una contestuale riorganizzazione dei servizi, migliorando altresì la regolarità della circolazione. Fase 1a: consente di servire la relazione Vittorio V. – Venezia senza cambio di treno a Conegliano ed evitare attestamenti a Conegliano e Sacile.Fase 1b: consente l'istituzione di nuovi servizi diretti per Bassano / Montebelluna da Padova e Venezia Fase 2 (anello basso linee bellunese): consentirà di realizzare relazioni dirette tra Belluno e Venezia / Padova, con conseguente riduzione di tempi di viaggio.



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	X
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Veneto

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
Interventi commissariati Accordi internazionali Accordi EE.LL. Fondo Sviluppo e Coesione Accordi EE.LL. Interventi commissariati PNRR	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi internazionali	Alta Velocità (AV)	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Adeguamento a standard tecnici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P125: Elettrificazione linee Veneto

Elettrificazione linee Veneto Fasi: 2a Vittorio Veneto - Ponte nelle Alpi - Belluno e opere propedeutiche Montebelluna-Feltre-Belluno; 2b: Montebelluna-Feltre-Belluno

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
200,00	200,00		152,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
200,00						200,00

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
200,00						200,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Elettrificazione linee Veneto Fasi: 2a Vittorio Veneto - Ponte nelle Alpi - Belluno e opere propedeutiche Montebelluna-Feltre-Belluno; 2b: Montebelluna-Feltre-Belluno	200,00	200,00	0,00	190,22	9,78	181,51	168,47	16,41	33,95	22,46	32,14	30,12	18,01	30,63
	200,00	200,00	0,00	190,22	9,78	181,51	168,47	16,41	33,95	22,46	32,14	30,12	34,30	30,63

CRONOPROGRAMMA

CUP	Stato attuativo	Iter procedurale												
			Prog.Prel.				Prog.Def.				Prog.Esec.			
			Inizio		Fine		Inizio		Fine		Inizio		Fine	
Elettrificazione linee Veneto Fasi: 2a Vittorio Veneto - Ponte nelle Alpi - Belluno e opere propedeutiche Montebelluna-Feltre-Belluno; 2b: Montebelluna-Feltre-Belluno	J14F18000010009 Realizzazione		7-2023	5-2025	10-2018	3-2019	12-2018	3-2023	-	12-2024	9-2018	12-2025	12-2025	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'investimento costituisce il completamento del programma di elettrificazione delle linee in Provincia Autonoma di Trento in continuità con gli interventi di potenziamento già realizzati sulla linea della Valsugana. L'investimento è citato nell'Accordo Quadro sottoscritto in data 09/08/2016 tra Provincia Autonoma di Trento ed RFI ed è stato chiesto dagli Enti Locali in previsione delle Olimpiadi Invernali 2026. Nell'ambito dei finanziamenti attualmente disponibili il progetto prevede:Elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica di tutto il progetto da Trento a Bassano.Realizzazione del SCMT sull'intera linea ed elettrificazione da Trento fino a Borgo Valsugana Est.

Gli interventi prevedono- Realizzazione della linea di contatto per circa 95 km - La realizzazione di 5 SSE con un passo di circa 20 km- Ulteriori adeguamenti tecnologici (DOTE)

L'intervento si sviluppa nell'ambito territoriale della Valsugana nella Provincia Autonoma di Trento

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

ElettrificazioneA Settembre 2022 è stata ultimata la Progettazione Definitiva della tratta prioritaria Trento – Borgo Valsugana Est.In data 01/02/2024 si è concluso l'iter autorizzativo. Ultimata e approvata la progettazione esecutiva, nel mese di gennaio 2025 sono stati consegnati i lavori.SCMTA Luglio 2021 è stata conseguita l'attivazione del SCMT nella tratta Trento – Grigno.A novembre 2023 è stata conseguita l'attivazione della tratta Grigno – Bassano del Grappa.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Il progetto si pone l'obiettivo, a regime, di creare le condizioni per collegamenti diretti tra Trento e Venezia senza rottura di carico.Gli interventi di prima fase ha l'obiettivo di convertire l'attuale servizio a frequenza oraria tra Trento e Borgo Valsugana da trazione termica a trazione elettrica.



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	X
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Trentino Alto Adige

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Elettrificazione Trento-Borgo Valsugana											X				X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Progetto P128: Elettrificazione linea Trento-Bassano 1^ fase

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

Evoluzione coperture finanziarie

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Elettrificazione Trento-Borgo Valsugana	60,00	60,00	0,00	19,76	40,24	47,20	11,54	0,00	0,00	3,46	0,97	1,39	5,00	50,82
	60,00	60,00	0,00	19,76	40,24	47,20	11,54	0,00	0,00	3,46	0,97	1,39	3,35	50,82

CRONOPROGRAMMA

CUP	Stato attuativo	Iter procedurale										
		Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
Elettrificazione Trento-Borgo Valsugana	Realizzazione	9-2020	2-2024	11-2021	2-2024	2-2024	7-2024	-	11-2020	1-2021	12-2025	5-2026

Tabella A05-Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali

Bacini Nord est

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede la realizzazione di una variante di tracciato dell'attuale linea del Brennero realizzata a tre binari in modo da garantire l'ingresso indipendente della linea Meranese, il nuovo tracciato con uno sviluppo complessivo di 1.200 m. Si sviluppa in parte in variante con una galleria di circa 500 m e in parte allo scoperto dove risulta prevalentemente in affiancamento al binario esistente, il progetto comprende oltre alla realizzazione del nuovo tunnel del Virgolo anche lo spostamento del Bivio della linea Meranese a sud dell'attuale posizione in modo da consentire l'accesso al nuovo deposito/officina ferroviario della Struttura Trasporto Alto Adige (SAD) e relativi adeguamenti tecnologici.

L'intervento si trova a sud della stazione di Bolzano: la modifica della radice Sud ricadrà in ambito ferroviario, mentre la nuova galleria in variante rispetto al tracciato attuale al fine di poter inserire il terzo binario indipendente, verrà realizzata sotto la balza rocciosa del monte Virgolo.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

La Conferenza dei Servizi è stata avviata il 30/06/2022 e l'iter autorizzativo si è concluso a maggio 2023. In data 28/06/2023 è stata avviata l'attività negoziale, a Dicembre 2023 è avvenuta l'aggiudicazione. Ultimata la Progettazione Esecutiva, in data 22/11/2024 sono stati consegnati i lavori. Sono in corso le attività progettuali relative agli interventi di adeguamento tecnologico. Per l'Appalto IS-TLC sono in corso le attività propedeutiche per l'avvio dell'attività negoziale.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

L'intervento consentirà di risolvere un principale collo di bottiglia sull'Asse Brennero garantendo un adeguato livello di capacità per lo sviluppo dei traffici regionali e merci attuali e futuri consentendo di incrementare la regolarità della circolazione attraverso una separazione dei flussi tra la linea Meranese e linea Brennero.

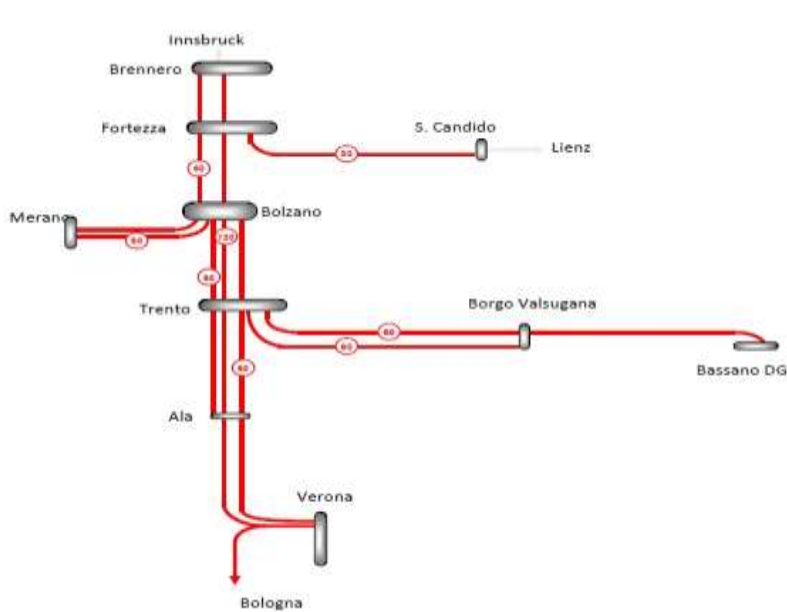

	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Trentino Alto Adige

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EELL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Modifica radice sud di Bolzano e inserimento terzo binario indipendente per linea Bolzano-Merano	X					X	X				X										X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Progetto P136: Linea Bolzano-Merano: Galleria del Virgolo

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
138,50						138,50

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrig	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
138,50						138,50

CRONOPROGRAMMA

	CUP	Stato attuativo	Iter procedurale										
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione	Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
Modifica radice sud di Bolzano e inserimento terzo binario indipendente per linea Bolzano-Merano	J94J17000040001	Realizzazione	6-2018	6-2023	4-2020	6-2023	-	-	6-2023	10-2025	12-2023	11-2027	1-2028

Bacini Nord est

Il progetto nasce con l'obiettivo, manifestato da PAB, di potenziare i servizi regionali sulla relazione Bolzano – Merano tramite raddoppio della linea con la realizzazione di un nuovo binario prevalentemente in affiancamento all'esistente tra le stazioni di Bolzano e Merano ed interventi localizzati di rettifica del tracciato al fine di eliminare i vincoli geometrici che ne limitano ad oggi la velocità di percorrenza. Sono inoltre previsti i seguenti interventi:-Rettifiche localizzate del tracciato Soppressione di tutti i passaggi a livello presenti sulla linea con contestuale ripristino della viabilità interferita.-Spostamento delle stazioni di Settequerce, Terlan e Vilpiano conseguentemente alle modifiche del tracciato.-Impianto multistazione ACCM con ETCS Livello 2 a servizio dell'intera linea (con esclusione dell'impianto di Bolzano), posizionato a Merano e telecomandato dal posto Centrale di Verona.-Modifiche all'assetto funzionale delle rimanenti località di servizio sulla tratta interessata dall'intervento.

attualità dati: 30/06/2025

Incremento di capacità da destinare ai servizi regionali rispettando le previsioni dichiarate in Accordo Quadro sottoscritto con la Provincia Autonoma di Bolzano; Potenziamento delle connessioni nel sistema di trasporto ferroviario della Provincia Autonoma di Bolzano grazie all'attivazione di nuovi servizi che consentiranno l'interscambio da/per Lienz e Malles; Riduzione dei tempi di percorrenza attuali dalla linea Meranese, grazie ai nuovi servizi veloci stimata in circa 15'; Incremento complessivo della regolarità della circolazione.



	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

Trentino Alto Adige

- Allegato MIMS al DEF
- Tavoli tecnici di ascolto
- Altri Provedimenti*
- Cofinanziamenti UE
- UE - workplan corridoì TEN-T
- AQ per l'utilizzo della capacità
- Fondo Sviluppo e Coesione
- Accordi E.E.L.L.
- Accordi Internazionali
- Interventi commissariati
- PNRR
- PNRR

- Coesione sociale e territoriale
- Accessibilità e qualità stazioni
- Resilienza al climate change
- Adeguamento a standard tecnici
- Sviluppo tecnologico
- Sistemi regionali e metropolitani
- Potenziamento connessioni metro
- Sviluppo corridoi TEN-T
- Completamento valichi alpini
- Alta Velocità (AV)

Raddoppio Bolzano-Merano

x

x

X

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P188: Raddoppio Bolzano-Merano

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2		
200,00	4,00	di cui:	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatiIRFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
200,00						200,00

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
4,00						4,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
			Fabbis.											
	Costo	Risorse		Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Bolzano-Merano	200,00	4,00	196,00	186,13	13,87	2,86	0,59	0,00	0,00	0,00	0,34	0,51	5,00	199,08
	200,00	4,00	196,00	186,13	13,87	2,86	0,59	0,00	0,00	0,00	0,34	0,51	0,08	199,08

CRONOPROGRAMMA													

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma prevede il potenziamento tecnologico ed infrastrutturale delle linee interessate dal traffico regionale. Gli interventi infrastrutturali tipicamente prevedono la velocizzazione degli itinerari deviati, le condizioni impiantistiche per la realizzazione dei movimenti contemporanei nelle sedi di incrocio sul semplice binario, la realizzazione di sottopassi e l'adeguamento dei marciapiedi. Dal punto di vista tecnologico generalmente è previsto il rinnovo del sistema di distanziamento, la realizzazione di nuovi apparati ed un nuovo sistema di supervisione e regolazione della circolazione e l'adeguamento dei sistemi di Informazione al Pubblico. E' prevista inoltre l'elettificazione di tratte a trazione diesel i, e interventi diffusi sulla sede e sulla sovrastruttura ferroviaria per omogeneizzare le caratteristiche prestazionali delle linee e gestire obsolescenza e punti singolari. Gli interventi, oltre che da necessità interne legate al miglioramento della gestione della circolazione ferroviaria, derivano dai Tavoli Tecnici di Ascolto che RFI ogni anno organizza con gli stakeholder, da Accordi/Protocolli sottoscritti con gli EE.LL., nonché dagli Accordi Quadro sottoscritti per l'allocazione della capacità.

Le principali realizzazioni riguardano: A) Interventi olimpiadi invernali 2026 - potenziamento stazioni di Belluno, Trento, Feltre, Ponte nelle Alpi e Longarone B) Potenziamento linea Rimini - Ravenna: soppressione di 8 passaggi a livello sulla linea Ravenna-Rimini mediante la realizzazione di opere sostitutive; ripristino del binario di precedenza della stazione di Rimini-Viserba sulla linea Ferrara-Rimini. Gli interventi sono derivanti dal Protocollo di Intesa per il potenziamento del collegamento ferroviario Ravenna - Rimini, sottoscritto tra il MIT, RER e RFI del 3 agosto 2020. C) Elettificazione Casarsa - Portogruaro: La linea ferroviaria a semplice binario Casarsa-Portogruaro, attualmente non elettrificata, in esercizio dal 19 Agosto 1888 ha una lunghezza complessiva di 21,116 km. Si trova al confine tra le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e collega la stazione di Casarsa della Delizia, inserita nella direttrice Udine Venezia, con la stazione di Portogruaro, inserita nella direttrice Venezia Trieste. La linea verrà elettrificata alla tensione nominale di 3 kV cc. Attività correlate all'intervento di elettrificazione sono il rinnovo e il potenziamento della sottostazione elettrica (SSE) di Casarsa e l'adeguamento della SSE di Portogruaro. Inoltre sono previste le indagini finalizzate alla riclassificazione della linea da C3L a D4; D) Elettificazione Cerea-Isola della Scala: l'intervento si inserisce in un più vasto contesto di elettrificazione di molteplici tratte diesel della regione Veneto ed il miglioramento del servizio ferroviario tramite la rimozione dei passaggi a livello esistenti. Attualmente la linea Isola della Scala - Cerea è completamente priva di elettrificazione e si evidenzia come l'unica linea non elettrificata delle tratte afferenti alle stazioni di Isola della Scala e Cerea. E) Elettificazione e potenziamento Vicenza-Schio: l'intervento si inserisce in un più vasto contesto di elettrificazione di molteplici tratte diesel della regione Veneto ed il miglioramento del servizio ferroviario tramite la rimozione dei passaggi a livello esistenti (Protocollo di Intesa per la soppressione passaggi a livello sul territorio della Regione Veneto del 19/09/2017). Attualmente la linea Vicenza - Schio è completamente priva di elettrificazione e si evidenzia come l'unica linea non elettrificata delle tratte afferenti alla stazione di Vicenza. Ulteriori interventi in fase di studio riguardano prime fasi di elettrificazione delle linee Parma-Brescia e la nuova stazione del Basso Garda.

Gli interventi interessano l'intero territorio delle regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna

STATO DI ATTUAZIONE*attualità dati: 30/06/2025*

A) Interventi olimpiadi invernali 2026 - interventi in realizzazione ad eccezione di Longarone ancora in progettazione. B) Potenziamento linea Rimini - Ravenna: Ripristino del binario di precedenza della stazione di Rimini-Viserba: Completato il progetto di fattibilità Tecnico ed Economica; Soppressione di 8 passaggi a livello sulla linea Ravenna-Rimini: PFTE di prima fase concluso. C) Elettificazione Casarsa - Portogruaro: E' stato affidato l'appalto all'Impresa esecutrice, con redazione e validazione del progetto esecutivo per la nuova elettrificazione. Sono state terminate tutte le attività preliminari di rilievo ordigni bellici, geotecniche, sismiche, ecc. Sono state avviate le attività di scavo e costruzioni delle fondazioni dei sostegni a partire dal mese di maggio 2023. Per quanto riguarda la riclassificazione della linea, sono state completate le indagini ed i rilievi, di prossimo avvio le attività. È stata manifestata una richiesta di finanziamenti integrativo di 11 M€ ad oggi non deliberati. D) Elettificazione Cerea-Isola della Scala: A dicembre 2024 è stata ultimata il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica di elettrificazione della linea, nel mese di febbraio 2025 è stata ultimata la verifica e la revisione degli elaborati da sottoporre a iter autorizzativo. È in corso di definizione con gli EE.LL. la soluzione per sopprimere i 7 PL rientranti nel perimetro dell'intervento. E) Elettificazione e potenziamento Vicenza-Schio: A novembre 2024 è stata effettuata una prima consegna del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'elettificazione della linea, nel mese di dicembre 2024 è stata ultimata la verifica e la revisione degli elaborati da sottoporre a iter autorizzativo. È in corso di definizione con gli EE.LL. la soluzione per sopprimere i 19 PL rientranti nel perimetro dell'intervento.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Sviluppo del traffico Regionale e Metropolitano, Efficientamento e potenziamento tecnologico delle infrastrutture Interventi olimpiadi invernali 2026 - Regione Veneto: Incremento dell'accessibilità al servizio ferroviario e sfruttamento sinergia ferro/gomma attraverso la riqualificazione della stazione e degli spazi antistanti; Incroci contemporanei dei treni nelle stazioni con minore perdita tempo Potenziamento Ravenna-Rimini: Aumento delle prestazioni della linea Ferrara-Rimini attraverso la possibilità di effettuare incroci nella stazione di Rimini Viserba. Elettificazione Casarsa-Portogruaro-Incremento della regolarità, grazie alla possibilità di utilizzare materiali rotabili più performanti; Possibilità di integrare i servizi regionali; Riduzione dell'inquinamento ambientale e di emissioni. Riqualificazione stazione di Trento, riattivazione fermata di Calliano e altri interventi PA Trento Nuova fermata di Calliano: miglioramento del sistema complessivo di accessibilità alla Stazione; Miglioramento dei collegamenti pubblici e rinnovo della funzione di Stazione. Stazione Trento: Miglioramento del livello di connettività e del sistema complessivo di accessibilità alla stazione, Riqualificazione e restauro del Fabbicato viaggiatori e delle pensiline storiche e manutenzione e Adeguamento infrastrutturale della stazione Ferrovia turistica Sacile - Gemona: salvaguardia e valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico in coerenza con quanto previsto nel piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, esercizio della tratta, eliminazione rallentamenti lungo tratta Elettificazione Cerea-Isola della Scala: l'elettificazione della tratta comporterebbe numerosi vantaggi in

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P199: Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord est

termini di collegamenti viaggiatori sulla relazione Isola della Scala - Cerea derivanti dall'utilizzo di convogli elettrici: Miglioramento della regolarità grazie all'efficientamento della località di Bovolone per i collegamenti fra Verona e Legnago grazie alle caratteristiche prestazionali superiori dei convogli elettrici; Riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico, sia in linea che nelle stazioni, ed alimentazione dei convogli con energia proveniente da fonti rinnovabili.



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	X
	Gestione spazi di stazione	X
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	X
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Veneto
Trentino Alto Adige
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica								Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EELL	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Allegato MIMS al DEF	Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni
Upgrading linee PA Trento - riqualificazione stazione di Trento, riattivazione fermata Calliano e altri interventi	X		X								X	Resilienza al climate change	Adeguamento a standard tecnici
Piano Olimpiadi - interventi regione Veneto	X		X								X	Sviluppo tecnologico	Sistemi regionali e metropolitani
Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord est - interventi diffusi			X	X							X	Potenziamento connessioni merci	Sviluppo corridoi TEN-T
Upgrading linee Friuli Venezia Giulia (comprende riattivazione Sacile-Maniago)			X								X	Completamento valichi alpini	Alta Velocità (AV)
Potenziamento linea Ravenna - Rimini (progettazione)			X								X		
Nuove stazioni Area nord-est			X								X		
Elettrificazione Casarsa-Portogruaro			X								X		
Elettrificazione e potenziamento Cerea-Isola della Scala			X								X		

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
1.145,70	362,16	di cui: 326,58	18,77	1,50	0,00	0,00	15,31		0,00	90,16	693,37

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P199: Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord est

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
1.153,94	-8,24					1.145,70
Variazione del costo dovuta allo spostamento in tabella C dei progetti ultimiati.						

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
374,99	-8,24		-7,82	3,24		362,16
Copertura con risorse proprie della Società per interventi non rientranti nel Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria; riduzione delle risorse Olimpiadi 2024						

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Piano Olimpiadi - interventi regione Veneto	35,79	35,79	0,00	33,14	2,65	14,51	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	5,00	33,75
Elettrificazione Casarsa-Portogruaro	25,70	25,70	0,00	23,70	2,00	18,95	12,31	0,00	0,00	0,00	0,21	5,65	5,00	14,16
Upgrading linee PA Trento - riqualificazione stazione di Trento, riattivazione fermata Calliano e altri interventi	43,51	43,51	0,00	41,95	1,56	30,72	9,65	0,00	0,00	0,09	0,00	1,95	5,00	34,07
Potenziamento linea Ravenna - Rimini (progettazione)	1,00	1,00	0,00	0,01	0,99	0,12	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,96
Upgrading linee Friuli Venezia Giulia (comprende riattivazione Sacile-Maniago)	75,20	75,20	0,00	72,00	3,20	70,71	65,97	18,14	2,84	28,91	11,19	3,26	14,71	8,79
Nuove stazioni Area nord-est	6,00	6,00	0,00	5,86	0,14	1,13	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,15
Elettrificazione e potenziamento Cerea-Isola della Scala	48,00	2,00	46,00	44,72	3,28	1,81	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	47,67
Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord est - interventi diffusi	910,51	172,97	737,54	96,85	813,66	101,00	93,15	49,61	5,39	7,58	20,33	6,42	8,82	817,58
	1.145,70	362,16	783,54	318,23	827,47	238,94	183,62	67,74	8,23	36,58	31,73	17,66	21,63	962,13

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Piano stazioni Olimpiche Regione Veneto	J17B20000640001	14,48	14,48	100%	2,76	19%	Realizzazione
Interventi nella stazione di Longarone	J57B20000230008	12,09	12,09	100%	0,71	6%	Realizzazione
Interventi nella stazione di Ponte nelle Alpi	J17B20000630001	6,24	6,24	100%	0,09	1%	Progettazione
Stazioni Olimpiche Regione Veneto - Feltre	C97D20000080001	2,98	2,98	100%	0,40	13%	Realizzazione
Piano Olimpiadi - interventi regione Veneto		35,79	35,79	100%	3,95	11%	
Potenziamento ed elettrificazione Casarsa - Portogruaro	J34E21001350001	25,70	25,70	100%	13,46	52%	Realizzazione
Elettrificazione Casarsa-Portogruaro		25,70	25,70	100%	13,46	52%	
Riqualificazione stazione di Trento	C66J20000210001	31,54	31,54	100%	11,45	36%	Realizzazione
Riattivazione fermata di Calliano	J77B20000870002	6,51	6,51	100%	6,36	98%	In ultimazione
Realizzazione della nuova fermata di San Giacomo di Laives (BZ) sulla linea ferroviaria Verona - Brennero	J91G23000000001	5,45	5,45	100%	0,02	0%	Progettazione
Upgrading linee PA Trento - riqualificazione stazione di Trento, riattivazione fermata Calliano e altri interventi		43,51	43,51	100%	17,83	41%	
Progettazione potenziamento della tratta Ravenna - Rimini	J44E21002870008	1,00	1,00	100%	0,04	4%	Realizzazione
Potenziamento linea Ravenna - Rimini (progettazione)		1,00	1,00	100%	0,04	4%	
Elettrificazione e potenziamento Cerea - Isola della Scala	J14J23001050001	48,00	2,00	4%	0,33	17%	Progettazione
Elettrificazione e potenziamento Cerea-Isola della Scala		48,00	2,00	4%	0,33	17%	
Realizzazione di nuove LdS e modifica di quelle esistenti Area Nord-Est	J34J23000610001	4,50	4,50	100%	0,00	0%	Progettazione
Fermata AV Basso Garda	J41G23000030001	1,50	1,50	100%	0,85	57%	Realizzazione
Nuove stazioni Area nord-est		6,00	6,00	100%	0,85	14%	
Interventi diffusi sulla linee d'interesse della regione Friuli Venezia Giulia	J24H17000530001	75,20	75,20	100%	67,37	90%	Realizzazione
Upgrading linee Friuli Venezia Giulia (comprende riattivazione Sacile-Maniago)		75,20	75,20	100%	67,37	90%	
Upgrading bacini nord est		795,79	58,33	7%	0,00	0%	Progettazione

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025**Programma P199: Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord est**

Interventi di upgrade tecnologico e prestazionale - VE	J14C20001960001	43,71	43,71	100%	36,00	82%	Realizzazione
Completamento SCC Area Veneta	J27I10000020001	21,90	21,90	100%	21,32	97%	In ultimazione
VR - Interventi diffusi di potenziamento tecnologico ed infrastrutturale linee regionali	J96J17000450001	21,08	21,08	100%	18,28	87%	Realizzazione
Linea Rimini-Ravenna efficientamento itinerario	J81J03000010001	16,00	16,00	100%	14,80	92%	In ultimazione
Interventi upgrading della rete viaggiatori - VE	J37H21004420001	4,75	4,75	100%	3,12	66%	Realizzazione
Elettrificazione e potenziamento Vicenza - Schio	J14J23001040001	3,50	3,50	100%	0,30	9%	Realizzazione
BO - Interventi diffusi di potenziamento tecnologico ed infrastrutturale linee regionali	J86J17000450001	3,20	3,20	100%	2,99	94%	In ultimazione
PRG di Peschiera del Garda	J74J22000540001	0,50	0,50	100%	0,00	0%	Progettazione
Interventi upgrading della rete viaggiatori - VE	J37F19000030001	0,08	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini nord est - interventi diffusi		910,51	172,97	19%	96,82	56%	

Progetto 0290: Nuova linea Passo Corese-Rieti

Bacini Centro

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova linea a semplice binario elettrificato, della lunghezza di circa 49 km dalla stazione di Fara Sabina, sulla linea Roma - Chiusi, alla stazione di Rieti della linea Terni – Sulmona con l'obiettivo di incrementare l'accessibilità all'infrastruttura ferroviaria nazionale e rendere competitivo il trasporto su ferro rispetto a quello su gomma, che attualmente costituisce l'unica modalità disponibile per il collegamento tra Rieti e Roma. L'intervento prevede una nuova località di servizio viaggiatori, «Osteria Nuova» e 3 posti di movimento intermedi.

attualità dati: 30/06/2025

Il nuovo collegamento Passo Corese – Rieti consentirà il potenziamento dell'accessibilità al servizio ferroviario del bacino reatino, e sarà specializzato per il trasporto viaggiatori di tipo regionale, creando un'alternativa competitiva al mezzo su gomma che attualmente costituisce la modalità prevalente per il collegamento tra Rieti e Roma. L'opera si pone come funzionale in ottica di sostenibilità ambientale, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2, rispetto agli attuali collegamenti diretti tra Roma e Rieti realizzati con materiali a trazione diesel, e un relativo minore impatto ambientale a livello locale con un notevole beneficio sociale in termine di riduzione dei costi esterni del sistema di trasporto ferroviario.



	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

Lazio

Coesione sociale e territoriale
Accessibilità e qualità stazioni
Resilienza al climate change
Adeguamento a standard tecnici
Sviluppo tecnologico
Sistemi regionali e metropolitani
Potenziamento connessioni merci
Sviluppo corridoi TEN-T
Completamento valichi alpini
Alta Velocità (AV)

Allegato MIMS al DEF
Tavoli tecnici di ascolto
Altri Provvedimenti*
Cofinanziamenti UE
UE - workplan corridoi TEN-T
AQ per l'utilizzo della capacità
Fondo Sviluppo e Coesione
Accordi EE.LL.
Accordi Internazionali
Interventi commissariati
PNRR

Nuova linea Passo Corese-Rieti

X

X

Progetto 0290: Nuova linea Passo Corese-Rieti

milioni di euro

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

Variazione del costo dovuta ad un adeguamento degli importi di progettazione ad esito della revisione del quadro economico e ad un maggior valore delle opere, ad esito del PFTE, per recepire le nuove normative, le varianti di tracciato e l'aggiornamento del quadro alle nuove tariffe.

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Nuova linea Passo Corese-Rieti	3.124,82	44,39	3.080,44	1.475,20	1.649,63	14,19	12,60	4,36	0,00	0,00	0,00	2,25	5,00	3.112,15
	3.124,82	44,39	3.080,44	1.475,20	1.649,63	14,19	12,60	4,36	0,00	0,00	0,00	2,25	6,06	3.112,15

CUP	Stato attuativo	Iter procedurale											
		Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Nuova linea Passo Corese-Rieti	J31H96000000031	Progettazione	1-2023	3-2032	3-2005	3-2006	-	-	4-2027	2-2028	2-2028	11-2035	12-2035

Progetto 0334: Potenziamento Foligno-Perugia-Terontola 1° stralcio

Bacini Centro

attualità dati: 30/06/2025

Consolidamento sede tratta Foligno-Assisi, velocizzazione
tratta Perugia Ponte San Giovanni - Foligno e nuova fermata
Perugia aeroporto

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0334: Potenziamento Foligno-Perugia-Terontola 1° stralcio

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
135,95	53,13	di cui:	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
135,95						135,95

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
53,13						53,13

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV				Produzione				
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Consolidamento sede tratta Foligno-Assisi, velocizzazione tratta Perugia Ponte San Giovanni - Foligno e nuova fermata Perugia aeroporto	135,95	53,13	82,82	74,09	61,86	13,17	12,84	5,92	0,73	0,10	4,22	1,86	5,22	123,01
	135,95	53,13	82,82	74,09	61,86	13,17	12,84	5,92	0,73	0,10	4,22	1,86	0,10	123,01

CRONOPROGRAMMA

	CUP		Stato attuativo				Iter procedurale							
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Consolidamento sede tratta Foligno-Assisi, velocizzazione tratta Perugia Ponte San Giovanni - Foligno e nuova fermata Perugia aeroporto	J47109000040009	Realizzazione	10-2011	8-2026	1-2019	8-2026	3-2027	9-2027	9-2026	2-2027	5-2022	3-2029	9-2028	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede il rinnovo del binario in alcune tratte della linea, il consolidamento del rilevato nella tratta Foligno - Assisi, nonché la realizzazione della nuova fermata “Perugia Capitini”, oltre alla realizzazione del nuovo PRG e della sottostazione elettrica di Perugia Ponte S. Giovanni.

Intervento 1 – Rinnovo binario in tratti saltuari della linea nonché consolidamento rilevato nella tratta Foligno AssisiIntervento 2 - Realizzazione nuova fermata di Perugia CapitiniIntervento 3 - Messa a piano regolatore e rinnovo SSE della stazione di Perugia P.S.G. (escluso ACC che verrà realizzato su un progetto dedicato specificatamente alle tecnologie).

Umbria

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Intervento 1Attività completate e messe in esercizioIntervento 2Attività completate e messe in esercizio Intervento 3 e 4Le attività sono state avviate e si è previsto il finanziamento integrativo su altro progetto.Si prevedono i seguenti interventi: luglio 2022 riattivazione binario 3 con nuovo marciapiede H55 e scale già in servizio (ascensore in fase di realizzazione).Settembre 2022 riattivazione radice lato Umbertide con modifiche al piano del ferro;Dicembre 2023 attivazione nuovo apparato centrale computerizzato .Dicembre 2024 completamento vari deviatoi e adeguamenti trazione elettrica,Dicembre 2024 attivazione piano regolatore generale di stazione

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Creare le condizioni per un potenziamento dell'offerta commerciale viaggiatori, miglioramento nella gestione della circolazione, dei livelli di accessibilità, regolarità e customer satisfaction



	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Umbria

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani
PRG Perugia S. Giovanni 1^ fase, Velocizzazione Perugia Pontivegge, nuova fermata Perugia Capitini e miglioramenti infrastrutturali tratte varie								X							X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Progetto 0810: Velocizzazione Foligno-Perugia-Terontola

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
35,99						35,99

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrig	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
35,99						35,99

CRONOPROGRAMMA

CUP	Stato attuativo				Iter procedurale								
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
PRG Perugia S. Giovanni 1^ fase, Velocizzazione Perugia Pontivegge, nuova fermata Perugia Capitini e miglioramenti infrastrutturali tratte varie	J11H990000000001	Esercizio	-	-	-	6-2005	-	-	10-2011	11-2013	2-2001	6-2015	6-2025

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede il raddoppio selettivo della linea regionale Firenze – Lucca, il potenziamento tecnologico e infrastrutturale delle tratte non oggetto di raddoppio e la realizzazione di opere sostitutive per l'eliminazione dei passaggi a livello.

L'intervento è articolato nei seguenti lotti funzionali: - Raddoppio tratta Pistoia - Montecatini Terme, mediante la realizzazione di una nuova galleria a doppio binario denominata "Serravalle", la trasformazione in fermata di Serravalle e l'adeguamento del piano del ferro delle stazioni di Pistoia e Montecatini T. - Upgrading infrastrutturale e tecnologico tratta Montecatini-Pescia. Viste le difficoltà in ambito Montecatini, al momento si è concordato di procedere al potenziamento della tratta storica a semplice binario Montecatini – Pescia in luogo del previsto raddoppio; in questo nuovo assetto l'impianto di Borgo a Buggiano permane con funzionalità di stazione.- Raddoppio tratta Pescia– Lucca in totale affiancamento, con trasformazione in fermata delle stazioni di Montecarlo e Tassignano.

Il Progetto di potenziamento ferroviario della linea Pistoia-Lucca si sviluppa interamente in regione Toscana, province di Pistoia e Lucca, comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese, Pieve a Nievole, Montecatini Terme, Massa e Cozzile, Buggiano, Uggiano, Pescia, Montecarlo, Altopascio, Porcari, Capannori e Lucca. L'intervento di raddoppio si sviluppa in affiancamento alla linea storica esistente, ad esclusione di un breve tratto di circa 2 km. in variante di tracciato rispetto alla linea esistente nel tratto coincidente con la costruzione della nuova galleria "Serravalle"; proprio la galleria è l'opera di maggior rilevanza dell'intero progetto che presenta anche significative opere per l'attraversamento del fiume Ombrone e dei torrenti Stella, Mandrione e Pescia. dal punto di vista orografico si tratta di un territorio pianeggiante (ad esclusione del sopracitato tratto della galleria Serravalle), posto in area centrale della Toscana, fortemente antropizzato con una sostanziale continuità di fabbricati e centri abitati che si sviluppano lungo l'intero tracciato oggetto dell'intervento di potenziamento; in ragione di ciò molte sono anche le interferenze con l'attuale viabilità stradale regolate da Passaggi a Livello elettrici: il progetto prevede la completa eliminazione di tutti i Passaggi a Livello posti sul tratto ferroviario oggetto di raddoppio (n. 19 PL) attraverso la realizzazione di nuove opere sostitutive (sovra o sottopassaggi stradali) ed interventi di "ricucitura" delle viabilità esistenti.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Tratta Pistoia-Montecatini: nel mese di novembre 2023 sono state completate le attività di scavo della galleria Serravalle; i lavori al momento sono concentrati sull'attività di attrezzaggio della galleria e del cunicolo di esodo, mentre proseguono sull'intera tratta di raddoppio le attività relative all'attrezzaggio tecnologico. Tratta Montecatini-Pescia: sono stati ultimati gli interventi di upgrading tecnologico ed infrastrutturale, sull'attuale linea in esercizio; Interventi puntuali Montecatini: è in fase di avvio lo sviluppo del Progetto Esecutivo per l'adeguamento di alcune opere d'arte presenti sul territorio. Tratta Pescia-Lucca: l'iter autorizzativo in corso (espletato parere CSLLPP; e non assoggettabilità VIA); sono in corso gli approfondimenti progettuali per avviare l'iter integrativo di assoggettabilità a VIA per opere puntuali.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Incremento della capacità della linea (da 4 treni/h nei due sensi di marcia a 10 treni/h sulle tratte oggetto di raddoppio); - maggiore regolarità d'esercizio ferroviario; - possibilità di sosta materiali/attestamento sui nuovi binari tronchi della stazione di Montecatini T. dei servizi da/per Firenze SMN.



	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	X
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Toscana

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Progetto 1346: Potenziamento linea Pistoia-Lucca

Coesione sociale e territoriale						
Accessibilità e qualità stazioni						
Resilienza al climate change						
Adeguamento a standard tecnici						
Sviluppo tecnologico						
Sistemi regionali e metropolitani						
Potenziamento connessioni merci						
Sviluppo corridoi TEN-T						
Completamento valichi alpini						
Alta Velocità (AV)						
Allegato MIMS al DEF						
Tavoli tecnici di ascolto						
Altri Provedimenti*						
Cofinanziamenti UE						
UE - workplan corridoi TEN-T						
AQ per l'utilizzo della capacità						
Fondo Sviluppo e Coesione						
Accordi EE.LL.						
Accordi Internazionali						
Interventi commissariati						
PNRR						
Intervento / Opere funzionali						
Raddoppio Pistoia-Montecatini						
Upgrading Montecatini-Pescia						
Raddoppio Pescia-Lucca						

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve	Priorità 1	Priorità 2	
752,10	364,12	di cui:	115,15	206,90	0,00	7,07	0,00	35,00	0,00	0,00	387,99

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
750,10			2,00			752,10

Variazione del costo ad esito della Progettazione Esecutiva.

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrig	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
362,12				2,00		364,12

Copertura appalto in corso per maggiori costi emersi ad esito della PE

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Altres
Raddoppio Pistoia-Montecatini	337,12	337,12	0,00	305,66	31,46	316,88	293,63	146,01	21,53	24,80	32,92	33,85	44,21	45,21
Upgrading Montecatini-Pescia	23,50	23,50	0,00	22,26	1,24	5,09	5,07	0,00	0,30	1,09	3,16	0,00	5,00	18,42
Raddoppio Pescia-Lucca	391,49	3,50	387,98	376,41	15,08	2,04	0,84	0,74	0,05	0,00	0,00	0,00	5,39	390,50
	752,10	364,12	387,99	704,33	47,77	324,01	299,54	146,76	21,89	25,89	36,08	33,85	33,50	454,14

CRONOPROGRAMMA

	CUP		Stato attuativo		Iter procedurale								
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
Raddoppio Pistoia-Montecatini	J91H03000190001	Realizzazione	1-2003	12-2009	1-2010	11-2010	-	-	-	2-2018	8-2015	9-2025	9-2025
Upgrading Montecatini-Pescia	J91H03000190001	Esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	12-2018	9-2022	9-2022
Raddoppio Pescia-Lucca	J91H03000190001	Iter autorizzativo	-	-	3-2016	5-2026	-	-	5-2026	2-2027	2-2027	10-2031	3-2032

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto mira alla razionalizzazione dei servizi regionali nell'ambito del territorio della regione Toscana, migliorando i collegamenti tra il capoluogo di regione ed il territorio della Val d'Elsa fino a Siena.

Il progetto è articolato nei seguenti macro-interventi:- raddoppio Empoli-Granaiole per un'estesa di circa 10 km, mantenendosi pressoché in sede, in affiancamento al binario esistente. Sono previste piccole rettifiche al tracciato esistente in corrispondenza delle attuali curve sottodimensionate per le caratteristiche prestazionali attese. Nell'ambito dell'intervento sono previsti: la realizzazione dell'ACC di Empoli e di Granaiole sul PRG attuale; la trasformazione in fermata di Ponte a Elsa con sottopasso e marciapiede a standard (H 55 cm; L 250 m) e l'eliminazione di 11 passaggi a livello.- elettrificazione della linea Empoli-Siena.È inoltre previsto l'adeguamento del VI binario a modulo 750 m della Stazione di Empoli.

L'intervento di raddoppio ferroviario della tratta Empoli-Granaiole si sviluppa per tutta la sua lunghezza in Regione Toscana, nel Comune di Empoli; all'estremità sud dell'intervento, soltanto un breve tratto di una nuova viabilità, ricade nel comune di Castelfiorentino; tutte le aree interessate dall'intervento ricadono all'interno dei limiti della Città Metropolitana di Firenze. Le principali infrastrutture di trasporto presenti nell'area di studio sono la Superstrada FI-LI-PI e la SRT 429 (in corso di realizzazione), i cui tracciati interferiscono con la tratta ferroviaria in esame; il progetto prevede inoltre la soppressione di tutti i 13 Passaggi a Livello presenti nel tratto in questione (di cui 3 a cura di altri appalti relativi alla realizzazione della variante alla SRT 429), con interventi di "ricucitura" delle viabilità esistenti.Dal punto di vista orografico il progetto si sviluppa in territorio di pianura intravalliva, a quote comprese tra 25 e 45 m s.l.m.; morfologicamente l'area si caratterizza per la presenza di settori pianeggianti o sub-pianeggianti riconducibili alle piane alluvionali del Fiume Elsa e del Fiume Arno, che rappresentano i principali corsi d'acqua che interessano il territorio; benché non siano previsti attraversamenti sul Fiume Elsa, in quanto la tratta ferroviaria in progetto si sviluppa in affiancamento al corso d'acqua principale, sono tuttavia presenti opere di attraversamento minori sui corsi d'acqua secondari che interferiscono con la linea ferroviaria in esame.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•Raddoppio Empoli-Granaiole:L'appalto è stato aggiudicato nel mese di marzo 2023. E' in corso la progettazione esecutiva e le relative verifiche, a valle della quale si darà avvio alla fase realizzativa. Sono state avviate nel frattempo le attività propedeutiche di bonifica ordigni esplosivi sul sedime dell'intervento.A settembre 2024 è stato attivato l'ACC di Empoli.L'attivazione del VI binario è prevista contestualmente all'attivazione dell'assetto finale della stazione di Empoli.•Elettrificazione Empoli-Siena:La progettazione definitiva ha ottenuto parere favorevole del CSLPP, si è concluso sia l'iter di autorizzazione ambientale con l'emissione da parte della Regione Toscana del Decreto di Esclusione alla VIA sia di autorizzazione archeologica con le Soprintendenze di Firenze e Siena.Il Commissario a settembre 2024 ha avviato l'iter per l'approvazione del progetto di elettrificazione tutt'ora in corso; tuttavia, tenuto conto dell'impatto delle prescrizioni impartite nel corso dell'iter ambientale è stato avviato un tavolo di confronto con gli Enti

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Incremento della capacità della linea (da 4 treni/h nei due sensi di marcia a 10 treni/h sulle tratte oggetto di raddoppio), con conseguente possibilità di istituire nuovi servizi, come da AQ RFI – Regione Toscana.- Maggiore regolarità d'esercizio ferroviario tra Empoli e Siena.- Sostenibilità ambientale.

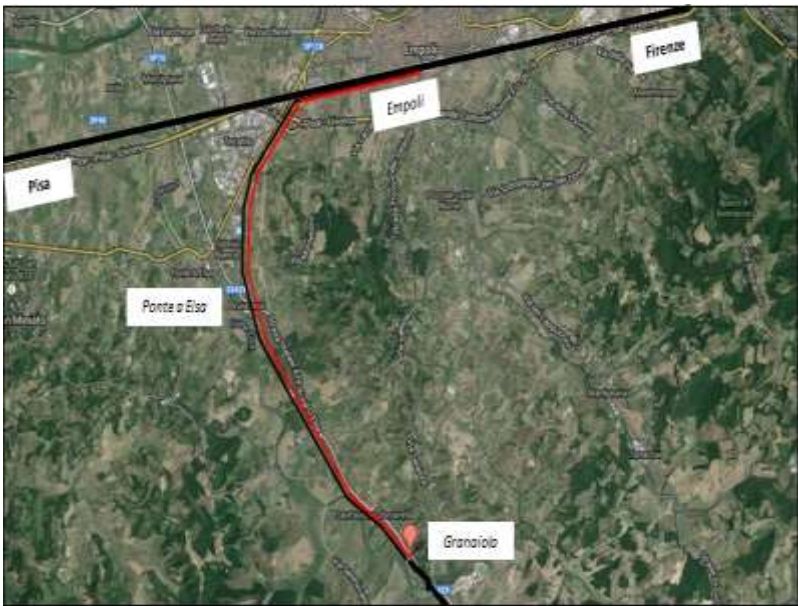

	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Toscana

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica	Obiettivi strategici
------------------------	----------------------

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P101: Potenziamento linea Empoli-Siena

	PNRR	Interventi commissariati	Accordi internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																					
Raddoppio Empoli-Granaioolo		X			X	X															
Elettrificazione linea Empoli-Siena		X			X	X															

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2		
353,71	353,71		268,71	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE										milioni di euro
Evoluzione Costo										
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025				
348,71			5,00			353,71	Variazione di costo è dovuta all'aggiornamento del quadro economico ad esito della PFTE.			
Evoluzione coperture finanziarie										
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025				
348,71				5,00		353,71	Copertura appalto in corso per maggiori costi emersi ad esito della PE			

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Empoli-Granaioolo	234,71	234,71	0,00	197,94	36,77	198,21	21,64	2,22	-0,08	6,41	4,37	3,52	6,33	209,45
Elettrificazione linea Empoli-Siena	119,00	119,00	0,00	111,43	7,57	3,22	2,50	2,24	0,03	0,01	0,02	0,44	6,16	116,25
	353,71	353,71	0,00	309,37	44,34	201,43	24,14	4,46	-0,04	6,42	4,39	3,97	8,83	325,70

CRONOPROGRAMMA														
			Stato attuativo				Iter procedurale							
	CUP													
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Raddoppio Empoli-Granaioolo	J54H17000300001	Realizzazione	-	-	2-2018	9-2022	-	-	12-2022	10-2023	3-2025	11-2028	4-2029	
Elettrificazione linea Empoli-Siena	J54H17000300001	Iter autorizzativo	-	-	9-2018	4-2025	-	-	5-2025	1-2026	1-2026	11-2028	4-2029	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento di elettrificazione della linea Civitanova-Albacina previsto nell'Accordo Quadro siglato nel 2016 tra Regione Marche e RFI trova in parte finanziamento nel programma "FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) 2014-2020. Cabina di Regia" approvato dal CIPE con delibera 54/2016.

Fase 1° - Adeguamento a sagoma delle gallerie della linea in modo tale da renderle compatibili con l'elettrificazione, velocizzazioni puntuali di tratte di linea, velocizzazione degli itinerari di stazione a 60 km/h e realizzazione delle condizioni per consentire la contemporaneità degli ingressi dai due lati di stazione, realizzazione di sottopassi e adeguamento marciapiedi (H55 e standard ipovedenti), soppressione di PL privati/pubblici, con la realizzazione di alcune opere sostitutive, realizzazione di impianto SCMT in luogo dell'attuale SSC. attivazione nuovo sistema ACCM e nuovo sistema di distanziamento basato su ERTMS. Fase 2° - Adeguamento a sagoma delle gallerie non già realizzato nella prima fase, elettrificazione della linea e realizzazione delle necessarie sottostazioni elettriche di alimentazione.

Marche

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Fase 1° - Sono in parte ultimati e in parte in corso di esecuzione gli interventi di adeguamento sede ferroviaria e sagoma delle gallerie, realizzazione sottopassi e adeguamento marciapiedi in stazione, realizzazione di fabbricati tecnologici per ACC, realizzazione opere sostitutive per soppressione PL privati. Completato l'attrezzaggio della linea con SCMT e l'attivazione degli impianti ACC di tutte le stazioni. Fase 2° (Fondi PNRR) - Per i lavori trazione elettrica e sottostazione elettrica/cabine sono stati stipulati atti contrattuali e consegnate le prestazioni progettuali. Avviata la fase realizzativa trazione elettrica a ottobre 2023 e SSE ad aprile 2024. Per la velocizzazione degli itinerari di stazione e dei relativi interventi di adeguamento sede, di realizzazione sottopassi ed adeguamento marciapiedi, il progetto definitivo è stato verificato e validato. Già realizzati i piano regolatore generale delle stazioni di Montecosaro, Morrovalle e Tolentino e Corridonia; mentre il piano regolatore generale di Macerata della linea Civitanova Marche - Albacina è stato realizzato per la parte Armamento e Segnalamento, sono state completate anche le Opere Civili nel 2024. Iniziate le opere alle SSE di Urbisaglia e Montecosaro e alle cabine TE di Albacina-Civitanova.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

L'intervento permetterà di offrire non solo un servizio cadenzato con materiale elettrico, già previsto in Accordo Quadro, sui collegamenti Ancona - Macerata e Ancona - Fabriano ma di ottenere velocizzazioni puntuali di tratte di linea, velocizzazione degli itinerari di stazione a 60 km/h e movimenti contemporanei.



	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Marche

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P147: Elettrificazione Civitanova-Macerata-Albacina

	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR		Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change	Adeguamento a standard tecnici	Sviluppo tecnologico	Sistemi regionali e metropolitani	Potenziamento connessioni merci	Sviluppo corridoi TEN-T	Completamento valichi alpini	Alta Velocità (AV)
Intervento / Opere funzionali																						
Elettrificazione Civitanova-Macerata-Albacina	X					X	X				X							X				

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatiche di breve				
								Priorità 1	Priorità 2			
160,15	160,15	di cui:	96,50	0,15	39,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE										milioni di euro
Evoluzione Costo										
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025				
160,00				0,15		160,15	Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari			
Evoluzione coperture finanziarie										
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025				
160,00				0,15		160,15	Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)			

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Elettrificazione Civitanova-Macerata-Albacina	160,15	160,15	0,00	120,45	39,70	123,57	85,54	20,94	11,34	3,84	6,20	13,23	22,53	75,44
	160,15	160,15	0,00	120,45	39,70	123,57	85,54	20,94	11,34	3,84	6,20	13,23	29,15	75,44

CRONOPROGRAMMA														
Stato attuativo					Iter procedurale									
CUP					Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione	
					Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine
Elettrificazione Civitanova-Macerata-Albacina					J94J18000010001	Realizzazione	-	-	-	-	7-2020	10-2026	4-2018	3-2026

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma prevede il potenziamento tecnologico ed infrastrutturale delle linee interessate dal traffico regionale. Gli interventi infrastrutturali tipicamente prevedono la velocizzazione degli itinerari deviati, le condizioni impiantistiche per la realizzazione dei movimenti contemporanei nelle sedi di incrocio sul semplice binario, la realizzazione di sottopassi e l'adeguamento dei marciapiedi. Dal punto di vista tecnologico generalmente è previsto il rinnovo del sistema di distanziamento, la realizzazione di nuovi apparati ed un nuovo sistema di supervisione e regolazione della circolazione e l'adeguamento dei sistemi di Informazione al Pubblico. E' prevista inoltre l'elettificazione di tratte a trazione diesel i, e interventi diffusi sulla sede e sulla sovrastruttura ferroviaria per omogeneizzare le caratteristiche prestazionali delle linee e gestire obsolescenza e punti singolari. Gli interventi, oltre che da necessità interne legate al miglioramento della gestione della circolazione ferroviaria, derivano dai Tavoli Tecnici di Ascolto che RFI ogni anno organizza con gli stakeholder, da Accordi/Protocolli sottoscritti con gli EE.LL., nonché dagli Accordi Quadro sottoscritti per l'allocazione della capacità.

Le principali realizzazioni riguardano: A) Potenziamento linee Faentina e Valdisieve: Interventi, finalizzati al miglioramento delle prestazioni della linea ferroviaria, in termini di sicurezza, capacità e puntualità, oggetto di un Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 4 dicembre 2017 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Toscana, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., A.N.A.S. S.p.A., Unione Montana dei Comuni del Mugello, Unione dei Comuni di Valdarno e Val di Sieve, Comune di Borgo S. Lorenzo, Comune di Scarperia e San Piero, Comune di Vicchio, Comune di Marradi, Comune di Pontassieve, Comune di Dicomano e Comune di Rufina. Sono stati individuati interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico e di soppressione passaggi a livello con lo scopo di conferire maggiore capacità alle linee ferroviarie in parola. B) Terzo binario Pescara C.le - Pescara Porta Nuova: nuovo collegamento, di estesa pari a circa 1 km, volto a rendere indipendenti i collegamenti Pescara - Sulmona/L'Aquila dai traffici insistenti lungo la Linea Adriatica C) Nuove Stazioni area centro: progettazione nuova fermata Tolentino campus, a servizio dell'area residenziale sorta all'indomani del terremoto del 2016 e progettazione miglioramento accessibilità fermata Fiera di Roma. Ulteriori interventi riguardano il potenziamento dell'impianto di Spoleto.

Gli interventi interessano l'intero territorio delle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio

STATO DI ATTUAZIONE*attualità dati: 30/06/2025*

A) Potenziamento linee Faentina e Valdisieve: Si tratta di interventi diffusi sulle linee per la soppressione di 7 PL mediante opere sostitutive o ricuciture di viabilità esistenti oltre ad interventi di riqualificazione delle stazioni con miglioramento dell'accessibilità e fruibilità degli impianti stessi. Di seguito è riportato lo stato di avanzamento delle attività: • Stazione di Vicchio, PL km 6 : Iter autorizzativo in corso confronto con gli Enti per l'individuazione di soluzioni progettuali; • PL Km 25: avviato studio progettuale di nuova soluzione condivisa con amministrazione comunale; • Stazione di Rufina: Progettazione esecutiva in corso; • Stazione di Contea-Londa e di soppressione dei PL 17 e 39 è in corso la fase realizzativa; • le opere per la soppressione PL km 24 e 38 sono di prossimo avvio; • le opere di completamento della Stazione di Dicomano (attivata nel 2023) e della soppressione PL km 14 sono state completate a dicembre 2024. • La riattivazione della stazione di Contea Londa nella configurazione a regime è al momento pianificata entro il 2025. B) Terzo binario Pescara C.le - Pescara Porta Nuova: Sovrastruttura ferroviaria: è in corso la redazione della progettazione C) Nuove Stazioni area centro: Tolentino campus - lavori in corso; fermata Fiera di Roma - progettazione da avviare

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Sviluppo del traffico Regionale e Metropolitano, Efficientamento e potenziamento tecnologico delle infrastrutture. In particolare, il potenziamento linee Faentina e Valdisieve contribuirà all'incremento della regolarità del servizio e miglioramento di accessibilità, all'informazione e servizi nelle principali stazioni, all'eliminazione delle interferenze con la circolazione stradale mediante soppressione PL con impatto positivo sull'incidentalità stradale e sulla regolarità dell'esercizio ferroviario.

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P200: Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini centro



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	X
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	X

LOCALIZZAZIONE

Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Abruzzo

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini centro - interventi diffusi		X					X									X					
Terzo binario Pescara c.le - Pescara Porta Nuova		X					X									X					
Potenziamento linee Faentina e Valdisieve		X					X									X					
Nuove stazioni - Area centro		X					X									X					
Nuova Stazione Alta Velocità Medio Etruria						X															

QUADRO FINANZIARIO

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatiche di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
969,56	363,51		336,07	0,17	10,00	0,00	0,00	17,26	12,00	190,43	403,62

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

Evoluzione Costo						CdP-I agg.2025	Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari e allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze		
994,01	-24,96		0,11			969,56	

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P200: Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini centro

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
280,12	-24,96			84,53	23,81	363,51	Copertura dei fabbisogni indifferibili connessi alla prosecuzione del programma; ulteriore copertura con risorse FSC 2021-2027 per stazione AV Medioetruria; ulteriore copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche); ulteriore copertura con risorse proprie della Società per interventi non rientranti nel Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Nuova Stazione Alta Velocità Medio Etruria	79,00	10,00	69,00	0,00	79,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	79,00
Potenziamento linee Faentina e Valdisieve	40,07	40,07	0,00	31,88	8,19	23,96	16,60	0,89	1,98	0,24	2,03	4,91	5,68	23,58
Terzo binario Pescara c.le - Pescara Porta Nuova	68,89	68,89	0,00	0,28	68,61	1,10	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	5,00	68,60
Nuove stazioni - Area centro	4,65	4,65	0,00	3,00	1,65	3,52	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,48
Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini centro - interventi diffusi	776,95	239,89	537,05	118,85	658,10	95,82	78,55	43,12	5,69	7,99	6,26	6,46	13,05	697,54
	969,56	363,51	606,05	154,00	815,56	126,06	98,19	44,01	7,68	8,23	8,28	11,61	18,54	871,21

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Nuova Stazione Alta Velocità Medio Etruria	J21G24000050001	79,00	10,00	13%	0,00	0%	Progettazione
Nuova Stazione Alta Velocità Medio Etruria		79,00	10,00	13%	0,00	0%	
Adeguamento e riqualificazione infrastrutturale della linea Faentina	J94J18000000001	40,07	40,07	100%	17,83	45%	Realizzazione
Potenziamento linee Faentina e Valdisieve		40,07	40,07	100%	17,83	45%	
Terzo binario di collegamento tra Pescara C.le e Pescara P.N.	J84J23000230001	68,89	68,89	100%	0,35	1%	Progettazione
Terzo binario Pescara c.le - Pescara Porta Nuova		68,89	68,89	100%	0,35	1%	
Nuove fermate e stazioni area Centro Nord	J41G22000010001	4,65	4,65	100%	3,06	66%	Realizzazione
Nuove stazioni - Area centro		4,65	4,65	100%	3,06	66%	
Upgrading bacini centro		637,75	101,19	16%	0,00	0%	Progettazione
RM - upgrading linee merci	J57J18000030001	28,00	28,00	100%	23,95	86%	Realizzazione
Interventi di Upgrading Tecnologici Diffusi - Ancona	J84C20001900001	21,64	21,64	100%	13,26	61%	Realizzazione
Nuovo PRG di Spoleto	J34G19000000001	21,40	21,40	100%	1,90	9%	Realizzazione
FI - upgrading linee viaggiatori	J87I17000050001	17,00	17,00	100%	16,88	99%	In ultimazione
FI - Interventi diffusi di potenziamento tecnologico ed infrastrutturale linee regionali	J86J17000460001	13,16	13,77	100%	12,26	89%	In ultimazione
Interventi diffusi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico ambito regione Marche	J87J18000700001	13,10	12,50	95%	10,47	84%	Realizzazione
Interventi di potenziamento servizi IF	J84J24000690005	9,36	9,36	100%	0,00	0%	Progettazione
Potenziamento servizi extra pacchetto minimo di accesso - AN	J84C20001920001	7,70	7,70	100%	6,00	78%	Realizzazione
Interventi upgrading della rete viaggiatori - AN	J87F20000030001	3,90	3,90	100%	0,58	15%	Realizzazione
Upgrading linee regionali Emilia Romagna	J47H21000280001	2,13	2,13	100%	1,36	64%	Realizzazione
Interventi per l'adeguamento e lo sviluppo dei servizi Il° pillar - Napoli	J37H21000910001	0,66	0,66	100%	0,53	80%	Realizzazione
Miglioramenti infrastrutturali – Potenziamento – Firenze	J87D24000210001	0,65	0,65	100%	0,00	0%	Progettazione
Liberazione immobili - RM	J57D22000060001	0,50	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini centro - interventi diffusi		776,95	239,89	31%	87,19	36%	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi sul Collegamento Terni – Rieti – L’Aquila – Sulmona mirano alla riduzione dei tempi di percorrenza tra Roma, Rieti e L’Aquila e al miglioramento delle connessioni interne alle regioni Abruzzo, Lazio ed Umbria. Sono previsti due progetti: Velocizzazione ed elettrificazione della linea, che comprende i seguenti interventi: - Velocizzazione Terni – Rieti (opere prioritarie) - Velocizzazione Rieti – L’Aquila – Sulmona (opere di completamento). - Elettrificazione della linea Terni – Rieti - L’Aquila – Sulmona- Adeguamento a peso assiale. Relativamente all’elettrificazione, le attività erano state interrotte a seguito dell’avvio del progetto per realizzare l’alimentazione ad idrogeno dei treni. Alimentazione dei servizi ferroviari della linea con idrogeno verde. L’intervento prevedeva la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di terra ('on site') per la produzione/stoccaggio e distribuzione di idrogeno verde per i servizi ferroviari della linea.

Gli interventi previsti si effettuano sulla linea ferroviaria esistente che attraversa l’area montuosa compresa tra le regioni Lazio ed Abruzzo


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•Alimentazione a idrogeno linea Terni-L’Aquila-Sulmona: l’intervento è stato definitivamente chiuso per mancanza dei requisiti per accedere alle risorse per la trasformazione ad idrogeno delle linee ferroviarie diesel, ed è stato riavviato il progetto di elettrificazione della tratta L’Aquila-Sulmona. •Potenziamento della linea Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona: Velocizzazione Terni - Rieti - PM Stroncone Lotto 1 PM Stroncone, conclusa CdS. Di prossimo avvio l’Attività negoziale Elettrificazione L’Aquila Sulmona Per l’elettrificazione della tratta L’Aquila Sulmona propedeuticamente e all’avvio del PFTE è necessario effettuare un piano di indagini conoscitivo delle opere esistenti sulla tratta. Altre fasi velocizzazione nel PFTE del Lotto 2 (PRG di Marmore, Greccio, Contigiano e Rieti e rettifica di alcune curve) è stato completato. Il PFTE del Lotto 3 che comprende soppressione del PL di Marmore e di Greccio, oltre al completamento del PRG di Marmore, potrà essere progettato a seguito di specifico confronto con gli enti locali. Adeguamento del peso assiale: sono state recentemente avviate le indagini propedeutiche all’avvio della progettazione con riferimento alla tratta Rieti L’Aquila

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Interventi di elettrificazione da L’Aquila a Sulmona e velocizzazione da Terni a Rieti: - Maggiore regolarità dell’esercizio ferroviario. - Miglioramento dell’accessibilità nelle Località di Servizio tra Terni e Rieti. - Miglior servizio grazie al nuovo sistema leC tra Terni e Rieti. - Possibilità di istituire relazioni dirette L’Aquila – Pescara con una percorrenza, a seguito della realizzazione della bretella di Sulmona, inferiore a quella delle corse bus che insistono sulla stessa tratta. - Riduzione dell’inquinamento ambientale a livello locale. - Abbattere le emissioni di CO2 connesse al trasporto ferroviario.

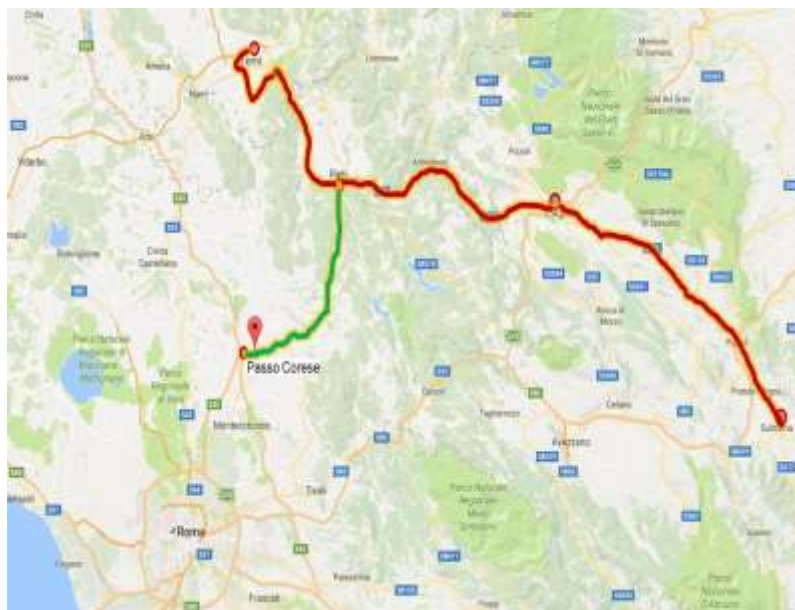

	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	X
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Umbria
Lazio
Abruzzo

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025												
Progetto P210A: Potenziamento della linea Terni – Rieti – L’Aquila-Sulmona												
Intervento / Opere funzionali												
	PNRR	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF		
											Alta Velocità (AV)	
											Sviluppo corridoi TEN-T	
											Potenziamento connessioni merci	
Velocizzazione Terni-Rieti e adeguamento massa assiale Rieti-L'Aquila									X		X	
Linea Terni-Sulmona: Infrastrutture di terra per la produzione/stoccaggi e distribuzione di idrogeno verde									X		X	

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
236,98	64,53	di cui: 64,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		0,00	9,31	163,14

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
204,00			32,98			236,98	Variazione di costo dovuta all'aggiornamento della PFTE, all'inserimento di opere inizialmente non previste e all'incremento dei costi di progettazione.

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
64,20					0,32	64,53	Copertura dell'incremento di costo, anche con risorse proprie della Società per interventi non rientranti nel Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
			Fabbis.			Impegni	Pagam.			2021	2022	2023	2024	Oltre
	Costo	Risorse		Lavori	S.a.D.			AI 2019	2020					
Velocizzazione Terni-Rieti e adeguamento massa assiale Rieti-L'Aquila	214,98	64,21	150,78	98,43	116,55	8,31	0,54	0,00	0,00	0,09	0,19	0,41	5,00	214,27
Linea Terni-Sulmona: Infrastrutture di terra per la produzione/stoccaggi e distribuzione di idrogeno verde	22,00	0,32	21,68	21,01	0,99	0,32	0,24	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	5,00	21,68
	236,98	64,53	172,45	119,44	117,55	8,63	0,78	0,00	0,00	0,09	0,44	0,42	0,09	235,95

CRONOPROGRAMMA													
CUP		Stato attuativo	Iter procedurale										
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
Velocizzazione Terni-Rieti e adeguamento massa assiale Rieti-L'Aquila	Iter autorizzativo		6-2021	10-2027	-	-	-	-	3-2025	8-2028	7-2025	2-2030	7-2030
Linea Terni-Sulmona: Infrastrutture di terra per la produzione/stoccaggi e distribuzione di idrogeno verde	J11B21008720008	Valutazione di fattibilità alternative progettuali	12-2021	1-2026	-	-	-	-	9-2025	11-2025	9-2025	12-2025	3-2026

Progetto 0242: Velocizzazione Palermo - Agrigento

Bacini Sud e isole

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0242: Velocizzazione Palermo - Agrigento

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatorie di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
167,50	167,50		7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	160,16	0,00	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
167,50						167,50

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
167,50						167,50

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Velocizzazione Montemaggiore-Roccapalumba, Variante Lercara e altri interventi minori	167,50	167,50	0,00	146,76	20,74	167,35	162,97	166,02	0,09	0,29	0,19	0,69	5,89	0,20
	167,50	167,50	0,00	146,76	20,74	167,35	162,97	166,02	0,09	0,29	0,19	0,69	0,01	0,20

CRONOPROGRAMMA														
CUP			Stato attuativo				Iter procedurale							
							Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.	
							Inizio		Fine		Inizio		Fine	
Velocizzazione Montemaggiore-Roccapalumba, Variante Lercara e altri interventi minori	J11H02000060001	Esercizio	6-2008	-	-	-	10-2013	9-2014	1-2005	11-2012	7-2003	12-2017	12-2017	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Primo Intervento Velocizzazione della tratta a semplice binario tra Bicocca e Augusta, comprendente la realizzazione di variante di tracciato, la correzione di curve, interventi di stabilizzazione della sede ferroviaria e nelle stazioni di Lentini, Brucoli e Augusta la sistemazione dei marciapiedi, sottopassi, pensiline e l'eliminazione delle barriere architettoniche. Secondo intervento Variante Gornalunga, necessaria per risolvere criticità idrauliche sulla linea, e adeguamento a STI della galleria Valsavoia.

Il progetto di velocizzazione prevede, essenzialmente, l'adeguamento delle curve attuali mediante variazioni della sopraelevazione e dei raccordi di transizione e la realizzazione delle seguenti varianti di tracciato:- Variante Lentini Diramazione (km 248+296 – km 249+511);- Variante 1 (km 251+916 – 252+667);- Variante Lentini (km 253+831 – km 255+684);- Variante 2 (km 262+317 – km 262+747);- Variante Agnone (km 263+358 – 264+205);- Variante Brucoli (km 274+294 – km 275+292).

La linea Catania-Siracusa inizia alla periferia sud di Catania (stazione di Bicocca) costeggia l'area dell'aeroporto della città etnea e attraversa la piana di Catania, nella quale scorre il fiume Simeto, in direzione di Lentini e della piana omonima. La piana di Catania è una vasta conca, per secoli paludosa e desertica, delimitata dagli ultimi contrafforti dei monti Erei ed Iblei e a nord dalle estremità del massiccio vulcanico dell'Etna. L'area è, ancora oggi, scarsamente popolata e ciò ha favorito le colture estensive basate sulla cerealicoltura e il pascolo transumante. Nelle zone più vicine a Catania e lungo la fascia costiera si sono invece insediate rilevanti attività industriali e grandi infrastrutture, numerose, particolarmente nei pressi della foce del Simeto, sono le case di villeggiatura sorte negli ultimi decenni. In prossimità di Lentini il tracciato devia bruscamente verso est, e quindi verso la costa e raggiunge, fiancheggiando le pendici dei monti Iblei, Agnone. Il tavolato ibleo è costituito da rilievi dalle forme smussate. Verso nord ha limiti incerti: il passaggio tra i versanti collinari e la Piana di Catania è invece brusco e caratterizzato da fratture, specie tra Scordia, Francofonte e Lentini, retaggio delle alluvioni quaternarie che s'insinuano fin sotto la massa montuosa formando una specie di conca. I confini ad est sono strutturati da terrazze degradanti dai 600 m ai 200 m che si allungano verso il litorale presso il quale si aprono le piane di Lentini, d'Augusta e di Siracusa. Lasciata la stazione d'Agnone, la linea fianchiaggia, in un primo tratto, la costa per poi spostarsi più all'interno fino ad Augusta. Il paesaggio costiero ha subito negli ultimi anni una forte e incontrollata pressione insediativa costituita sia da case per la villeggiatura sia da edilizia residenziale. Le aree attraversate dal progetto sono caratterizzate da una prevalente morfologia di altipiani che si affacciano sul Mar Ionio. Le linee guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) suddividono il territorio siciliano in 17 ambiti differenziati tra loro in base ai caratteri strutturali morfologici del paesaggio. Il tratto di linea ferroviaria Bicocca-Augusta attraversa due ambiti diversi: l'ambito territoriale 14 "Area della pianura alluvionale catanese" e l'ambito territoriale 17 "Area dei rilievi e del tavolato ibleo", e indettaglio:- da pk 234+640 (inizio progetto) a 263+500 l'ambito 14 Area della pianura alluvionale catanese;- da pk 263+500 a 266+000 un territorio, al limite tra l'ambito 14 ed il 17, in cui i caratteri peculiari dell'uno e dell'altro si contaminano;- da pk 266+000 a 280+000 (fine I lotto) l'ambito 17 Area dei rilievi e del tavolato ibleo; AREE SIC E ZPSI siti Natura 2000 potenzialmente interessati nelle attività di costruzione della linea sono:- Zone di Protezione Speciale ZPS ITA070029 "Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del Fiume Simeto e area antistante la foce";- Siti di Importanza Comunitaria SIC ITA 070001 "Foce del Simeto e Lago di Gornalunga". Nel tratto tra km 238+500 e km 239+000, la linea ferroviaria sistente attraversa il Fiume Simeto, tutelato dalla ZPS ITA070029 e dal SIC ITA 070001, ed il progetto prevede limitati interventi di manutenzione dell'opera d'arte consistenti nel rifacimento degli strati superficiali di protezione del ferro della attuale travata metallica. Non sono previste modifiche del piano ferro. In merito ai suddetti siti Natura 2000, si evidenzia che la procedura di Valutazione di Incidenza presso la Regione Siciliana è stata espletata nel corso sia del progetto preliminare che del definitivo.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Primo intervento: attivato a dicembre 2020. Secondo intervento «Variante Gornalunga»: in corso la fase realizzativa; «Adeguamento a STI Galleria Valsavoia»: affidati i lavori, in avvio la fase realizzativa

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Il progetto consentirà una riduzione dei tempi di viaggio tra le località di Catania C.le e Siracusa, con recuperi fino a 2', nonché un miglioramento dell'accessibilità al servizio con realizzazione sottopassi e nuovi marciapiedi per lo svolgimento del servizio viaggiatori e il miglioramento della infrastruttura e della affidabilità della linea. Realizzazione di un nuovo binario tronco per servizio viaggiatori nella stazione di Lentini.

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0271A: Velocizzazione Catania-Siracusa 1^ fase



	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	X
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Sicilia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

	Priorità programmatica								Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workshop corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali													
Velocizzazione Bicocca-Augusta						X	X	X			X	X	Accessibilità e qualità stazioni
													Resilienza al climate change
													Adeguamento a standard tecnici
													Sviluppo tecnologico
													Sistemi regionali e metropolitani
													Potenziamento connessioni merci
													Sviluppo corridoi TEN-T
													Completamento valichi alpini

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Totale Risorse	Sezione 1 - Opere in corso finanziate							Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
		di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
100,33	97,36		14,38	3,19	0,00	0,00	79,79	0,00	0,00	2,97	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo							CdP-I agg.2025	Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari.
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze			
98,55				1,78			100,33	
Evoluzione coperture finanziarie							CdP-I agg.2025	Copertura di adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni			
95,58				1,78			97,36	

PIANO DELLA SPESA

	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam. Al	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Velocizzazione Bicocca-Augusta	100,33	97,36	2,97	71,94	28,39	84,21	61,39	48,46	1,28	0,44	1,41	5,78	10,78	35,80
	100,33	97,36	2,97	71,94	28,39	84,21	61,39	48,46	1,28	0,44	1,41	5,78	7,16	35,80

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0271A: Velocizzazione Catania-Siracusa 1^ fase

CRONOPROGRAMMA

			Stato attuativo		Iter procedurale												
			CUP														
					Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità		
					Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine			
Velocizzazione Bicocca-Augusta			J11H03000150001	Realizzazione	-	12-2005	12-2010	2-2028	9-2012	12-2019	3-2015	3-2025	11-2015	2-2026	11-2020		

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi si inquadrano nel programma di velocizzazione del collegamento tra Catania e Siracusa e completano funzionalmente il programma di interventi previsti per il potenziamento della direttrice ionica Messina - Catania - Siracusa. Gli interventi consistono nella velocizzazione della tratta a semplice binario tra Augusta e Targia, comprendente la realizzazione di variante di tracciato, la correzione di curve, interventi di stabilizzazione della sede ferroviaria.

Nelle stazioni di Megara e Priolo è stata prevista la velocizzazione degli scambi di comunicazione tra il binario di corsa ed il binario di precedenza, con la sostituzione degli scambi esistenti con deviatori 60 UNI/400/0.074 che consentono l'ingresso in deviato dei treni alla velocità di 60 km/h, nonché la realizzazione di tronchini di sicurezza in corrispondenza dei binari di precedenza. Per la stazione di Targia è prevista la velocizzazione della radice lato Catania mediante la sostituzione dei deviatori sul binario di corsa con una comunicazione tipo 60UNI/1200/0.040, per consentire l'ingresso in deviato alla velocità di 100 km/h.

Dopo Augusta, in direzione Siracusa, il tracciato segue la costa, attraversa l'agglomerato industriale del polo petrolchimico di Priolo-Melilli e giunge all'insediamento artigianale di Targia. Gli impianti industriali d'Augusta - Priolo - Melilli hanno profondamente modificato il paesaggio e l'ambiente, con evidenti effetti di degrado ambientale. In generale l'area attraversata dalla linea è caratterizzata dalla presenza di un patrimonio storico ed ambientale d'elevato valore: le zone costiere, che ancora conservano tracce del sistema dunale; gli habitat delle foci e degli ambienti fluviali; le caratteristiche "cave"; gli ampi spazi degli altopiani che costituiscono un paesaggio agrario unico. Il tracciato della linea da Augusta a Targia, include il Sito "SIC" TA090014 Saline di Augusta. La linea, realizzata nell'ultimo decennio del XIX secolo, interseca le saline in due tratti compresi fra il km 280+350 ed il km 282+300. Nello stesso intervallo si trova la stazione di Augusta. I lavori per la velocizzazione non comportano sostanziali modifiche alla situazione attuale se non quelle determinate dall'adeguamento del piano di stazione alle norme di sicurezza e dalla necessità di consolidamento del rilevato ferroviario.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Approvata dal CIPE la progettazione preliminare. Il progetto è attualmente sospeso per mancanza di finanziamenti.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Riduzione dei tempi di percorrenza e miglioramento della regolarità della circolazione.



	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Sicilia

INQUADRAMENTO STRATEGICO**Priorità programmatica**

Allegato MIMS al DEF
Tavoli tecnici di ascolto
Altri Provvedimenti*
Cofinanziamenti UE
UE - workplan corridoi TEN-T
AQ per l'utilizzo della capacità
Fondo Sviluppo e Coesione
Accordi EE.LL.
Accordi Internazionali
Interventi commissariati
PNRR

Obiettivi strategici

Coesione sociale e territoriale
Accessibilità e qualità stazioni
Resilienza al climate change
Adeguamento a standard tecnici
Sviluppo tecnologico
Sistemi regionali e metropolitani
Potenziamento connessioni merci
Sviluppo corridoi TEN-T
Completamento valichi alpini
Alta Velocità (AV)

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0271B: Velocizzazione Catania-Siracusa completamente

Velocizzazione Augusta-Targia	X	X	X	X	X
-------------------------------	---	---	---	---	---

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2		
44,00	0,00	di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l’affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell’investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all’art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
44,00						44,00

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
0,00						0,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Velocizzazione Augusta-Targia	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	44,00
	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00

CRONOPROGRAMMA														
CUP			Stato attuativo				Iter procedurale							
							Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
			Velocizzazione Augusta-Targia	J11H03000150001	Progettazione	-	-	-	-	-	-	-	-	12-2028

Tabella A05-Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali

Bacini Sud e isole

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento comprende le modifiche alle curve e varianti di tracciato per aumentare la velocità di percorrenza, soppressione di 2 PL e opere tecnologiche connesse all'intero intervento. L'intervento si sviluppa in due fasi: -1^a fase: rettifiche e varianti tratta Siracusa- Fontanebianche; -2^a fase: rettifiche e varianti tratta Fontanebianche -Noto. Metroferrovia tratta Genisi - Ragusa e collegamento al porto di Pozzallo.

In sintesi, le opere progettate in fase preliminare sono le seguenti: - rettifiche di tracciato e varianti nella tratta Siracusa - Noto: - velocizzazione Siracusa – Fontanebianche (lunghezza 7,8 km); - variante Fontanebianche (lunghezza 7,8 km); - velocizzazione Avola-Noto (lunghezza 9,1 km); - variante Noto (lunghezza 4,4 km).

Il tracciato della relazione Siracusa - Gela segue il corridoio naturale della pianura che costeggia tutto il versante sud-est, per poi introdursi nella zona più montuosa di Ragusa. L'orografia sfavorevole ha comportato il ricorso frequente a gallerie e a ponti per l'attraversamento dell'alveo di fiumi e di valloni. Sulla tratta in esame ci sono 22 località di servizio, di cui 14 stazioni, 1 fermata e 7 posti movimento. Sulla tratta in esame ci sono 96 P.L., di cui 24 manovrati, 51 automatici e 21 privati. Dal punto di vista del sistema ambientale e fisico, le due aree fondamentali del sistema delle aree protette interessate dal tracciato di progetto, tutelate come riserve regionali e contemporaneamente proposte come siti di interesse comunitario, sono costituite dall'area del fiume Ciane e dall'area del fiume Cassibile. Nel tratto Siracusa-Fontane Bianche la linea attraversa, rimanendo comunque all'interno della sede esistente, un'area di rilevante interesse naturalistico, protetta dalla Regione Siciliana attraverso l'istituzione di una Riserva Naturale e proposta quale sito di interesse comunitario Riserva Naturale Orientata Fiume Ciane e Saline di Siracusa (elemento della rete Natura 2000, proposto SIC ITA090006 denominato "Fiume Ciane e Saline di Siracusa. Nell'ambito della variante di tracciato "Fontane Bianche", nel territorio di Siracusa, il tracciato ferroviario attraversa un'area di rilevante interesse naturalistico, protetta dalla Regione Siciliana attraverso l'istituzione di una Riserva Naturale gestita dall'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sicilia, e proposta quale sito di interesse comunitario (elemento della rete Natura 2000 che si estende sulla superficie di 5210 ettari lungo il fiume Cassibile: proposto SIC ITA090007 denominato "Cava Grande del Cassibile, Cava Cinque Porte, Cava e Bosco di Bauli"). Tra le progressive km 9+780 e km 12+700 il tracciato attraversa un'area identificata dal PRG di Siracusa come area di valenza paesaggistica ed ambientale a vocazione agricola; il regime di tutela è sostanzialmente mirato alla formazione di un'area cuscinetto di protezione alla Riserva Naturale Orientata Cava Grande del Cassibile.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Sviluppato nel 2007 il Progetto Preliminare. Intervento sospeso per mancanza di finanziamenti.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Miglioramento regolarità della circolazione; riduzione tempi di percorrenza e miglioramento dell'accessibilità al servizio ferroviario nel comune di Ragusa.



	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Sicilia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025														
Progetto 0315: Velocizzazione Siracusa-Ragusa-Gela														
Intervento / Opere funzionali														
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T
Velocizzazione Siracusa-Ragusa-Gela														

QUADRO FINANZIARIO												milioni di euro		
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento			
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2				
200,00	0,32	di cui: 0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	199,68			

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE											milioni di euro
Evoluzione Costo											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze						CdP-I agg.2025
200,00											200,00
Evoluzione coperture finanziarie											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni						CdP-I agg.2025
0,32											0,32

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Velocizzazione Siracusa-Ragusa-Gela	200,00	0,32	199,68	190,39	9,61	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	199,69
	200,00	0,32	199,68	190,39	9,61	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,69

CRONOPROGRAMMA														
CUP	Stato attuativo				Iter procedurale									
	Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità			
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine				
Velocizzazione Siracusa-Ragusa-Gela	J14F05000040001	Progettazione	10-2005	5-2007	7-2027	11-2028	-	-	10-2029	7-2030	9-2030	6-2039	4-2039	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi consistono in: velocizzazioni tratte di linea e ingressi in stazione in deviate, upgrading e impianti (realizzazioni sottopassi, marciapiedi H55 e velocizzazione itinerari, lavori per la maggior parte già realizzati), soppressione PP.LL., adeguamento a modulo 750 m ad Ascoli Satriano, attivazione Sistema Controllo Marcia Treno, ed elettrificazione.

L'intervento è così articolato:- Interventi di tipo tecnologico per l'adeguamento a standard e razionalizzazione impianti, marciapiedi, informazione al pubblico, adeguamento a sagoma P/C 45 tra Cervaro e San Nicola di Melfi;- Elettrificazione, rettifiche in sede di tracciato in prossimità delle località di Candela e Rocchetta, soppressione PL, consolidamento sede;- Progettazione della Variante S. Nicola di Melfi;- Soppressione di passaggi a livello nel Comune di Rionero.

L'area dell'intervento ricade parte in Puglia. e parte in Basilicata. Procedendo da Nord a Sud l'area interessata dal tracciato è caratterizzata dalla presenza di settori subpianeggianti ricobducibili alla valle alluvionale del Torrente Cervaro, da bassi rilievi in località Candela fino al Fiume Ofanto al confine tra Puglia e Basilicata, dal rilievo del Vulture e a seguire da rilievi incisi da numerose valli e torrenti fino ad arrivare alla valle del Fiume Basento in zona Sud di Potenza. L'intervento di Ammodernamento prevede l'elettrificazione di 120 km di linea con adeguamento dove necessario delle 40 gallerie presenti in linea per consentire l'attrezzaggio TE, con abbassamento del p.f. dove il ballast lo consente e in taluni casi con rifacimento dell'arco rovescio, velocizzazione rettifiche di tracciato in corrispondenza di due curve utili all'aumento del raggio di curvatura nell'ottica di consentire la velocizzazione in tali tratte, ristrutturazione di 104 tombini idraulici sulla tratta Cervaro - Rocchetta - S.Nicola di Melfi in funzione della riclassificazione da C3 a D4, interventi di manutenzione straordinario di 9 ponti e viadotti in muratura in detta tratta, soppressione di 29 PL mediante cavalcaferrovia e viabilità sostitutive, adeguamenti degli impianti IS e TLC in coerenza con l'attrezzaggio TE, attrezzaggio SCMT con encoder da cabina


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•1^ fase:Attività concluse. •2^ fase:Lotto 1.1 Elettrificazione Cervaro - Rocchetta: in corso la fase realizzativa con interventi di posa cavi, di installazione linee di contatto, realizzazione SSE di S. Nicola di Melfi e Ascoli Satriano, realizzazione Cabina TE PM Cervaro e consolidamento gallerie S. Venere e Isca della Ricotta. Lotto 1.2 Elettrificazione Rocchetta-Potenza: in corso la fase realizzativa con interventi per SSE, posa cavi TE e sistemazioni idrauliche. Lotto 5 Attrezzaggio SCMT tratta Rocchetta - Potenza: in corso la fase realizzativa. Soppressione PL nel comune di Rionero: in corso l'iter sul PE. •Velocizzazione Foggia-Potenza: Velocizzazione Rocchetta - Potenza: in corso l'iter sulla progettazione esecutiva. Soppressione PL nel comune di Ortona: da avviare la PFTE. In corso la PFTE per la variante di S. Nicola di Melfi e per la soppressione di 3 PL nel comune di Melfi. Sottopasso nel comune di Candela e soppressione del PL nel comune di Ascoli Satriano: da avviare la Progettazione Definitiva. Opere di mitigazione di rischio idrogeologico: da avviare l'aggiornamento del progetto definitivo. Soppressione di 3 PL nel comune di Melfi: in corso la PFTE. •Variante San Nicola di Melfi: In corso la Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

A seguito dei lavori, sarà possibile garantire, come da Accordo Quadro, servizi orari Potenza - Melfi, Melfi - Foggia e Avigliano - Potenza Superiore, sommati a servizi «spot» veloci Foggia - Potenza. Gli interventi permetteranno, inoltre, un aumento della velocità massima di tracciato con riduzione dei tempi di percorrenza fino a 10' sulla relazione Potenza - Foggia. L'elettrificazione e l'adeguamento della sagoma P/C 45 già realizzato permetteranno il potenziamento dei servizi merci da/per l'impianto FIAT di S. Nicola di Melfi. Nuovi marciapiedi (già realizzati) negli impianti di Rocchetta S.A./L., Ascoli Satriano, Melfi, Rionero e Castel Lagopesole migliorano l'accessibilità e consentono l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle stesse località. Attivato il nuovo sistema di informazione al pubblico.

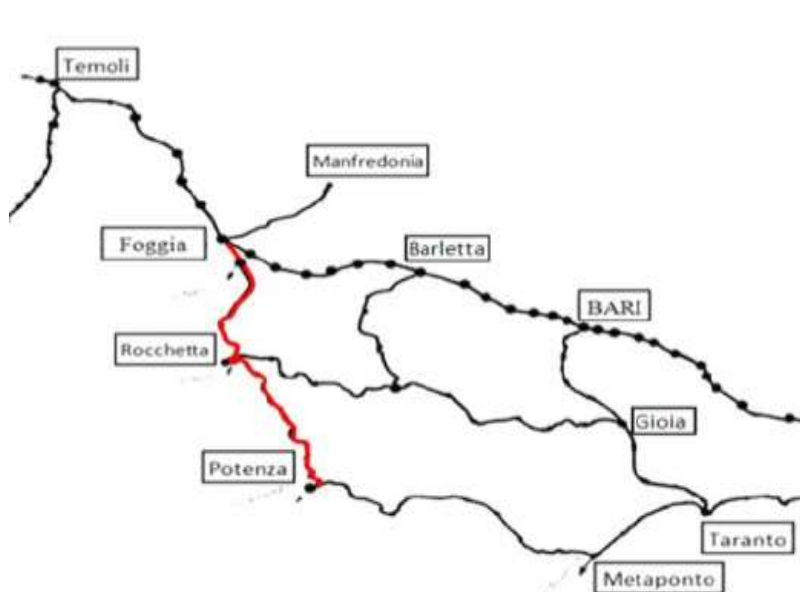

	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	X
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Puglia
Basilicata

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 1674: Linea ferroviaria Potenza - Foggia - ammodernamento

INQUADRAMENTO STRATEGICO

	Priorità programmatica								Obiettivi strategici					
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EELL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Intervento / Opere funzionali														
HUB di Melfi														
Ammodernamento Potenza-Foggia Fase 1: adeguamento a standard RFI e razionalizzazione impianti						X								X
Ammodernamento Potenza-Foggia Fase 2B: velocizzazione						X								X
Variante di Melfi						X								X
Ammodernamento Potenza-Foggia Fase 2A: elettrificazione, soppressione PL e consolidamento sede						X			X					X

QUADRO FINANZIARIO

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
874,57	365,00		70,47	0,00	200,00	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	509,57

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

Evoluzione Costo							CdP-I agg.2025	Variazione del costo dovuta all'incremento del costo dell'intervento di adeguamento alle STI- SRT/ENE concernenti "la sicurezza nelle gallerie ferroviarie" sezione "sottosistema energia" per quattro gallerie ad esito del Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica. Inoltre, si evidenzia una variazione di perimetro relativa all'inserimento delle opere di mitigazione idrogeologiche per la Linea Potenza-Foggia.
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze			
695,80			178,77					

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
374,00					-9,00	365,00	Rimodulazione della copertura su interventi parzialmente finanziati a favore di ulteriori fabbisogni maggiormente prioritari

PIANO DELLA SPESA

	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Altre
HUB di Melfi	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	250,00
Ammodernamento Potenza-Foggia Fase 1: adeguamento a standard RFI e razionalizzazione impianti	52,27	52,27	0,00	48,44	3,82	51,33	51,31	49,70	0,86	0,73	0,02	0,00	8,06	0,94
Ammodernamento Potenza-Foggia Fase 2B: velocizzazione	341,60	82,03	259,57	197,52	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	341,60
Variante di Melfi	6,00	6,00	0,00	0,38	5,62	4,79	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	5,00	5,85
Ammodernamento Potenza-Foggia Fase 2A: elettrificazione, soppressione PL e consolidamento sede	224,70	224,70	0,00	180,45	44,25	127,23	56,22	24,60	4,20	3,60	4,39	9,09	9,29	172,72
	874,57	365,00	509,57	426,79	447,77	183,34	107,68	74,30	5,05	4,33	4,42	9,24	6,12	771,11

CRONOPROGRAMMA

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 1674: Linea ferroviaria Potenza - Foggia - ammodernamento

CUP		Stato attuativo	Iter procedurale										
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
HUB di Melfi	Progettazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammodernamento Potenza-Foggia Fase 1: adeguamento a standard RFI e razionalizzazione impianti	J19B12000040001	Esercizio	9-2012	4-2014	6-2013	-	-	-	1-2014	7-2014	8-2014	12-2022	3-2020
Ammodernamento Potenza-Foggia Fase 2B: velocizzazione	J19B12000040001	Progettazione	3-2025	5-2026	-	-	8-2025	6-2026	-	-	-	-	3-2028
Variante di Melfi	J19B12000040001	Progettazione	3-2023	12-2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammodernamento Potenza-Foggia Fase 2A: elettrificazione, soppressione PL e consolidamento sede	J19B12000040001	Realizzazione	3-2020	5-2026	6-2014	5-2026	11-2017	7-2025	-	5-2022	5-2022	6-2026	12-2026

Progetto I162: Ripristino linea Palermo-Trapani via Milo

Bacini Sud e isole

Gli interventi, interessanti la tratta Alcamo Dir. Trapani (vi Milo), consistono in:-potenziamento infrastrutturale mediante modifiche al corpo stradale e alle opere di difesa;-adeguamento ai nuovi standard tecnologici;-velocizzazione degli itinerari in deviate nelle principali località sede di incrocio.-soppressione PL nell'ambito del comune di Trapani mediante realizzazione di opera sostitutiva

La tratta in questione si sviluppa principalmente in rilevato e a mezza costa, con pendenze entro il 5‰, e comprende n. 11 gallerie, di cui una lunga 1.628 m, 107 ponti/ponticelli ad arco in muratura e 13 ponti ad arco in muratura a più luci. Tutte le curve hanno raggio maggiore o uguale a 500 m. L'epoca di costruzione della linea risale agli inizi del secolo scorso (1930). Tutti i deviatori di ingresso alle stazioni sono percorribili sul ramo deviato alla velocità massima di 30 km/h. Vi sono 29 PL maggiormente concentrati nella tratta Piraineto - Alcamo D.ne. La riapertura della tratta garantirebbe lo sviluppo di collegamenti veloci a basso impatto ambientale tra i due capoluoghi e con l'aeroporto di Trapani Birgi. Dal punto di vista tecnico l'intervento prevede modifiche del corpo stradale e delle opere di difesa dell'infrastruttura ferroviaria per consentire il potenziamento della linea e l'adeguamento agli standard di sicurezza vigenti, l'adeguamento ai nuovi standard degli apparati tecnologici e dei supporti trasmissivi per la gestione degli impianti di comando e controllo, la velocizzazione degli incroci dei treni nelle stazioni.

L'intervento è di ripristino della linea ferroviaria, quindi ripercorre lo stesso tracciato attuale, in zone scarsamente urbanizzate, tranne l'opera di sostituzione del PL di Trapani. L'orografia è di tipo collinare.

attualità dati: 30/06/2025

Ripristino linea Palermo-Trapani via Milo, lavori in corso. In data 06/05/2025 è stato attivato l'ACC della stazione di Trapani. Sono in corso gli interventi ai rilevati, alle trincee e alle paratie lungo la linea. Sottopasso di via Sieli a Trapani: conclusa la fase di verifica della progettazione esecutiva dalla quale emerge l'inapprovabilità dell'attuale proposta progettuale.

Gli interventi creano le condizioni per il ripristino del servizio commerciale sulla tratta Alcamo – Trapani via Milo. Il tempo di percorrenza attuale sulla tratta Piraineto-Trapani è pari a 2h e 50' (via Castelvetro). L'obiettivo dell'intervento è di recuperare fino a 70'(via Milo).



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

Sicilia

- Allegato MINUS ai DE+
- Tavoli tecnici di ascolto
- Altri Provedimenti*
- Cofinanziamenti UE
- UE - workplan corridoi TEN-T
- AQ per l'utilizzo della capacità
- Fondo Sviluppo e Coesione
- Accordi E.E.LL.
- Accordi Internazionali
- Interventi commissariati
- PNRR

- Coesione sociale e territoriale
- Accessibilità e qualità stazioni
- Resilienza al climate change
- Adeguamento a standard tecnici
- Sviluppo tecnologico
- Sistemi regionali e metropolitani
- Potenziamento connessioni merci
- Sviluppo corridoi TEN-T
- Completamento valichi alpini
- Alta Velocità (AV)

Intervento / Opere funzionaliRipristino linea Palermo-Trapani via Milo

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto I162: Ripristino linea Palermo-Trapani via Milo

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
237,00	233,30		69,30	0,00	34,00	0,00	0,00	130,00	0,00	3,70	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatIRFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						CdP-I agg.2025	L'incremento del costo è conseguente agli interventi di ripristino della struttura delle pensiline nella stazione di Trapani, nell'ambito dell'intervento al PRG, propedeutico ai fini della certificazione per la riattivazione dell'impianto, e all'intervento di bonifica di una condotta idrica rinvenuta nella fase di BOE lungo la linea ferroviaria e interferente con i lavori di ripristino della sede.
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze		
221,00			16,00				

Evoluzione coperture finanziarie						CdP-I agg.2025	Copertura degli interventi con risorse PR FESR Sicilia 2021-2027
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni		
215,80				130,00	-112,50		

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Ripristino linea Palermo-Trapani via Milo	237,00	233,30	3,70	205,88	31,12	105,89	20,05	1,88	0,54	0,26	1,26	4,11	5,68	213,04
	237,00	233,30	3,70	205,88	31,12	105,89	20,05	1,88	0,54	0,26	1,26	4,11	15,90	213,04

CRONOPROGRAMMA

CUP	Stato attuativo	Iter procedurale													
		Prog.Prel.				Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
		Inizio		Fine		Inizio		Fine		Inizio		Fine			
Ripristino linea Palermo-Trapani via Milo	J44H17000670001	Realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	11-2021	10-2022	2-2022	6-2028	12-2028

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto consiste nel potenziamento della stazione di Canosa di Puglia (nuovo PRG a 3 binari) elettrificazione della tratta Barletta-Canosa (25 km), nella realizzazione della nuova fermata di Barletta Ospedale, del nuovo punto d'incrocio presso la località di Canne della Battaglia (nuovo PRG a 2 binari) e soprattutto nel risanamento della sede per mitigare il rischio idraulico.

Il territorio dove si realizza l'opera è prevalentemente pianeggiante ed è ubicato tra i comuni di Barletta e Canosa.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Elettrificazione della tratta Barletta- Barletta Ospedale: approvata la progettazione esecutiva, in corso l'iter autorizzativo. Elettrificazione Barletta Ospedale- Canne della Battaglia - Canosa: da avviare la VIA e l'invio del progetto al CSLPP. L'avvio della CdS è vincolato alla disponibilità delle risorse finanziarie. Fermata Barletta Ospedale: progettazione esecutiva in corso. PRG di Barletta e Canosa: in corso la redazione del progetto relativo all'adeguamento del PRG di Barletta, ultimata la fase realizzativa del PRG di Canosa.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

• Incremento della capacità di linea da 1 treno/h nei due sensi di marcia a 4 treni/h nei due sensi di marcia. • Maggiore accessibilità al servizio ferroviario mediante l'assegnazione della fermata a Barletta Ospedale alle relazioni Barletta – Canosa, così come previsto dal vigente AQ con Regione Puglia. Gli interventi sono finalizzati perseguire gli scenari di servizio previsti da Accordo Quadro RFI-Regione Puglia del 18/3/2016 nonché del 2021: • estensione dei collegamenti Fasano - Bari - Barletta sino a Canosa senza rottura di carico in modo da migliorare l'accessibilità a questa porzione di territorio; • possibilità di collegamenti diretti Canosa - Aeroporto di Bari, una volta completata l'interconnessione di Barletta con la rete Ferrotranviaria.



Capacità	X
Velocità	
Accessibilità	X
Regolarità	
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Puglia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Elettrificazione e ammodernamento linea Barletta-Canosa						X					X				X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto I170: Elettrificazione e ammodernamento linea Barletta-Canosa

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
368,10	35,00		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,10

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
348,40			19,70			368,10
Variazione di costo per l'adeguamento dell' esito della Progettazione Esecutiva.						

Evoluzione coperture finanziarie					
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni
35,00					
					CdP-I agg.2025
					35,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione					
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Elettrificazione e ammodernamento linea Barletta-Canosa	368,10	35,00	333,10	350,81	17,29	19,83	3,75	0,87	0,02	1,14	1,59	1,31	5,42
	368,10	35,00	333,10	350,81	17,29	19,83	3,75	0,87	0,02	1,14	1,59	1,31	0,64

CRONOPROGRAMMA													
	CUP	Stato attuativo				Iter procedurale							
		Realizzazione	1-2019	5-2026	4-2020	Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Nego.	
						Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
						Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine
Elettrificazione e ammodernamento linea Barletta-Canosa	J54F18000010009	Realizzazione	1-2019	5-2026	4-2020	3-2027	11-2027	-	-	3-2021	3-2021	6-2028	11-2029

Progetto I173: Elettrificazione, velocizzazione e ammodernamento linee Salerno - Mercato S.S. - Avellino - Benevento e tratta Mercato S.S. - Codola - Sarno

Bacini Sud e isole

Gli interventi consistono nell'elettrificazione, velocizzazione e ammodernamento della infrastruttura ferroviaria esistente della linea Salerno-Mercato San Severino-Avellino-Benevento e della linea Mercato San Severino-Codola, compreso l'ammodernamento della tratta Mercato S. Severino - Codola - Sarno previa riattivazione in esercizio.

L'intervento si articola in più lotti, temporalmente e funzionalmente indipendenti:- Elettrificazione della linea: realizzazione di una nuova linea di contatto a 3kv c.c. e di due nuove sottostazioni elettriche a Prata Pratola e Mercato S. Severino;- Riclassificazione del tracciato: realizzazione di interventi di rinnovo del binario e consolidamento delle opere d'arte e della piattaforma per eventualmente migliorare l'accessibilità al servizio ferroviario delle aree industriali afferenti alla linea.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

L'elettrificazione e gli interventi infrastrutturali pianificati per fasi: 1° fase «Salerno-Mercato S.S.» e «Mercato S.S.-Codola-Sarno»: Attivata; 2° fase «Mercato S.S.-Avellino-Prata P.»: in corso la realizzazione degli interventi di elettrificazione; 3° fase «Prata P.-Benevento»: in corso la progettazione di fattibilità tecnico-economica. Sulle tratte «Salerno-Mercato S.S.» e «Mercato S.S.-Avellino» è in corso lo studio di fattibilità tecnico-economico mirato all'individuazione degli interventi necessari per la riclassificazione della linea dall'attuale categoria A alla categoria C3 finalizzato al miglioramento delle prestazioni per l'esercizio al traffico merci.

L'intervento consentirà un aumento della velocità commerciale (con recupero dei tempi di percorrenza fino a 5' sulla tratta Salerno-Benevento) e l'incremento dei livelli di accessibilità al servizio ferroviario e regolarità della circolazione nonché il miglioramento delle prestazioni per il traffico merci. È infatti previsto l'upgrading dall'attuale categoria A alla categoria C3. L'intervento comporterà una riduzione dell'inquinamento ambientale e di emissioni. Inoltre, a completamento della metropolitana di Salerno (tratta Arechi-Pontecagnano Aeroporto), ci sarà la possibilità di estendere i servizi Salerno – Mercato S.S fino a Pontecagnano Aeroporto.



	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

Campania

Priorità programmatica

- Allegato MIMS al DEF
- Tavoli tecnici di ascolto
- Altri "Provvedimenti"
- Cofinanziamenti UE
- UE - workplan corridoi TEN-T
- AQ per l'utilizzo della capacità
- Fondo Sviluppo e Coesione
- Accordi EE.LL.
- Accordi Internazionali
- Interventi commissariati
- PNRR

- Coesione sociale e territoriale
- Accessibilità e qualità stazioni
- Resilienza al climate change
- Adeguamento a standard tecnici
- Sviluppo tecnologico
- Sistemi regionali e metropolitani
- Potenziamento connessioni merci
- Sviluppo corridoi TEN-T
- Completamento valichi alpini
- Alta Velocità (AV)

Intervento / Opere funzionali

Upgrade armamento linee Salerno - Mercato S.S. - Avellino -

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto I173: Elettrificazione, velocizzazione e ammodernamento linee Salerno - Mercato S.S. - Avellino - Benevento e tratta Mercato S.S. - Codola - Sarno

Benevento e tratta Mercato S.S. - Codola - Sarno

Elettrificazione, velocizzazione e ammodernamento linee Salerno - Mercato S.S. - Avellino - Benevento e tratta Mercato S.S. - Codola - Sarno	X	X		X		X				X
--	---	---	--	---	--	---	--	--	--	---

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
211,68	207,68	di cui:	33,00	0,68	0,00	0,00	0,00	174,00	4,00	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo							CdP-I agg.2025	Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari e allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze			
229,32	-18,00		-0,19	0,36		211,68		

Evoluzione coperture finanziarie							CdP-I agg.2025	Copertura appalto in corso per maggiori costi emersi nel corso della realizzazione e per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni			
218,32	-18,00			7,36		207,68		

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Elettrificazione, velocizzazione e ammodernamento linee Salerno - Mercato S.S. - Avellino - Benevento e tratta Mercato S.S. - Codola - Sarno	211,68	207,68	4,00	199,76	11,92	152,17	123,24	44,18	12,73	16,66	14,33	18,54	26,18	86,40
	211,68	207,68	4,00	199,76	11,92	152,17	123,24	44,18	12,73	16,66	14,33	18,54	18,83	86,40

CRONOPROGRAMMA														
CUP	Stato attuativo					Iter procedurale								
	Realizzazione	Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità		
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine			
Elettrificazione, velocizzazione e ammodernamento linee Salerno - Mercato S.S. - Avellino - Benevento e tratta Mercato S.S. - Codola - Sarno	Realizzazione	12-2023	-	-	-	-	-	-	-	6-2018	7-2018	6-2026	1-2027	

Tabella A05-Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali

Bacini Sud e isole

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede il recupero dell'ex-stazione ferroviaria di Taranto Nasisi sulla linea Taranto - Brindisi, prossima al quartiere Paolo VI di Taranto e la realizzazione di un terminal intermodale ferro-gomma con annessa area di parcheggio. Nell'ambito del progetto è prevista la progettazione e realizzazione dei seguenti interventi:- Opere Civili: realizzazione di un nuovo fabbricato viaggiatori dotato di aree di attesa; Costruzione di 2 marciapiedi h=55 e L 250 m con relative pensiline; Sottopasso viaggiatori per il collegamento tra il marciapiedi I e marciapiedi II; Area di interscambio ferro-gomma;- Tecnologie: modifica ed integrazione degli attuali apparati di sicurezza e segnalamento, per la configurazione al nuovo piano di stazione ed ai nuovi servizi; Integrazione con apparati di telecomunicazione e per il servizio informazione ai viaggiatori; - Armamento e Trazione Elettrica: realizzazione di 3 binari aventi modulo 250 m , di cui uno di corretto tracciato, uno di incrocio ed uno per l'attestamento del servizio, sono previsti itinerari contemporanei alla velocità di 60 KM/h; adeguamento dell'impianto di trazione elettrica per configurarlo al nuovo piano di stazione.

L'intervento si sviluppa nell'ambito del Comune di Taranto

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Aggiudicata la gara; in corso la progettazione esecutiva.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Nuova accessibilità al sistema ferroviario con la riattivazione della Località di Servizio ed il prolungamento sino a Nasisi dei servizi Bari – Taranto, così come previsto nell'AQ con Regione Puglia del 2021. Possibilità di interscambio modale tra il servizio ferroviario ed i servizi extra – urbani su gomma provenienti dalla Provincia di Taranto.



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	X
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Puglia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Nuova stazione Taranto Nasisi				X	X	X					X				X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto I174: Nuova stazione Taranto Nasisi

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatorie di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
34,12	34,12		19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
34,12						34,12

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
34,12						34,12

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Nuova stazione Taranto Nasisi	34,12	34,12	0,00	12,70	21,42	1,27	1,14	0,00	0,33	0,35	0,03	0,00	5,00	32,98
	34,12	34,12	0,00	12,70	21,42	1,27	1,14	0,00	0,33	0,35	0,03	0,00	0,42	32,98

CRONOPROGRAMMA														
CUP	Stato attuativo					Iter procedurale								
	Realizzazione	-	-	6-2020	11-2023	-	-	11-2023	12-2024	1-2025	12-2026	12-2026		
Nuova stazione Taranto Nasisi	J44C20000000001	Realizzazione	-	-	6-2020	11-2023	-	-	11-2023	12-2024	1-2025	12-2026	12-2026	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento prevede la realizzazione del completamento dell'attuale collegamento metropolitano a semplice binario in esercizio tra le stazioni di Salerno e Arechi.

Completamento metropolitana di Salerno:Il Completamento della metropolitana prevede un tracciato a semplice binario in affiancamento al binario dispari della linea a doppio binario Salerno – Battipaglia di estesa complessiva pari a 8,8 Km. Il tracciato ha inizio nella stazione di Arechi, punto terminale dell'attuale tratto in esercizio della metropolitana di Salerno , e termina nei pressi dell'aeroporto di Salerno Costa D'Amalfi (Pontecagnano Aeroporto).Fermata ASI: L'intervento prevede la realizzazione di una nuova fermata metropolitana di Salerno a servizio della zona Industriale del capoluogo di provincia. In particolare la nuova località di servizio sarà localizzata sul prolungamento della linea metropolitana che prevede l'estensione da Arechi fino all'aeroporto di Pontecagnano, attualmente in corso di progettazione.

Realizzazione di un nuovo tratto di linea ferroviaria a singolo binario di circa 8,8 km con la realizzazione di 3 nuove stazioni oltre all'adeguamento di quelle esistenti di Arechi e Pontecagnano ed all'implementazione dell'ACCM sull'intera tratta.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•Metro Salerno:A giugno 2024 sono state avviate le attività propedeutiche di bonifica ordigni esplosivi, successivamente nel settembre 2024 sono stati consegnati i lavori della cd Fase A relativa alla realizzazione dei primi ca 3 km di linea a partire dall' esistente stazione «Arechi», includendo quindi anche la realizzazione della “Fermata ASI Salerno”. Per quanto riguarda la cd Fase B, relativa alla realizzazione dei successivi ca 6 km di linea a partire da “Fermata ASI Salerno” e sino alla Stazione “Aeroporto”, è stata ultimata la progettazione esecutiva a cura dell'Appaltatore ed è in corso la verifica ed approvazione della stessa propedeutica all'avvio lavori. Da avviare inoltre la progettazione per le modifiche tecnologiche introdotte. •Fermata ASI:Lavori in corso.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Completamento metropolitana di Salerno:tratta Arechi – Pontecagnano AeroportoLa realizzazione del completamento della metropolitana di Salerno tratta Arechi – Pontecagnano Aeroporto è finalizzato al potenziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa nell'ambito dell'area urbana di Salerno, nell'ottica dell'aumento dell'offerta di servizi ferroviari metropolitani per il collegamento con i comuni dell'hinterland meridionale migliorando i collegamenti con l'ospedale, l'università, l'aeroporto, l'area industriale e riducendo il traffico veicolare privato.La nuova infrastruttura consentirà l'accesso ai servizi ferroviari ai territori compresi tra lo Stadio Arechi di Salerno e Pontecagnano Aeroporto (grazie alle nuove località di servizio intermedie) e l'Interscambio tra le linee Salerno-Arechi-Pontecagnano Aeroporto e Salerno- Battipaglia nelle stazioni di Pontecagnano e la futura stazione a servizio dell'Aeroporto.Inoltre, a completamento dell'elettificazione della direttrice Salerno – Mercato S.S, ci sarà la possibilità di estendere i servizi Salerno – Mercato S.S fino a Pontecagnano Aeroporto.Nuova stazione metropolitana «Zona Industriale»:La fermata avrà l'obiettivo di aumentare l'accessibilità all'infrastruttura ferroviaria a servizio dell'intera Zona industriale di Salerno e di favorire lo split modale verso i servizi su ferro contribuendo sia allo sviluppo della mobilità sostenibile sia a decongestionare l'area urbana di Salerno dal traffico veicolare.



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	X
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Campania

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto I177: Completamento metropolitana di Salerno: tratta stadio Arechi-Pontecagnano Aeroporto

	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																					
Completamento metropolitana di Salerno: tratta stadio Arechi-Pontecagnano Aeroporto	X				X																
ASI Salerno - nuova stazione metropolitana - "Zona Industriale"	X				X																

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatiche di breve			
									Priorità 1	Priorità 2		
314,75	314,75	249,87	0,00	0,00	0,00	64,88	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE												milioni di euro		
Evoluzione Costo														
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025								
314,75						314,75								

Evoluzione coperture finanziarie														
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025								
309,87			-100,00	4,88	100,00	314,75						Copertura appalto in corso per maggiori costi emersi ad esito della PE		

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Completamento metropolitana di Salerno: tratta stadio Arechi-Pontecagnano Aeroporto	297,87	297,87	0,00	230,24	67,63	215,81	10,68	0,46	1,92	0,74	1,22	9,19	5,46	282,63
ASI Salerno - nuova stazione metropolitana - "Zona Industriale"	16,88	16,88	0,00	15,69	1,19	11,88	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	5,00	16,01
	314,75	314,75	0,00	245,93	68,82	227,69	11,51	0,46	1,92	0,74	1,22	9,71	2,06	298,64

CRONOPROGRAMMA														
CUP		Stato attuativo	Iter procedurale											
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Completamento metropolitana di Salerno: tratta stadio Arechi-Pontecagnano Aeroporto	J44G19000010001	Realizzazione	4-2019	12-2019	12-2019	12-2022	-	-	-	-	-	-	3-2028	
ASI Salerno - nuova stazione metropolitana - "Zona Industriale"	J44G19000010001	Realizzazione	-	10-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	11-2026	

Programma P074: Ammodernamento e velocizzazione itinerari Palermo-Catania-Messina, Messina-Palermo e Messina-Siracusa
Tabella A05-Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali

Bacini Sud e isole

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma comprende interventi di upgrading tecnologico ed infrastrutturale degli assi Palermo-Messina, Palermo-Catania e Messina-Catania-Siracusa per migliorare la regolarità della circolazione, ottimizzando lo sfruttamento della capacità e conseguire, in sinergia con altri interventi in corso, significativi recuperi sui tempi di percorrenza. Gli interventi consistono in opere di velocizzazione e razionalizzazione su alcuni impianti delle tratte a semplice binario delle linee Palermo-Messina (tratta Pollina – Gioiosa Marea) e Messina-Catania-Siracusa (tratta Giampilieri – Giarre) attraverso: velocizzazione degli itinerari in alcune stazioni sedi di incrocio tramite: "deviate" di ingresso/uscita a 60 Km/h, "tronchini" di sicurezza, adeguamento marciapiedi e -realizzazione di sottopassaggi per il servizio viaggiatori e rampe inclinate per la clientela diversamente abile, con riduzione dei tempi di sosta e contemporaneità dei movimenti dei treni incrocianti sulle relazioni Palermo - Catania - Messina.-Interventi tecnologici per consentire il controllo telecomandato della circolazione.-rinnovo garitte di Blocco Automatico (BACC).

Gli interventi sono localizzati nelle stazioni oggetto di intervento di ammodernamento e velocizzazione

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Realizzate le seguenti opere: il sottopasso di Letojanni, il BACC Milazzo - Barcellona , i sottopassi nelle stazioni di Villarosa, S. Stefano, Tusa, Caronia e Pollina, le opere civili a Capo D'Orlando, dove sono stati installati gli ascensori, le modifiche al piano del ferro nella stazione di Tusa e Sant'Agata, i lavori alla TE a Sant'Agata, Tusa e Santo Stefano, i lavori di adeguamento degli impianti IS nelle località di Sant'Agata e Villarosa e riconfigurazione SCC a Sant'Agata e Santo Stefano. In corso il completamento dei lavori di adeguamento degli impianti IS nella località di Caltanissetta Xirbi, dove è stato attivato nel 2024 l'ACC. In corso la progettazione esecutiva per la realizzazione delle opere civili (sottopasso) nella stazione di Alcantara.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Recupero tempi di percorrenza nella relazioni Palermo – Catania fino a 3', Messina-Palermo fino a 5' e Messina-Siracusa fino a 5'. Incremento della regolarità della circolazione e degli standard di accessibilità al servizio ferroviario.



	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Sicilia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workshop corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Ammodernamento e velocizzazione itinerari Palermo-Catania-Messina, Messina-Palermo e Messina-Siracusa						X	X	X			X				X

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P074: Ammodernamento e velocizzazione itinerari Palermo-Catania-Messina, Messina-Palermo e Messina-Siracusa

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamente
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
53,00	53,00	di cui: 37,70	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
53,00						53,00

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
53,00						53,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Ammodernamento e velocizzazione itinerari Palermo-Catania-Messina, Messina-Palermo e Messina-Siracusa	53,00	53,00	0,00	50,32	2,68	48,54	45,21	13,97	5,14	6,12	6,53	8,49	11,28	7,74
	53,00	53,00	0,00	50,32	2,68	48,54	45,21	13,97	5,14	6,12	6,53	8,49	5,01	7,74

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Potenziamento e velocizzazione Messina - Palermo e Messina - Siracusa	J27112000190001	33,00	33,00	100%	28,76	87%	Realizzazione
Potenziamento e velocizzazione itinerario Palermo - Catania	J17112000380001	20,00	20,00	100%	16,90	84%	Realizzazione
Ammodernamento e velocizzazione itinerari Palermo-Catania-Messina, Messina-Palermo e Messina-Siracusa		53,00	53,00	100%	45,66	86%	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma prevede il potenziamento tecnologico ed infrastrutturale delle linee interessate dal traffico regionale. Gli interventi infrastrutturali tipicamente prevedono la velocizzazione degli itinerari deviati, le condizioni impiantistiche per la realizzazione dei movimenti contemporanei nelle sedi di incrocio sul semplice binario, la realizzazione di sottopassi e l'adeguamento dei marciapiedi. Dal punto di vista tecnologico generalmente è previsto il rinnovo del sistema di distanziamento, la realizzazione di nuovi apparati ed un nuovo sistema di supervisione e regolazione della circolazione e l'adeguamento dei sistemi di Informazione al Pubblico. E' prevista inoltre l'elettificazione di tratte a trazione diesel i, e interventi diffusi sulla sede e sulla sovrastruttura ferroviaria per omogeneizzare le caratteristiche prestazionali delle linee e gestire obsolescenza e punti singolari. Gli interventi, oltre che da necessità interne legate al miglioramento della gestione della circolazione ferroviaria, derivano dai Tavoli Tecnici di Ascolto che RFI ogni anno organizza con gli stakeholder, da Accordi/Protocolli sottoscritti con gli EE.LL., nonché dagli Accordi Quadro sottoscritti per l'allocazione della capacità.

Le principali realizzazioni riguardano: A) Metroferrovia di Ragusa B) Nuova fermata Acireale - Bellavista C) nuove fermate area sud e isole: progettazione nuove fermate Fontanelle. S.Michele, Carini RIMED e Aci Castello. D) Elettificazione del Bacino del Sulcis: linea Decimomannu - Villamassargia - Iglesias/Carbonia), in coerenza con quanto previsto nell'ambito dell'accordo quadro TPL sottoscritto tra RFI e Regione Sardegna. Progetto correlato al raddoppio della tratta Villamassargia – Decimomannu. Ulteriori interventi riguardano il miglioramento della dotazione infrastrutturale della rete ferroviaria della regione Sicilia.

Gli interventi interessano l'intero territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

A) Focus Metroferrovia di Ragusa Fase 1: è in corso la contrattualizzazione degli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e opere connesse nella stazione di Ragusa centrale. A seguito di varie procedure di gara andate deserte per le restanti opere è in corso una revisione progettuale per la pubblicazione del nuovo bando di gara; B) Focus Fermata Acireale Bellavista Aggiudicata la gara, attualmente è in corso la progettazione esecutiva. Fase 2: in corso la Progettazione Definitiva. C) in progettazione. D) Elettificazione del Bacino del Sulcis

Concluso il PFTE e inviato al CSLLPP In progettazione ulteriori interventi regione Sicilia.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

La realizzazione delle opere permetterà il conseguimento dei seguenti benefici: miglioramento dell'accessibilità al sistema ferroviario, con l'inserimento delle nuove fermate e la rifunzionalizzazione delle esistenti; conseguente maggiore competitività del trasporto ferroviario rispetto al trasporto collettivo su gomma; miglioramento del livello di connettività dell'offerta multimodale e del sistema complessivo di accessibilità al sistema ferroviario. Elettificazione bacino del Sulcis- Migliorare la performance dell'attuale collegamento ferroviario da Cagliari a Carbonia/Iglesias; -Sostenibilità ambientale: l'abbandono della trazione termica incrementa la sostenibilità ambientale, tramite la riduzione delle emissioni carboniche, e acustica del servizio ferroviario, derivante dalla sostituzione dei rotabili a carburante a favore degli elettrici. -Vantaggi derivanti dall'impiego dei treni elettrici che consentono maggiori prestazioni in termini di capacità di trazione, velocità e rendimenti energetici



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	X

LOCALIZZAZIONE

Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P201: Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini sud e isole

Calabria
Sicilia
Sardegna

INQUADRAMENTO STRATEGICO

	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																					
Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini sud e isole - interventi diffusi		X		X						X						X					
Nuove fermate e stazioni sud e isole							X									X					
Metroferrovia di Ragusa							X									X					
Fermata Acireale Bellavista							X									X					
Elettrificazione Olbia Aeroporto-Olbia-Golfo Aranci							X									X					
Elettrificazione linee Sulcis							X									X					

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
1.631,94	633,67	di cui:	406,19	2,03	15,59	28,45	97,39	84,03	60,00	231,00	707,27

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo							CdP-I agg.2025	Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari e allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati. Variazione di costo relativa ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (aggiunto CUP J74J23000740001 da riga
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze			
1.593,28	-8,44	47,00		0,10			1.631,94	
Evoluzione coperture finanziarie							CdP-I agg.2025	Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche); rimodulazione della copertura su interventi parzialmente finanziati a favore di ulteriori fabbisogni maggiormente prioritari (NA026, P249)
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni			
660,98	-8,44	2,00		0,10	-20,97		633,67	

PIANO DELLA SPESA

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Metroferrovia di Ragusa	37,90	37,90	0,00	35,02	2,88	1,75	1,40	0,00	0,01	0,95	0,16	0,00	5,00	36,49
Fermata Acireale Bellavista	8,57	8,57	0,00	8,24	0,33	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	8,57
Nuove fermate e stazioni sud e isole	12,50	12,50	0,00	11,82	0,68	0,64	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	5,00	11,89
Elettrificazione linee Sulcis	87,00	0,70	86,30	83,77	3,23	0,60	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	5,00	86,40

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025														
Programma P201: Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini sud e isole														
Elettrificazione Olbia Aeroporto-Olbia-Golfo Aranci	47,00	2,00	45,00	39,03	7,97	1,39	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	46,45
Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini sud e isole - interventi diffusi	1.438,97	572,00	866,97	418,46	1.020,51	427,37	390,84	282,45	16,30	20,71	40,23	19,11	53,53	1.045,57
	1.631,94	633,67	998,27	596,34	1.035,60	436,39	393,99	282,45	16,31	21,66	40,39	19,86	15,88	1.235,38
AVANZAMENTO PROGRAMMA			CUP rif.		Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo				
Metroferrovia Ragusa			J44H20001660009		37,90	37,90	100%	1,41	4%	Realizzazione				
Metroferrovia di Ragusa					37,90	37,90	100%	1,41	4%					
Nuova fermata Acireale - Bellavista			J61J20000180008		8,57	8,57	100%	0,00	0%	Progettazione				
Fermata Acireale Bellavista					8,57	8,57	100%	0,00	0%					
Nuove fermate e stazioni area Centro Sud			J91G22000030001		12,50	12,50	100%	0,62	5%	Realizzazione				
Nuove fermate e stazioni sud e isole					12,50	12,50	100%	0,62	5%					
Progettazione elettrificazione del bacino del Sulcis			J74E21001680008		87,00	0,70	1%	0,60	85%	Progettazione				
Elettrificazione linee Sulcis					87,00	0,70	1%	0,60	85%					
Elettrificazione della tratta Olbia Aeroporto-Golfo Aranci			J74J23000740001		47,00	2,00	4%	0,56	28%	Progettazione				
Elettrificazione Olbia Aeroporto-Olbia-Golfo Aranci					47,00	2,00	4%	0,56	28%					
Upgrading bacini sud e isole					945,70	78,96	8%	0,00	0%	Progettazione				
PA - Interventi diffusi di potenziamento tecnologico ed infrastrutturale linee regionali			J66J17000390001		132,69	132,69	100%	101,02	76%	Realizzazione				
Progettazione e realizzazione SCC Bari-Lecce			J97I07000010001		78,58	78,58	100%	76,94	98%	In ultimazione				
Interventi diffusi convenzione con Regione Calabria			J91J05000030002		55,40	55,40	100%	49,05	89%	Realizzazione				
NA - upgrading linee viaggiatori			J97I17000080001		39,50	39,50	100%	23,26	59%	Realizzazione				
Scc nodo di Palermo			J77I07000030001		38,50	38,50	100%	34,51	90%	Realizzazione				
Progettazione e realizzazione SCC Fiumetorto-Messina			J67I07000030001		37,18	37,18	100%	37,15	100%	In ultimazione				
RC - upgrading linee viaggiatori			J27I17000050001		27,73	27,63	100%	18,06	65%	Realizzazione				
Upgrading linea Adriatica. Ulteriori interventi BA			J87J18000260001		23,00	23,00	100%	22,94	100%	In ultimazione				
Interventi diffusi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico ambito Regione Abruzzo			J87J18000690001		14,00	14,00	100%	14,00	100%	In ultimazione				
Upgrade tecnologico dell'impianto di Paduli			J56E20000020001		10,00	10,00	100%	1,96	20%	Realizzazione				
Interventi di Miglioramento Infra. BA			J34J24000410001		10,00	10,00	100%	0,00	0%	Progettazione				
Ripristino itinerario merci Napoli - Bari (a Foggia)			J27I12000220001		10,00	10,00	100%	9,57	96%	In ultimazione				
Upgrade prestazionale rete Sarda			J74J23000650001		5,20	5,20	100%	3,25	63%	Realizzazione				
Miglioramenti infrastrutturali Potenziamento Napoli			J97J18000370001		5,16	5,03	98%	5,01	100%	In ultimazione				
Liberazione immobili - BA			J87B17000440001		2,38	2,38	100%	2,26	95%	In ultimazione				
Liberazione immobili - RC			J27B14000100005		1,34	1,34	100%	1,31	98%	In ultimazione				
Liberazione immobili - RC			J27B17000160001		1,16	1,16	100%	1,02	88%	Realizzazione				
Liberazione immobili - NA			J97B16000320001		1,00	1,00	100%	0,90	90%	In ultimazione				
CA - upgrading linee viaggiatori			J74E21001890001		0,30	0,30	100%	0,30	100%	In ultimazione				
Realizzazione della nuova fermata Santa Maria di Settimo sulla linea Paola - Cosenza			J54E21003570001		0,15	0,15	100%	0,11	75%	Realizzazione				
Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini sud e isole - interventi diffusi					1.438,97	572,00	40%	402,63	70%					

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento consiste nella realizzazione di un nodo di interscambio tra la ferrovia RFI Napoli – Salerno (via Nocera Inferiore) e la linea Napoli – Sorrento gestita da EAV (Ex-Circumvesuviana) in corrispondenza del sito UNESCO di Pompei, in prossimità dell'uscita di Pompei Ovest dell'autostrada A3 Napoli-Salerno e facilmente accessibile anche dalla S.S. 18, costituendo un nodo strategico per l'accessibilità alla rete TPL per i comuni di Pompei, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Le opere consistono nella realizzazione di una nuova fermata sulla linea RFI, di un nuovo fabbricato viaggiatori (con riutilizzo dei manufatti di elevato pregio artistico della ex fermata Pompei Scavi costruiti prima del 1844) e di un percorso pedonale di interscambio tra la nuova fermata RFI e la fermata esistente EAV Villa dei Misteri attraverso una passerella pedonale sopraelevata. Sono previsti inoltre, interventi sulle viabilità di accesso alla nuova fermata e la realizzazione di un cavalcavia ferroviario ad est della Fermata.

L'intervento prevede la realizzazione della nuova fermata di Pompei, che ha l'obiettivo di migliorare l'accessibilità e l'interscambio tra i diversi trasporti ferroviari, con ricadute sul territorio circostante, come la creazione di un parco urbano e di un nuovo parcheggio di interscambio.

Gli interventi interessano il Comune di Pompei, Regione Campania


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Verifica di assoggettabilità a VIA completata Completata la Conferenza dei Servizi ai sensi della 383/94 sulla base del Progetto Definitivo Gara di prossimo avvio

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

La realizzazione dell'intervento comporterà una razionale organizzazione dei flussi di mobilità dell'area vesuviana costiera, integrando e completando gli altri interventi programmati e in parte realizzati sul territorio. - Miglioramento dell'accessibilità da/per l'area archeologica organizzazione dei flussi di mobilità dell'area vesuviana costiera che consentirà l'accrescimento del bacino di utenza per l'area degli scavi con sistemi di trasporto sostenibili. miglioramento dell'accessibilità viaria e ciclopedonale all'area del Parco Archeologico, consentendo l'incremento della competitività del trasporto ferroviario. - Possibilità di nuovi servizi per connettere l'area Archeologica di Pompei. - Miglioramento di interscambio tra servizi su linea gestita da Rfi e linea gestita da EAV- Miglioramento dello scambio intermodale con servizi su gomma.

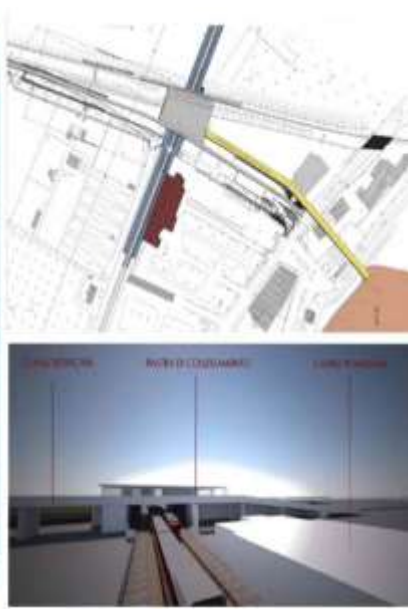

	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	X
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Campania

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Allegato MIMS al DEF
Tavoli tecnici di ascolto
Altri Provvedimenti*
Cofinanziamenti UE
UE - workplan corridoi TEN-T
AQ per l'utilizzo della capacità
Fondo Sviluppo e Coesione
Accordi EE.LL.
Accordi Internazionali
Interventi commissariati
PNRR

Obiettivi strategici

Coesione sociale e territoriale
Accessibilità e qualità stazioni
Resilienza al climate change
Adeguamento a standard tecnici
Sviluppo tecnologico
Sistemi regionali e metropolitani
Potenziamento connessioni merci
Sviluppo corridoi TEN-T
Completamento valichi alpini
Alta Velocità (AV)

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P211: Nodo complesso di Pompei

Nodo complesso di Pompei	X	X	X
--------------------------	---	---	---

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatorie di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2		
40,00	40,00	di cui:	9,40	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
40,00						40,00

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
40,00						40,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Nodo complesso di Pompei	40,00	40,00	0,00	22,68	17,32	27,50	2,01	0,00	0,30	0,69	0,20	0,01	5,00	38,47
	40,00	40,00	0,00	22,68	17,32	27,50	2,01	0,00	0,30	0,69	0,20	0,01	0,33	38,47

CRONOPROGRAMMA														
CUP					Iter procedurale									
					Stato attuativo									
					Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione	
					Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
Nodo complesso di Pompei					J64C19000300001	Realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-

Progetto P230: Stazione AV Foggia Cervaro

Tabella A05-Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali

Bacini Sud e isole

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

La Fermata AV «Foggia Cervaro» sarà ubicata al km 4+000 della linea Foggia - Potenza/Napoli, nell'area sud-orientale della città, all'interno dell'anello stradale previsto dal PUMS di Foggia. Essa consentirà ai treni AV provenienti dalla Puglia e diretti a Napoli/Roma di servire il capoluogo senza effettuare il movimento di regresso obbligatorio per layout del piano del ferro della stazione di Foggia. Nell'ambito del progetto è prevista la realizzazione di tronchini di attestamento dei treni regionali nella stazione di Cervaro. La nuova località di Foggia Cervaro comporterà un guadagno nei tempi di percorrenza e una liberazione dei binari di Foggia dal traffico AV, aspetti entrambi significativi se si considera la rilevanza dei lavori di velocizzazione dell'itinerario Bari – Napoli e dei successivi incrementi dei servizi previsti. Con la nuova fermata è infatti previsto un incremento dei collegamenti di lungo percorso tra la Puglia e Napoli/Roma, oltreché nuovi servizi regionali Foggia – Napoli e servizi da/per il Gargano. Questi ultimi saranno funzionali specificamente al collegamento di Foggia con la nuova fermata e verranno attestati sui due nuovi binari tronchi di cui verrà dotata la stazione di Cervaro, come opera complementare al progetto della fermata. Prevista una seconda fase con la trasformazione della fermata in stazione AV.

Il territorio dove si realizza l'opera è prevalentemente pianeggiante ed è ubicato all'interno del tessuto urbano della città di Foggia in località Cervaro.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

«Fermata AV Foggia Cervaro»: in corso la progettazione esecutiva; «Trasformazione della fermata in stazione AV Foggia Cervaro»: concluso la PFTE; l'iter autorizzativo sarà avviato previa copertura finanziaria dell'intervento.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

• Possibilità per i servizi di Lungo Percorso di servire l'area foggiana senza effettuare il movimento di regresso obbligatorio presso la stazione esistente e, grazie anche alla bretella di Foggia attivata nel 2015. • Liberazione di capacità presso la stazione di Foggia. • Possibilità di integrazione dei servizi regionali dell'area foggiana con i servizi AV Bari/Lecce – Napoli/Roma, come prospettato nell'AQ con Regione Puglia del 2021.

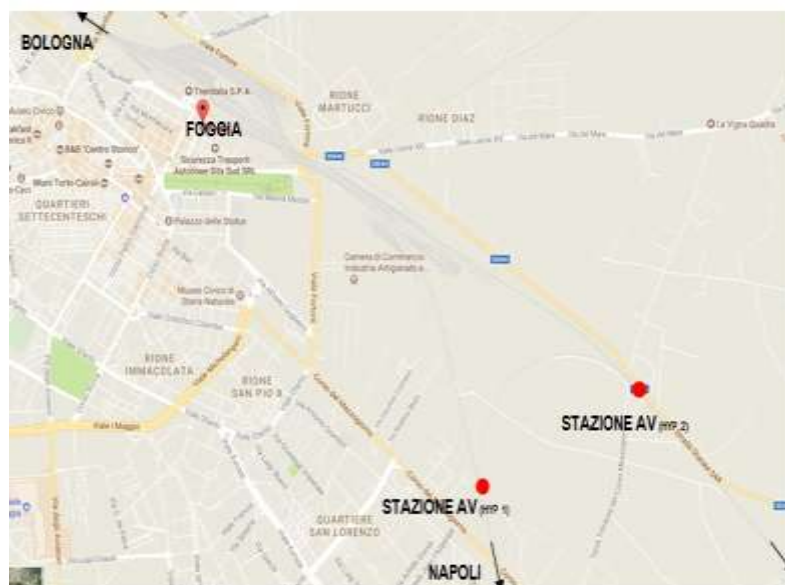

	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	X
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Puglia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Stazione AV Foggia Cervaro							X				X				X

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P230: Stazione AV Foggia Cervaro

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
99,23	48,04		27,23	0,00	20,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	51,19

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						CdP-I agg.2025	Variazione del costo ad esito dell'aggiornamento del quadro economico con le nuove tariffe.
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze		
94,60			4,63				

Evoluzione coperture finanziarie						CdP-I agg.2025
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	
48,04						

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV				Produzione					Oltre
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Stazione AV Foggia Cervaro	99,23	48,04	51,19	89,78	9,45	5,59	2,40	0,00	0,11	1,05	0,64	0,04	5,00	96,59	
	99,23	48,04	51,19	89,78	9,45	5,59	2,40	0,00	0,11	1,05	0,64	0,04	0,80	96,59	

CRONOPROGRAMMA

	CUP	Stato attuativo	Iter procedurale										
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione	Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
Stazione AV Foggia Cervaro	J24C20000000009	Realizzazione	5-2020	4-2027	2-2021	4-2027	1-2025	4-2027	10-2023	12-2024	4-2021	9-2026	3-2027

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi consistono nella ricostruzione del viadotto al km 326+645 (oggetto di crollo e demolizione) e consolidamento di ulteriori 12 viadotti, interventi su opere d'arte minori e gallerie con miglioramento sicurezza, messa a norma stazione di Niscemi, interventi di ripristino agli impianti ferroviari.

L'intervento è suddiviso in due fasi:-Lotto 1 «Caltagirone – Niscemi»;-Lotto 2 «Niscemi – Gela».

L'intervento di ripristino della linea ferroviaria compresa tra Caltagirone e Gela ripercorre lo stesso tracciato attuale. Si sviluppa nei territori provinciali di Catania e Caltanissetta. L'orografia è di tipo collinare.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Lotto 1 Caltagirone-Niscemi, in corso i lavori:a) per la ricostruzione del viadotto al km 326+645;b) per il consolidamento dei 5 viadotti;c) per il consolidamento della sede e di ripristino delle opere civili.Lotto 2 Niscemi-Gela: in corso l'iter autorizzativo sul PFTE e la progettazione per gara.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

•Gli interventi creano le condizioni per il ripristino del servizio commerciale sulla tratta Caltagirone – Gela (4 treni/h);•Collegamento del bacino di Gela e Caltagirone con il nodo di Catania;•A completamento del lotto 1, con la riattivazione dell'impianto di Niscemi, si creeranno le condizioni per il prolungamento fino a tale località dei servizi attualmente attestati a Caltagirone.



	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Sicilia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Ripristino linea Caltagirone - Gela	X	X			X																X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
397,20	290,51	di cui:	110,19	0,09	90,00	90,23	0,00	0,00	0,00	1,59	105,10

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P232: Ripristino linea Caltagirone - Gela

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
348,70			48,41	0,09		397,20	L'incremento di costo è dovuto principalmente all'adeguamento del valore opere a seguito delle progettazioni e all'adeguamento tariffe per gli interventi di attrezzaggio della sede ferroviaria della tratta Caltagirone-Niscemi. Si registra, inoltre, una variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari.

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
290,42				0,09		290,51	Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Ripristino linea Caltagirone - Gela	397,20	290,51	106,69	245,48	151,72	109,49	6,23	2,09	0,43	0,68	0,34	1,09	6,55	389,25
	397,20	290,51	106,69	245,48	151,72	109,49	6,23	2,09	0,43	0,68	0,34	1,09	3,32	389,25

CRONOPROGRAMMA

	CUP	Stato attuativo	Iter procedurale										
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
Ripristino linea Caltagirone - Gela	J64G18000140001	Realizzazione	5-2020	11-2025	12-2018	12-2020	-	-	-	-	-	-	7-2029

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede la realizzazione delle opere necessarie all'elettificazione della linea Palermo – Trapani via Milo, nella tratta tra Cinisi e Trapani, per una lunghezza complessiva di circa 87 Km. L'intervento prevede la realizzazione di 4 nuove Sottostazioni Elettriche localizzate nelle località di Partinico, Alcamo D.ne, Bruca e Milo, nonché una cabina TE in corrispondenza di Piraineto, posta a 5 Km dalla SSE esistente di Carini funzionale alla diramazione della linea dal Passante ferroviario di Palermo già in esercizio.

Gli interventi previsti si effettuano sulla linea ferroviaria esistente che attraversa l'area occidentale della Regione Sicilia

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

In corso la realizzazione dei blocchi di fondazione lungo linea e avviate le attività preliminari per la realizzazione delle sottostazioni elettriche (SSE) di Alcamo e Partinico. Sono in elaborazione i progetti di dettaglio riguardanti: l'abbassamento del piano del ferro nelle gallerie Spadafora e Straccia, l'attraversamento della linea di contatto in corrispondenza dei cavalcaferrovia e il risanamento della galleria Straccia. Relativamente alla connessione alla rete elettrica delle sottostazioni di Alcamo e Bruca, sono in corso le CdS a cura dell'Ente Erogatore, mentre per Partinico è stata accettata la soluzione tecnica minima di dettaglio per la realizzazione della connessione all'elettrodotto.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

•Migliorare la performance dell'attuale collegamento ferroviario da Palermo a Trapani; •L'abbandono della trazione termica incrementa la sostenibilità ambientale e acustica del servizio ferroviario, derivante dalla sostituzione dei rotabili a carburante a favore degli elettrici.



Capacità	
Velocità	X
Accessibilità	
Regolarità	
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	X
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Sicilia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Elettificazione Cinisi-Alcamo Dir- Trapani	X	X					X			X				X	

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
102,25	102,25	di cui: 69,14	0,00	0,00	33,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P236: Elettrificazione della tratta Cinisi-Alcamo Dir- Trapani della linea Palermo - Trapani " via Milo"

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE milioni di euro

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
102,25						102,25

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
102,25						102,25

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Elettrificazione Cinisi-Alcamo Dir- Trapani	102,25	102,25	0,00	84,02	18,23	51,00	9,82	0,00	0,75	0,06	0,29	0,30	5,00	92,59
	102,25	102,25	0,00	84,02	18,23	51,00	9,82	0,00	0,75	0,06	0,29	0,30	8,26	92,59

CRONOPROGRAMMA

CUP	Stato attuativo		Iter procedurale										
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Nego.		Esecuzione		Funzionalità
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
Elettrificazione Cinisi-Alcamo Dir- Trapani	J64C20002310001	Realizzazione	-	-	-	-	-	-	12-2022	8-2023	6-2023	12-2028	5-2029

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede la velocizzazione e l'elettrificazione della trasversale molisana tra Roccaravindola/Venafrò e Matrice ed è articolato nelle seguenti fasi: Fase 1: Elettrificazione della tratta Roccaravindola – Isernia. L'intervento comprende anche la nuova sottostazione elettrica di Pettoranello, il potenziamento tecnologico con upgrade del sistema di Protezione della Marcia Treno (SCMT) e il PRG della stazione di Isernia con attivazione di un nuovo ACC; Fase 2 + 3: Elettrificazione della tratta Isernia – Campobasso. L'intervento comprende il rinnovo del binario con contestuale risanamento della massicciata tra fino a Matrice. Modifiche al piano regolatore generale delle stazioni di Campobasso, Vinchiaturò, Baranello e Carpinone. Upgrade tecnologico con nuovi apparati centrali computerizzati nelle stazioni di Carpinone e Campobasso e realizzazione di nuove sottostazioni elettriche, a Guardiaregia, Pettoranello, Ripalimosani, per garantire la disponibilità energetica necessaria alla regolare circolazione dei treni elettrici.

Fase 1: Elettrificazione della tratta Roccaravindola – Isernia. L'intervento comprende anche la nuova sottostazione elettrica di Pettoranello, il potenziamento tecnologico con upgrade del sistema di Protezione della Marcia Treno (SCMT) e il PRG della stazione di Isernia con attivazione di un nuovo ACC; Fase 2 + 3: Elettrificazione della tratta Isernia – Campobasso. L'intervento comprende il rinnovo del binario con contestuale risanamento della massicciata tra fino a Matrice. Modifiche al piano regolatore generale delle stazioni di Campobasso, Vinchiaturò, Baranello e Carpinone. Upgrade tecnologico con nuovi apparati centrali computerizzati nelle stazioni di Carpinone e Campobasso e realizzazione di nuove sottostazioni elettriche, a Guardiaregia, Pettoranello, Ripalimosani, per garantire la disponibilità energetica necessaria alla regolare circolazione dei treni elettrici.

Molise

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Fase 1: •Tratta Roccaravindola-Isernia (17 km): interrotta da giugno 2020. L'attivazione dell'elettrificazione è avvenuta a dicembre 2023 con circolazione dei primi servizi commerciali con materiale rotabile a trazione elettrica a partire dallo scorso 10 febbraio 2024. Inoltre, è stato attivato il nuovo apparato centrale computerizzato di Isernia con contestuali interventi di piano regolatore generale. Fase 2 + 3: •Isernia-Guardiaregia (36 km) attivazione dell'elettrificazione a ottobre 2025 se confermata risoluzione interferenze di ENEL nei tempi concordati (Lavori RFI conto TE ultimati. In corso predisposizione documentazione di richiesta AMIS verso ANSFISA da emettere entro giugno. Attivazione eseguibile a seguito risoluzione interferenza ENEL); •Tratta Guardiaregia-Vinchiaturò (9 km): interrotta da giugno 2020 con attivazione dell'elettrificazione a Fine lavori Giugno 2026-Attivazione tra marzo e giugno 2027; •Tratta Vinchiaturò-Campobasso (14 Km): interrotta da giugno 2020 con attivazione dell'elettrificazione entro il 2028; •Campobasso-Matrice (10 km) con attivazione dell'elettrificazione entro Fine lavori Giugno 2026- Attivazione tra marzo e giugno 2027; •Tratta Termoli-Ururi (20,0 km): intervento di rinnovo binario con previsione di fine lavori a Giugno 2026;

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Il Progetto prevede di elettrificare e velocizzare la tratta Roccaravindola - Isernia – Campobasso -Matrice al fine di incrementare la velocità commerciale e potenziare l'offerta di servizi ferroviari regionali per il collegamento reciproco delle due Province, oltre che a ridurre l'inquinamento ambientale e le emissioni.



	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Molise

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P246: Potenziamento Venafro - Campobasso - Matrice

	PNRR	Accordi Internazionali Interventi commissariati	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF		Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																					
Potenziamento Venafro - Campobasso - Matrice 1^ fase	X		X	X	X											X					
Potenziamento Venafro - Campobasso - Matrice 2^ fase	X															X					

QUADRO FINANZIARIO												milioni di euro		
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento			
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2				
393,62	393,62	di cui:	115,00	3,62	50,00	210,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00			

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
293,34			100,00	0,28		393,62	Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari e ad adeguamenti emersi in sede realizzativa a causa di eventi di forza maggiore.

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
293,34				100,28		393,62	Copertura dei fabbisogni indifferibili connessi ad un incremento di costo derivanti da fenomeni non prevedibili di cause di forza maggiore. Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Potenziamento Venafrò - Campobasso - Matrice 1^ fase	143,46	143,46	0,00	133,01	10,45	135,24	115,11	1,87	10,00	27,19	35,15	33,44	6,87	20,78
Potenziamento Venafrò - Campobasso - Matrice 2^ fase	250,16	250,16	0,00	143,05	107,11	133,22	58,20	0,00	0,00	0,00	4,04	12,93	5,00	189,24
	393,62	393,62	0,00	276,06	117,56	268,47	173,32	1,87	10,00	27,19	39,19	46,36	59,00	210,02

CRONOPROGRAMMA														
CUP	Stato attuativo					Iter procedurale								
	Realizzazione	-	-	-	-	Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione
						Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	
Potenziamento Venafro - Campobasso - Matrice 1^ fase	J14F18000000001	Realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6-2023	3-2019	3-2027
Potenziamento Venafro - Campobasso - Matrice 2^ fase	J14E22000020001	Realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	7-2020	10-2024	5-2020	3-2026	-

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

La linea Palermo-Agrigento è stata oggetto di investimenti per incrementare la velocità massima e ridurre i tempi di percorrenza. Inoltre, nell'ambito del nuovo collegamento Palermo-Catania è prevista la realizzazione di un nuovo tracciato ferroviario tra Fiumetorto e Lercara. L'investimento in questione sulla tratta Lercara Diramazione – Agrigento centrale si propone di ottimizzare gli interventi pregressi e di sviluppare le migliori sinergie con quelli in corso, intervenendo sulle performance delle opere d'arte e del sedime, al fine di rendere coerenti le prestazioni dell'infrastruttura con il piano di sviluppo dei servizi ferroviari, consentendo pertanto una maggiore capacità di trasporto e maggiore competitività rispetto ad altri vettori. La linea Agrigento Bassa-Porto Empedocle, a semplice binario, è sospesa all'esercizio commerciale ed impegnata da treni turistici essendo stata inserita dalla Legge n.128 del 9 agosto 2017 tra le tratte ferroviarie nazionali ad uso turistico. L'investimento in esame comprende interventi multidisciplinari di mantenimento/potenziamento dell'infrastruttura finalizzati alla ripresa dell'offerta commerciale.

È stata proposta la suddivisione dell'intervento in due fasi funzionali: Una prima fase, per un importo di circa € 40 Mln propedeutici all'attivazione commerciale della linea Agrigento Bassa – Porto Empedocle, la quale rimarrà all'interno del perimetro PNRR; Una seconda fase, per la quota parte restante pari a € 60 Mln, propedeutici alla riclassificazione a categoria C3 della linea Palermo – Agrigento C.le, la quale potrebbe necessitare di copertura da altre fonti di finanziamento.

Sicilia

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Tratta Agrigento Bassa – Porto Empedocle: Completati gli interventi di manutenzione straordinaria di alcune gallerie della linea Agrigento Bassa – Porto Empedocle. Completati i lavori di rinnovo binario e risanamento massicciata sulla tratta Agrigento Bassa – Porto Empedocle e di rinnovo deviatoi nella stazione di Porto Empedocle. Attivato il nuovo piano regolatore generale di Agrigento Centrale ed eseguiti lavori di rinnovo deviatoi e binari di Agrigento Bassa. Completati i lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento degli impianti di trazione elettrica in occasione dei lavori di armamento nelle stazioni interessate. Sono in corso i lavori TE a seguito del completamento del PRG di Agrigento Centrale. In fase di avvio le attività per manutenzione straordinaria ed upgrade impianti di segnalamento. Tratta Palermo – Agrigento C.le: Completate le indagini sulle opere d'arte ed i rilevati della Lercara – Agrigento Centrale. In fase di esecuzione le verifiche a seguito delle indagini. Completata la ricostruzione di alcuni rilevati e di alcune opere d'arte che non hanno superato le verifiche. Procedono le attività di ricostruzione di alcuni rilevati e di sostituzione/manutenzione straordinaria delle opere d'arte con verifiche con esito negativo.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

•Aumentare la competitività del vettore ferroviario e incrementare l'offerta di trasporto; •incremento prestazionale della tratta Lercara Dir. ed Agrigento è coerente con l'intervento di raddoppio del tratto Fiumetorto-Lercara Dir. nell'ambito del progetto di realizzazione della nuova linea veloce Palermo-Catania, che consente di aumentare la capacità dell'infrastruttura con sensibile diminuzione dei tempi di percorrenza; •miglioramento delle caratteristiche della linea in termini di codifica di massa assiale consentiranno la circolazione di nuove tipologie di materiale rotabile, a beneficio del comfort e della capacità di trasporto.



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	X
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Sicilia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P247: Potenziamento Palermo - Agrigento - Porto Empedocle bassa

	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR		Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																						
Potenziamento Palermo - Agrigento - Porto Empedocle bassa	x									X							X					

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2			
103,00	103,00	di cui:	0,00	3,00	0,00	40,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE									
Evoluzione Costo									
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025			
100,00			3,00			103,00	Variazione di costo imputabile al proseguimento delle attività sulla linea.		
Evoluzione coperture finanziarie									
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025			
40,00				63,00		103,00	Copertura fabbisogni con risorse PR FESR Sicilia 2021-2027; ulteriore incremento di risorse previsto da Legge di Bilancio 2025.		

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione					
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	AI 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Potenziamento Palermo - Agrigento - Porto Empedocle bassa	103,00	103,00	0,00	59,49	43,51	56,36	41,15	0,00	0,00	0,00	5,95	15,98	5,00
	103,00	103,00	0,00	59,49	43,51	56,36	41,15	0,00	0,00	0,00	5,95	15,98	17,73

CRONOPROGRAMMA													
CUP	Stato attuativo				Iter procedurale								
	Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità		
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine			
Potenziamento Palermo - Agrigento - Porto Empedocle bassa	J64E22000010001	Realizzazione	-	-	-	-	-	-	10-2017	2-2026	1-2022	6-2026	-

Progetto P248: Raddoppio Decimomannu-Villamassargia

Bacini Sud e isole

Il raddoppio della tratta Decimomannu – Villamassargia, sulla quale confluiscono i servizi Cagliari-Iglesias e Cagliari-Carbonia, previsto anche nell'ambito dell'Accordo Quadro TPL tra RFI e Regione Sardegna, si estende per circa 30 km e prevede la realizzazione del raddoppio di binario tra le due località di servizio e la soppressione dei passaggi a livello esistenti. La linea sarà caratterizzata da un sistema di esercizio in telecomando con tecnologia di tipo SCC-M/ACCM e sistema di informazione al pubblico I&C.

Sardegna

attualità dati: 30/06/2025

•Lotto 1: Raddoppio Decimoma-Villaspeciosa:In corso approfondimenti sul parere rilasciato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici sul PFTE. •Lotto 2 PC Polveriera-Villa Speciosa:In corso la progettazione esecutiva •Lotti 3-4: Radd. PC Polveriera-Villamassargia:in corso il PFTE.

Gli interventi permetteranno di incrementare la capacità dell'infrastruttura creando le condizioni per un potenziamento del servizio ferroviario sulle relazioni Cagliari – Carbonia/Iglesias, in coerenza con quanto sottoscritto nell'ambito dell'Accordo Quadro per i servizi TPL con Regione Sardegna. In particolare il completamento del raddoppio crea le condizioni infrastrutturali per l'incremento della frequenza dei servizi da/per il Sulcis, con obiettivo di cadenzamento a 30' lungo le relazioni Cagliari – Iglesias/Carbonia con una frequenza a 15' nella stazione di Villamassargia. In aggiunta, l'opera consente il consolidamento e l'incremento dello shift modale sia degli spostamenti sistematici, tenuto conto dell'elevato carattere di pendolarismo sulla relazione (bacino di utenza pari a ca. 200.000 persone), nonché degli spostamenti di carattere turistico, tenuto conto dell'elevata valenza territoriale della costa (ca. 850.000 presenze nel 2019) e di altri poli attrattori (es. archeologia industriale locale) ad alto potenziale turistico inespresso. Il progetto crea altresì le condizioni per l'incremento dei livelli qualitativi del servizio e di regolarità, anche in relazione alla soppressione di tutti i PL presenti sulla linea. Il completamento del raddoppio crea le condizioni infrastrutturali per l'incremento della frequenza dei servizi da/per il Sulcis, con obiettivo di cadenzamento a 30' lungo la relazione Cagliari-Iglesias/Carbonia e una frequenza a 15' nella stazione di Villamassargia.



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

Sardegna

Coesione sociale e territoriale Accessibilità e qualità stazioni Resilienza al climate change Adeguamento a standard tecnici Sviluppo tecnologico Sistemi regionali e metropolitani Potenziamento connessioni merci Sviluppo corridoi TEN-T Completamento valichi alpini Alta Velocità (AV)	X
Allegato MMS al DEF Tavoli tecnici di ascolto Altri Provvedimenti* Cofinanziamenti UE UE - workplan corridoi TEN-T AQ per l'utilizzo della capacità Fondo Sviluppo e Coesione Accordi EE.LL. Accordi internazionali Interventi commissariati PNRR	x
Intervento / Opere funzionali	X
Raddoppio Decimomannu-Villamassargia Lotto 2 Villa Speciosa-Polveriera	X

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P248: Raddoppio Decimomannu-Villamassargia

Raddoppio Decimomannu-Villamassargia Lotti 3-4 Polveriera-Villamassargia	x	X
Raddoppio Decimomannu-Villamassargia Lotto 1 Decimomannu-Villa Speciosa	x	X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Totale Risorse	Sezione 1 - Opere in corso finanziate							Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
		di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
949,00	137,00		55,10	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
992,00			-43,00			949,00
						Variazione di costo dovuta all'esito dello sviluppo del PFTE per gara che ha previsto un contenimento dei costi della tratta, senza variare né il perimetro, né la tipologia delle opere da realizzare.

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
210,00					-73,00	137,00
						Rimodulazione della copertura su interventi parzialmente finanziati a favore di ulteriori fabbisogni maggiormente prioritari

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico			OGV		Produzione								
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Decimomannu-Villamassargia Lotto 2 Villa Speciosa-Polveriera	91,00	91,00	0,00	16,54	74,46	9,72	2,47	0,00	0,00	0,01	1,18	1,39	5,00	87,46
Raddoppio Decimomannu-Villamassargia Lotti 3-4 Polveriera-Villamassargia	573,00	0,00	573,00	555,23	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	573,00
Raddoppio Decimomannu-Villamassargia Lotto 1 Decimomannu-Villa Speciosa	285,00	46,00	239,00	273,56	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	285,00
	949,00	137,00	812,00	845,33	103,67	9,72	2,47	0,00	0,00	0,01	1,18	1,39	0,97	945,46

CRONOPROGRAMMA														
CUP		Stato attuativo				Iter procedurale								
		Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità		
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	
Raddoppio Decimomannu-Villamassargia Lotto 2 Villa Speciosa-Polveriera	J74E21000940009	Attività negoziali	8-2021	4-2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Raddoppio Decimomannu-Villamassargia Lotti 3-4 Polveriera-Villamassargia	J74E21000940009	Valutazione di fattibilità alternative progettuali	-	-	-	-	-	-	-	3-2028	2-2031	12-2030		
Raddoppio Decimomannu-Villamassargia Lotto 1 Decimomannu-Villa Speciosa	J74E21000940009	Progettazione	-	5-2026	-	-	-	-	5-2026	3-2027	3-2027	8-2029	8-2028	

Tabella A05-Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali

Bacini Sud e isole

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento prevede la realizzazione di una variante di tracciato della linea Messina-Siracusa, in prossimità della città di Augusta, e di una nuova stazione ubicata fuori dal centro abitato ma in zona di nuova espansione.

La stazione di Augusta è posizionata sulla direttrice ferroviaria che collega tra di loro i due capoluoghi di Catania e Siracusa. Il tracciato della linea in corrispondenza dell'attraversamento del territorio comunale augustano è formato da una serie di curve e controcurve che hanno permesso di avvicinare la ferrovia al nucleo storico della città, costituito dall'Isola delle Palme, prima isola minore della Sicilia per numero di abitanti.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

In corso la progettazione esecutiva.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

•Riqualificazione urbanistica•Liberazione del centro di Augusta dalla linea ferroviaria•Incremento della regolarità della circolazione ed eliminazione delle interferenze tra l'IFN ed il tessuto urbano dell'omonima città.



- Capacità
- Velocità
- Accessibilità
- Regolarità
- Prestazioni (merci)
- Gestione dei rotabili
- Gestione spazi di stazione
- Intermodalità merci
- Intermodalità passeggeri
- Integrazione della rete
- Upgrade e sicurezza
- Efficientamento processi

X

LOCALIZZAZIONE

Sicilia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento commissioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Bypass di Augusta	X	X									x						X				

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Totale Risorse	Sezione 1 - Opere in corso finanziate							Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
175,71	175,71	di cui: 57,48	0,00	0,00	118,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P253: Potenziamento collegamenti bacino di Augusta

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
175,71						175,71

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
175,71						175,71

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV				Produzione				
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Bypass di Augusta	175,71	175,71	0,00	130,89	44,83	6,51	4,21	0,00	0,00	0,00	0,74	2,40	5,00	171,41
	175,71	175,71	0,00	130,89	44,83	6,51	4,21	0,00	0,00	0,00	0,74	2,40	1,15	171,41

CRONOPROGRAMMA

CUP		Stato attuativo				Iter procedurale							
		Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Nego.		Esecuzione		Funzionalità	
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine		
Bypass di Augusta	J51B21001950006 Realizzazione	5-2022	5-2024	-	5-2024	-	-	-	-	-	-	12-2026	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

La nuova linea ferroviaria regionale Bari–Bitritto è un'opera avviata dal 1988 la cui realizzazione è stata assegnata dalla Regione Puglia alle Ferrovie Appulo Lucane (FAL). L'infrastruttura che si sviluppa per circa 10 km è stata progettata originariamente secondo gli standard vigenti in RFI e si innesta sulla linea Bari – Taranto, in corrispondenza dell'attuale stazione di Bari Parco Nord. Completati i lavori, si sono registrate criticità da parte di FAL per la messa in servizio e l'acquisizione delle certificazioni da parte di ANSFISA e quindi ad oggi non attiva all'esercizio commerciale. A seguito del Decreto Legge 162/2019 la linea è stata trasferita a titolo gratuito al RFI.

Puglia


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Gli interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico sono completati, hanno previsto l'upgrade degli attuali sottosistemi Infrastruttura, Energia e Comando e Controllo agli standard presenti sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, traguardando l'attivazione di Dicembre 2023. In particolare, sono stati eseguiti i seguenti macro-interventi: -adeguamento del corpo stradale, del profilo plano-altimetrico del binario per garantire la rispondenza agli standard di pendenza; -completamento dell'impianto TE con installazione pali mancanti, sostituzione delle parti non a standard RFI, pali e relativi collegamenti sui viadotti, posa fune portante, linea di contatto, circuito di protezione, derivazione alimentazione da SSE RFI per inserimento sotto DOTE dei QCC sezionatori; -adeguamento degli impianti IS di piazzale utili, completamento impianto SCMT, con riconfigurazione ACC di Bari PN e riconfigurazione CTC Bari-Taranto; -adeguamento degli impianti LFM, installazione nuovi GE esterni, adeguamento QE dei fabbricati viaggiatori, realizzazione impianti di condizionamento delle sale relè; -realizzazione nuove dorsali cavi in f.o., impianti copertura GSM-R, impianti leC nelle stazioni/fermate, impianti SEM ascensori nelle stazioni/fermate; -adeguamento dei fabbricati viaggiatori e dei marciapiedi per garantire la piena rispondenza alle STI PRM; -realizzazione degli allacci ENEL, acquedotto e fognatura in corrispondenza dei fabbricati viaggiatori; Certificazione sei sottosistemi strutturali INFRA, ENE ed CCS. L'attivazione della linea è avvenuta il 30 dicembre 2023, così come da Circolare Territoriale n. 028/2023. Il servizio commerciale è partito l'8 gennaio 2024, a seguito dell'affidamento del servizio da parte di Regione Puglia a Trenitalia. Gli interventi sulle opere d'arte sono stati completati. Ultimata la progettazione della fermata Stadio San Nicola.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Integrazione con l'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

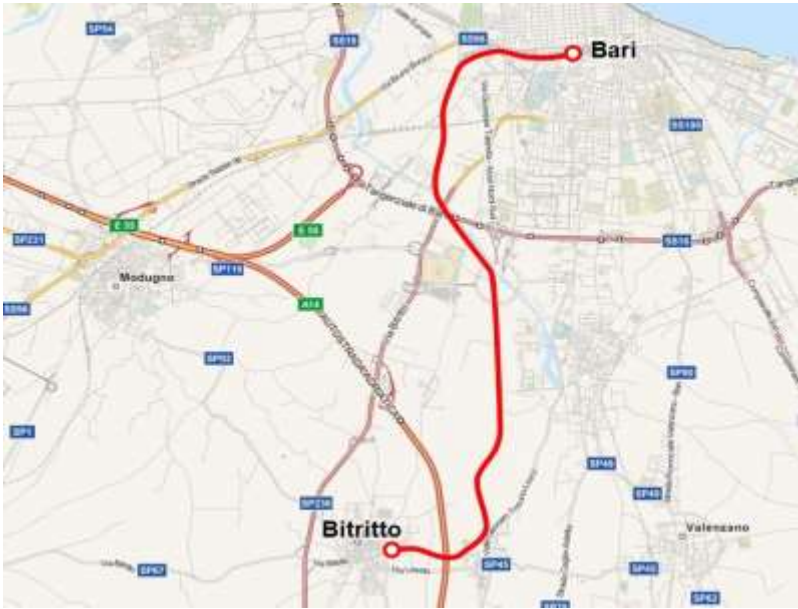

	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Puglia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P259: Linea Bari-Bitritto: upgrading infrastrutturale

	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR		Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																						
Linea Bari-Bitritto: upgrading infrastrutturale											X							X				

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatiche di breve				
								Priorità 1	Priorità 2			
30,11	30,11	di cui:	0,00	0,00	0,00	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE										milioni di euro
Evoluzione Costo										
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025				
40,11			-10,00			30,11	Variazione di costo per l'ottimizzazione delle risorse finanziarie sul programma.			

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
30,11						30,11

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Linea Bari-Bitritto: upgrading infrastrutturale	30,11	30,11	0,00	25,92	4,19	28,87	27,18	0,00	0,00	0,00	6,49	15,88	5,00	3,17
	30,11	30,11	0,00	25,92	4,19	28,87	27,18	0,00	0,00	0,00	6,49	15,88	4,57	3,17

CRONOPROGRAMMA														

Progetto P254B: Velocizzazione Villamassargia-Carbonia

Tabella A05-Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali

Rete Sarda

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'investimento è finalizzato alla velocizzazione della tratta Villamassargia – Carbonia tramite correzioni piano altimetriche di cinque curve, oltre ad interventi di soppressione di due passaggi a livello consentendo il miglioramento della regolarità dei treni e incremento della sicurezza.

Sardegna

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

A seguito della progettazione fattibilità tecnico economica , è in fase avanzata la progettazione esecutiva, con alcuni interventi approvati.Sono stati avviati i primi interventi propedeutici da giugno 2024 con obiettivo di attivazione entro dicembre 2026. Attività di risanamento della massicciata su tratte inerenti alla velocizzazione Avviate le prime attività di velocizzazione dal km 13 c.a al km 15 c.aCompletamento realizzazione nuova sede per lo spostamento curve n. 8, 9 e n. 12, 13 ,14.Prossimo avvio durante l'interruzione totale da luglio 2025 a dicembre 2026: - velocizzazione stazione di Carbonia con scambi a 60 km/h;- sostituzione rotaie in tratta;- spostamento curve

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Riduzione dei tempi di viaggio e ottimizzazione dell'orario sulle tratte Decimomannu – Villamassargia – Carbonia – Iglesias, miglioramento della regolarità dei treni e incremento della sicurezza.In stretta correlazione con il raddoppio Villamassargia – Decimomannu, consentirà di creare le condizioni favorevoli per un cadenzamento a 30' sulla relazione Cagliari-Carbonia



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Sardegna

INQUADRAMENTO STRATEGICO

	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																					
Velocizzazione Villamassargia-Carbonia							X										X				

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
13,00	13,00	di cui:	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Progetto P254B: Velocizzazione Villamassargia-Carbonia

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE milioni di euro

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
13,00						13,00

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrig	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
13,00						13,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Velocizzazione Villamassargia-Carbonia	13,00	13,00	0,00	12,59	0,41	10,37	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	5,00	8,86
	13,00	13,00	0,00	12,59	0,41	10,37	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	3,38	8,86

[illegible]

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P265: Piano straordinario di riqualificazione rete infrastrutturale civile

Tabella A05-Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali

Interventi diffusi intera rete

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma è finalizzato alla gestione dell'obsolescenza e al miglioramento delle prestazioni delle opere d'arte maggiori e minori in ottica di linea/direttrice, in sinergia con i programmi di conservazione delle opere d'arte (vedi A1014 e nuovo CdP-S), adeguamento a STI (A1004F), miglioramento sismico (A1013B) e upgrading nodi-bacini-direttici che generalmente intervengono per superare situazioni puntuali. Gli interventi, da realizzare possibilmente in scenari di chiusura tratta già programmati, possono riguardare il rinnovamento/riqualificazione di travate metalliche, impalcati vetusti, ponticelli, fossi di guardia e tombini nonché il consolidamento di rilevati e trincee cedevoli.

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Intervento non finanziato

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Upgrade prestazionale- Adeguamento a STI rete TEN-T



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento commissioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Piano straordinario di riqualificazione rete infrastrutturale civile - interventi diffusi															X	X	X	X			

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR	Altro UE	Altro		Priorità 1	Priorità 2	
2.000,00	0,00	di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50,00	1.950,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P265: Piano straordinario di riqualificazione rete infrastrutturale civile

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
2.000,00						2.000,00

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
0,00						0,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Piano straordinario di riqualificazione rete infrastrutturale civile - interventi diffusi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AVANZAMENTO PROGRAMMA			CUP rif.			Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo			
Piano di riqualificazione rete infrastrutturale civile						2.000,00	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione			
Piano straordinario di riqualificazione rete infrastrutturale civile - interventi diffusi						2.000,00	0,00	0%	0,00	0%				

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Intervenuti commissariati	PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento commissioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Quadruplicamento Torino Porta Susa-Stura e progettazione fermate Dora e Zappata, Stazione AV Torino Porta Susa e Nuova SSE Torino Bramante				X	X			X				X				X					

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0052: Passante di Torino tratta Porta Susa - Stura

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
1.045,03	1.045,03	di cui: 834,97	0,00	0,00	0,00	49,96	160,10		0,00	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE											milioni di euro
Evoluzione Costo											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025					
1.045,03						1.045,03					
Evoluzione coperture finanziarie											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025					
1.045,03						1.045,03					

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Quadruplicamento Torino Porta Susa-Stura e progettazione fermate Dora e Zappata, Stazione AV Torino Porta Susa e Nuova SSE Torino Bramante	1.045,03	1.045,03	0,00	908,22	136,82	1.038,85	1.010,17	1.012,86	2,59	5,47	1,38	2,30	8,26	13,32
	1.045,03	1.045,03	0,00	908,22	136,82	1.038,85	1.010,17	1.012,86	2,59	5,47	1,38	2,30	7,10	13,32

CRONOPROGRAMMA																
			Stato attuativo				Iter procedurale									
							CUP		Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Nego.	
						Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
Quadruplicamento Torino Porta Susa-Stura e progettazione fermate Dora e Zappata, Stazione AV Torino Porta Susa e Nuova SSE Torino Bramante			J11H02000040008	Esercizio		5-2006	7-2016	11-2002	7-2026	4-1996	5-2006	5-2004	10-2019	9-2000	7-2027	12-2012

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma prevede il potenziamento tecnologico ed infrastrutturale degli impianti e delle linee afferenti il nodo, interessate da traffico promiscuo regionale, medio-lunga percorrenza e merci. Gli interventi infrastrutturali tipicamente prevedono l'adeguamento/potenziamento del Piano Regolatore Generale (PRG) delle stazioni per gestire le interferenze tra flussi. Ulteriori interventi riguardano l'upgrading dei sistemi di Informazione al Pubblico, il potenziamento dei sistemi di alimentazione elettrica e interventi diffusi sulla sede e sulla sovrastruttura ferroviaria per omogeneizzare le caratteristiche prestazionali delle linee e gestire obsolescenza e punti singolari. Gli interventi sono prioritariamente legati agli accordi quadro per la capacità sottoscritti da RFI e le Regioni.

Il progetto prevede: 1) Il rinnovo del CTC tratta Cantalupo – San Giuseppe di Cairo; 2) Realizzazione nuovo apparato centrale di Settimo Torinese; 3) La realizzazione del nuovo Posto Centrale a Torino Lingotto; 4) L'upgrading del Blocco nella tratta Settimo Torinese - Torino Lingotto per ottenere un distanziamento a 4' nella tratta Porta Susa – Rebaudengo e rinnovo degli apparati centrali di Torino Porta Susa, Stura e Settimo Torinese; 5) Estensione ACC di Settimo Torinese a B.vio Settimo.

Piemonte


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

1) Il rinnovo del CTC tratta Cantalupo – San Giuseppe di Cairo è stato attivato nel 2019; 2) Il nuovo apparato centrale di Settimo Torinese è stato attivato nel 2021; 3) Fabbricato del nuovo Posto Centrale a Torino Lingotto: è in corso la realizzazione; è stata ultimata la Progettazione Definitiva relativa all'allestimento del Nuovo Posto Centrale e sono in corso le attività per la contrattualizzazione degli interventi, in particolare: Lotto 1 Hitachi: sottoscritta la lettera di intenti per avvio della Progettazione Esecutiva; Lotto 2 Alstom: Progettazione esecutiva in fase di verifica; Lotto 3 Siemens: stipulato il contratto applicativo sono in corso le attività per la consegna delle prestazioni (PE); Lotto 4 STI: in via di ultimazione l'attività negoziale; 4) Sono in corso i lavori relativi agli ACC di Torino Stura e Torino Porta Susa compresi gli impianti segnalamento di "piazzale", fabbricati, lavori di piazzale.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Miglioramento della qualità dei servizi in termini di regolarità della circolazione e della capacità da 10 treni/h per direzione a 12 treni/h per direzione. La realizzazione del Posto Centrale di Torino Lingotto consentirà di accentrare la gestione della circolazione dei treni dell'intero bacino Piemontese in un unico Posto Centrale favorendo il coordinamento delle figure coinvolte nella gestione delle situazioni di degrado della circolazione.

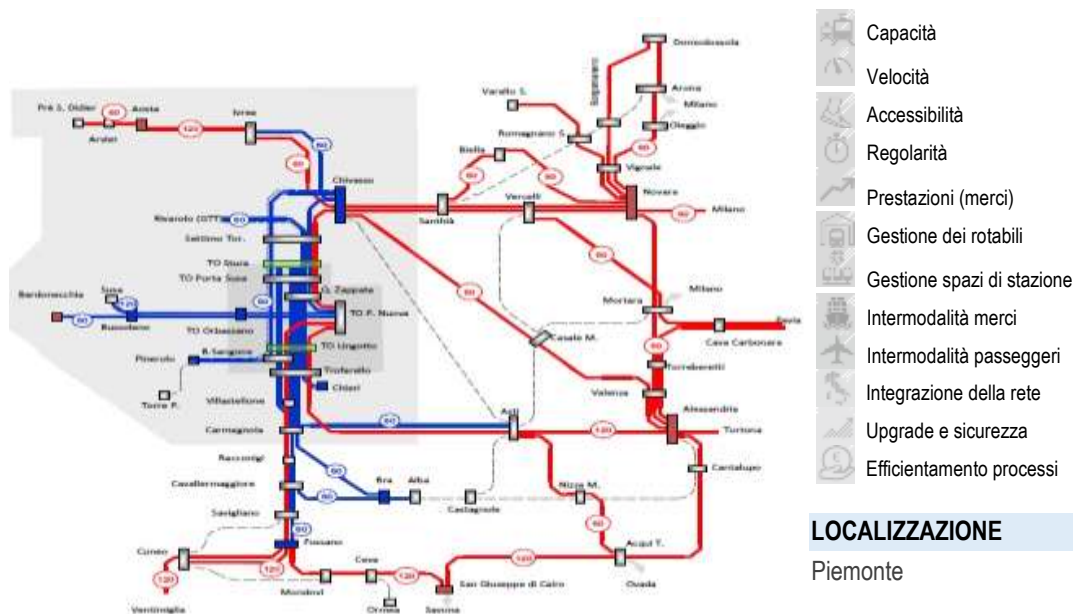

LOCALIZZAZIONE

Piemonte

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025											
Programma P080: Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Torino											
Intervento / Opere funzionali											
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR
Potenziamento tecnologico nodo di Torino					X					X	
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Torino - interventi diffusi					X						

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
252,43	162,10	di cui: 160,67	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8,96	81,37

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE							milioni di euro
Evoluzione Costo							
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
251,00				1,43		252,43	Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari
Evoluzione coperture finanziarie							
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
161,00				1,43	-0,33	162,10	Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Potenziamento tecnologico nodo di Torino	90,43	90,43	0,00	81,79	8,64	51,27	30,37	4,65	2,05	6,99	1,78	7,94	6,88	60,38
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Torino - interventi diffusi	162,01	71,68	90,33	53,73	108,28	53,60	50,90	12,42	1,96	18,25	11,27	3,00	10,18	112,38
	252,43	162,10	90,33	135,52	116,92	104,88	81,27	17,07	4,01	25,24	13,05	10,93	9,37	172,76

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Potenziamento tecnologico del nodo di Torino e linee afferenti	J74H17000140001	90,43	90,43	100%	32,96	36%	Realizzazione
Potenziamento tecnologico nodo di Torino		90,43	90,43	100%	32,96	36%	
Upgrading nodo di Torino		105,11	14,78	14%	0,00	0%	Progettazione
Potenziamento infrastrutturale e tecnologico ambito Torino	J67H21008500001	23,17	23,17	100%	20,48	88%	Realizzazione
Nodo di Torino: adeguamento linea passante interno	J77I10000290001	10,43	10,43	100%	9,62	92%	In ultimazione
Potenziamento infrastrutturale e tecnologico ambito Torino	J67F20000190001	10,00	10,00	100%	9,98	100%	In ultimazione
Potenziamento infrastrutturale e tecnologico ambito Torino	J67F19000090001	9,21	9,21	100%	8,38	91%	In ultimazione
Potenziamento infrastrutturale e tecnologico ambito Torino	J67H22000160001	4,09	4,09	100%	3,15	77%	Realizzazione
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Torino - interventi diffusi		162,01	71,68	44%	51,60	72%	

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P216: Completamento fermate SFM Torino

	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change	Adeguamento a standard tecnici	Sviluppo tecnologico	Sistemi regionali e metropolitani	Potenziamento connessioni merci	Sviluppo corridoi TEN-T	Completamento valichi alpini	Alta Velocità (AV)
Intervento / Opere funzionali																					
Fermata S.Paolo	X				X	X	X	X									X				
Fermata Borgata Quaglia - Le Gru	X				X	X	X		X								X				
Fermata S.Luigi Orbassano					X	X											X				
Fermate Dora e Zappata					X	X											X				
Fermata Ferriera - Buttigliera					X	X											X				

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
185,62	183,97		170,18	0,09	0,70	0,00	0,00	13,00	0,00	1,65	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo							L'incremento di costo deriva dall'aggiornamento del valore delle opere a conclusione della Progettazione definitiva relativa alla Fermata di Torino San Paolo su FM3. Si registra inoltre una variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari.
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
183,18			2,35	0,09		185,62	
Evoluzione coperture finanziarie							Copertura per ricostituzione finanziamento FSC 2014-2020 in base a delibera CIPESS n. 78/2024; ulteriore copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
183,18				0,79		183,97	

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Fermata S.Paolo	39,75	38,10	1,65	30,85	8,90	10,68	0,50	0,28	0,00	0,00	0,00	0,20	5,13	39,26
Fermata Borgata Quaglia - Le Gru	17,03	17,03	0,00	9,97	7,06	11,11	1,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,31	5,16	16,04
Fermata S.Luigi Orbassano	40,00	40,00	0,00	27,90	12,10	30,18	12,83	0,02	0,00	0,33	1,21	1,57	5,00	27,24
Fermate Dora e Zappata	65,75	65,75	0,00	56,02	9,73	0,97	0,28	0,00	0,00	0,00	0,27	0,01	5,00	65,46
Fermata Ferriera - Buttigliera	23,09	23,09	0,00	18,80	4,29	20,72	3,28	0,01	0,26	0,29	0,10	0,74	5,01	20,67
	185,62	183,97	1,65	143,53	42,09	73,66	17,89	0,58	0,26	0,62	1,58	2,83	11,08	168,66

CRONOPROGRAMMA											
CUP	Stato attuativo				Iter procedurale						
					Prog.Prel.	Prog.Def.	Prog.Esec.	Attiv.Negoz.	Esecuzione	Funzionalità	
					Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P216: Completamento fermate SFM Torino

Fermata S.Paolo	J74J17000010001	Realizzazione	-	-	4-2018	3-2025	-	-	11-2022	12-2025	6-2023	3-2028	4-2028
Fermata Borgata Quaglia - Le Gru	J74J17000010001	Realizzazione	-	-	7-2018	11-2022	-	-	12-2022	9-2023	5-2023	11-2026	12-2026
Fermata S.Luigi Orbassano	J74J17000010001	Realizzazione	-	-	4-2021	6-2025	3-2025	6-2025	6-2019	10-2020	12-2020	9-2025	12-2026
Fermate Dora e Zappata	J74J17000010001	Attività negoziali	-	-	1-2022	12-2023	-	-	11-2024	7-2025	7-2025	6-2027	2-2028
Fermata Ferriera - Buttigliera	J74J17000020001	Realizzazione	-	-	4-2021	12-2026	12-2025	12-2026	6-2020	4-2021	4-2021	3-2026	4-2026

Progetto P217: Potenziamento linea veloce collegamento Porta Nuova -Porta Susa

	Priorità programmatica	Obiettivi strategici
	Allegato MIMS al DEF Tavoli tecnici di ascolto Altri Provvedimenti* Cofinanziamenti UE UE - workplan corridoi TEN-T AQ per l'utilizzo della capacità Fondo Sviluppo e Coesione Accordi EE.LL. Accordi internazionali Interventi commissariati PNRR	Coesione sociale e territoriale Accessibilità e qualità stazioni Resilienza al climate change Adeguatezza a standard tecnici Sviluppo tecnologico Sistemi regionali e metropolitani Potenziamento connessioni merci Sviluppo corridoi TEN-T Completamento valichi alpini Alta Velocità (AV)
Potenziamento linea veloce collegamento Porta Nuova - Porta Susa	X X	X

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P217: Potenziamento linea veloce collegamento Porta Nuova -Porta Susa

QUADRO FINANZIARIO												milioni di euro
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2		
116,11	116,11	di cui:	116,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE							
Evoluzione Costo							
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
116,11						116,11	
Evoluzione coperture finanziarie							
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
116,11						116,11	

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Potenziamento linea veloce collegamento Porta Nuova -Porta Susa	116,11	116,11	0,00	69,26	46,85	82,26	3,24	1,48	0,04	0,00	0,38	1,18	5,72	112,87
	116,11	116,11	0,00	69,26	46,85	82,26	3,24	1,48	0,04	0,00	0,38	1,18	0,16	112,87

CRONOPROGRAMMA														
CUP			Stato attuativo											
			Iter procedurale											
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Potenziamento linea veloce collegamento Porta Nuova -Porta Susa	J74H17000590001	Realizzazione	-	-	12-2017	8-2023	-	-	6-2023	5-2024	-	-		5-2028

Tabella A06-Programmi città metropolitane

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi consistono nel:- raddoppio del tratto da Milano San Cristoforo ad Albairate/Vermezzo (attivato nel 2009);- realizzazione delle nuove fermate metropolitane di Romolo (attivata nel 2006);- realizzazione della nuova fermata metropolitana di Milano Tibaldi e riqualificazione della fermata Porta Romana in asse all'esistente;- raddoppio di circa 3,5 km nella tratta Albairate-Abbiategrosso e la soppressione dei PL presenti lungo la tratta, tramite viabilità sostitutive.- opere di Mitigazione ambientale nella tratta Milano Porta Romana – San Cristoforo (Cintura Sud di Milano).

La linea Milano – Mortara, mantiene la sua caratterizzazione di linea di penetrazione radiale sul nodo di Milano. Il tracciato segue, fondamentalmente, quello della linea attuale adeguandone sia la sede che le opere d'arte.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Fermata di Tibaldi Attivata nel 2022 Fermata di Milano Porta Romana Sono in corso le attività di realizzazione. Raddoppio Milano S. Cristoforo-Albairate Il Raddoppio MI S. Cristoforo-Vermezzo/Albairate è stato attivato nel 2009. La Fermata di Romolo è stata attivata nel 2006. Raddoppio tratta Albairate-Abbiategrosso Completato l'aggiornamento del progetto definitivo a tariffe 2025 per recepire le osservazioni formulate dal Provveditorato delle Opere Pubbliche. l'avvio dell'iter autorizzativo è condizionato al reperimento della copertura finanziaria dell'intervento. Opere di Mitigazione ambientale Cintura Sud È in corso di definizione il tipologico delle barriere di concerto con Comune di Milano. In corso la Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica per iter autorizzativo.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Incremento capacità della linea fino ad Abbiategrosso da 4 treni/h a 10 treni/h per direzione;- Miglioramento dell'accessibilità e dello scambio intermodale;- Riqualificazione urbana.



	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	X
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lombardia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Raddoppio Milano S.Cristoforo- Albairate					X										X						
Fermate Porta Romana e Tibaldi					X										X						
Riqualificazione Milano S. Cristoforo-P.ta Romana					X										X						

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0049A: Raddoppio Milano-Mortara: 1^ fase

Raddoppio Albairate-Abbiategrosso

X

X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
564,68	253,33	di cui: 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	287,34	24,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo							CdP-I agg.2025	
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze			
550,78			13,89				564,68	Variazione del costo dovuta all'aggiornamento del quadro economico ad esito della Progettazione Definitiva per i raddoppi delle tratta Albairate - Abbiategrosso.

Evoluzione coperture finanziarie						CdP-I agg.2025	
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni		
249,58					3,75	253,33	Rimodulazione da intervento 0049B per prosecuzione attività in corso

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Milano S.Cristoforo- Albairate	196,13	196,13	0,00	145,79	50,35	195,75	190,06	195,64	0,03	0,00	0,00	0,00	5,05	0,40
Fermate Porta Romana e Tibaldi	47,54	47,54	0,00	38,61	8,93	38,53	27,38	1,94	3,01	8,51	5,95	3,09	5,04	18,64
Riqualficazione Milano S. Cristoforo-P.ta Romana	25,00	1,00	24,00	18,56	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	25,00
Raddoppio Albairate-Abbiategrosso	296,00	8,66	287,34	160,11	135,89	4,96	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	5,00	293,29
	564,68	253,33	311,34	363,07	201,61	239,23	219,36	197,58	3,04	8,51	5,95	5,77	6,50	337,33

CRONOPROGRAMMA													
				Stato attuativo				Iter procedurale					
				CUP		Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.	
						Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
Raddoppio Milano S.Cristoforo- Albairate	J31H96000070008	Esercizio		7-2007	12-2007	5-2003	12-2007	-	-	12-2004	12-2005	11-2005	6-2014
Fermate Porta Romana e Tibaldi	J31H96000070008	Realizzazione		5-2006	5-2011	12-2007	6-2025	1-2017	4-2021	6-2019	12-2022	6-2020	11-2025
Riqualficazione Milano S. Cristoforo-P.ta Romana	J31H96000070008	Progettazione		6-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	7-2029
Raddoppio Albairate-Abbiategrosso	J31H96000070008	Progettazione		-	-	11-2021	8-2026	-	-	-	-	-	8-2030

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0049B: Raddoppio Milano-Mortara: 2^ fase

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE milioni di euro

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
323,12			1.219,54			1.542,66	Variazione della stima dei costi, effettuata su base parametrica, per i raddoppi delle tratte Abbiategrasso – Parona e Parona – Mortara nell'ambito della predisposizione dell'Analisi Costi Benefici.

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
6,42					-3,75	2,66	Rimodulazione a favore di intervento 0049A per prosecuzione attività in corso

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Abbiategrasso-Vigevano-Parona	1.202,66	2,66	1.200,00	1.109,38	93,28	1,42	1,42	1,42	0,00	0,00	0,01	0,00	5,00	1.201,24
Raddoppio Parona-Mortara	340,00	0,00	340,00	285,79	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	340,00
	1.542,66	2,66	1.540,00	1.395,17	147,49	1,42	1,42	1,42	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1.541,24

CRONOPROGRAMMA

		CUP		Stato attuativo		Iter procedurale										
						Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Nego.		Esecuzione		Funzionalità
				Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine			
Raddoppio Abbiategrasso-Vigevano-Parona	J31H96000070008	Progettazione	10-2002	3-2006	9-2027	9-2029	-	-	9-2029	7-2030	8-2030	3-2036	3-2036			
Raddoppio Parona-Mortara	J31H96000070008	Valutazione di fattibilità alternative progettuali	-	-	-	-	-	-	8-2027	7-2028	4-2028	12-2030	12-2029			

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma prevede il potenziamento tecnologico ed infrastrutturale degli impianti e delle linee afferenti il nodo, interessate da traffico promiscuo regionale, medio-lunga percorrenza e merci. Gli interventi infrastrutturali tipicamente prevedono l'adeguamento/potenziamento del Piano Regolatore Generale (PRG) delle stazioni per gestire le interferenze tra flussi. Dal punto di vista tecnologico è generalmente previsto il potenziamento del sistema di distanziamento (anche con sezioni corte e/o ERTMS High Density nelle tratte più congestionate), degli apparati centrali e del sistema di supervisione e regolazione della circolazione per migliorare la regolarità di esercizio e consentire l'incremento della capacità. Ulteriori interventi riguardano l'upgrading dei sistemi di Informazione al Pubblico, il potenziamento dei sistemi di alimentazione elettrica e interventi diffusi sulla sede e sulla sovrastruttura ferroviaria per omogeneizzare le caratteristiche prestazionali delle linee e gestire obsolescenza e punti singolari. Gli interventi sono prioritariamente legati agli accordi quadro per la capacità sottoscritti da RFI e le Regioni.

Le principali realizzazioni riguardano: A) Upgrading sistema di distanziamento Nodo di Milano 1^a fase: implementazione nuovi sistemi di distanziamento a 3/4', anche di tipo ERTMS HD, per gestire l'incremento del traffico regionale nell'ambito delle principali stazioni del nodo di Milano sulle tratte: Monza - Greco Pirelli - Milano Lambrate - Milano Smistamento; Milano P. Garibaldi - Milano Greco / Lambrate. B) ACC Milano Porta Garibaldi, con giurisdizione anche su Bivio Mirabello, e realizzazione di un nuovo collegamento che consentirà la possibilità di attestare sui binari I-XII i treni provenienti da Bovisio (FNM) e linea cintura; C) PRG e ACC Milano Lambrate, con interventi al Fabbicato Viaggiatori di adeguamento strutturale e funzionale, la realizzazione del nuovo ACC e la riorganizzazione della radice lato MI C.le dei binari da I a IV, eliminazione dei tagli a raso per i servizi merci e regionali con la realizzazione di una nuova galleria; D) ACC Milano Certosa e upgrade tecnologico delle tratte Milano Certosa - PM Ghisolfi e Milano Certosa - Rho (linea Varese, linea Novara e linea AV/AC); E) PRG e ACC Gallarate, con adeguamento a modulo 750 m; velocizzazione e aumento contemporaneità; upgrade e banalizzazione del sistema di distanziamento sulle tratte Gallarate - Busto e Gallarate - Sesto Calende (non banalizzato); nuovo ACC Somma Lombardo; F) Potenziamento infrastrutturale e tecnologico di Milano Centrale: realizzazione di un nuovo ACC; banalizzazione delle linee «Chiasso» e «Circolazione»; adeguamento per fasi del PRG di stazione finalizzati alla rifunzionalizzazione dei fasci laterali, ingresso indipendente delle linee «Malpensa» e «Venezia», velocizzazione di alcuni itinerari (dagli attuali 6 a 21); ammissione di nuove contemporaneità in impianto (dalle attuali 9 a 12); eliminazione intersezioni sotto Cabina C; realizzazione 3° binario di collegamento con aumento itinerari da/verso linea «Venezia», linea «Circolazione», Parco Centrale e Parco Martesana; G) Upgrade tecnologico Monza - Carnate: realizzazione nuovo sistema di distanziamento costituito da un BAB3/3 (emulato RsC) con sezioni di estesa ricompresa fra 900 - 1060 m in marcia sinistra e almeno 4 sezioni di blocco in marcia destra; Interfacciamento del nuovo BA con l'ACEI di Carnate; realizzazione del sistema di informazione al pubblico nelle fermate in conformità agli standard IEC attuali per consentirne la gestione dal Posto Centrale di Milano Greco; H) Upgrading nodo di Milano e linee di interesse regione Lombardia (fase): Il progetto prevede interventi diffusi di natura infrastrutturale e tecnologica che consentiranno l'ammissione dei movimenti contemporanei tra treni e, ove possibile, la velocizzazione a 60 km/h degli itinerari nelle stazioni di Calusco, Cisano, Crema, Ternate e Ponte in Valtellina. Inoltre, è prevista la realizzazione di nuovi sottopassi nelle stazioni di Besana, Calusco, Paderno e Terno e l'adeguamento in altezza e lunghezza di alcuni marciapiedi secondo gli standard di interoperabilità. I) Scavalco Bivio/PM Adda: Il Progetto prevede la realizzazione di un'opera di scavalco tra la linea per Bergamo e la linea Interconnessione, con innesto su quest'ultima mediante deviate a 100 km/h, completamente indipendente rispetto alla linea Venezia LL. Verrà, altresì, prevista una bretella di collegamento tra LL e linea per Bergamo con innesto a raso mediante deviate a 60 km/h. Di seguito si riportano le caratteristiche dell'opera: - Velocità massima: 100 km/h sullo scavalco; 60 km/h sulla bretella; - Codifica trasporto combinato: P/C 80; - Elettrificazione: 3 kV cc; - Massa assiale: D4; - Sistema di esercizio: SCCM/ACCM; - Regime di Circolazione: Blocco Radio con ERTMS/ETCS L2; - Pendenza: idonea alla circolazione traffico misto passeggeri/merci. Con la configurazione proposta di PM/Bivio Adda si perde la possibilità di passaggio tra la LL e la DD. Al fine di ripristinare tale funzionalità, nel presente Progetto è previsto l'inserimento ambito Treviglio di una comunicazione con posa sinistra percorribile a 60 km/h sul prolungamento dei binari V e VI lato Milano. Nell'ambito del presente Progetto dovranno essere ricomprese le necessarie riconfigurazioni ai sottosistemi CCS ed ENE.L) Potenziamento fermata di Milano Forlanini: La richiesta di un potenziamento della fermata di Forlanini è legata alle esigenze emerse nel Tavolo Tecnico di Ascolto dalle Regioni Lombardia e Liguria e, successivamente, nell'ambito di un gruppo di lavoro tra Regione Liguria, Regione Lombardia, MIT e RFI. Nel primo semestre del 2024 è stato condiviso il Quadro Esigenziale e si è avviata la redazione del DocFAP. Il DocFAP ha studiato e confrontato quattro alternative funzionali che prevedono una combinazione di fermata/stazione sulle linee «Merci» e «Genova» e due scenari trasportistici a cui fare riferimento. Ulteriori interventi hanno riguardato la riqualificazione del ponte Paderno Adda sulla linea Seregno-Bergamo (ultimato).

Lombardia

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025


A) Upgrading sistema di distanziamento Nodo di Milano 1^a fase Sono in corso i lavori relativi per l'implementazione delle sezioni corte. A giugno 2023 è stato attivato il PP-ACC di Quadrivio Turro sono in corso le attività per una riconfigurazione di Fase propedeutica alla realizzazione dell'HD-ERTMS. In data 20/03/2024 per gli interventi di upgrading blocchi Nodo di Milano (piazzi sud) sono state consegnate all'Appaltatore le prestazioni di Progettazione Esecutiva. In data 31/03/2024 sono stati consegnati i lavori. È stata ultimata la verifica della progettazione esecutiva per gli interventi di upgrading blocchi Nodo di Milano (piazzi ovest), in data 11/10/2024 sono stati consegnati i lavori di piazzale, in corso la contrattualizzazione per gli interventi di cabina. In data 01/12/2024 è stata conseguita l'attivazione dell'ACCM di Bivio Turro 2^a Fase, per l'implementazione del distanziamento a 4' nelle tratte Milano G. Pirelli-PM Turro-Milano Lambrate. A dicembre 2024 sono stati consegnati i lavori per la realizzazione del Nuovo SCCM AV/AC al PCM di MI Greco Pirelli. B) ACC Milano Porta Garibaldi Sono in corso i lavori relativi al nuovo apparato centrale nella stazione di Milano Porta Garibaldi. C) PRG e ACC Milano Lambrate Sono stati ultimati gli interventi al Fabbicato Viaggiatori. È stata attivata la Fase 0a e Fase 0a plus. Sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo PP ACC. Sono in corso i lavori relativi agli interventi di PRG propedeutici all'attivazione del nuovo PP ACC sul «ferro attuale» (fase intermedia). Sono in corso le attività

Programma P054: Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Milano

propedeutiche per l'avvio dell'aggiornamento/rivisitazione della Progettazione Definitiva relativa alla Fase 2 del PRG.D) ACC Milano Certosaln data 13/02/2024 sono state consegnate le prestazioni all'Appaltatore, l'ultimazione della Progettazione Esecutiva è avvenuta in data 01/10/2024. Sono in corso le attività di verifica.E) PRG e ACC GallarateIn data 18/09/2023 è stato attivato l'adeguamento a modulo a 750 mt dei binari 7 e 8 dell'impianto di Gallarate.Sono in corso i lavori del nuovo Apparato Centrale di Gallarate e interventi secondari connessi, inoltre sono in corso i lavori relativi agli interventi TE, LFM e IS nonché i lavori di armamento.Fabbricati Tecnologici completati. F) Potenziamento infrastrutturale e tecnologico di Milano CentraleÈ stata ultimata la Progettazione Definitiva. A Giugno 2023 è stata avviata l'attività negoziale, in data 22/03/2024 è avvenuta l'aggiudicazione. A Maggio 2024 è stata avviata la Progettazione Esecutiva, attualmente in corso. A febbraio 2025 è avvenuta l'approvazione tecnica della Fase 1 (Fase ACEI). Il 28/03/2025 sono stati consegnati i lavori Fase 1. G) Upgrade tecnologico Monza - Carnate È stata ultimata la Progettazione Esecutiva a cura dell'appaltatore relativa all'appalto ACCM (interventi di piazzale), sono in corso le attività di verifica.Sono in corso le attività propedeutiche per la contrattualizzazione dei lavori di cabina. H) Potenziamento fermata di Milano ForlaninIl DocFAP è stato concluso e ha individuato come preferibile la configurazione che prevede il potenziamento dell'attuale impianto attraverso la realizzazione di una fermata sulla linea "Merci" e sulla linea "Genova". Sono state avviate le attività di progettazione relativa al PFTE. Al fine di traguardare una riduzione dei tempi, si ipotizza una fasizzazione degli interventi come di seguito riportato:- una prima fase funzionale che prevede l'attivazione della fermata sulla linea «Genova»;- una seconda fase funzionale che prevede la realizzazione della banchina sulla linea «Merci».I) Scavalco Bivio/PM AddaAttualmente è in corso il progetto di fattibilità tecnico-economica.Nel mese di febbraio 2025 è stata ultimata l'Analisi Costi Benefici.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Sviluppo del traffico Regionale e Metropolitano- Efficientamento e potenziamento tecnologico delle infrastrutture- Eliminazione di «colli di bottiglia» - accentramento al Posto Centrale di Milano Greco Pirelli delle funzioni di comando e controllo della circolazione;- incremento della capacità e miglioramento dei livelli di puntualità e regolarità della circolazione all'interno del nodo, in particolare maggiore flessibilità nella gestione della circolazione sulle linee «Chiasso» e «Circolazione locomotive» in ambito Milano Centrale- risoluzione delle principali interferenze con un incremento generale delle contemporaneità d'impianto - ottimizzazione generale del piano del ferro con specializzazione dei binari per servizi merci e regionali- aumento della capacità sulle tratte Monza - Greco Pirelli - Milano Lambrate - Milano Smistamento, Chiasso - Monza, Monza - Carnate (dagli attuali 10 treni/ora per senso di marcia a 12 treni/h) e Milano Porta Garibaldi - Milano Greco/Lambrate (dagli attuali 12 treni/ora per senso di marcia a 16 treni/h) , in relazione al livello generale di puntualità dei sistemi afferenti ed alla minore o maggiore omogeneità di velocità commerciali nelle tratte promiscue;- riduzione dei tempi di ingresso/uscita da/per i raccordi e i relativi tempi di manovra, determinando un vantaggio in termini di costi operativi grazie alla centralizzazione dei binari di stazione e rifunzionalizzazione dei fasci laterali d'impianto di Milano C.le per la sosta/ricovero del materiale rotabile- Regionali: recupero medio di 1,8 minuti per ogni treno incrociante nelle stazioni sul semplice binario oggetto dell'intervento

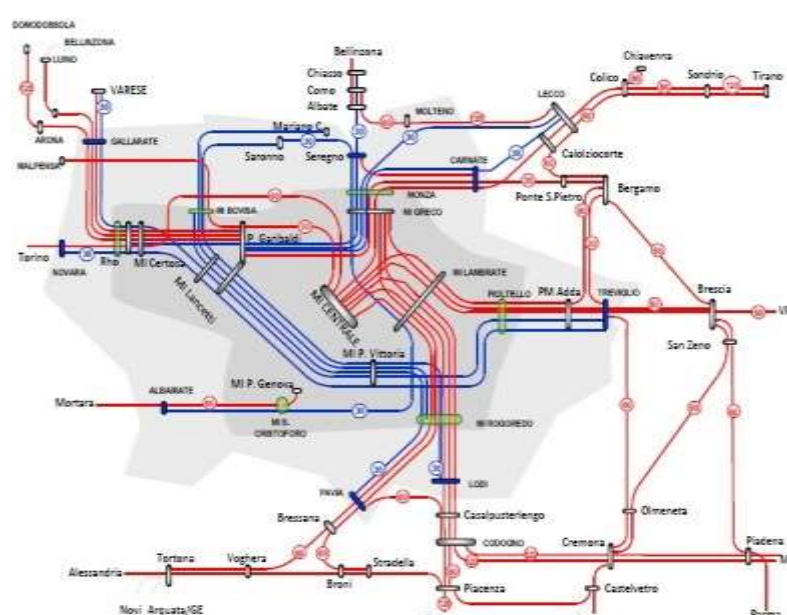

	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	X
	Gestione spazi di stazione	X
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lombardia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Allegato MIMS al DEF
Tavoli tecnici di ascolto
Altri Provvedimenti*
Cofinanziamenti UE
UE - workplan corridoi TEN-T
AQ per l'utilizzo della capacità
Fondo Sviluppo e Coesione
Accordi EE.LL.
Accordi internazionali
Interventi commissariati
PNRR

Obiettivi strategici

Coesione sociale e territoriale
Accessibilità e qualità stazioni
Resilienza al climate change
Adeguamento a standard tecnici
Sviluppo tecnologico
Sistemi regionali e metropolitani
Potenziamento connessioni merci
Sviluppo corridoi TEN-T
Completamento valichi alpini
Alta Velocità (AV)

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025											
Programma P054: Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Milano											
Upgrading sistema di distanziamento Nodo di Milano 1^ fase	X	X	X	X	X						X
PRG e ACC Gallarate	X	X	X	X	X						X
ACC Milano Porta Garibaldi	X	X	X	X	X						X
ACC e PRG di Milano Centrale	X	X	X	X	X						X
PRG e ACC Milano Lambrate		X	X	X	X						X
Upgrading nodo di Milano e linee di interesse regione Lombardia (fase)		X	X	X	X						X
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Milano - interventi diffusi		X	X	X	X						X
Scavalco Bivio/PM Adda		X	X	X	X						X
Riqualficazione aree esterne stazione di Mantova		X	X	X	X						X
Interventi diffusi tecnologici Nodo di Milano (comprende upgrade Carnate-Monza)		X	X	X	X						X
ACC di Milano Certosa e interventi diffusi tecnologici nel nodo di Milano		X	X	X	X						X

QUADRO FINANZIARIO												milioni di euro
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2		
1.150,51	801,30	di cui:	780,41	2,35	0,00	0,80	1,65	16,09	0,00	287,79	61,43	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE												milioni di euro
Evoluzione Costo												
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025						
1.174,16	-25,60			1,95		1.150,51	Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari e allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.					
Evoluzione coperture finanziarie												
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025						
796,87	-25,60			29,98	0,04	801,30	Copertura dei fabbisogni indifferibili connessi agli extraoneri degli appalti in corso e per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)					

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Upgrading sistema di distanziamento Nodo di Milano 1^ fase	127,16	127,16	0,00	115,43	11,73	51,31	21,05	0,67	4,79	5,36	4,14	3,34	5,01	106,30
ACC Milano Porta Garibaldi	74,50	74,50	0,00	68,22	6,28	36,04	12,37	0,92	0,37	1,17	3,28	0,81	5,05	62,36
PRG e ACC Milano Lambrate	130,87	97,87	33,00	109,50	21,38	51,53	37,40	6,15	3,14	3,64	3,44	10,87	7,70	93,79
ACC di Milano Certosa e interventi diffusi tecnologici nel nodo di Milano	58,98	57,07	1,91	17,34	41,64	2,26	2,25	0,00	0,06	0,87	0,03	0,01	5,00	56,74
PRG e ACC Gallarate	56,30	56,30	0,00	49,40	6,90	45,97	23,43	0,93	0,11	0,45	3,05	8,47	5,05	32,54
ACC e PRG di Milano Centrale	105,48	105,48	0,00	98,57	6,91	11,81	3,79	0,00	0,00	0,10	1,03	2,06	5,00	101,79
Interventi diffusi tecnologici Nodo di Milano (comprende upgrade Carnate-Monza)	13,35	12,50	0,85	12,51	0,84	0,88	0,70	0,04	0,05	0,05	0,10	0,45	5,04	12,65
Scavalco Bivio/PM Adda	254,38	1,50	252,88	51,62	202,76	1,47	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	5,00	253,34
Upgrading nodo di Milano e linee di interesse regione Lombardia (fase)	171,72	171,72	0,00	171,72	0,00	153,70	148,15	80,63	21,52	14,33	8,73	17,66	18,50	23,35
Riqualficazione aree esterne stazione di Mantova	4,45	4,45	0,00	2,48	1,97	2,62	1,84	0,00	0,12	0,05	0,00	0,60	5,00	2,36

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025														
Programma P054: Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Milano														
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Milano - interventi diffusi	153,32	92,74	60,58	27,32	126,00	43,25	40,77	35,24	0,27	0,96	2,15	1,27	7,98	112,35
	1.150,51	801,30	349,21	724,10	426,41	400,84	292,88	124,59	30,42	26,97	25,96	45,58	39,43	857,56
AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.				Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo				
Sistemi di distanziamento per incremento capacità nodo di Milano (1°fase)	J94H14000230001				127,16	127,16	100%	22,95	18%	Realizzazione				
Upgrading sistema di distanziamento Nodo di Milano 1^ fase					127,16	127,16	100%	22,95	18%					
Potenziamento tecnologico della stazione di Milano Porta Garibaldi e velocizzazioni lato Bivio/PC Mirabello	J54H16001170001				74,50	74,50	100%	15,23	20%	Realizzazione				
ACC Milano Porta Garibaldi					74,50	74,50	100%	15,23	20%					
PRG Lambrate	J54B13001110001				130,87	97,87	75%	38,68	40%	Realizzazione				
PRG e ACC Milano Lambrate					130,87	97,87	75%	38,68	40%					
ACC di Milano Certosa	J46E19000210001				58,98	57,07	97%	2,26	4%	Realizzazione				
ACC di Milano Certosa e interventi diffusi tecnologici nel nodo di Milano					58,98	57,07	97%	2,26	4%					
Potenziamento tecnologico e infrastrutturale dell'impianto di Gallarate	J24H16000490001				56,30	56,30	100%	27,77	49%	Realizzazione				
PRG e ACC Gallarate					56,30	56,30	100%	27,77	49%					
Potenziamento infrastrutturale e tecnologico di Milano Centrale	J44H20001400009				105,48	105,48	100%	4,03	4%	Realizzazione				
ACC e PRG di Milano Centrale					105,48	105,48	100%	4,03	4%					
Upgrading della tratta Carnate - Monza della linea Lecco - Milano	J87J18000280001				13,35	12,50	94%	0,70	6%	Realizzazione				
Interventi diffusi tecnologici Nodo di Milano (comprende upgrade Carnate-Monza)					13,35	12,50	94%	0,70	6%					
Scavalco di PM/Bivio Adda	J84J23000100008				254,38	1,50	1%	1,12	75%	Progettazione				
Scavalco Bivio/PM Adda					254,38	1,50	1%	1,12	75%					
Upgrading nodo di Milano e linee d'interesse della Regione Lombardia	J84H17000440001				171,72	171,72	100%	149,05	87%	Realizzazione				
Upgrading nodo di Milano e linee di interesse regione Lombardia (fase)					171,72	171,72	100%	149,05	87%					
Riqualificazione aree esterne stazione di Mantova	J17F19000310001				4,45	4,45	100%	2,49	56%	Realizzazione				
Riqualificazione aree esterne stazione di Mantova					4,45	4,45	100%	2,49	56%					
Upgrading nodo di Milano					59,84	4,80	8%	0,00	0%	Progettazione				
Sviluppo e completamento area nord	J84H17000940001				46,00	46,00	100%	35,41	77%	Realizzazione				
Adeguamento fermata esistente di Milano Forlanini	J84J24000840001				35,00	35,00	100%	0,00	0%	Progettazione				
Velocizzazione Melzo Scalo - Treviglio Linea DD	J24H17000570001				6,90	6,90	100%	5,53	80%	Realizzazione				
Interventi upgrading della rete viaggiatori - MI	J97D22000150001				5,58	0,04	1%	0,04	100%	Progettazione				
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Milano - interventi diffusi					153,32	92,74	60%	41,12	44%					

Programma P192: Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Genova

Tabella A06-Programmi città metropolitane

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma prevede il potenziamento tecnologico ed infrastrutturale degli impianti e delle linee afferenti il nodo, interessate da traffico promiscuo regionale, medio-lunga percorrenza e merci. Gli interventi infrastrutturali tipicamente prevedono l'adeguamento/potenziamento del Piano Regolatore Generale (PRG) delle stazioni per gestire le interferenze tra flussi. Ulteriori interventi riguardano l'upgrading dei sistemi di Informazione al Pubblico, il potenziamento dei sistemi di alimentazione elettrica e interventi diffusi sulla sede e sulla sovrastruttura ferroviaria per omogeneizzare le caratteristiche prestazionali delle linee e gestire obsolescenza e punti singolari. Gli interventi sono prioritariamente legati agli accordi quadro per la capacità sottoscritti da RFI e le Regioni.

Liguria


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

In corso interventi diffusi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Sviluppo del traffico Regionale e Metropolitano- Efficientamento e potenziamento tecnologico delle infrastrutture- Eliminazione di «colli di bottiglia»

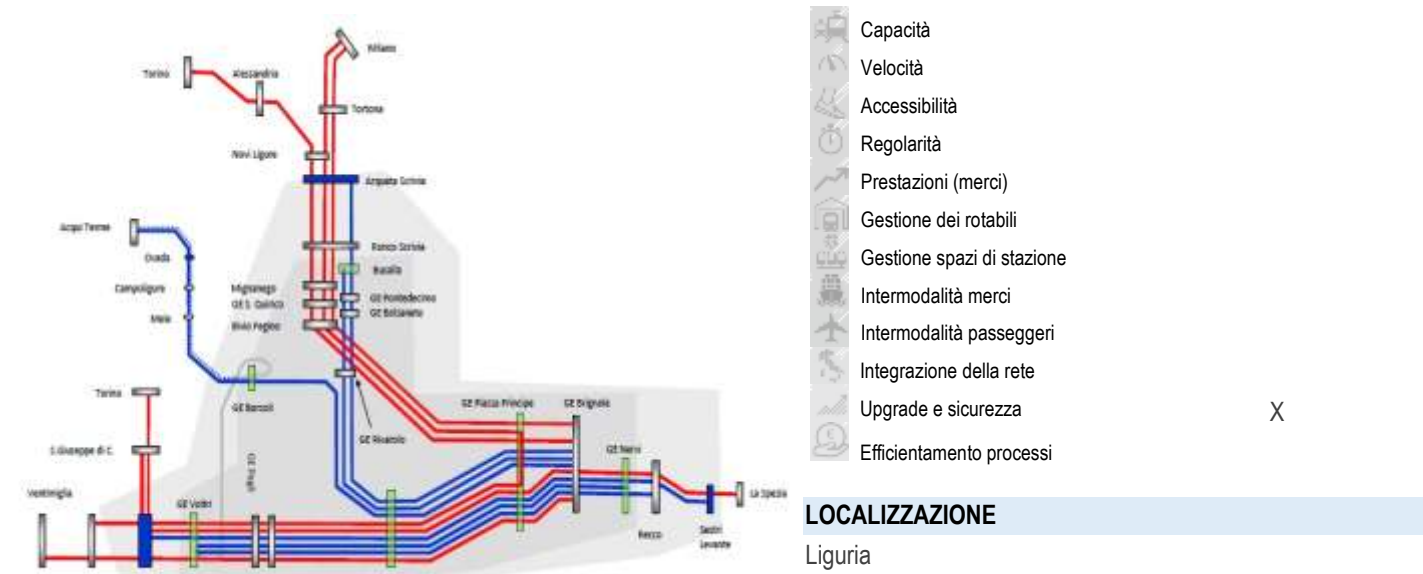

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EELL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati PNRR	Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change	Adeguamento a standard tecnici	Sviluppo tecnologico
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Genova - interventi diffusi															

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
20,55	20,55	di cui: 18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50		0,00	0,00	0,00

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P192: Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Genova

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE milioni di euro

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
55,55			-35,00			20,55	Variazione del costo a seguito della riduzione del perimetro per l'upgrading tecnologico sul programma ERTMS

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
20,55						20,55

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Genova - interventi diffusi	20,55	20,55	0,00	19,74	0,81	20,30	19,68	13,93	1,74	1,56	0,62	0,16	15,14	0,81
	20,55	20,55	0,00	19,74	0,81	20,30	19,68	13,93	1,74	1,56	0,62	0,16	1,73	0,81

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
GE - upgrading linee merci	J97J18000060001	20,55	20,55	100%	20,15	98%	In ultimazione
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Genova - interventi diffusi		20,55	20,55	100%	20,15	98%	

Tabella A06-Programmi città metropolitane

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma prevede il potenziamento tecnologico ed infrastrutturale degli impianti e delle linee afferenti il nodo, interessate da traffico promiscuo regionale, medio-lunga percorrenza e merci. Gli interventi infrastrutturali tipicamente prevedono l'adeguamento/potenziamento del Piano Regolatore Generale (PRG) delle stazioni per gestire le inteferenze tra flussi. Ulteriori interventi riguardano l'upgrading dei sistemi di Informazione al Pubblico, il potenziamento dei sistemi di alimentazione elettrica e interventi diffusi sulla sede e sulla sovrastruttura ferroviaria per omogeneizzare le caratteristiche prestazionali delle linee e gestire obsolescenza e punti singolari. Gli interventi sono prioritariamente legati agli accordi quadro per la capacità sottoscritti da RFI e le Regioni.

Le principali realizzazioni riguardano:A) Ulteriore Fase di Potenziamento tecnologico Venezia Mestre – Venezia Santa LuciaL'intervento è in piena continuità con gli interventi già avviati in prima fase.Il progetto prevede:-La realizzazione di una nuova SSE elettrica necessaria per sostenere gli incrementi di traffico ed interventi correlati sul sistema di trazione elettrica.-Modifiche al piano del ferro per completare la revisione totale della radice su ponte vecchio.-Sdoppiamento del Fascio Sacca con realizzazione delle indipendenze tra movimenti di ingresso e movimenti di uscita e rifacimento dei marciapiedi H 55 a servizio dei binari di Fascio Sacca (binari dal XV a XX).-Rinnovo SCC esistente al fine di adeguarlo ai più recenti standard e integrare la supervisione e regolazione di impianti tradizionali.Interventi a completamento:-Implementazione delle C luminose per Mezzi d'Opera nella località di Venezia-Mestre;-Applicazione dello Schema di Principio V456 (I luminosa) per movimenti su binari parzialmente ingombri nella località di Venezia-Mestre;-Completamento SCMT per mitigazione delle Velocità di rilascio (Vril) a 10 km/hB) Nuovo PRG Stazione di Venezia S. Lucia: Il progetto di investimento prevede la realizzazione degli interventi che consentiranno di concludere i lavori del PRG della stazione di Venezia Santa Lucia allo scopo di aumentare la capacità dell'impianto perseguendo quattro obiettivi funzionali:1.Revisione della funzionalità delle aste, in modo da realizzare dei binari di stazionamento in grado di favorire le partenze e arrivi dei treni;2.Semplificazione del ferro in radice lato Mestre, in modo da consentire la banalizzazione completa della stazione anche tra i segnali esterni e quelli interni;3.Modifica del piano del ferro sulla radice del fascio Sacca in modo da rendere possibili movimenti contemporanei di arrivo e partenza dei treni;4.Mantenimento del collegamento ferroviario con la ex stazione di Venezia Marittima e predisposizione per un futuro utilizzo.

Veneto


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

A)Ulteriore Fase di Potenziamento tecnologico Venezia Mestre – Venezia Santa LuciaA luglio 2021 è stata attivata una fase dell'SCC-M contestuale alla 3^ configurazione dell'ACC-M di Venezia, a Ottobre 2022 è stata attivata la 4^ configurazione dell'ACC-M di Venezia, sono in corso i lavori relativi all'ultima fase del SCC-M.Sono in corso i lavori relativi alla nuova SSE di Venezia Santa LuciaL'attivazione del sistema di supporto e automazione (SSA) di Venezia è avvenuto in data 19/11/2023.In corso la progettazione definitiva degli interventi a completamento.È stata ultimata la verifica della Progettazione Definitiva relativa agli adeguamenti funzionali e normativi ACC-M di Venezia, sono in corso le attività propedeutiche per l'avvio dell'attività negoziale.B) Nuovo PRG Stazione di Venezia S. LuciaIn data 06/05/2024 è stato avviato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, attualmente in corso.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Incremento dei Servizi Attestati a Venezia Santa Lucia. Incremento di regolarità della circolazione

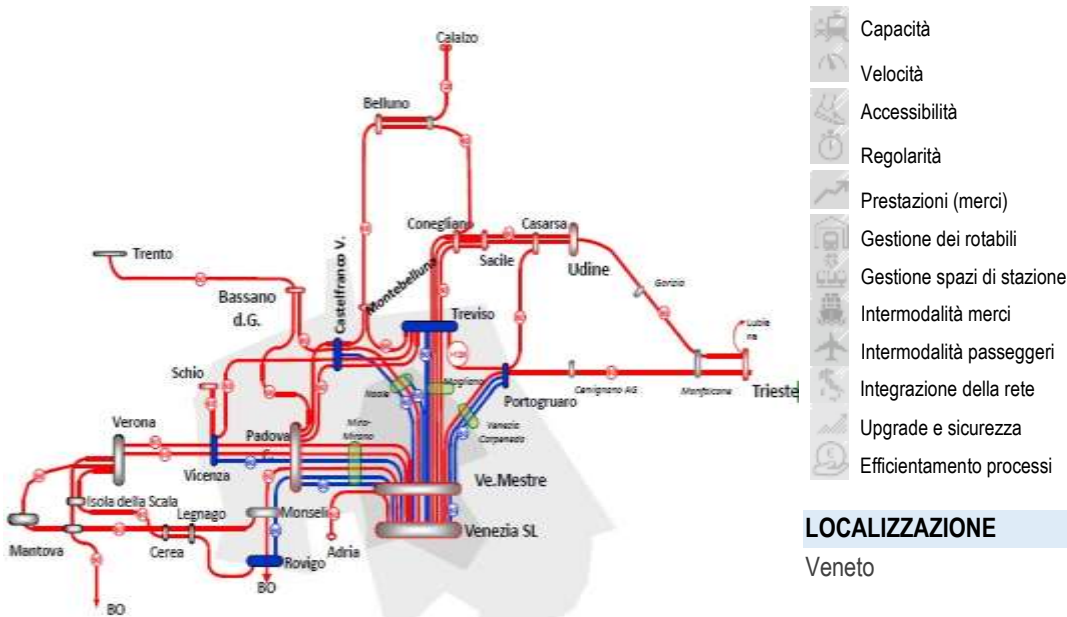

LOCALIZZAZIONE

Veneto

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P075: Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Venezia

	PNRR	Accordi Internazionali Interventi commissariati	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF		Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																					
Potenziamento tecnologico nodo di Venezia (fase)	X		X		X	X	X	X	X							X					
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Venezia - interventi diffusi			X		X	X	X	X	X							X					
Nuovo PRG della stazione di Venezia S. Lucia																					

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
230,73	130,73	di cui:	111,48	0,09	0,00	2,00	0,00	17,16	0,00	30,00	70,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatIRFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE							milioni di euro
Evoluzione Costo							
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrig	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
230,73						230,73	
Evoluzione coperture finanziarie							
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrig	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
130,73						130,73	

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo		Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024
														Oltre
Nuovo PRG della stazione di Venezia S. Lucia	60,00	30,00	30,00	55,23	4,77	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Potenziamento tecnologico nodo di Venezia (fase)	55,09	55,09	0,00	39,43	15,66	38,59	36,57	13,72	4,16	9,40	7,89	1,78	12,61	17,74
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Venezia - interventi diffusi	115,64	45,64	70,00	33,62	82,02	35,00	34,85	34,84	0,03	0,00	0,12	0,00	6,46	80,65
	230,73	130,73	100,00	128,28	102,45	74,58	71,42	48,56	4,19	9,41	8,01	1,78	0,40	158,39

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Nuovo PRG della stazione di Venezia S. Lucia	J74J24000060001	60,00	30,00	50%	0,12	0%	Progettazione
Nuovo PRG della stazione di Venezia S. Lucia		60,00	30,00	50%	0,12	0%	
Completamento tecnologico Venezia Mestre - Venezia S. Lucia	J14H17000600001	55,09	55,09	100%	37,38	68%	Realizzazione
Potenziamento tecnologico nodo di Venezia (fase)		55,09	55,09	100%	37,38	68%	
Upgrading nodo di Venezia		80,64	10,64	13%	0,00	0%	Progettazione
Nuovo impianto di manutenzione rotabili di Venezia Mestre	J74H17000180001	35,00	35,00	100%	34,99	100%	In ultimazione
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Venezia - interventi diffusi		115,64	45,64	39%	34,99	77%	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto di competenza RFI prevede in particolare: Interramento tratto di linea ferroviaria in galleria in affiancamento all'interramento stradale della SS64 «Porrettana», interramento stradale a cura dell'ente gestore A.N.A.S.; Realizzazione in galleria della fermata di Casalecchio di Reno; Soppressione PL di via Marconi km 122+176 della linea ferroviaria Bologna-Pistoia.

L'intervento denominato "Nodo Ferrostradale di Casalecchio di Reno", che si sviluppa interamente all'interno del territorio comunale di Casalecchio di Reno (Regione Emilia Romagna), include:- Realizzazione della Nuova SS64 "Porrettana" su nuovo tracciato con un tratto interrato (competenza ANAS);- Modifica di un tratto della linea ferroviaria Bologna-Porretta-Pistoia "Porrettana" con un tratto interrato in affiancamento alla galleria stradale (competenza RFI);- Realizzazione in galleria della fermata di Casalecchio di Reno (competenza RFI) con soppressione del passaggio a livello di via Marconi km 122+176 della linea ferroviaria Bologna-Porretta-Pistoia. Caratteristiche tecniche intervento:- Sviluppo Intervento: 1.863 m (da pk 121+075 a 122+938 della linea ferroviaria esistente Bologna-Porretta-Pistoia);- Tipologia linea ferroviaria: linea di interesse locale;- Velocità di progetto: 90 km/h;- Pendenza longitudinale: 1 – 13,6 ‰;- Interasse binari: 3,555 – 4,00 m;- Alimentazione TE: 3 kV;- Segnalamento: BAcc con ACCM. Obiettivi/ Benefici intervento:- Ricucitura urbana mediante l'interramento parziale delle infrastrutture e recupero delle aree per servizi alla città;- Separazione delle tipologie del traffico stradale con redistribuzione del traffico locale su strade comunali e del traffico passante su infrastruttura dedicata;- Soppressione passaggio a livello di via Marconi in prossimità della fermata di Casalecchio di Reno.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Il progetto preliminare dell'intero "Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno" redatto da ANAS è stato approvato con delibera CIPE 81/2006. Il progetto definitivo del "Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno" redatto da ANAS è stato approvato con delibera CIPE 75/2012 limitatamente alle opere stradali, rinviando per mancanza di finanziamenti l'approvazione del progetto definitivo e la realizzazione degli interventi ferroviari. Con delibera CIPESS 5/2022 è stata individuata RFI come nuovo soggetto aggiudicatore dell'intervento "Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno - progetto ferroviario". Concluso e trasmesso l'aggiornamento della progettazione definitiva per successivo avvio dell'ITER

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

L'intervento di realizzazione della galleria ferroviaria per interrimento della linea ferroviaria Bologna-Porretta-Pistoia "Porrettana", opera in affiancamento alla galleria per l'interramento stradale SS64, produrrà i seguenti benefici/obiettivi: continuità del servizio ferroviario in corrispondenza dell'attuale fermata di Casalecchio di Reno per tutta la durata dei lavori grazie allo spostamento, in via provvisoria, dell'attuale tracciato ferroviario sopra la sede della nuova galleria stradale di ANAS; ricucitura urbana di Casalecchio mediante la soppressione del passaggio a livello di via Marconi in prossimità dell'attuale fermata di Casalecchio di Reno; recupero di aree per servizi alla città; separazione delle tipologie di traffico stradale con redistribuzione del traffico locale su strade comunali e del traffico passante su infrastruttura dedicata.



Capacità	
Velocità	
Accessibilità	
Regolarità	X
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Emilia Romagna

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 1438: Nodo ferrostradale Casalecchio di Reno: interramento linea Porrettana (stralcio ferroviario)

	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																					
Nodo Casalecchio di Reno: interramento linea Porrettana (stralcio ferroviario)								X									X				

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatiche di breve				
								Priorità 1	Priorità 2			
140,38	4,21	di cui:	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	136,16	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE						
Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
140,38						140,38
Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
4,21						4,21

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Nodo Casalecchio di Reno: interramento linea Porrettana (stralcio ferroviario)	140,38	4,21	136,16	137,50	2,87	3,58	2,69	0,74	0,00	0,00	0,78	1,06	5,00	137,17
	140,38	4,21	136,16	137,50	2,87	3,58	2,69	0,74	0,00	0,00	0,78	1,06	0,62	137,17

CRONOPROGRAMMA														
CUP	Stato attuativo				Iter procedurale									
	Progettazione	-	-	-	Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione	
					Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine
					6-2020	2-2030	6-2029	2-2030	4-2028	10-2028	3-2030	4-2035	-	-
Nodo Casalecchio di Reno: interramento linea Porrettana (stralcio ferroviario)	J81J05000010008	Progettazione	-	-	-	-	6-2020	2-2030	6-2029	2-2030	4-2028	10-2028	3-2030	4-2035

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma prevede il potenziamento tecnologico ed infrastrutturale degli impianti e delle linee afferenti il nodo, interessate da traffico promiscuo regionale, medio-lunga percorrenza e merci. Gli interventi infrastrutturali tipicamente prevedono l'adeguamento/potenziamento del Piano Regolatore Generale (PRG) delle stazioni per gestire le interferenze tra flussi, la realizzazione di nuove fermate e la riqualificazione di quelle esistenti per garantire una migliore accessibilità al sistema ferroviario. Ulteriori interventi riguardano l'upgrading dei sistemi di Informazione al Pubblico, il potenziamento dei sistemi di alimentazione elettrica e interventi diffusi sulla sede e sulla sovrastruttura ferroviaria per omogeneizzare le caratteristiche prestazionali delle linee e gestire obsolescenza e punti singolari. Gli interventi sono prioritariamente legati agli accordi quadro per la capacità sottoscritti da RFI e le Regioni.

Tra gli interventi previsti: A) Interventi Per AQ sulle linee Bologna – Rimini e Bologna - Porretta Terme/Vignola: realizzazione nuovo binario di precedenza pari nella stazione di Forlì e riconfigurazione dell'apparato di stazione; realizzazione nuovo binario di precedenza pari nella stazione di Castel San Pietro Terme, adeguamento a standard H55 del marciapiede corrispondente e riconfigurazione dell'apparato di stazione; ripristino del binario V della Stazione di Castelbolognese, realizzazione del nuovo tracciato indipendente verso Ravenna, riconfigurazione dell'apparato di stazione e adeguamento del marciapiede a servizio del binario V a standard H55; ripristino del binario IV della Stazione di Imola e del relativo marciapiede e, riconfigurazione dell'apparato di stazione; realizzazione di nuovo Posto di Blocco Intermedio sulla linea Bologna-Pistoia, nella tratta PM Santa Viola – Casalecchio Garibaldi, tra le fermate di Borgo Panigale e Castelbolognese; ripristino binario di incrocio nella stazione di Vergato. B) PIMBO. Nell'ambito del Progetto Integrato della Mobilità Bolognese (PIMBO) per il completamento del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) e per la filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano, è stata inserita anche la realizzazione e il completamento delle fermate SFM di Bologna, progetto promosso e finanziato in collaborazione con gli Enti locali. Il progetto è articolato come segue: Fase 1: Opere ferroviarie ricadenti nel Progetto Definitivo approvato dalla Delibera CIPE 92/2017 realizzate da RFI in conto terzi:

interventi di completamento della fermata esistente di Bologna San Vitale/Rimesse (FER) a servizio delle linee Bologna - Prato e Bologna-Portomaggiore (FER); interventi per il completamento della nuova fermata di Bologna Borgo Panigale Scala a servizio della linea Bologna-Milano; ammodernamento della stazione di Bologna San Ruffillo a servizio della linea Bologna-Prato; realizzazione nuova fermata del sistema SFM Bologna Zanardi a servizio della linea Bologna-Padova. Fase 2: Interventi realizzati da RFI in conto investimenti: - interventi di accessibilità alla fermata di Bologna Borgo Panigale Scala; - ammodernamento della fermata di Bologna Fiere a servizio della linea di Cintura di Bologna; - realizzazione nuova fermata del sistema SFM Bologna Prati di Caprara, a servizio delle linee Bologna - Milano, Bologna - Verona, Bologna – Pistoia.

Regione Emilia Romagna

STATO DI ATTUAZIONE


attualità dati: 30/06/2025

A) Interventi Per AQ sulle linee Bologna – Rimini e Bologna - Porretta Terme/Vignola Le attività in stazione di Vergato e di Forlì sono state già eseguite così come è già stato realizzato il posto di blocco intermedio tra Bologna S. Viola e Casalecchio Garibaldi. L'attività di Castelbolognese è sostanzialmente ultimata, mentre le lavorazioni su Imola e Castel S. Pietro Terme sono previste entro il 2025 e il 2027. Gli interventi al PM di Mirandola Ozzano sono in fase di progettazione e le fasi realizzative saranno ultimate nel 2027. B) PIMBO Fermate di Bologna Si è concluso l'adeguamento del Progetto Definitivo degli interventi di competenza RFI, approvato dal CIPE con Delibera 92/2017, trasmesso al Comune di Bologna a novembre 2022. Si è in attesa delle determinazioni MIT/Comune in merito alla proposta di realizzazione degli interventi per fasi, in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Sviluppo del traffico Regionale e Metropolitano- Efficientamento e potenziamento tecnologico delle infrastrutture- Eliminazione di «colli di bottiglia» Interventi Per AQ sulle linee Bologna – Rimini e Bologna - Porretta Terme/Vignola - Maggiore accessibilità al servizio ferroviario con la realizzazione di un binario dedicato ai servizi per Ravenna presso l'impianto di Castel Bolognese. - Maggiore regolarità dell'esercizio ferroviario con la mitigazione degli effetti dovuti alle differenze di velocità tra i diversi servizi presenti sulla linea (lunga percorrenza e regionali). Progetto PIMBO: L'intervento completa il sistema del Servizio Ferroviario Metropolitano bolognese favorendo la nascita di nuovi servizi ferroviari, in linea con quanto prospettato da Regione Emilia Romagna.

Programma P112: Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Bologna

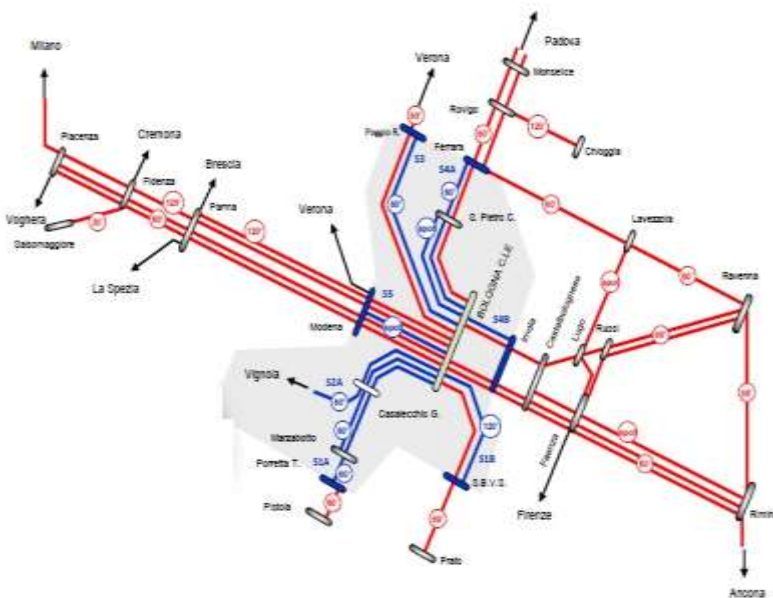

	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	X
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Emilia Romagna

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica							Obiettivi strategici				
	PNRR	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Altri Provvedimenti*	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Bologna - interventi diffusi						X		X			X	
Interventi di potenziamento linea Bologna-Imola-Rimini						X		X			X	
Completamento fermate SFM Bologna						X		X			X	

QUADRO FINANZIARIO

Costo	Totale Risorse	Sezione 1 - Opere in corso finanziate							Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
		di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
195,04	132,17		113,21	0,09	0,00	0,00	0,00	18,87	0,00	33,20	29,68

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

Evoluzione Costo							Evoluzione coperture finanziarie	
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	CdP-I agg.2024	CdP-I agg.2025
224,30			-29,26			195,04	121,10	132,17
Variazione di costo per una riduzione del perimetro per spostamento fabbisogni legati ad upgrading tecnologico sul programma ERTMS							Copertura con risorse proprie della Società per interventi non rientranti nel Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria	
PIANO DELLA SPESA							Produzione	
Quadro finanziario ed economico							OGV	

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P112: Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Bologna

	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Completamento fermate SFM Bologna	53,20	20,00	33,20	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	53,20
Interventi di potenziamento linea Bologna-Imola-Rimini	36,20	36,20	0,00	30,13	6,07	25,20	22,38	14,04	1,83	0,42	4,59	1,37	8,70	13,87
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Bologna - interventi diffusi	105,64	75,97	29,68	67,61	38,03	64,96	57,92	7,04	1,75	13,57	20,16	4,99	12,04	50,59
	195,04	132,17	62,88	97,75	97,30	90,16	80,30	21,08	3,58	14,00	24,75	6,36	7,60	117,66

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
PIMBO Fermate di Bologna		53,20	20,00	38%	0,00	0%	Progettazione
Completamento fermate SFM Bologna		53,20	20,00	38%	0,00	0%	
Interventi di potenziamento legati ad Accordo Quadro – Bologna	J34H17000120001	36,20	36,20	100%	22,66	63%	Realizzazione
Interventi di potenziamento linea Bologna-Imola-Rimini		36,20	36,20	100%	22,66	63%	
Upgrading nodo di Bologna		34,88	5,20	15%	0,00	0%	Progettazione
BO - upgrading infrastrutturali e tecnologici diffusi	J44E21000080001	18,11	18,11	100%	17,52	97%	In ultimazione
BO - upgrading infrastrutturali e tecnologici diffusi	J44E22000060001	14,15	14,15	100%	13,46	95%	In ultimazione
BO - upgrading infrastrutturali e tecnologici diffusi	J84J24000790001	11,07	11,07	100%	6,27	57%	Realizzazione
BO - upgrading infrastrutturali e tecnologici diffusi	J87F20000270001	10,00	10,00	100%	8,77	88%	Realizzazione
BO - upgrading infrastrutturali e tecnologici diffusi	J87F19000260001	9,63	9,63	100%	9,56	99%	In ultimazione
BO - upgrading infrastrutturali e tecnologici diffusi	J44J23000990001	7,81	7,81	100%	6,60	85%	Realizzazione
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Bologna - interventi diffusi		105,64	75,97	72%	62,18	82%	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il tratto urbano della nuova linea AV/AC, lungo complessivamente oltre 9 km, si sviluppa per circa 7 km in sotterranea con due gallerie parallele mantenendosi in superficie nei tratti terminali di Castello - Rifredi e di Firenze Campo di Marte - Rovezzano. Lungo il tracciato in sotterranea, in zona Belfiore - Macelli, è prevista la costruzione di una nuova stazione AV dedicata al traffico Alta Velocità, un hub intermodale in connessione diretta con l'aeroporto di Firenze e la stazione di Santa Maria Novella tramite una fermata dedicata Stazione AV lungo la nuova linea tramviaria 2 Piazza dell'Unità - Aeroporto Peretola.

Sono parte del progetto anche diversi interventi propedeutici di natura ferroviaria e alcune opere di mitigazione socio ambientale.

L'intervento è interamente localizzato in Regione Toscana, Provincia e Comune di Firenze. Si tratta di una nuova linea ad alta Velocità/Capacità, per la maggior parte in sotterraneo, compresa la nuova Stazione AV. L'opera principale (l'appalto a CG) interessa l'area urbana di Firenze, sottoattraversa due aste idrauliche (i torrenti Mugnone e Terzolle) e riguarda aree esclusivamente pianeggianti. Non sono presenti opere d'arte significative, ad esclusione della doppia canna in affiancamento che realizza il sotto-attraversamento della città e della Stazione AV.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Passante e Stazione A novembre 2022 è stata comunicata l'aggiudicazione al costituendo Consorzio Pizzarotti-Saipem (successivamente costituitosi in Consorzio Florentia), per il completamento dei lavori della Stazione e del Passante; a gennaio 2023 è avvenuta la consegna lavori ed è in corso la realizzazione dell'opera. Sono in corso lavori in stazione e lo scavo con TBM del binario pari e dispari del passante AV. Sono state inoltre avviate le attività per la realizzazione del bypass del Mugnone. Opere in Superficie Per quanto concerne gli interventi di superficie si possono considerare essenzialmente ultimati. Sono in corso alcuni interventi di progettazione e realizzazione di barriere antirumore.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

L'intervento consente di separare i flussi lunga percorrenza da quelli regionali, permettendo quindi agli uni di mantenere la marcia il più possibile imperturbata, e agli altri di effettuare le fermate in ambito urbano senza interferenze con i servizi a velocità maggiore. Il nuovo assetto del nodo permetterà di liberare capacità per lo sviluppo del sistema ferroviario metropolitano della città di Firenze in linea con le previsioni di Accordo Quadro, nonché un incremento in termini di regolarità ambito nodo. Nel Passante è prevista l'installazione dell'ERTMS L2, senza soluzione di continuità rispetto alle linee AV Bologna - Firenze e Firenze - Roma. - Riduzione dei tempi di percorrenza per i servizi AV che attualmente effettuano fermata nella stazione di Santa Maria Novella. - Miglioramento della regolarità della circolazione del nodo grazie alla separazione dei flussi lunga percorrenza, regionali e merci. - Liberazione di capacità nella tratta Firenze Rifredi - Firenze CM nonché a Firenze SMN per lo sviluppo del sistema ferroviario metropolitano della Città di Firenze in linea con le previsioni di Accordo con Regione Toscana.



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Toscana

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto A5000_1: Nodo AV di Firenze

	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																					
Nodo AV di Firenze					X	X	X						X				X				

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatiche di breve				
								Priorità 1	Priorità 2			
2.735,02	2.735,02	di cui:	242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,98	0,00	0,00	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
2.735,02						2.735,02

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
2.735,02						2.735,02

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Nodo AV di Firenze	2.735,02	2.735,02	0,00	2.155,91	579,11	2.151,90	1.127,22	822,04	37,67	33,00	39,19	52,93	14,41	1.598,34
	2.735,02	2.735,02	0,00	2.155,91	579,11	2.151,90	1.127,22	822,04	37,67	33,00	39,19	52,93	151,85	1.598,34

CRONOPROGRAMMA														
Stato attuativo					Iter procedurale									
CUP		Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità		
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine			
Nodo AV di Firenze		J91C04000000008	Realizzazione	-	-	1-2004	6-2020	1-2004	-	10-2005	12-2021	6-2006	5-2029	12-2028

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma prevede il potenziamento tecnologico ed infrastrutturale degli impianti e delle linee afferenti il nodo, interessate da traffico promiscuo regionale, medio-lunga percorrenza e merci. Gli interventi infrastrutturali tipicamente prevedono l'adeguamento/potenziamento del Piano Regolatore Generale (PRG) delle stazioni per gestire le interferenze tra flussi, la realizzazione di nuove fermate e la riqualificazione di quelle esistenti per garantire una migliore accessibilità al sistema ferroviario. Dal punto di vista tecnologico è generalmente previsto il potenziamento del sistema di distanziamento (anche con sezioni corte e/o ERTMS High Density nelle tratte più congestionate), degli apparati centrali e del sistema di supervisione e regolazione della circolazione per migliorare la regolarità di esercizio e consentire l'incremento della capacità. Ulteriori interventi riguardano l'upgrading dei sistemi di Informazione al Pubblico, il potenziamento dei sistemi di alimentazione elettrica e interventi diffusi sulla sede e sulla sovrastruttura ferroviaria per omogeneizzare le caratteristiche prestazionali delle linee e gestire obsolescenza e punti singolari. Gli interventi sono prioritariamente legati agli accordi quadro per la capacità sottoscritti da RFI e le Regioni.

Le principali realizzazioni riguardano: A) potenziamento tecnologico del nodo: Il Progetto comprende: Revamping ed upgrading del CTC Firenze – Roma (linee LL e DD), ed adeguamento della sala controllo di Firenze Campo Marte; Realizzazione dell' ACC Multistazione del Nodo di Firenze (comprendente Firenze S.M.N.), upgrading tecnologico del sistema di supervisione della circolazione del nodo di Firenze e realizzazione del HD - ERTMS del Nodo di Firenze; Realizzazione dell' ACC Firenze Castello e dell' ACC Multistazione Empoli – Rifredi; B) PRG di Empoli. L'intervento prevede:- Integrazione servizio metropolitano stazione di Empoli: Al fine di potenziare il servizio viaggiatori da/per Empoli, sono previsti all'interno dell'area della stazione, tre nuovi binari di attestamento da adibire al servizio metropolitano: Piazzale Est con due nuovi binari di testa e relativo marciapiede intermedio; Piazzale Ovest con un nuovo binario tronco e relativo marciapiede. In ragione degli interventi da attuare, si rende necessaria la modifica del tracciato del binario esistente l' Est con conseguente allungamento del relativo marciapiede. Inoltre sono previsti implementazione delle periferiche audio e dotazione segnaletica; oltre che alla realizzazione di 5 nuove pensiline nelle banchine ferroviarie.- Armamento PRG: Sono previste modifiche dell'attuale piano del ferro di stazione finalizzate a migliorare i flussi ferroviari in stazione, attualmente in fase di ottimizzazione, che prevederanno modifiche della radice lato Firenze per consentire le comunicazioni in parallelo dei binari provenienti da Firenze verso quelli in direzione Siena; adeguamento della radice lato Siena/Pisa della stazione per migliorare l'innesto della linea Empoli-Siena in ragione anche del futuro raddoppio della linea Empoli-Granaiole; adeguamento delle comunicazioni di ingresso sul VI binario, finalizzati a completare l'allungamento del modulo dello stesso a 750 m, con transito sullo stesso a 60km/h.C) Nuova fermata Firenze Guidoni: Interventi al fabbricato Viaggiatori, Aree Esterne ed Accessibilità:- Realizzazione di nuovo Fabbricato Viaggiatori con corpi di risalita a quota binario, di un sottopasso a quota piano campagna, dei marciapiedi ferroviari, di una pensilina di copertura del fabbricato e dei marciapiedi e la sistemazione delle aree esterne, con l'inserimento delle dotazioni intermodali di fermata. - Realizzazione, a partire dalla quota del marciapiede ferroviario, di una nuova passerella pedonale, che consentirà di sovrappassare in sicurezza Viale Guidoni e Viale XI Agosto, raggiungendo la fermata della linea tramviaria e il parcheggio di interscambio.

Gli interventi interessano la Regione Toscana.

STATO DI ATTUAZIONE*attualità dati: 30/06/2025*

A) Potenziamento tecnologico del nodo- Sono state conseguite tutte le attivazioni previste a meno di quelle relative ai punti successivi; - Sono in corso i lavori relativi all'ACCM, SCCM e HD ERTMS del Nodo di Firenze; - Sono in corso i lavori relativi all'ACCM della tratta Empoli – Rifredi. - Sono in corso i lavori relativi al PP-ACC di Firenze Castello. B) PRG di Empoli Ultimato l'iter approvativo. Di prossimo avvio le attività negoziali.


C) Nuova fermata Firenze Guidoni -Progettazione definitiva completata;- Completata la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA presso il Ministero dell'Ambiente (parere favorevole di esclusione); - Conferenza di Servizi in corso

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Gli interventi individuati sono finalizzati al rinnovo tecnologico degli impianti del Nodo con contestuale aumento di produttività ed efficientamento nella gestione della circolazione, della gestione dell'informazione al Pubblico e della diagnostica dell'infrastruttura. In particolare il progetto consente di:- Garantire una supervisione integrata della circolazione;- Realizzare un sistema di circolazione ad alta densità/alta capacità di tipo HD ERTMS; - Aumentare la regolarità; La nuova fermata Firenze Guidoni consentirà: - Incremento dell'accessibilità alla rete ferroviaria;- Riqualificazione di spazi urbani e ferroviari;- Realizzazione dell'interscambio tra la rete ferroviaria e la linea tramviaria T2, anche in ottica di connessione con l'aeroporto Vespucci.

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P076: Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Firenze

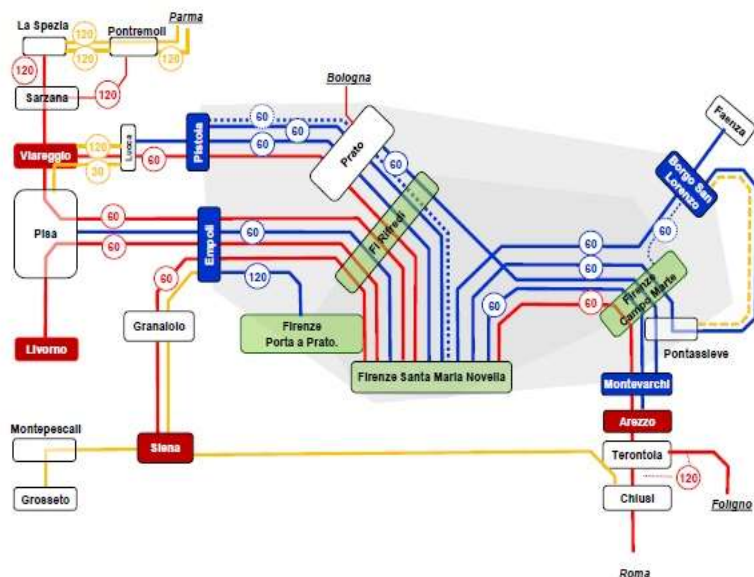

Capacità	X
Velocità	
Accessibilità	X
Regolarità	X
Prestazioni (merci)	X
Gestione dei rotabili	X
Gestione spazi di stazione	X
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Toscana

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change	Adeguamento a standard tecnici	Sviluppo tecnologico	Sistemi regionali e metropolitani	Potenziamento connessioni merci	Sviluppo corridoi TEN-T	Completamento valichi alpini	Alta Velocità (AV)
Intervento / Opere funzionali																					
Potenziamento tecnologico nodo di Firenze					X					X									X		
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Firenze - interventi diffusi					X														X		
PRG Empoli					X														X		
Nuova fermata Firenze Guidoni					X														X		

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo

Sezione 1 - Opere in corso finanziate

Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve		finanziari a completamento
								Priorità 1	Priorità 2	
379,56	di cui:	363,28	13,28	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
478,72	-42,30			2,47		438,88	Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari e allo spostamento in tabella C dei progetti ultimate.

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
408,72	-42,30			2,47	10,68	379,56	Rimodulazione di risorse per 10,68 M€ a favore della fermata di Firenze Guidoni (da intervento P237). Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P076: Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Firenze

dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
PRG Empoli	36,60	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	36,60
Nuova fermata Firenze Guidoni	23,84	23,84	0,00	0,13	23,71	0,74	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	5,00	23,25
Potenziamento tecnologico nodo di Firenze	277,47	277,47	0,00	257,55	19,92	167,68	124,93	61,35	14,08	15,12	10,48	12,97	23,71	145,86
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Firenze - interventi diffusi	100,97	41,66	59,32	37,33	63,64	37,93	35,11	0,00	0,00	3,39	29,45	1,74	5,00	64,28
	438,88	379,56	59,31	331,61	107,27	206,36	160,61	61,35	14,08	18,51	39,92	15,02	20,01	269,99

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Nuova fermata di Firenze Guidoni	J11G22000000009	23,84	23,84	100%	0,74	3%	Realizzazione
Nuova fermata Firenze Guidoni		23,84	23,84	100%	0,74	3%	
Potenziamento tecnologico del nodo di Firenze	J67111000230001	277,47	277,47	100%	138,37	50%	Realizzazione
Potenziamento tecnologico nodo di Firenze		277,47	277,47	100%	138,37	50%	
Nuovo PRG della stazione di Empoli	J74E21001910001	36,60	36,60	100%	0,00	0%	Progettazione
PRG Empoli		36,60	36,60	100%	0,00	0%	
Upgrading nodo di Firenze		62,36	3,04	5%	0,00	0%	Progettazione
Potenziamento infrastrutturale e tecnologico ambito Firenze	J87H22000310001	28,62	28,62	100%	28,47	99%	In ultimazione
Potenziamento infrastrutturale e tecnologico ambito Firenze	J87F20000260001	10,00	10,00	100%	8,24	82%	Realizzazione
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Firenze - interventi diffusi		100,97	41,66	41%	36,70	88%	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi:- un sistema People Mover con attestamento da un lato, sulla sede dell'attuale binario 1A nella stazione di FI SMN, dall'altro lateralmente alla futura stazione AV di Belfiore, a cui è connessa attraverso un sistema di collegamenti orizzontali/passerelle aeree.- nuova fermata di Circondaria, che prevede l'integrazione intermodale del sistema ferroviario regionale, non solo con la stazione AV ma anche con gli altri sistemi di trasporto pubblico, comprensivo delle sistemazioni esterne necessarie per garantire - l'accessibilità alla nuova Fermata nonché allo scambio dei flussi con la Stazione AV che avverrà tramite un sistema di collegamenti orizzontali/verticali e passerelle aeree. Inoltre, in coerenza con gli scenari del PUMS comunale, sarà realizzata un'area di sosta per bus turistici.

Toscana

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•Fermata Circondaria:Circondaria(1°fase): conclusa la PFTE, in corso l'iter autorizzativo ambientale (inviato al MASE la documentazione per la verifica di assoggettabilità alla VIA).Circondaria(2°fase): previsto l'avvio della redazione del PFTE di completamento a seguito della definizione degli input progettuali delle aree esterne di Stazione AV.È in corso un tavolo di confronto con il Comune di Firenze e la Regione Toscana per la definizione dell'assetto finale delle aree esterne la stazione che costituisca un unicum con le opere di accessibilità alla stazione AV. •People Mover:Previsto l'avvio della redazione del PFTE di completamento a seguito della definizione degli input progettuali delle aree esterne di Stazione AV.È in corso un tavolo di confronto con il Comune di Firenze e la Regione Toscana per la definizione dell'assetto finale delle aree esterne la stazione che costituisca un unicum con le opere di accessibilità alla stazione AV.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Gli obiettivi primari dell'investimento sono quelli di migliorare l'integrazione funzionale fra il sistema della mobilità urbana e i servizi ferroviari AV e regionali e garantire una migliore accessibilità al nodo intermodale di Belfiore da parte dell'utenza, attraverso tempi di connessioni ottimizzati, in linea con l'assunto fondamentale del Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS) di assegnare al trasporto pubblico (ferrovie, tramvie, autobus) il ruolo privilegiato per la penetrazione verso il centro e di collegamento bipolare fra il centro storico e le aree cittadine e metropolitane a maggiore domanda di spostamento.



Capacità	
Velocità	
Accessibilità	X
Regolarità	
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Toscana

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Intervento / Opere funzionali	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Resilienza al climate change	Coesione sociale e territoriale
People mover Firenze Belfiore - Santa Maria Novella	X	X	X	

Tabella A06-Programmi città metropolitane

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Nell'ambito della realizzazione della stazione AV Roma Tiburtina si è proceduto con il riassetto del fascio dei binari e la costruzione della nuova stazione-ponte. Il Piano di Assetto di Roma Tiburtina prevede inoltre dei servizi tecnici di stazione ST1 nel comparto C2/C3 del fronte nomentano di stazione. Con specifico atto d'obbligo tra RFI e Roma Capitale, RFI ha assunto l'impegno di realizzare il parco V4, sono compresi ulteriori interventi che completano la riqualificazione urbanistica delle aree interessate.

L'intervento ricade nell'ambito del Comune di Roma, e rappresenta la ricucitura urbana tra 2 quartieri storicamente separati dalla ferrovia: Nomentano e Tiburtino-Pietralata.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

La Stazione AV di Roma Tiburtina è stata attivata il 28.11.2011. Nel dicembre 2020, a cura di FSSU è stata presentata a Roma Capitale una proposta di variante urbanistica al Piano di Assetto per il completamento dell'attuazione del piano medesimo successivamente aggiornata ad agosto 2021. L'avvio della revisione del Progetto Definitivo dei comparti ST1, C2 e C3 è subordinata alla approvazione della variante urbanistica. Il Piano Operativo di Bonifica del Parco V4 è stato approvato da Roma Capitale con Determina Dirigenziale del gennaio 2020. Sono concluse le attività di monitoraggio delle acque su ulteriori tre comparti (V4, C8 e C9), in relazione alle modifiche di perimetro e di destinazione d'uso introdotte dalla variante urbanistica e d'intesa con il Dipartimento Ciclo Rifiuti. Ai fini dell'elaborazione di un nuovo Piano Operativo di Bonifica in variante per i comparti V4, C8 e C9, è stata redatta la nuova analisi di rischio che verrà trasmessa agli enti per il parere di competenza.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

La nuova stazione AV di Roma Tiburtina consente di ottenere un sistema integrato nel Nodo Urbano a beneficio anche del traffico regionale e pendolare con importanti opportunità di sinergia e sviluppo rispetto ad altre città vicine come Napoli e Firenze. Rappresenta inoltre un'opportunità di riqualificazione urbanistica delle aree circostanti, concepito come spazio non più dedicato alle sole attività ferroviarie ma anche luogo di incontro e nuova porta della città.



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lazio

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica		Obiettivi strategici	
	PNRR	Altri	Altri	Altri
Stazione AV stazione Tiburtina e infrastrutturazione area	X	Allegato MINS al DEF Tavoli tecnici di ascolto Altri Provvedimenti* Cofinanziamenti UE UE - workplan corridoi TEN-T AQ per l'utilizzo della capacità Fondo Sviluppo e Coesione Accordi EE.LL. Accordi Internazionali Interventi commissariati	Potenziamento connessioni merci Sistemi regionali e metropolitani Sviluppo tecnologico Adeguamento a standard tecnici Resilienza al climate change Accessibilità e qualità stazioni Coesione sociale e territoriale	Alta Velocità (AV) Completamento valichi alpini Sviluppo corridoi TEN-T

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Progetto 0083: Infrastrutturazione area stazione Tiburtina e nodo di interscambio

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art. 1 in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
322,50						322,50

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
286,84				16,30	0,32	303,46	Copertura per realizzazione parcheggio P6 e bonifica parco V4

CRONOPROGRAMMA

	CUP		Stato attuativo				Iter procedurale							
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Stazione AV stazione Tiburtina e infrastrutturazione area	J31H98000030008	Esercizio	5-2001	3-2015	6-2002	4-2027	2-2004	12-2026	5-2005	8-2027	10-2007	7-2027	11-2011	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede una soluzione di tracciato finalizzata alla chiusura dell'anello ferroviario di Roma nord tra la linea FL3 Roma-Viterbo, la linea Tirrenica e l'innesto sulla linea "merci" (direzione Chiusi e direzione Tiburtina) in corrispondenza del "bivio nord" (≈17.0 Km). Per il suo valore trasportistico, è stato deciso di riprendere la progettazione dell'anello parte Nord, che consentirebbe di potenziare l'offerta commerciale nel nodo e creare un servizio "a ring" con vocazione prevalentemente di trasporto passeggeri. In particolare tale progetto prevede: il raddoppio della tratta Valle Aurelia – Vigna Clara; il nuovo tracciato tra la fermata Vigna Clara e la stazione Val d'Ala comprensiva della nuova stazione Tor di Quinto (dove sarà possibile effettuare l'interscambio con la linea Roma – Viterbo gestita dall' ATAC) e della diramazione per Roma Smistamento (Bivio Tor di Quinto), e modifiche al PRG di Roma Tiburtina; l'interconnessione con la linea Roma – Grosseto (Bivio Pineto).

L'intervento si articola nei seguenti 3 lotti funzionali: Lotto 1: raddoppio della tratta Valle Aurelia – Vigna Clara – Tor di Quinto suddiviso a sua volta in: Lotto 1A: raddoppio Valle Aurelia – Vigna Clara; Lotto 1B: realizzazione nuovo tracciato Vigna Clara – Tor di Quinto comprensivo della nuova stazione Tor di Quinto (con interscambio con la linea Roma – Viterbo gestita dall' ATAC); Lotto 2: nuovo tracciato tra Tor di Quinto e Val d'Ala, diramazione per Roma Smistamento (Bivio Tor di Quinto) e modifiche al PRG di Roma Tiburtina; Lotto 3: Bivio Pineto – Stazione Aurelia (bretella Tirrenica) e Bivio Tor di Quinto - Smistamento (bretella Roma Firenze).

Gli interventi ricadono interamente nel Comune di Roma, si sviluppa parte in galleria sotto l'altura di Monte Mario e parte in rilevato /viadotto tre la piana di Tor di Quinto la zona Salaria. Il tracciato attraversa il fiume Tevere il fiume Aniene. L'opera è costituita prevalentemente da viadotti e gallerie.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•Lotto 1A: Raddoppio Valle Aurelia-Vigna Clara: A dicembre 2023 è stato chiuso iter autorizzativo; concluse le attività negoziali e consegnate le prestazioni di progettazione esecutiva, tutt'ora in corso. •Lotto 1B: Vigna Clara-Tor di Quinto: Dibattito Pubblico concluso nel 2023. Acquisito parere CSLLPP sul PFTE; avviata procedura VIA e iter autorizzativo su PFTE. In considerazione del parere negativo del Ministero della Difesa, è in corso di elaborazione una revisione del progetto dell'accesso alla stazione Tor di Quinto che comporterà la necessità di integrare la documentazione presenta in sede VIA e CdS. •Lotto 2: Tor di Quinto-Val d'Ala e PRG Tiburtina: Da avviare il DOCFAP, poiché in esito al Dibattito Pubblico è emersa la richiesta di garantire un servizio ad anello chiuso senza "la rottura di carico" prevista a Roma Tiburtina. •Lotto 3: Bivio Pineto-Staz. Aurelia e Bivio Tor di Quinto-Roma Smistamento: Consegnato PFTE. Dibattito Pubblico da avviare in esito agli approfondimenti progettuali previsti sul lotto 2.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- istituzioni di nuovi servizi metropolitani; - accessibilità diretta ai servizi ferroviari per alcuni municipi urbani; - migliore integrazione della rete anche con l'interscambio a Tor di Quinto con la linea Roma - Viterbo gestita da ATAC; - nuove funzioni di interscambio con la fermata di Val d'Ala, oggetto di futuro prolungamento dei servizi FL2 Roma-Avezzano-Sulmona in relazione al completamento del PRG di Roma Tiburtina- itinerari alternativi di traffico in condizioni di circolazione perturbata.



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	X
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lazio

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0258_A: Chiusura anello ferroviario di Roma

	PNRR	Accordi internazionali Interventi commissariati	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF		Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Adeguamento a standard tecnici	Sviluppo tecnologico	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																					
Chiusura anello di Roma lotto 1A Raddoppio Valle Aurelia - Vigna Clara		X			X	X									X	X					
Chiusura anello di Roma lotto 1B Vigna Clara - Tor di Quinto		X			X	X									X	X					
Chiusura anello di Roma lotto 2 Tor di Quinto - Val d'Ala		X			X	X									X	X					
Chiusura anello di Roma lotto 3 Collegamenti con linee Tirrenica e Roma-Firenze		X			X	X									X	X					

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatiche di breve				
								Priorità 1	Priorità 2			
1.245,79	117,78	di cui:	117,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,04	861,97		

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE						
Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
1.245,79						1.245,79
Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
117,78						117,78

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Chiusura anello di Roma lotto 1A Raddoppio Valle Aurelia - Vigna Clara	76,94	76,94	0,00	50,03	26,91	41,98	8,59	3,53	0,09	1,00	0,59	2,30	5,05	68,16
Chiusura anello di Roma lotto 1B Vigna Clara - Tor di Quinto	306,88	40,84	266,04	287,77	19,11	4,41	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	304,18
Chiusura anello di Roma lotto 2 Tor di Quinto - Val d'Ala	394,08	0,00	394,08	368,97	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	394,08
Chiusura anello di Roma lotto 3 Collegamenti con linee Tirrenica e Roma-Firenze	467,89	0,00	467,88	435,73	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	467,89
	1.245,79	117,78	1.128,01	1.142,50	103,28	46,39	9,24	3,53	0,09	1,00	0,59	2,30	3,95	1.234,31

CRONOPROGRAMMA														
CUP	Stato attuativo				Iter procedurale									
					Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione	
					Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine
Chiusura anello di Roma lotto 1A Raddoppio Valle Aurelia - Vigna Clara	J31H03000180008	Realizzazione			11-2002	8-2028	9-2026	8-2028	-	-	-	-	-	4-2026
Chiusura anello di Roma lotto 1B Vigna Clara - Tor di Quinto	J31H03000180008	Iter autorizzativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7-2029
Chiusura anello di Roma lotto 2 Tor di Quinto - Val d'Ala	J31H03000180008	Progettazione	-	-	3-2028	-	-	-	-	-	3-2028	12-2028	12-2028	6-2033

Chiusura anello di Roma lotto 3 Collegamenti con linee Tirrenica e Roma-Firenze	J31H03000180008	Progettazione	-	-	-	12-2028	-	-	12-2028	9-2029	9-2029	4-2035	7-2035
---	-----------------	---------------	---	---	---	---------	---	---	---------	--------	--------	--------	--------

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto si colloca nel quadrante orientale di Roma e prevede la prosecuzione del raddoppio già realizzato nel tratto Tiburtina-Prenestina-Lunghezza (estesa di circa 15 km della linea FL2), per la maggior parte in affiancamento all'attuale tracciato. La prosecuzione del raddoppio da Lunghezza a Guidonia Colle Fiorito si estende per circa 10 km e prevede, l'estensione dell'attuale sistema di telecomando (SCC FL2) sino a Guidonia. Il progetto prevede la realizzazione di opere civili, armamento, trazione elettrica a 3 kV cc, impianti tecnologici avanzati per il distanziamento e la sicurezza ferroviaria e nuovi apparati tecnologici, prevedendo lavorazioni per fasi al fine di garantire sulla linea il mantenimento dello standard di servizio attualmente offerto e per le altre opere limitare il disturbo alla viabilità e quindi agli abitanti. Sono previste le seguenti fasi:- Macrofase 2: Raddoppio Lunghezza - Bagni di Tivoli e modifica del PRG Bagni di Tivoli- Macrofase 3: Nuova stazione di Guidonia Colle Fiorito- Macrofase 4 e 5: Raddoppio Bagni di Tivoli – Guidonia Colle Fiorito e Barriere

L'intervento di raddoppio, che ricade nei Comuni di Roma, Tivoli e Guidonia, si sviluppa su una fascia collinare tra Roma e i monti Tiburtini caratterizzata dagli ambiti urbanizzati di Lunghezza, Tivoli e Guidonia intervallati da aree di tipo agrario. L'opera è costituita prevalentemente da una successione di rilevati e trincee interrotte da opere d'arte che risolvono le interferenze stradali e idrauliche. Non sono previste opere d'arte significative.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Macrofase 2 - Raddoppio Lunghezza – Bagni di Tivoli In corso di realizzazione il raddoppio della tratta Lunghezza - Bagni Tivoli comprensive di OO.CC e tecnologie ed il nuovo PRG Bagni di Tivoli. Macrofase 3 - Nuova Stazione di Guidonia Colle Fiorito Sono attualmente in corso le lavorazioni delle OO.CC e tecnologie. Macrofase 4 e 5 – Barriere e Raddoppio Bagni di Tivoli – Guidonia Colle Fiorito Avviata la procedura VIA sul PFTE e acquisito il parere del Comitato Speciale del CSLPP. A marzo 2025 è stato avviato l'iter autorizzativo a cura del Commissario Straordinario.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Incremento della capacità (da 4 treni/h nei due sensi di marcia a 10 treni/h per direzione) con prolungamento da Lunghezza a Guidonia del servizio metropolitano con cadenzamento a 15'- Miglioramento della regolarità della circolazione e ottimizzazione della gestione dei rotabili, grazie all'incremento del numero di binari per la sosta con la nuova località di Guidonia Colle Fiorito con eliminazione degli invii attualmente programmati- Miglioramento dell'accessibilità grazie ad interventi di viabilità, all'eliminazione dei PL e alla realizzazione di parcheggi di interscambio a Guidonia Colle Fiorito ed a Bagni di Tivoli.- Riduzione dei tempi di percorrenza



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	X
	Gestione spazi di stazione	X
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lazio

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0260: Raddoppio Lunghezza-Guidonia

	PNRR	Accordi Internazionali Interventi commissariati	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF		Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																					
Raddoppio Lunghezza-Guidonia 1^ fase (Lunghezza-Bagni di Tivoli)	X	X			X		X			X						X					
Raddoppio Lunghezza-Guidonia 2^ fase (Bagni di Tivoli - Guidonia)		X			X					X						X					

QUADRO FINANZIARIO												milioni di euro		
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento			
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2				
395,14	178,71	di cui:	103,87	0,00	0,00	74,40	0,44	0,00	0,00	18,61	197,82			

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE												milioni di euro		
Evoluzione Costo														
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze							CdP-I agg.2025		
354,54			40,60									395,14	Tratta Lunghezza - Bagni di Tivoli: variazione di costo ad esito della progettazione esecutiva, dovuto all'incremento dei costi per le barriere antirumori e per gli appalti di attrezzaggio tecnologici. Raddoppio della tratta Bagni di Tivoli - Guidonia: aggiornamento dei quadri economici ad esito della progettazione definitiva.	

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrig	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
178,71						178,71

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Lunghezza-Guidonia 1^ fase (Lunghezza-Bagni di Tivoli)	192,32	173,71	18,61	118,97	73,35	160,23	122,54	61,43	4,16	2,79	9,83	31,83	13,20	63,84
Raddoppio Lunghezza-Guidonia 2^ fase (Bagni di Tivoli - Guidonia)	202,82	5,00	197,82	173,77	29,04	2,69	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	201,85
	395,14	178,71	216,43	292,74	102,39	162,93	123,51	61,43	4,16	2,79	9,83	31,83	19,41	265,69

CRONOPROGRAMMA														
</														

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

La linea Roma – Viterbo, da Roma Ostiense fino a Viterbo Porta Fiorentina, ha una estesa pari a 87,75 km; è a doppio binario da Ostiense fino a Cesano (km 27,64), a semplice binario da Cesano a Viterbo. Il raddoppio della tratta Cesano – Bracciano, prosecuzione del raddoppio già realizzato tra Roma e Cesano, si inquadra nell'ambito degli interventi finalizzati al potenziamento e allo sviluppo del trasporto ferroviario nella Regione Lazio. Il progetto prevede il raddoppio, parte in affiancamento al binario esistente e parte in variante di tracciato per 16 km tra le stazioni di Cesano e Bracciano, nonché l'eliminazione di tutti i passaggi a livello e la realizzazione di un sistema di distanziamento con Blocco Automatico (BA).

L'intervento è suddiviso in due 2 Fasi funzionali: Raddoppio Cesano - Vigna di Valle; Raddoppio Vigna di Valle – Bracciano.

L'intervento di raddoppio, che ricade nei Comuni di Roma, Anguillara Sabazia e Bracciano, si sviluppa su una fascia collinare posta a margine del complesso vulcanico Sabatino a carattere prevalentemente extraurbano agrario con densità abitative scarse fatta eccezione per gli agglomerati urbani di Cesano di Roma, Anguillara, Vigna di Valle e Bracciano. Tra Cesano e Vigna di Valle (12 km) l'opera è costituita prevalentemente da una successione di rilevati e trincee interrotte da opere d'arte che risolvono le interferenze stradali e idrauliche. Le principali opere d'arte tra Cesano e Vigna di Valle sono costituite da tre cavalcavia ferroviari e una galleria artificiale per la soppressione dei PL esistenti. Tra Vigna di Valle e Bracciano (4 km) l'opera si sviluppa prevalentemente in rilevati e trincee ad eccezione dell'ultimo chilometro dove si prevede una trincea tra muri per abbassare la quota della stazione di Bracciano.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•Raddoppio Cesano-Vigna di Valle: A gennaio 2022 è stata indetta dal Commissario Straordinario la CdS, la cui chiusura è vincolata all'emissione del Decreto MiTE - MiC di compatibilità ambientale dell'opera. Nell'ambito della VIA la Soprintendenza ha evidenziato l'incompatibilità della soluzione progettata per la stazione di Vigna di Valle con i vincoli paesaggistici presenti, pertanto è stato avviato uno specifico tavolo tecnico con Sovrintendenza e Commissione VIA. A seguito del positivo incontro con la Commissione VIA sulla nuova soluzione progettuale per Vigna di Valle, che recepisce le richieste della Commissione, si darà avvio ad un aggiornamento del PFTE. Parallelamente sono in corso interlocuzioni con il Comune di Anguillara per risolvere le criticità inerenti all'avvio della procedura con la Regione Lazio – Area Usi Civici ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, propedeutica anch'essa alla chiusura della CdS. •Raddoppio Vigna di Valle-Bracciano: PFTE consegnato a settembre 2022; verifica tecnica e recepimento prescrizioni conclusi a gennaio 2023. Il progetto sarà inviato al CSLLPP e sottoposto ad Iter Autorizzativo solo a seguito della chiusura positiva della VIA e della CdS della tratta Cesano-Vigna di Valle.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

L'intervento consentirà di incrementare la capacità della linea (da 4 treni/h nei due sensi di marcia a 10 treni/h per direzione), migliorare le prestazioni, ridurre i tempi di percorrenza, incrementare l'accessibilità e la regolarità della circolazione, creando le condizioni per prolungare il servizio di tipo metropolitano fino alla stazione di Bracciano.



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lazio

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0331: Raddoppio linea Roma-Viterbo: tratta Cesano-Bracciano

	PNRR	Interventi commissariati	Accordi internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF		Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																						
Raddoppio Cesano-Vigna di Valle		X				X					X						X					
Raddoppio Vigna di Valle-Bracciano		X				X					X						X					

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2		
713,12	18,50	di cui:	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,41	304,21	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l’affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell’investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all’art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE						
Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
713,12						713,12
Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
18,50						18,50

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam. AI	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Cesano-Vigna di Valle	402,22	11,82	390,41	384,04	18,18	7,07	5,84	3,43	0,63	0,26	1,01	0,60	7,10	396,29
Raddoppio Vigna di Valle-Bracciano	310,90	6,68	304,21	299,50	11,40	0,57	0,13	0,00	0,00	0,02	0,06	0,00	5,00	310,78
	713,12	18,50	694,62	683,54	29,58	7,63	5,97	3,43	0,63	0,28	1,07	0,60	0,03	707,07

CRONOPROGRAMMA														
CUP		Iter autorizzativo	Stato attuativo				Iter procedurale							
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
Raddoppio Cesano-Vigna di Valle	J21C08000000009	Iter autorizzativo	4-2010	4-2026	3-2017	4-2026	1-2027	8-2027	-	-	1-2027	1-2030	1-2030	
Raddoppio Vigna di Valle-Bracciano	J21C08000000009	Iter autorizzativo	-	-	-	12-2026	-	-	-	-	9-2027	6-2030	6-2030	

Tabella A06-Programmi città metropolitane

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede il raddoppio della tratta Campoleone – Aprilia di circa 6 km, modifiche puntuali per la realizzazione e la velocizzazione del PRG nelle stazioni di Campoleone e Aprilia, adeguamento degli apparati di gestione della circolazione e dei sistemi di informazione al pubblico, per l'innesto sulla linea Roma-Napoli via Formia e Aprilia per gestire il passaggio da doppio a semplice binario del tratto di linea che in fase successiva proseguirà verso Nettuno. Nel dettaglio, l'intervento prevede il raddoppio della linea tramite la costruzione di un nuovo binario in sx in uscita dalla stazione di Campoleone fino al termine della curva, in modo da compatibilizzare il cavalcavia stradale esistente con i binari ferroviari di progetto, e successivamente con un nuovo binario in dx fino all'ingresso nell'impianto di Aprilia. L'interasse tra i 2 binari di linea è pari a 5.50 m, ed è tale da consentire il raddoppio con il contemporaneo esercizio ferroviario, e prevede il mantenimento del binario esistente nella posizione attuale.

L'intervento di raddoppio, ricade interamente nel Comune di Aprilia e si sviluppa su una fascia pianeggiante che degrada lentamente verso il mare. Il contesto è a carattere prevalentemente naturale/agrario ad eccezione degli ambiti urbanizzati presso la stazione di Campoleone e di Aprilia. L'opera è costituita prevalentemente da una successione di rilevati e trincee interrotte da opere d'arte che risolvono le interferenze stradali e idrauliche. Non sono previste opere d'arte significative.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Appalto OO.CC: Avviate a dicembre 2024 i lavori della «parte A» (bonifica ordigni bellici e relativi scavi e conferimenti); in data 16 aprile 2025 sono stati consegnati i lavori delle restanti opere (Parte B). Appalto Multidisciplinare Tecnologico: Consegna delle prestazioni avvenuta a giugno 2024, in corso di conclusione la progettazione esecutiva, a cui seguirà la verifica. I lavori potranno essere avviati, a seguito del completamento della sede del nuovo binario pari a cura dell'appalto opere civili.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Incremento della capacità (da 4 treni/h nei due sensi di marcia a 10 treni/h per direzione), incremento della regolarità di esercizio e delle prestazioni, nonché miglioramento dell'accessibilità al servizio da parte della clientela e riduzione dei tempi di percorrenza.



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lazio

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Accordi internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MINS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani
Raddoppio Campoleone-Aprilia	X		X	X	X					X					X

Progetto 0359: Raddoppio Campoleone-Aprilia

milioni di euro

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Campoleone-Aprilia	98,29	98,29	0,00	77,17	21,12	54,08	6,83	2,17	0,06	0,03	0,10	1,15	5,17	90,96
	98,29	98,29	0,00	77,17	21,12	54,08	6,83	2,17	0,06	0,03	0,10	1,15	3,82	90,96

Raddoppio Campoleone-Aprilia	J77112000010008	Realizzazione	1-2014	12-2014	3-2017	9-2023	-	-	12-2022	2-2025	7-2023	7-2027	1-2027
------------------------------	-----------------	---------------	--------	---------	--------	--------	---	---	---------	--------	--------	--------	--------

Tabella A06-Programmi città metropolitane

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede il potenziamento infrastrutturale e tecnologico delle linee regionali Roma-Albano e Roma-Frascati. L'intervento prevede:- la realizzazione di un posto di incrocio nella stazione di Marino, sulla linea Albano - Ciampino;- la realizzazione del sottopasso nella stazione di Marino, adeguamento PRG Marino e realizzazione nuova fermata di Villa Senni sulla linea Frascati – Ciampino;- potenziamento tecnologico, con realizzazione del nuovo apparato di Frascati e del nuovo sistema di distanziamento, , con ripristino del secondo binario di stazione.

L'intervento di potenziamento, ricade interamente nella provincia di Roma e si sviluppa lungo il rilievo montuoso dei Monti Albani. Il contesto è caratterizzato da una urbanizzazione diffusa di tipo extraurbano ad eccezione dei centri di maggior rilievo.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Nuova stazione di Villa Senni e ripristino secondo binario di Frascati: In esito al nuovo scenario funzionale e normativo, è stato avviato a gennaio 2023 lo studio delle alternative progettuali. A causa di forti interferenze archeologiche, idrauliche e ambientali presenti sul sito precedentemente individuato, è stata consolidata l'ipotesi di delocalizzazione della stazione di Villa Senni nel comune di Ciampino. Per quanto riguarda il ripristino del secondo binario di Frascati - intervento necessario per garantire la funzionalità della nuova stazione di Villa Senni/Ciampino - Sono in corso verifiche di fattibilità propedeutiche all'avvio del nuovo PFTE.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

L'intervento consentirà di aumentare le frequenze sulla linea Ciampino – Frascati (da 2 a 4 treni/h), il miglioramento della regolarità della circolazione e il miglioramento dell'accessibilità per la clientela.



	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	X
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lazio

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EELL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Potenziamento stazione di Marino e Frascati; potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea Ciampino-Frascati e nuova stazione di Villa Senni				X		X		X							X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 1417: Potenziamento linee Castelli Romani

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatorie di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
30,60	26,60		24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	4,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
30,60						30,60

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
26,60						26,60

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Potenziamento stazione di Marino e Frascati; potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea Ciampino-Frascati e nuova stazione di Villa Senni	30,60	26,60	4,00	16,38	14,22	12,76	12,44	12,41	0,03	0,00	0,00	0,00	5,00	18,16
	30,60	26,60	4,00	16,38	14,22	12,76	12,44	12,41	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16

CRONOPROGRAMMA															
	CUP	Stato attuativo				Iter procedurale									
		Realizzazione				Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione	
						Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
Potenziamento stazione di Marino e Frascati; potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea Ciampino-Frascati e nuova stazione di Villa Senni	J91H92000040111	Realizzazione				12-2004	-	9-2005	11-2026	9-2005	7-2009	10-2026	8-2027	12-2011	8-2028

Tabella A06-Programmi città metropolitane

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento consiste nella realizzazione di due nuove fermate e risulta articolato in 2 fasi:Fase 1: Nuova Fermata Pigneto su FL1/FL3 (Fara Sabina - Fiumicino e Roma - Viterbo) con interscambio con la fermata Metro C Pigneto. Nell'ambito della Fase 1 è prevista una prima attivazione della fermata in una configurazione light per Giubileo 2025 (fermata all'aperto con parziale copertura trasversale) cui farà seguito l'attivazione della fermata in galleria con copertura totale trasversale del vallo e attivazione del sottopasso pedonale di collegamento con la metro C.Fase 2: Nuova fermata Mandrione su FL4/FL6 (Roma - Cassino).è prevista l'attivazione di una nuova fermata sulla linea Roma-Cassino con annesso sottopasso di collegamento con la fermata Pigneto.L'intervento del Nodo di Pigneto prevede inoltre i seguenti interventi:una fase propedeutica di ripristino dei binari esterni di Tuscolana;il completamento della copertura longitudinale della trincea ferroviaria a Pigneto (Fase 3 da finanziare).

Gli interventi del Presente Progetto sono svolti nell'area urbana di Pigneto che si estende da piazzale Labicano (poco fuori Porta Maggiore) tra le vie Prenestina (lato destro e sinistro fino alla ferrovia Roma-Sulmona-Pescara), Casilina (lato sinistro) e di Acqua Bulicante

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•Fase 1: Fermata Pigneto FL1/FL3:Consegnati i lavori a settembre 2024;Ad aprile 25 è stata installata la nuova passerella provvisoria che ha consentito la demolizione del ponticello pedonale preesistente.Ultimata la realizzazione dei flessi provvisori delle linee FL1/FL3, necessari per la realizzazione delle banchine di stazione.E' in corso la realizzazione delle paratie perimetrali.Attivati i binari esterni di Tuscolana propedeutici alla fermata del Pigneto a dicembre 2024. •Fase 2: Nuova fermata Mandrione su FL4/FL6:in corso progettazione definitiva. Nel corso dello sviluppo della progettazione, sono stati svolti incontri con le Soprintendenze competenti in considerazione delle preesistenze archeologiche presenti sull'area.Si rende necessario effettuare ulteriori confronti per valutare la possibilità di revisionare opportunamente il layout progettuale.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Interscambio di qualità tra servizi metropolitani FL1/FL3 ed FL4/FL6, circolanti tra Roma Tuscolana e Roma Tiburtina e i servizi della nuova linea metro C di Roma.



Capacità	
Velocità	
Accessibilità	X
Regolarità	
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	X
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lazio

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi E.E.L.L.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Fermata Pigneto su linea FL1/FL3 e copertura parziale vallo	X				X	X	X		X	X	X					X					
Fermata Pigneto su linea FL4/6 e sistemazioni viarie	X				X	X				X						X					

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 1483: Nodo di interscambio di Pigneto

Completamento copertura vallo ferroviario Pigneto	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
230,36	195,28	di cui: 155,42	0,89	38,97	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	35,08

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo							
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
201,77			28,11	0,49		230,36	Variazione del costo dovuta ad adeguamenti tariffari ed a maggiori costi emersi in fase di gara per un rialzo presentato dall'aggiudicatario.

Evoluzione coperture finanziarie							
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
166,30				43,86	-14,88	195,28	Copertura maggiori costi a seguito del rialzo presentato da parte dell'appaltatore in sede di aggiudicazione, precedentemente coperti mediante attivazione della clausola di flessibilità ex art. 1 comma 5. Ulteriore copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Fermata Pigneto su linea FL1/FL3 e copertura parziale vallo	191,40	191,40	0,00	176,45	14,95	157,30	21,19	5,30	0,92	2,03	2,00	8,56	5,75	169,15
Fermata Pigneto su linea FL4/6 e sistemazioni viarie	23,97	3,89	20,08	21,97	2,00	3,44	0,35	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	21,65
Completamento copertura vallo ferroviario Pigneto	15,00	0,00	15,00	10,71	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	15,00
	230,36	195,28	35,08	209,12	21,24	160,74	21,54	5,95	0,92	2,03	2,00	8,56	5,12	205,80

CRONOPROGRAMMA														
CUP			Stato attuativo				Iter procedurale							
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Fermata Pigneto su linea FL1/FL3 e copertura parziale vallo	J37106000070001	Realizzazione	-	-	6-2006	12-2021	5-2022	6-2023	7-2024	10-2024	6-2016	8-2029	8-2029	
Fermata Pigneto su linea FL4/6 e sistemazioni viarie	J37106000070001	Progettazione	-	-	9-2025	10-2026	-	-	2-2027	11-2027	11-2027	9-2031	3-2031	
Completamento copertura vallo ferroviario Pigneto	J37106000070001	Progettazione	-	-	-	-	-	-	-	-	1-2032	9-2035	-	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma prevede il potenziamento tecnologico ed infrastrutturale degli impianti e delle linee afferenti il nodo, interessate da traffico promiscuo regionale, medio-lunga percorrenza e merci. Gli interventi infrastrutturali tipicamente prevedono l'adeguamento/potenziamento del Piano Regolatore Generale (PRG) delle stazioni per gestire le interferenze tra flussi. Dal punto di vista tecnologico è generalmente previsto il potenziamento del sistema di distanziamento (anche con sezioni corte e/o ERTMS High Density nelle tratte più congestionate), degli apparati centrali e del sistema di supervisione e regolazione della circolazione per migliorare la regolarità di esercizio e consentire l'incremento della capacità. Ulteriori interventi riguardano l'upgrading dei sistemi di Informazione al Pubblico, il potenziamento dei sistemi di alimentazione elettrica e interventi diffusi sulla sede e sulla sovrastruttura ferroviaria per omogeneizzare le caratteristiche prestazionali delle linee e gestire obsolescenza e punti singolari. Gli interventi sono prioritariamente legati agli accordi quadro per la capacità sottoscritti da RFI e le Regioni.

Le principali realizzazioni riguardano: A) Potenziamento tecnologico del Nodo di Roma: Relativamente al potenziamento tecnologico nel nodo di Roma sono previsti diversi interventi, relativi a opere tecnologiche di linea e di stazione, per la realizzazione di Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (con posto centrale PCM presso il fabbricato PCS di Roma Termini) su varie tratte, i relativi fabbricati, nonché alcuni interventi infrastrutturali finalizzati ad un'ottimizzazione dei piani regolatori e alla creazione delle condizioni per l'impresenziamento. Inoltre verrà realizzato il Sistema di Comando e Controllo della circolazione ferroviaria del Nodo di Roma (SCCM), nonché Opere civili ed impiantistiche per il completamento del nuovo Posto Centrale. Rientrano nel perimetro del progetto anche gli interventi del PPM di Torricola, il PP-ACC di Anagni e l'upgrade SCCM di Roma. Inoltre nel perimetro del progetto è previsto l'attrezzaggio della tratta Roma Termini-Casilina-Ciampino e della linea locale Cesano – Ostiense – Tiburtina con sistemi tecnologici innovativi ERTMS Livello 2 Alta Densità (ERTMS HD) che permettono di ridurre la distanza tra i treni in tratta, quindi aumentando la capacità della linea. È prevista anche l'implementazione di ACCM sulle medesime tratte e la remotizzazione delle funzioni di comando e controllo presso il Posto Centrale di Roma Termini. B) Upgrading tecnologico e infrastrutturale RM Casilina: L'intervento prevede la realizzazione di una bretella di collegamento diretto della linea Indipendente con la linea per Formia. La bretella avrà uno sviluppo di circa 2 km e verrà realizzata su un nuovo tracciato che, partendo in affiancamento ai binari per Cassino e Formia dentro Roma Casilina, si riconnette tramite un bivio sulla linea per Formia. C) Upgrading tecnologico e infrastrutturale Roma Tuscolana: Le attività consistono nella progettazione e realizzazione della sistemazione a PRG della stazione Tuscolana e relativo PP-ACC su nuovo piano ferro attuale. Il nuovo PRG è finalizzato alla separazione dei flussi della linea Locale, Roma-Pisa e Indipendente. Il progetto si articola in tre interventi: Delocalizzazione provvisoria dei Nuclei Manutentivi in ambito Roma Tuscolana; Delocalizzazione definitive di DN (SeRoDi) e Squadra Ponti rispettivamente a Smistamento e Maccarese; PRG Tuscolana.

lazio

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

A) Potenziamento tecnologico del Nodo di Roma: Relativamente al potenziamento tecnologico nel nodo di Roma sono previsti diversi interventi, relativi a opere tecnologiche di linea e di stazione, per la realizzazione di Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (con posto centrale PCM presso il fabbricato PCS di Roma Termini) su varie tratte, i relativi fabbricati, nonché alcuni interventi infrastrutturali finalizzati ad un'ottimizzazione dei piani regolatori e alla creazione delle condizioni per l'impresenziamento. Inoltre verrà realizzato il Sistema di Comando e Controllo della circolazione ferroviaria del Nodo di Roma (SCCM), nonché Opere civili ed impiantistiche per il completamento del nuovo Posto Centrale. Rientrano nel perimetro del progetto anche gli interventi del PPM di Torricola, il PP-ACC di Anagni e l'upgrade SCCM di Roma. Inoltre nel perimetro del progetto è previsto l'attrezzaggio della tratta Roma Termini-Casilina-Ciampino e della linea locale Cesano – Ostiense – Tiburtina con sistemi tecnologici innovativi ERTMS Livello 2 Alta Densità (ERTMS HD) che permettono di ridurre la distanza tra i treni in tratta, quindi aumentando la capacità della linea. È prevista anche l'implementazione di ACCM sulle medesime tratte e la remotizzazione delle funzioni di comando e controllo presso il Posto Centrale di Roma Termini. B) Upgrading tecnologico e infrastrutturale RM Casilina: Roma Casilina: Ad agosto 2016 è stato attivato il nuovo Apparato Centrale e Calcolatore (ACC) di Casilina, su piano del ferro attuale. Nel maggio 2017 è stata attivata una nuova riconfigurazione dell'apparato, che ha aumentato ulteriormente le potenzialità dell'impianto. Bretella Casilina: Adeguamento della Progettazione definitiva attualmente sospesa a seguito delle proteste dei cittadini e successivo ritiro della disponibilità delle aree da parte del Comune di Roma; sono state interrotte le indagini archeologiche preventive al consolidamento della PD e alla successiva indizione della Conferenza dei Servizi (CdS). A luglio 2022 sono stati svolti confronti con le Soprintendenze competenti per la ripresa delle attività di indagini archeologiche preventive in esito ai quali è stato elaborato un aggiornamento del progetto relativo alle predette indagini al fine di chiedere nuovamente la disponibilità delle aree e completare le indagini stesse. A fine 2022 è stato approvato un aggiornamento del progetto delle indagini archeologiche. In corso interlocuzioni per rappresentare a Roma Capitale i benefici connessi alla realizzazione della Bretella, al fine di consentire la ripresa delle indagini archeologiche preventive. C) Upgrading tecnologico e infrastrutturale Roma Tuscolana: Delocalizzazione Definitiva: Per Roma Smistamento e Maccarese sono state concluse le verifiche tecniche della progettazione definitiva, propedeutiche all'approvazione della stessa. Delocalizzazioni Provvisorie: È in corso la progettazione esecutiva dell'appalto del sottopasso pedonale di accesso al fabbricato nell'ambito del PRG Tuscolana. Sono state inoltre avviate le attività di Bonifica Ordigni Esplosivi PRG Roma Tuscolana: A dicembre 2022 è stato completato il progetto definitivo per successivo avvio dell'iter autorizzativo.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Gli interventi sono finalizzati a: - miglioramento della regolarità dell'esercizio ferroviario sulle linee oggetto di intervento; - incremento dei livelli qualitativi del servizio; - incremento dei livelli di accessibilità in stazione; - risolvere il problema dell'obsolescenza tecnologica degli apparati, garantendo uniformità tecnologica con gli investimenti in corso di realizzazione; - riduzione dei degni in esercizio derivanti da indisponibilità degli apparati che gestiscono la circolazione; - accentramento al Posto Centrale di Roma Termini delle funzioni di comando e controllo della circolazione; - riduzione delle specifiche di distanziamento sulla linea lenta (tratta Orte–Settebagni); - Aumento della capacità teorica ammessa

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P053: Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Roma

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatIRFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
1.448,17	-141,95			1,54		1.307,75
Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari e allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.						

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
822,78	-141,95			4,54	-75,00	610,36
Rimodulazione della copertura su interventi parzialmente finanziati a favore di ulteriori fabbisogni maggiormente prioritari; copertura di fabbisogni connessi con le attività Giubileo 2025 e per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)						

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Potenziamento tecnologico nodo di Roma 1^ fase (tratte Orte-Tiburtina-Ostienze-Cesano, Termini-Ciampino-Colleferro, Temini-Campoleone-Nettuno)	235,00	235,00	0,00	204,03	30,97	230,25	221,85	183,69	12,62	17,40	5,46	6,42	34,59	6,90
Incremento capacità linee FL4/FL6 tratta Roma Termini - Ciampino	27,00	27,00	0,00	24,39	2,61	11,53	7,43	4,22	2,01	0,23	1,40	0,03	7,51	19,08
Nuovo sistema di distanziamento FL1/FL3 tratta Cesano - Ostiense - Tiburtina	100,54	100,54	0,00	89,44	11,10	87,44	59,85	27,56	4,51	6,79	14,42	12,45	11,96	30,59
Potenziamento tecnologico nodo di Roma 2^ fase (Ostiense-Fiumicino, Ostiense-Civitavecchia, linee Castelli Romani)	60,00	47,00	13,00	54,06	5,94	15,01	6,73	0,00	1,60	0,02	2,49	1,73	5,00	52,79
Potenziamento tecnologico Roma Tuscolana (PRG/ACC)	435,52	23,26	412,26	273,17	162,35	14,78	7,86	1,98	0,00	0,25	0,47	5,07	5,01	427,24
Potenziamento tecnologico Roma Casilina (PRG/ACC)	103,36	36,69	66,67	89,66	13,70	28,17	28,40	27,49	0,01	0,44	0,20	0,00	5,01	75,21
Collegamento Ostiense - Valle Aurelia - Vigna Clara	55,00	50,83	4,17	50,46	4,54	49,95	49,52	41,30	0,80	2,44	4,34	0,78	6,10	5,08
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Roma - interventi diffusi	291,33	90,04	201,29	85,56	205,77	86,46	79,62	20,70	11,11	7,82	33,70	5,14	18,78	209,83
	1.307,75	610,36	697,39	870,76	436,99	523,59	461,27	306,95	32,67	35,39	62,47	31,61	11,93	826,74

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Potenziamento tecnologico del Nodo di Roma	J77111000000009	235,00	235,00	100%	228,23	97%	In ultimazione
Potenziamento tecnologico nodo di Roma 1^ fase (tratte Orte-Tiburtina-Ostiense-Cesano, Termini-Ciampino-Colleferro, Temini-Campoleone-Nettuno)		235,00	235,00	100%	228,23	97%	
Sistemi di distanziamento per incremento capacità nodo di Roma FL4/6 tratta Casilina-Ciampino	J34H14000460001	27,00	27,00	100%	7,93	29%	Realizzazione
Incremento capacità linee FL4/FL6 tratta Roma Termini - Ciampino		27,00	27,00	100%	7,93	29%	
Interventi per lo sviluppo del nodo di Roma (tecnologie Cesano-Ostiense-Tiburtina)	J34H14000500001	100,54	100,54	100%	71,37	71%	Realizzazione
Nuovo sistema di distanziamento FL1/FL3 tratta Cesano - Ostiense - Tiburtina		100,54	100,54	100%	71,37	71%	
Potenziamento tecnologico nodo di Roma (ulteriore fase)	J86I18000060009	60,00	47,00	78%	7,67	16%	Realizzazione
Potenziamento tecnologico nodo di Roma 2^ fase (Ostiense-Fiumicino, Ostiense-Civitavecchia, linee Castelli Romani)		60,00	47,00	78%	7,67	16%	
PRG di Roma Tuscolana/Casilina	J31H03000150008	435,52	23,26	5%	8,28	36%	Progettazione
Potenziamento tecnologico Roma Tuscolana (PRG/ACC)		435,52	23,26	5%	8,28	36%	
PRG di Roma Tuscolana/Casilina	J31H03000150008	103,36	36,69	35%	28,14	77%	Realizzazione
Potenziamento tecnologico Roma Casilina (PRG/ACC)		103,36	36,69	35%	28,14	77%	
Ripristino della tratta Valle Aurelia - Vigna Clara - prima fase funzionale e opere propedeutiche al raddoppio	J84H15001310001	55,00	50,83	92%	49,93	98%	In ultimazione
Collegamento Ostiense - Valle Aurelia - Vigna Clara		55,00	50,83	92%	49,93	98%	
Upgrading nodo di Roma		202,59	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Attrezzaggio RED ambito RM	J54G18000130001	45,00	45,00	100%	44,08	98%	In ultimazione
Interventi upgrading della rete viaggiatori - RM	J57H22000160001	37,04	37,04	100%	35,46	96%	In ultimazione
Prolungamento della pista ciclabile Monte Mario - Monte Ciocchi verso Città del Vaticano per il Giubileo del 2025	J81B22003200005	6,70	8,00	100%	5,58	70%	Realizzazione
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Roma - interventi diffusi		291,33	90,04	31%	85,12	95%	

Tabella A06-Programmi città metropolitane

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento consiste nella realizzazione, in affiancamento alla coppia di binari esistenti tra Capannelle e Ciampino, per complessivi 5,7 km, di una nuova coppia di binari su un sedime ferroviario già esistente ed il contestuale adeguamento del PRG di Ciampino. È previsto altresì l'adeguamento della fermata Capannelle e delle funzioni a servizio della fermata, (parcheggio di scambio) nonché del sistema di viabilità circostante la fermata con l'adeguamento dell'attuale sottovia di via di Capannelle.

L'intervento è suddiviso nei seguenti sotto progetti: a) Modifiche PRG Ciampino radice lato Castelli; b) Adeguamento SSE Ciampino e nuova SSE Albano; c) Quadruplicamento Ciampino – Capannelle; d) Modifiche PRG Ciampino radice lato Roma;

Lazio


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Modifiche PRG Ciampino radice lato Castelli Attivazione del PRG radice lato castelli conseguita a settembre 2022. Adeguamento SSE Ciampino e nuova SSE Albano (Marino) SSE di Ciampino: è in fase di avvio l'iter autorizzativo a cura del Commissario SSE di Albano: A causa di importati interferenze archeologiche emerse nel corso delle indagini preventive sul sito individuato (Albano), è stata recentemente individuata come localizzazione alternativa per la SSE un area RFI adiacente la stazione di Marino. Quadruplicamento Ciampino-Capannelle e modifiche PRG Ciampino radice lato Roma È stato rilasciato il parere da parte del CSLPP sul PFTE a febbraio 2022. Sono in corso la procedura VIA, avviata a dicembre 2021 e, l'iter autorizzativo a cura del Commissario Straordinario, avviato a luglio 2023, nonché le indagini archeologiche preventive integrative condivise con il MiC. Nel mese di gennaio 25 è stato inviato a firma del CS sollecito al MASE per concludere la procedura VIA. A febbraio 25 L'ente Regionale dell'Appia Antica ha evidenziato che non è possibile rilasciare parere positivo in quanto non compatibile con le norme tecniche del parco. Sono attualmente in corso approfondimenti.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- L'intervento consentirà di aumentare le frequenze sulla linea RM Termini – Ciampino, il miglioramento della regolarità della circolazione e il miglioramento dell'accessibilità per la clientela. - Incremento di capacità da 10 treni/h a 20 treni/h; - Specializzazione dei servizi.

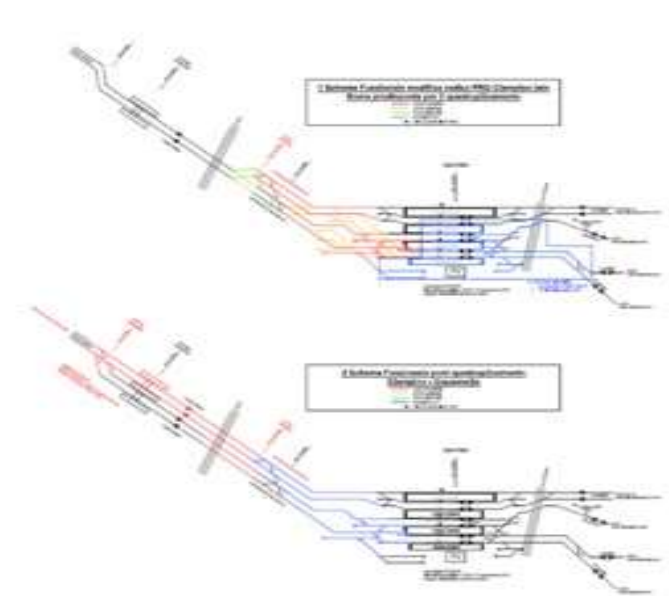

	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficiamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lazio

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica						Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	
Quadruplicamento Capannelle-Ciampino e PRG Ciampino	X							X	X		X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Progetto P260: Potenziamento Capannelle-Ciampino

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
376,44						376,44

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrig	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
50,20						50,20

CRONOPROGRAMMA

	CUP	Stato attuativo	Iter procedurale											
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Quadruplicamento Capannelle-Ciampino e PRG Ciampino	J31H96000000011	Realizzazione	6-2004	2-2026	10-2005	4-2028	8-2027	4-2028	7-2020	9-2027	9-2027	6-2029	6-2029	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma prevede il potenziamento tecnologico ed infrastrutturale degli impianti e delle linee afferenti il nodo, interessate da traffico promiscuo regionale, medio-lunga percorrenza e merci. Gli interventi infrastrutturali tipicamente prevedono l'adeguamento/potenziamento del Piano Regolatore Generale (PRG) delle stazioni per gestire le interferenze tra flussi. Ulteriori interventi riguardano l'upgrading dei sistemi di Informazione al Pubblico, il potenziamento dei sistemi di alimentazione elettrica e interventi diffusi sulla sede e sulla sovrastruttura ferroviaria per omogeneizzare le caratteristiche prestazionali delle linee e gestire obsolescenza e punti singolari. Gli interventi sono prioritariamente legati agli accordi quadro per la capacità sottoscritti da RFI e le Regioni.

Le principali realizzazioni riguardano: A) Gli interventi di potenziamento tecnologico del nodo di Napoli prevedono l'estensione dell'attuale sistema comando e controllo della circolazione su tratte del Nodo caratterizzate da apparati e sistemi di esercizio vetusti, nonché l'upgrade del sistema già esistente su alcune tratte del Nodo. Le tratte inserite nel SCC del Nodo di Napoli fase a): Villa Literno - Napoli Centrale, Cancellaro - Sarno, S. Marcellino - Maddaloni Marcellanise. L'intervento interessa inoltre le tratte Salerno - Battipaglia, dove si prevede l'inserimento in telecomando della stazione di Pontecagnano, e la tratta Sparanise - 2° bivio Caserta Nord - Caserta e 2° bivio Caserta Nord, dove è previsto il rinnovo degli apparati delle stazioni di Capua e di S. Maria Capua a Vetere nonché la realizzazione di alcuni interventi puntuali di adeguamento del PRG; B) Adeguamento tecnologie Passante ferroviario di Napoli: realizzazione dell'ACC di Napoli Campi Flegrei e SCCM Nodo di Napoli; C) ACC di Napoli Centrale: gli interventi prevedono il rinnovo tecnologico dell'attuale apparato di stazione, nonché interventi di PRG. In particolare: - realizzazione di nuovo apparato centrale computerizzato per la gestione della circolazione nella stazione di Napoli C.le, con postazione al Posto Centrale di Napoli, interfacciato con l'attuale apparato dell'impianto Dinamico Polifunzionale (IDP) e con SCC del Nodo di Napoli; - realizzazione nel Posto Centrale di Napoli di un sistema di supervisione della stazione per la regolazione automatica della circolazione nella stazione di Napoli C.le; - interventi di adeguamento dei locali tecnologici nel Posto Centrale di Napoli C.le propedeutici all'inserimento del nuovo apparato e sistema di supervisione; - intervento su PRG per il raddoppio del binario di collegamento tra IDP e Napoli C.le. Nuovo Posto Centrale di Napoli: l'intervento prevede la realizzazione del nuovo CCC di Napoli Centrale che consiste nella costruzione di un nuovo edificio che dovrà rispondere alle esigenze tipiche di un Posto Centrale di gestione della circolazione ferroviaria (ambienti operativi di Circolazione e Manutenzione, sale tecnologiche, aree di esercizio, impiantistica ecc.) nonché alle esigenze di uffici per le direzioni territoriali di RFI. In particolare all'interno della nuova palazzina dovranno essere previste: - le sale operative del CCC per le funzioni di circolazione, manutenzione e controllo remoto e quelle destinate al coordinamento ed alla gestione delle situazioni di crisi/emergenza; - i locali tecnici e tecnologici; - gli ambienti logistici tipici di un CCC (magazzini, spogliatoi, ...); - le aree per la formazione degli operatori del CCC; - gli uffici per le strutture territoriali di RFI funzionali all'esercizio del CCC; - locali da adibire alle funzioni per il "disaster recovery". D) Nodo complesso di Salerno Centrale. Si prevede di realizzare: - un nuovo ACC stand-alone con relativo nuovo attrezzaggio di piazzale IS-SCMT, che gestirà l'intera area che si estende fino a Salerno Irno; - il potenziamento PRG Salerno.

Campania

STATO DI ATTUAZIONE


attualità dati: 30/06/2025

A) Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Napoli Sono state conseguite tutte le attivazioni del progetto, in corso lavori di completamento. B) Adeguamento tecnologie Passante ferroviario di Napoli «ACC Campi Flegrei»: approvato il progetto definitivo, in corso la verifica della validità dell'intervento, tenendo conto del Piano Nazionale ERTMS in corso. «SCCM Nodo di Napoli»: attivato, in corso i lavori di completamento. C) ACC di Napoli Centrale: Appalto ACC: è in corso la realizzazione. Interventi di PRG: attivate varie fasi di PRG, in corso la stipula dei contratti per le modifiche al PRG per la gestione del confine con IDP Napoli. Nuovo Posto Centrale di Napoli: Approvata la progettazione per la delocalizzazione dell'attuale cantiere meccanizzato, sito nel quale verrà realizzato il nuovo CCC di Napoli C.le, in corso la verifica della Progettazione Definitiva. È stata avviata la PFTE delle opere civili per il nuovo Fabbricato CCC di Napoli C.le. D) Nodo complesso di Salerno Centrale «Nuovo impianto ACC su ferro attuale»: in corso la redazione del progetto esecutivo; «Potenziamento del PRG di Salerno»: progettazione definitiva da avviare.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Attraverso questa azione di Piano saranno create le condizioni per rendere più regolare la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, garantendo possibilità di un ulteriore sviluppo del trasporto regionale e metropolitano. - per tutte le tipologie di servizio, azzeramento dei minuti di ritardo derivanti da indisponibilità degli apparati che gestiscono la circolazione negli impianti/tratte interessati dall'intervento di potenziamento tecnologico - eliminazione dell'obsolescenza e la disomogeneità tecnologica attraverso il rinnovo degli apparati e dei sistemi di distanziamento, elevando al contempo i livelli di sicurezza con l'automazione dei processi e l'upgrading degli apparati; - realizzazione di un nuovo modello operativo e normativo dell'organizzazione e delle procedure di lavoro, compatibile con il modello tecnologico sopra definito, con ottimizzazione delle risorse preposte alla gestione della circolazione e alla manutenzione degli impianti - concentrazione nel Posto Centrale le attività per la gestione della circolazione e della manutenzione minimizzando i tempi di intervento in caso di anomalie; - upgrade funzionale dell'attuale SCC in esercizio, con miglioramento delle prestazioni in termini di comando/controllo della circolazione e di informazione al pubblico; - nuove funzionalità per la gestione della circolazione

Programma P134: Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Napoli

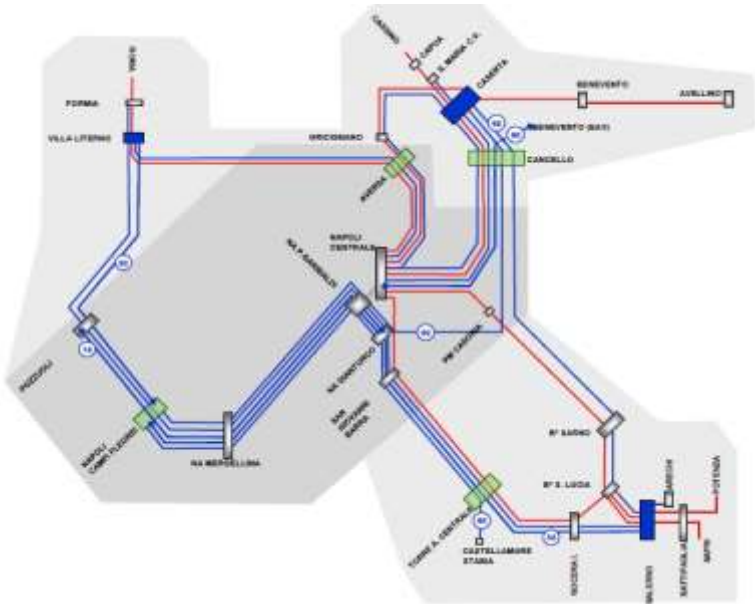

	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	X
	Gestione spazi di stazione	X
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	X

LOCALIZZAZIONE

Campania

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici			
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MINS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T
Potenziamento tecnologico nodo di Napoli 1^ fase (SCC tratte Villa Literno - Napoli Centrale, Cancelli - Sarno, San Marcellino - Grignano - Maddaloni Marciante UM2 e Napoli S.Giovanni Barra - Nocera Inferiore - Salerno via Cava dei Tirreni; CTC Sarno -							X				X			X
Upgrading tecnologico Napoli Centrale											X			X
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Napoli - interventi diffusi											X			X
Nodo complesso di Salerno											X			X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
537,84	341,35	di cui: 146,09	0,65	127,00	0,00	67,61	0,00		14,00	31,60	150,89

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						CdP-I agg.2025	Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari. Riduzione del perimetro per spostamento fabbisogni legati ad upgrading tecnologico sul programma ERTMS
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze		
539,25			-1,80	0,39		537,84	

Evoluzione coperture finanziarie

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P134: Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Napoli

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	Copertura per ricostituzione finanziamento FSC 2014-2020 in base a delibera CIPESS n. 78/2024 e per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)
327,15				14,39	-0,19	341,35	

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	AI 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Potenziamento tecnologico nodo di Napoli 1^ fase (SCC tratte Villa Literno - Napoli Centrale, Cancellò – Sarno, San Marcellino – Gricignano – Maddaloni Marcianise UM2 e Napoli S.Giovanni Barra - Nocera Inferiore – Salerno via Cava dei Tirreni; CTC Sarno -	142,42	133,12	9,30	120,33	22,09	108,87	104,68	90,90	2,18	1,14	1,97	8,85	11,02	35,83
Upgrading tecnologico Napoli Centrale	168,68	132,68	36,00	154,15	14,53	100,31	73,27	50,46	7,34	8,71	4,93	2,12	13,61	92,07
Nodo complesso di Salerno	47,94	25,64	22,30	42,78	5,16	18,31	1,74	0,24	0,24	0,67	0,66	0,01	5,24	46,01
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Napoli - interventi diffusi	178,80	49,91	128,89	38,34	140,46	32,05	19,72	4,68	2,07	6,33	4,29	0,57	9,33	159,24
	537,84	341,35	196,49	355,61	182,24	259,54	199,41	146,27	11,83	16,86	11,85	11,56	6,33	333,16

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Potenziamento tecnologico nodo di Napoli	J67110000020001	84,10	77,10	92%	68,60	89%	Realizzazione
Passante ferroviario di Napoli -Adeguamento tecnologie	J26118000040001	30,32	28,02	92%	10,85	39%	Realizzazione
Nodo di Napoli: potenziamento tecnologico - ulteriore fase	J27112000160001	28,00	28,00	100%	27,14	97%	In ultimazione
Potenziamento tecnologico nodo di Napoli 1^ fase (SCC tratte Villa Literno - Napoli Centrale, Cancellò – Sarno, San Marcellino – Gricignano – Maddaloni Marcianise UM2 e Napoli S.Giovanni Barra - Nocera Inferiore – Salerno via Cava dei Tirreni; CTC Sarno -		142,42	133,12	93%	106,60	80%	
ACC di Napoli centrale	J27112000170001	98,68	98,68	100%	77,92	79%	Realizzazione
Nuovo Posto Centrale di Napoli	J94E21000060009	70,00	34,00	49%	0,29	1%	Progettazione
Upgrading tecnologico Napoli Centrale		168,68	132,68	79%	78,21	59%	
Nodo complesso di Salerno Centrale	J44C19000040009	47,94	25,64	53%	1,95	8%	Realizzazione
Nodo complesso di Salerno		47,94	25,64	53%	1,95	8%	
Upgrading nodo di Napoli		137,47	8,58	6%	0,00	0%	Progettazione
Interventi upgrading della rete viaggiatori - NA	J27H21000440001	22,36	22,36	100%	7,64	34%	Realizzazione
Interventi upgrading della rete viaggiatori - NA	J27J19000010001	7,65	7,65	100%	6,45	84%	Realizzazione
Interventi upgrading della rete viaggiatori - NA	J97J18000410001	6,70	6,70	100%	5,68	85%	Realizzazione
Interventi upgrading della rete viaggiatori - NA	J97D240000000001	2,40	2,40	100%	0,72	30%	Realizzazione
Sistema Controllo Circolazione Linee e Informazione al Pubblico	J11J04000070211	2,22	2,22	100%	2,20	99%	In ultimazione
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Napoli - interventi diffusi		178,80	49,91	28%	22,69	45%	

Tabella A06-Programmi città metropolitane

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto, sostanzialmente ultimato, ha riguardato il raddoppio delle tratte terminali di accesso al nodo delle linee Bari-Taranto e Bari-Lecce, nonché la creazione di un itinerario di by-pass per il traffico merci dalle linee Adriatiche verso i porti di Taranto e Gioia Tauro. Il progetto è articolato nei seguenti macro interventi: - raddoppio Bari Parco Sud - Bari Torre a Mare (attivato nel 2004)- bretella merci e variante ingresso linea viaggiatori Bari – Taranto in Bari Centrale (attivato nel 2009)- modifica della radice lato nord di Bari Centrale e ACC di Bari PN (attivato nel 2015)- potenziamento dei binari di stazione della stazione di Bari C.le.

L'intervento prevede modifiche all'armamento, alla trazione elettrica e agli impianti tecnologici. Non sono previste nuove opere civili. Il territorio dove si realizza l'opera è prevalentemente pianeggiante ed è ubicato all'interno del tessuto urbano della città di Bari e nelle zone limitrofe comunque ricomprese nell'ambito della città metropolitana di Bari.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Ingresso linea Bari - Taranto in Bari Centrale e ACC Bari Parco Nord: interventi attivati, in corso i lavori di completamento per l'ACC di Bari Parco Nord e la Progettazione Definitiva per il tronco di sezionamento trazione elettrica nella stazione di Bari C.le. Rinnovo binari di stazione in Bari Centrale: in corso la progettazione esecutiva.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

• Integrazione con le FNB con possibilità di attestamento a Bari C.le dei nuovi servizi da/per l'Aeroporto di Bari, come previsto nell'AQ con Regione Puglia del 2021. • Integrazione con i servizi della nuova linea Bari – Bitritto. • Integrazione con i servizi delle linee FSE. • Maggiore regolarità dell'esercizio ferroviario.



	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Puglia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi E.E.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Raddoppio Bari Parco Sud - Bari Torre a Mare e variante ingresso linea merci Bari-Taranto, Variante ingresso linea viaggiatori Bari-Taranto, modifica radice lato Nord Bari C.le e ACC Bari Parco Nord, Binari di stationamento della stazione di Bari C.le					X	X	X	X												X	

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0149: Sistemazione nodo di Bari

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR	Altro UE	Altro	programmatorie di breve		
						nuovi progetti	(CEF/TEN, PON-FESR)	(EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
159,61	159,61		114,61	0,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrig	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
159,61						159,61

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrig	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
159,61						159,61

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Bari Parco Sud - Bari Torre a Mare e variante ingresso linea merci Bari-Taranto, Variante ingresso linea viaggiatori Bari-Taranto, modifica radice lato Nord Bari C.le e ACC Bari Parco Nord, Binari di stazionamento della stazione di Bari C.le	159,61	159,61	0,00	109,92	49,69	140,04	113,57	133,95	2,82	0,64	0,13	0,48	9,52	22,03
	159,61	159,61	0,00	109,92	49,69	140,04	113,57	133,95	2,82	0,64	0,13	0,48	-0,44	22,03

CRONOPROGRAMMA														
	CUP		Stato attuativo				Iter procedurale							
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Raddoppio Bari Parco Sud - Bari Torre a Mare e variante ingresso linea merci Bari-Taranto, Variante ingresso linea viaggiatori Bari-Taranto, modifica radice lato Nord Bari C.le e ACC Bari Parco Nord, Binari di stazionamento della stazione di Bari C.le	J71H98000000001	Esercizio	2-2009	11-2009	2-2009	5-2025	7-2000	6-2025	3-2011	1-2026	10-2001	11-2026	11-2008	

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P193: Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Bari

	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																					
Sistemazione del nodo di Bari Centrale					X								X				X				
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Bari - interventi diffusi	X															X					

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatiche di breve				
								Priorità 1	Priorità 2			
121,50	91,50	di cui:	1,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00		

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE							milioni di euro
Evoluzione Costo							
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
121,50						121,50	
Evoluzione coperture finanziarie							
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
91,50						91,50	

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Sistemazione del nodo di Bari Centrale	120,00	90,00	30,00	82,46	37,54	76,90	54,06	39,03	5,59	4,28	3,02	1,78	12,80	60,36
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Bari - interventi diffusi	1,50	1,50	0,00	1,43	0,07	1,40	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,44
	121,50	91,50	30,00	83,89	37,61	78,30	54,31	39,03	5,59	4,28	3,02	1,78	6,01	61,80

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
PRG ed ACC Bari Centrale	J37112000140001	120,00	90,00	75%	61,54	68%	Realizzazione
Sistemazione del nodo di Bari Centrale		120,00	90,00	75%	61,54	68%	
Accessibilità Bari Torre a Mare	J97D22000040001	1,50	1,50	100%	0,99	66%	Realizzazione
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Bari - interventi diffusi		1,50	1,50	100%	0,99	66%	

Tabella A06-Programmi città metropolitane

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma prevede il potenziamento tecnologico ed infrastrutturale degli impianti e delle linee afferenti il nodo, interessate da traffico promiscuo regionale, medio-lunga percorrenza e merci. Gli interventi infrastrutturali tipicamente prevedono l'adeguamento/potenziamento del Piano Regolatore Generale (PRG) delle stazioni per gestire le interferenze tra flussi. Ulteriori interventi riguardano l'upgrading dei sistemi di Informazione al Pubblico, il potenziamento dei sistemi di alimentazione elettrica e interventi diffusi sulla sede e sulla sovrastruttura ferroviaria per omogeneizzare le caratteristiche prestazionali delle linee e gestire obsolescenza e punti singolari. Gli interventi sono prioritariamente legati agli accordi quadro per la capacità sottoscritti da RFI e le Regioni.

Calabria

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

In corso interventi diffusi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Sviluppo del traffico Regionale e Metropolitano- Efficientamento e potenziamento tecnologico delle infrastrutture- Eliminazione di «colli di bottiglia»



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	X

LOCALIZZAZIONE

Calabria

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Reggio Calabria - interventi diffusi				X							X					X					

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
10,48	10,48	di cui:	0,00	0,08	7,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P194: Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Reggio Calabria

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
132,87	-125,17	7,00		0,08		10,48	Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari, allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati e ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (aggiunto CUP J94H15000790001 dalla riga P111). Riduzione del perimetro per spostamento fabbisogni legati ad upgrading tecnologico sul programma ERTMS

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
128,57	-125,17	7,00		0,08		10,48	Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Reggio Calabria - interventi diffusi	10,48	10,48	0,00	7,73	2,75	7,99	3,84	2,60	0,18	0,06	0,43	0,39	5,01	6,64
	10,48	10,48	0,00	7,73	2,75	7,99	3,84	2,60	0,18	0,06	0,43	0,39	0,18	6,64

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Interventi di mascheramento galleria artificiale e riqualificazione lungomare di Cannitello	J94H15000790001	7,08	7,08	100%	1,58	22%	Realizzazione
Costruzione della nuova stazione di Reggio Calabria aeroporto	J31C08000010002	3,40	3,40	100%	2,29	67%	Realizzazione
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Reggio Calabria - interventi diffusi		10,48	10,48	100%	3,87	37%	

Tabella A06-Programmi città metropolitane

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Progetto suddiviso in tre tratte: tratta A: raddoppio tratta Palermo C.le/Brancaccio-Notarbartolo (8,5 km); tratta B: raddoppio tratta Notarbartolo - La Malfa (4,3 km, in variante); tratta C: raddoppio tratta La Malfa-Carini (16,2 km). Gli interventi comprendono anche la realizzazione delle nuove fermate di De Gasperi e Lazio nel tratto già raddoppiato tra Palermo Notarbartolo e Carini e l'attivazione della nuova fermata Papireto nel tratto tra Orleans e Notarbartolo oggetto di raddoppio.

Il Passante di Palermo si sviluppa per circa 27,4 km, di cui 4,3 km verso Messina e circa 24 km verso Trapani e prevede la realizzazione di 25 stazioni/fermate (10 realizzate ex novo) di cui 7 extraurbane e la soppressione di 22 passaggi a livello.

Il Nodo di Palermo si inquadra nell'ambito dell'area metropolitana di Palermo, con ambiti territoriali che vanno dall'estremamente urbanizzato al sub-urbano. Per il raddoppio sono realizzate e sono in realizzazione una notevole quantità di gallerie artificiali/naturali.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Attivate le tratte da Notarbartolo a Punta Raisi e da Palermo C.le ad Orleans, nonché l'ACC di Palermo C.le. Per il completamento della tratta Orleans-Notarbartolo, in corso lo scavo dell'ultimo tratto di galleria per circa 60 mt, interessato da un ulteriore imprevisto idrogeologico. Aggiudicata la gara per il completamento dell'attrezzaggio Tecnologico della tratta A, Orleans-Notarbartolo, e la gara per i lavori di elettrificazione ed integrazione del sistema MATS del binario dispari della galleria. Da avviare nella tratta Orleans-Notarbartolo le gare per: Servizi igienici (in corso iter autorizzativo), Disconnessione fumi (in corso la progettazione per iter), Adeguamento resistenza al fuoco in galleria (in corso la progettazione per gara) e Ripristino edifici vicolo Bernava (in corso la progettazione per gara). -Tratta EMS-Isola, tratta attivata, da avviare la progettazione per iter per la realizzazione del collettore fognario di Capaci. Tratta Notarbartolo-La Malfa, tratta attivata, in corso la realizzazione della Fermata Lazio, con interventi di consolidamento terreni e realizzazione diaframmi.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Gli interventi consentiranno di eliminare il principale «collo di bottiglia» del Nodo di Palermo, legato sia alla configurazione infrastrutturale di semplice binario sia alla forte domanda di spostamento delle località interessate e conseguiranno un incremento dell'accessibilità al servizio ferroviario, grazie alla realizzazione delle nuove fermate. In particolare, unitamente ad altri interventi in corso, l'intervento consentirà di potenziare i servizi per l'aeroporto internazionale "Falcone e Borsellino" di Punta Raisi sia dall'intero agglomerato cittadino sia dall'area che si estende fino a Termini Im. e Cefalù creando le condizioni per l'incremento della frequenza dei convogli nel Nodo (da 4 a 8 treni/h sulla relazione Palermo-Punta Raisi) e l'istituzione di un servizio metropolitano che migliorerà la mobilità sia nel centro cittadino sia verso le aree suburbane di Palermo, decongestionando il traffico su gomma.

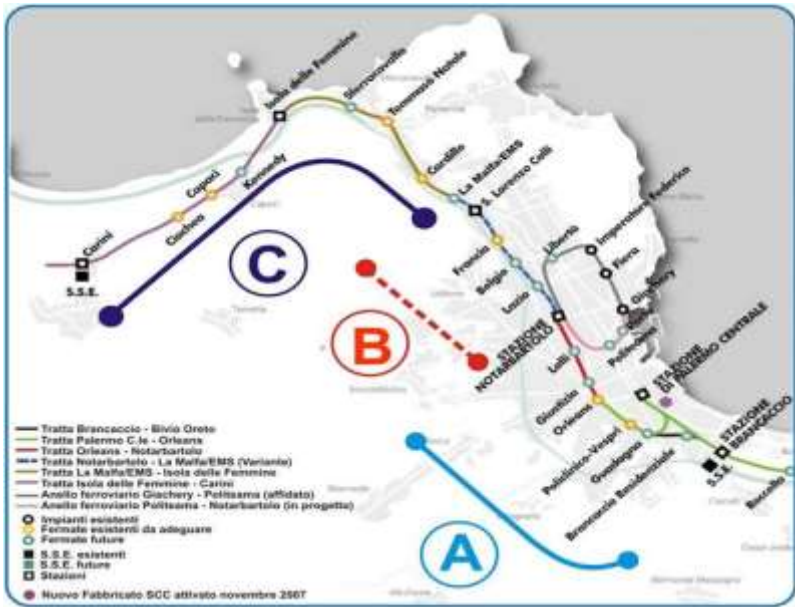

	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Sicilia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Progetto 0036: Nodo di Palermo

CRONOPROGRAMMA													
	CUP	Stato attuativo	Iter procedurale										
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
Passante ferroviario Palermo c.le/Notarbartolo-Carini, Apparato tecnologico Palermo c.le e Completamento raddoppio Carini-Punta-Raisi e adeguamento tecnologico Palermo c.le-Fiumetorto	J11H92000000008	Realizzazione	4-2008	8-2008	5-2008	10-2011	-	-	6-2005	5-2009	7-1999	1-2027	10-2026

Tabella A06-Programmi città metropolitane

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento fa parte del più ampio progetto di raddoppio della linea Messina – Siracusa, una delle direttrici ferroviarie principali della Sicilia. Il progetto, articolato in ben distinte opere funzionali, prevede il potenziamento di tratte della linea Messina-Catania-Siracusa in ingresso ai nodi di Catania (tratte Fiumefreddo-Giarre e Catania Ognina - Catania Centrale) e Siracusa (tratta Targia-Siracusa).

La prima fase funzionale, ultimata nel 2002, ha riguardato opere di completamento dei raddoppi delle tratte Fiumefreddo-Giarre della linea Messina-Catania e Targia-Siracusa. La seconda funzionale, in corso, prevede il raddoppio, in affiancamento, della tratta Catania Ognina - Catania Centrale e la realizzazione di tre fermate di tipo metropolitano (Europa, Picanello e Ognina) poste all'interno del tessuto urbano della città di Catania.

L'intervento ferroviario si sviluppa in un contesto completamente urbanizzato della città di Catania. Il tracciato si svolge al margine sud orientale dell'abitato etneo, attraversando un territorio a morfologia sub pianeggiante, debolmente inclinato verso la linea di costa, con diverse rotture di pendenze e brevi parti sub verticali con salti di alcuni metri dovuti al permanere di brevi e discontinui relitti di fronti di colate laviche non ancora cancellati dalla attività antropica.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

L'intervento di raddoppio della tratta Catania Ognina - Catania Centrale si è sviluppato in due fasi: 1^a Fase: nuovo semplice binario (futuro binario dispari) ad est della linea attuale. I lavori sono stati ultimati nel 2010. 2^a Fase: Raddoppio attivato il 18 giugno 2017. A dicembre 2018 è stata attivata la Fermata sotterranea di Picanello.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Gli interventi in corso consentiranno:- Eliminazione dei "colli di bottiglia" attuali con aumento della capacità sulle tratte interessate (la capacità potenziale aumenterà da 80 a 120 treni al giorno);- Creazione dei requisiti infrastrutturali per soddisfare lo sviluppo della domanda di trasporto merci da/verso le aree industriali di Catania, Priolo ed Augusta, nonché per la crescita di un servizio di tipo metropolitano urbano e suburbano per la città di Catania;- Miglioramento della regolarità di circolazione.



	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Sicilia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Raddoppio Catania Ognina - Catania Centrale e interventi di completamento raddoppio Fiumefreddo-Giarre e Targia - Siracusa						X	X	X				X			X

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0115: Raddoppio Messina - Siracusa 1^ fase

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
126,66	126,66		67,69	0,00	0,00	0,00	58,97	0,00	0,00	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
126,66						126,66

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
126,66						126,66

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Catania Ognina - Catania Centrale e interventi di completamento raddoppio Fiumefreddo-Giarre e Targia - Siracusa	126,66	126,66	0,00	99,43	27,23	126,16	123,80	124,99	0,08	0,06	0,59	0,04	6,09	0,91
	126,66	126,66	0,00	99,43	27,23	126,16	123,80	124,99	0,08	0,06	0,59	0,04	0,00	0,91

CRONOPROGRAMMA

	CUP	Stato attuativo				Iter procedurale							
		Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Raddoppio Catania Ognina - Catania Centrale e interventi di completamento raddoppio Fiumefreddo-Giarre e Targia - Siracusa	J11H92000020008	Esercizio	12-2002	7-2003	-	7-2003	-	-	2-2005	7-2009	8-2005	12-2018	6-2017

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede la prosecuzione del raddoppio della linea Messina-Palermo in ingresso al nodo di Palermo per un'estesa di circa 32 km da Fiumetorto a Castelbuono. L'intervento è articolato in due lotti: -Fiumetorto - Ogliastrillo (Cefalù) per un'estesa di circa 19 km;-Ogliastrillo (Cefalù) – Castelbuono per un'estesa di circa 13 km, di cui 11 km in galleria, e realizzazione della nuova fermata di Cefalù.

La prima fase funzionale riguarda il raddoppio della tratta Fiumetorto-Cefalù Ogliastrillo. Da Fiumetorto a Lascari (14,2km) il nuovo tracciato è in variante per circa 5 km (Himera) quindi si affianca all'attuale binario fino a Lascari. Nel tratto Lascari-Cefalù -Ogliastrillo (5,7km) la nuova linea è in galleria (4km), poi procede per un breve tratto allo scoperto per attraversare il torrente Carbone, quindi in trincea in prossimità di Ogliastrillo. La seconda fase funzionale riguarda il raddoppio della tratta Cefalù Ogliastrillo-Castelbuono. Da Ogliastrillo (Cefalù) a Castelbuono (circa 13 km) il tracciato è previsto in galleria a doppia canna di circa 6,9 km: in tale tratto verrà realizzata la nuova fermata di Cefalù. Segue quindi un tratto allo scoperto e due ulteriori tratti in galleria (S. Ambrogio circa 4 km) e Malpertugio (180 m). La maggior parte del tracciato sarà sotterraneo, consentendo di eliminare 7 passaggi a livello.

Il progetto prevede il raddoppio della linea da Fiumetorto a Castelbuono. Il tratto da Fiumetorto a Lascari è essenzialmente in affiancamento alla linea preesistente, con connotazioni pianeggianti e sub-urbane. Il secondo tratto, che ha chiuso la prima fase funzionale, da Lascari a Cefalù Ogliastrillo, è in variante con galleria naturale, allontanandosi dalla linea di costa, con caratteristiche extraurbane. la sesonda fase funzionale, Cefalù Ogliastrillo-Castelbuono, è essenzialmente in galleria naturale e in variante rispetto alla linea esistente, allontanandosi anch'essa dalla linea di costa, con caratteristiche extraurbane.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Fiumetorto – Ogliastrillo: tratta Fiumetorto - Campofelice attivata a gennaio 2016; tratta Campofelice – Ogliastrillo: attivata a dicembre 2017. Tratta Ogliastrillo - Castelbuono: in corso la realizzazione delle gallerie naturali di: Cefalù, Malpertugio e S. Ambrogio, di alcune viabilità, dei rilevati, delle trincee e delle opere minori.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

•Unitamente agli interventi in corso sul nodo di Palermo l'intervento consentirà un incremento di capacità (da 4 treni/h nei due sensi di marcia a 10 treni/h per direzione) e una migliore accessibilità alla città di Palermo e all'aeroporto internazionale "Falcone e Borsellino" di Punta Raisi. •Unitamente agli interventi in corso di velocizzazioni puntuali della rimanente tratta a semplice binario sino a Patti, il progetto crea inoltre le condizioni per una riduzione dei tempi di percorrenza sulla relazione Palermo – Messina e per una migliore gestione della circolazione.



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Sicilia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0336: Raddoppio Palermo-Messina tratta Fiumetorto-Castelbuono

	PNRR	Interventi commissariati	Accordi internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF		Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																						
Raddoppio Fiumetorto-Ogliastrillo						X	X	X									X					
Raddoppio Ogliastrillo-Castelbuono	X					X	X										X					

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatiche di breve				
								Priorità 1	Priorità 2			
1.017,57	1.017,57	di cui:	360,93	19,33	0,00	277,29	360,01	0,00	0,00	0,00		

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l’affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell’investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all’art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE							milioni di euro	
Evoluzione Costo								
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corregge	Variazioni costo/perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025		
988,26			19,43	9,87		1.017,57	Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari ed a maggiori costi sostenuti per la realizzazione della galleria di sfollamento Cefalù.	

Evoluzione coperture finanziarie								
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corregge	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025		
968,26				9,87	39,43	1.017,57	Copertura appalto in corso per maggiori costi emersi nel corso della realizzazione, per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche) e per soccombenze da Collegio Consultivo Tecnico	

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Fiumetorto-Ogliastrillo	417,62	417,62	0,00	337,09	80,53	416,38	403,08	401,03	4,48	-0,04	0,09	-0,01	16,62	7,30
Raddoppio Ogliastrillo-Castelbuono	599,95	599,95	0,00	533,89	66,06	511,59	234,98	28,42	14,02	55,69	78,79	24,86	17,42	348,19
	1.017,57	1.017,57	0,00	870,98	146,59	927,98	638,06	429,45	18,51	55,64	78,88	24,85	54,74	355,50

CRONOPROGRAMMA														
CUP					Stato attuativo			Iter procedurale						
					Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione	
					Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine
Raddoppio Fiumetorto-Ogliastrillo	J57109000060007	Esercizio	-	-	1-2005	3-2011	-	-	4-2011	4-2016	10-2005	3-2020	12-2017	
Raddoppio Ogliastrillo-Castelbuono	J57109000060007	Realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	9-2012	4-2028	11-2028	

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025
Programma P135: Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodi di Palermo - Catania - Messina

Tabella A06-Programmi città metropolitane

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma prevede il potenziamento tecnologico ed infrastrutturale degli impianti e delle linee afferenti il nodo, interessate da traffico promiscuo regionale, medio-lunga percorrenza e merci. Gli interventi infrastrutturali tipicamente prevedono l'adeguamento/potenziamento del Piano Regolatore Generale (PRG) delle stazioni per gestire le interferenze tra flussi, la realizzazione di nuove fermate e la riqualificazione di quelle esistenti per garantire una migliore accessibilità al sistema ferroviario. Dal punto di vista tecnologico è generalmente previsto il potenziamento del sistema di distanziamento (anche con sezioni corte e/o ERTMS High Density nelle tratte più congestionate), degli apparati centrali e del sistema di supervisione e regolazione della circolazione per migliorare la regolarità di esercizio e consentire l'incremento della capacità. Ulteriori interventi riguardano l'upgrading dei sistemi di Informazione al Pubblico, il potenziamento dei sistemi di alimentazione elettrica e interventi diffusi sulla sede e sulla sovrastruttura ferroviaria per omogeneizzare le caratteristiche prestazionali delle linee e gestire obsolescenza e punti singolari. Gli interventi sono prioritariamente legati agli accordi quadro per la capacità sottoscritti da RFI e le Regioni.

Sicilia


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

In corso interventi diffusi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Sviluppo del traffico Regionale e Metropolitano- Efficientamento e potenziamento tecnologico delle infrastrutture- Eliminazione di «colli di bottiglia»

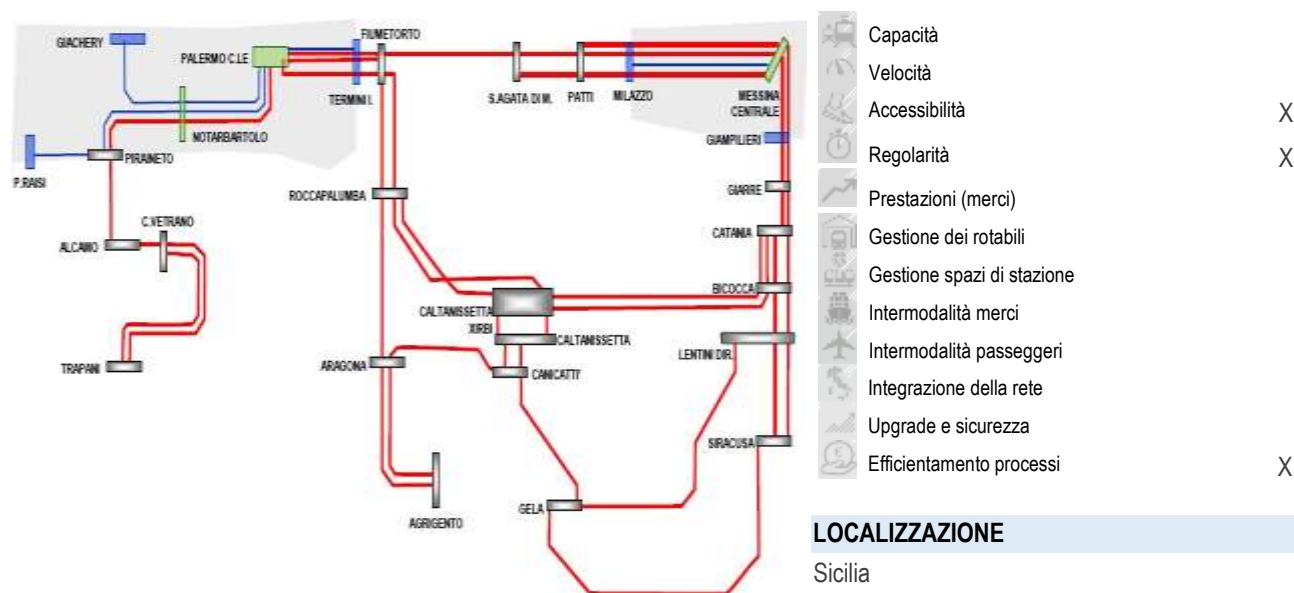

LOCALIZZAZIONE

Sicilia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica						Obiettivi strategici					
	PNRR	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	Cofinanziamenti UE	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	UE - workplan corridoi TEN-T	UE - workplan corridoi TEN-T	UE - workplan corridoi TEN-T
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodi di Palermo - Catania - Messina - interventi diffusi			X			X	X					X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P135: Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodi di Palermo - Catania - Messina

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
19,50	19,50		16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
19,50						19,50

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
19,50						19,50

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodi di Palermo - Catania - Messina - interventi diffusi	19,50	19,50	0,00	18,16	1,34	18,78	18,40	14,29	2,07	2,47	0,05	-0,05	10,64	0,72
	19,50	19,50	0,00	18,16	1,34	18,78	18,40	14,29	2,07	2,47	0,05	-0,05	-0,04	0,72

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Upgrade tecnologico e infrastrutturale legato al potenziamento delle linee merci e regionali	J64J17000010001	17,20	17,20	100%	16,49	96%	In ultimazione
PA - upgrading linee viaggiatori	J67I17000010001	2,30	2,30	100%	2,29	100%	In ultimazione
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodi di Palermo - Catania - Messina - interventi diffusi		19,50	19,50	100%	18,78	96%	

Tabella A06-Programmi città metropolitane

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento, articolato in due fasi funzionali, consiste nel prolungamento, in prima fase, dell'attuale linea a semplice binario Palermo Notarbartolo - Giachery fino alla nuova stazione di attestamento denominata Politeama e, in seconda fase, nella chiusura dell'Anello dalla stazione di Politeama fino alla stazione di Palermo Notarbartolo. Nella prima fase, è prevista la realizzazione, oltre che della stazione Politeama, di due fermate ubicate rispettivamente nel tratto attualmente in esercizio (fermata Libertà) e nel nuovo tratto in corrispondenza del porto (Fermata Porto). Nella seconda fase è prevista la realizzazione della nuova fermata Turrisi Colonna e la trasformazione in fermata della stazione Politeama. L'intervento consentirà di aumentare la capacità e l'accessibilità dell'infrastruttura, creando le condizioni per un incremento dei servizi ferroviari della città di Palermo.

Gli interventi previsti sono tutti ricompresi nell'ambito territoriale del Comune di Palermo


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Tratta Politeama-Notarbartolo: Aggiudicata la gara, è in corso la verifica della progettazione esecutiva presentata dall'appaltatore ed è stata avviata la realizzazione delle opere propedeutiche. Ad esito dell'iter autorizzativo è stata prescritta la realizzazione del Masterplan per la sistemazione superficiale dell'area Lolli-Malaspina, per cui deve essere avviata la progettazione di fattibilità tecnico economica, previa sottoscrizione del protocollo d'intesa con il Comune di Palermo.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

•L'intervento mira al potenziamento del sistema metropolitano della città di Palermo. •Aumento della capacità teorica ammessa sulla linea dagli attuali 2 treni/h a 3 treni/h nella prima fase, e a 6 treni/h nella fase di completamento •Possibilità di nuovi servizi di tipo metropolitano nelle nuove fermate Libertà, Porto, Politeama e Turrisi Colonna •Incremento della regolarità della circolazione •Potenziamento dell'accessibilità al servizio ferroviario

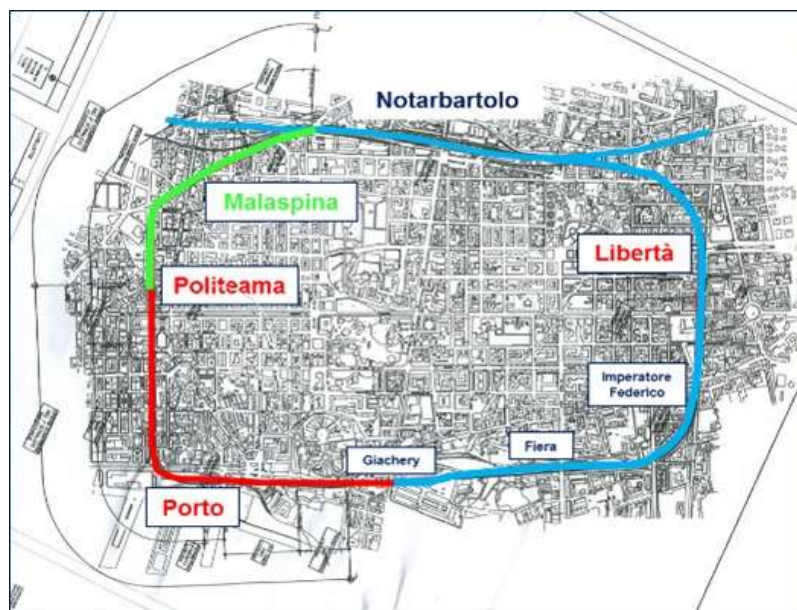

Capacità	X
Velocità	
Accessibilità	X
Regolarità	X
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Sicilia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica					Obiettivi strategici				
	PNRR	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MINS al DEF
Anello di Palermo 2° stralcio: tratta Politeama-Notarbartolo	X			X	X				X	

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P235: Chiusura anello di Palermo tratta Politeama - Notarbartolo

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve			
								Priorità 1	Priorità 2		
141,80	127,02	di cui:	27,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14,78	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
141,80						141,80

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
127,02						127,02

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Anello di Palermo 2° stralcio: tratta Politeama-Notarbartolo	141,80	127,02	14,78	116,30	25,50	105,03	4,95	0,00	0,81	1,41	0,83	0,60	5,00	137,02
	141,80	127,02	14,78	116,30	25,50	105,03	4,95	0,00	0,81	1,41	0,83	0,60	1,13	137,02

CRONOPROGRAMMA														
CUP	Stato attuativo					Iter procedurale								
	Realizzazione	-	8-2026	10-2019	6-2023	Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Funzionalità
						Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	
Anello di Palermo 2° stralcio: tratta Politeama-Notarbartolo	J74C20001660001	Realizzazione	-	8-2026	10-2019	6-2023	10-2026	8-2026	-	-	-	2-2024	2-2028	7-2028

Progetto 0417: Porto di Taranto - collegamento ferroviario del complesso del porto di Taranto con la rete nazionale

Tabella A07-Programma porti e interporti - Ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto consiste nell'attrezzaggio e nel collegamento alla linea ferroviaria nazionale del porto di Taranto attraverso la realizzazione dei seguenti 2 lotti funzionali: 1^a lotto: potenziamento/modifiche alla stazione di Cagioni per la realizzazione del fascio di arrivi e partenze / presa e consegna per il collegamento con il Molo Polisettoriale e della radice per il collegamento dell'ampliamento del 5^a sporgente; 2^a lotto: realizzazione di un fascio di arrivi e partenze / presa e consegna per il collegamento con la realizzanda Piastra Logistica, con il 4^a sporgente ed il 1^a sporgente.

Il territorio dove si realizza l'opera è prevalentemente pianeggiante ed è ubicato parte all'interno dei territori di giurisdizione dell'Autorità Portuale di Taranto e parte nello scalo merci di Cagioni in prossimità della stazione ferroviaria di Taranto.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Potenziamento impianto di Cagioni: fase realizzativa in corso per la prima fase transitoria, da definire il nuovo assetto del terminal portuale che sarà realizzato nella seconda fase. Collegamento con Piastra Logistica: in corso la realizzazione di opere di mitigazione ambientale, opere per la risoluzione di interferenze, LFM, rilevati, trincee e opere minori per l'armamento.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Incremento della capacità di impianto da 6 coppie di treni/giorno di lunghezza 460/550m a 10 coppie di lunghezza fino a 750 m ed efficientamento delle operazioni di manovra.

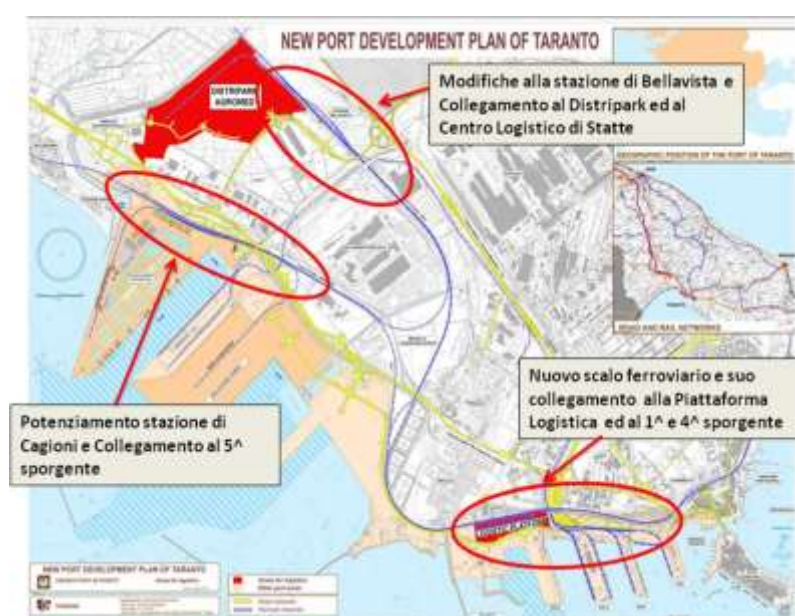

Capacità	X
Velocità	
Accessibilità	
Regolarità	
Prestazioni (merci)	X
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	X
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Puglia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Accordi internazionali Interventi commissariati	Accordi EELL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani
Nuova stazione di Cagioni e collegamento con nuova Piastra Logistica	X					X							X		

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
44,95	44,95	di cui: 14,60	0,46	0,00	29,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0417: Porto di Taranto - collegamento ferroviario del complesso del porto di Taranto con la rete nazionale

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
43,50			0,99	0,46		44,95
Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari						
Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
43,50				0,46	0,99	44,95
Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche) e per soccombenze da Collegio Consultivo Tecnico						

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Nuova stazione di Cagioni e collegamento con nuova Piastra Logistica	44,95	44,95	0,00	35,09	9,85	39,47	24,48	6,39	0,99	2,53	4,27	5,90	5,38	19,37
	44,95	44,95	0,00	35,09	9,85	39,47	24,48	6,39	0,99	2,53	4,27	5,90	5,49	19,37

CRONOPROGRAMMA														
CUP			Stato attuativo				Iter procedurale							
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
Nuova stazione di Cagioni e collegamento con nuova Piastra Logistica	J71H02000120008	Realizzazione	7-2010	10-2011	11-2011	11-2014	-	-	12-2014	8-2021	4-2017	5-2026	12-2027	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento consiste in un piano di investimenti sugli impianti e sulle linee del nodo di Trieste finalizzato ad fini di accompagnare il previsto sviluppo dei traffici del porto e prevede il potenziamento della stazione di Trieste Campo Marzio (previsto in 3 fasi principali) e degli impianti correlati di Servola e Aquilinia. Gli interventi ricadono prevalentemente su aree di proprietà di RFI.

POTENZIAMENTO STAZIONE TRIESTE C.MARZIO1^ Fase – Interventi urgenti coerenti con la configurazione finale del nodo, finalizzata al consolidamento della infrastruttura ferroviaria a servizio del Porto;2^ Fase – Nuovo PRG di Campo Marzio, al fine di rinnovare e potenziare completamente l'impianto di stazione merci oggi esistente prevedendo:un rifacimento complessivo del fascio arrivi e partenze con incremento del modulo fino a 750 m;rinnovo tecnologico mediante la realizzazione del nuovo ACC-M a servizio di tutti gli impianti ferroviari afferenti al porto;una nuova struttura delle aste delle Parenzane con una dismissione dei binari esistenti ed un rifacimento complessivo dei binari afferenti ai moli V, VI e VII;3^ Fase – Realizzazione del nuovo Varco 5 per accesso diretto al Molo VII.POTENZIAMENTO IMPIANTI A SERVIZIO DEL PORTO DI TRIESTE-ULTERIORE FASEInterventi sugli impianti di Campo Marzio, Trieste Aquilinia e Servola e tratte afferenti.

L'intervento verrà realizzato nelle aree prospicienti il Porto di Trieste e lungo la linea storica che raccorda i vari impianti industriali presenti sulla golfo di Trieste a Servola ed Aquilinia e permetterà di aumentare delle prestazioni degli impianti a servizio del porto, in vista dei futuri incrementi di traffico ferroviario.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•Potenziamento stazione Trieste Campo Marzio:1^ Fase Interventi urgenti coerenti con la configurazione finale del nodo: Attivato ad Aprile 2018 l'estensione dell'ACEI di Trieste C.M. fino a Trieste Servola, in data 05 Settembre 2021 è avvenuta la riattivazione del binario tratta Bivio San Giacomo-Bivio Cantieri;2^ Fase Nuovo PRG di Campo Marzio: In data 22/03/2021 è stata attivata la Fase Funzionale relativa alle aste Parenzane (Varco 2);In corso i lavori per l'adeguamento del PRG di campo Marzio e la realizzazione del nuovo ACC.3^ Fase Realizzazione del nuovo Varco 5 per accesso diretto al Molo VII: In data 08/11/2024 è stata consegnata la Progettazione Esecutiva sviluppata dall'Appaltatore, sono in corso le attività di verifica. •Potenzimanto impainti porto di Trieste-ulteriore fase:Sono in corso i lavori di armamento, opere civili e trazione elettrica.In data 08/02/2024 è avvenuta l'aggiudicazione relativa ai lavori per l'estensione dell'ACC di TS-Campo Marzio ai Fasci Servola Aquilinia, in data 19 Marzo 2024 sono state consegnate le prestazioni all'appaltatore. In data 02/08/2024 è avvenuta la consegna della Progettazione Esecutiva, concluse le attività di verifica sono in corso le attività propedeutiche per la consegna dei lavori. Per i restanti Interventi (barriere antirumore e GSMR), in data 27/12/2024 è avvenuta la chiusura la CdS per le barriere antirumore, in corso un aggiornamento della progettazione ad esito dell'iter autorizzativo. In corso la PFTE degli interventi sul nuovo impianto di Servola.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Portare la capacità di impianto da 13 coppie/giorno di lunghezza 600 metri a 35 coppie/giorno di lunghezza 750 metri.



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	X
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Friuli Venezia Giulia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica	Obiettivi strategici
------------------------	----------------------

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025													
Progetto I008: Porto di Trieste													
Intervento / Opere funzionali													
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR		
	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale			
Potenziamento stazione Trieste Campo Marzio					X	X				X			
Potenziamento impianti a servizio del porto di Trieste	X			X	X	X	X						

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	completamento
173,21	126,21	di cui:	107,59	1,61	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE											milioni di euro
Evoluzione Costo											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025					
172,73				0,48		173,21	Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari				
Evoluzione coperture finanziarie											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025					
125,73				0,48		126,21	Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)				

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Potenziamento stazione Trieste Campo Marzio	82,28	82,28	0,00	71,62	10,66	58,31	26,22	9,93	2,78	1,12	2,28	4,24	10,92	55,71
Potenziamento impianti a servizio del porto di Trieste	90,93	43,93	47,00	77,57	13,36	17,58	13,15	0,00	0,24	3,87	5,91	2,80	5,00	77,30
	173,21	126,21	47,00	149,19	24,02	75,89	39,37	9,93	3,02	4,99	8,19	7,04	7,03	133,01

CRONOPROGRAMMA														
CUP	Stato attuativo					Iter procedurale								
	Realizzazione	-	-	7-2017	9-2023	-	-	12-2019	9-2021	7-2018	5-2027	12-2026		
Potenziamento stazione Trieste Campo Marzio	J74H16000230001	Realizzazione	-	-	7-2017	9-2023	-	-	12-2019	9-2021	7-2018	5-2027	12-2026	
Potenziamento impianti a servizio del porto di Trieste	J74C19000030001	Realizzazione	-	-	2-2020	9-2026	-	-	5-2023	3-2021	12-2025	7-2026		

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma comprende misure volte potenziamento e l'efficientamento delle interconnessioni tra la rete ferroviaria e i distretti produttivi, i porti e gli interporti, mirando alla riduzione dei costi "dell'ultimo miglio". Gli interventi si concentrano sui porti e terminali core e consistono nella realizzazione/upgrading degli impianti ferroviari a servizio dei terminali e nel potenziamento tecnologico ed infrastrutturale delle linee di collegamento alla rete nazionale. Le azioni riguardano principalmente l'adeguamento a standard europeo della lunghezza dei binari (modulo d'impianto), l'elettificazione estesa fino ai binari di presa e consegna, l'upgrade del layout del piano di stazione idoneo a ridurre il numero e l'estensione delle manovre primarie e secondarie e l'installazione del segnalamento basso.

Le principali realizzazioni riguardano: A) Genova Marittima Fuorimuro: realizzazione di una nuova stazione che farà parte dell'IFN dotata di un nuovo ACC, avente giurisdizione su 7 binari elettrificati a modulo 750 metri, alcuni dei quali dotati di tronchini per lo svincolo/sosta locomotori. I binari saranno idonei all'arrivo/partenza di treni completi, il cui approntamento e terminalizzazione da/verso le banchine portuali avverrà attraverso apposite aste di manovra centralizzate; B) potenziamento scalo Castelnuovo Garfagnana: La linea Lucca - Aulla, inserita in un articolato contesto geo-morfologico, è stata interessata da più richieste di nuovi trasporti merci che hanno portato all'intervento di potenziamento della stazione di Castelnuovo Garfagnana. Il progetto prevede l'adeguamento della stazione ai fini della terminalizzazione dei servizi merci mediante: modifiche al piano del ferro per l'adeguamento del terzo binario merci con realizzazione delle relative indipendenze, del binario di scalo, del binario di innesto di un nuovo raccordo; realizzazione di un'asta di manovra per movimentazione carri e di due binari di carico e scarico; di un'area attrezzata per il passaggio dei container da ferro a gomma e viceversa; la soppressione del passaggio a livello di via Enrico Fermi. La Stazione sarà gestita con un impianto ACC (Apparato Centrale Computerizzato) inserito in CTC (Controllo del Traffico Centralizzato) evoluto, con contestuale adeguamento del posto centrale di Pisa. Nell'ambito del progetto è prevista anche la realizzazione di: sottopassaggio e ascensore a servizio dei tre binari; nuovo marciapiede a servizio dei binari II e III, di lunghezza minima utile adeguata a contenere il treno viaggiatori di massima composizione circolante sulla linea e un'altezza di 55 cm sul piano del ferro; implementazione della segnaletica a messaggio fisso e variabile adeguata a standard I&C; modifiche al piano del ferro per realizzazione contemporaneità; C) ripristino bretella Merci S. Maria Capua Vetere: l'intervento è finalizzato al completamento della "Bretella di Santa Maria Capua Vetere", ovvero il collegamento diretto della linea Roma Napoli via Cassino con lo Scalo di Maddaloni Marcianise Smistamento. La bretella, lunga circa 8,5 km, risulta già realizzata ma mai attivata. L'intervento prevede l'attivazione di un collegamento merci atto a garantire una connessione diretta tra la linea Cassino, in corrispondenza della stazione di S. Maria Capua Vetere, e l'impianto di Maddaloni Marcianise Smistamento. D) potenziamento del terminale di Verona QE: Il Potenziamento del QE, anche attraverso la realizzazione degli interventi di potenziamento/ampliamento dell'infrastruttura, quali il nuovo PRG di stazione e le nuove tecnologie, consentono il collegamento diretto con la Direttrice del Brennero e con la linea ferroviaria per Bologna. L'intervento relativo alla stazione è a beneficio non solo del quarto modulo, ma anche del secondo e del terzo modulo permettendo di lavorare i treni a 750 metri in arrivo dall'asse del Brennero con l'apertura del BBT e della Fortezza – Ponte Gardena. Gli interventi sono suddivisi in: Lotto 1. realizzazione del nuovo fascio arrivi e partenze con modulo di 750 mt; Lotto 2. realizzazione del nuovo Terminal di carico e scarico (2 fasci da 4 binari ciascuno serviti da gru). Ulteriore intervento: realizzazione di 2 nuovi binari per l'impianto del 3° modulo dell'Interporto di Verona-Quadrante Europa E) Nuovo capolinea 5 Terre Express a La Spezia: realizzazione di un nuovo binario tronco centralizzato ed elettrificato a modulo TPL con relativo marciapiede H55 e conseguente implementazione delle informazioni a messaggio variabile e fisso, per l'attestamento dei servizi 5 Terre Express, per i quali sarà garantita la possibilità di piazzamento della riserva calda ambito scalo di Valdellora. F) Collegamento area industriale Valle Ufita: il progetto preliminare della nuova linea ferroviaria Napoli – Bari prevede nell'ambito della stazione di Hirpinia la predisposizione per un raccordo ferroviario con l'area industriale di Valle Ufita. Attualmente, l'ipotesi più accreditata prevede la realizzazione di un impianto merci intermodale di tipo innovativo, con modulo 550 metri, da allocare a nord rispetto alla stazione di Hirpinia in appalto, prevedendo una configurazione di testa del nuovo impianto merci, che consente l'ingresso da entrambe le direzioni (Napoli/Bari) tramite dei collegamenti percorribili a 60 km/h in ascesa verso l'impianto intermodale. G) Hub di Alessandria: offre un'area atta alla realizzazione di una nuova infrastruttura terminale, consentendone una rifunionalizzazione a servizio della logistica del territorio e dei traffici nazionali e internazionali. Gli interventi consistono nella realizzazione nuovo ACC per la gestione dei binari di circolazione; messa a modulo 650-750m dei binari del fascio Arrivi/Partenze attrezzati per la gestione di Merci Pericolose; piazzale pavimentato per carico/scarico merci e stoccaggio materiali; 4 binari a modulo 750m a servizio del Terminal, provvisti di gru a portale, ed 1 binario per circolazione locomotive; realizzazione di un nuovo ACC «terzo» per la gestione del fascio binari del Terminal innovativo; Nuovo gate di ingresso/uscita, corsie e parcheggi per la viabilità di TIR o autoveicoli di servizio; Nuova viabilità di accesso al Terminal. H) Interventi ambito S. Nicola di Melfi: L'impianto di San Nicola di Melfi è situato a circa 60 km da Foggia. Il collegamento ferroviario avviene attraverso la linea Rocchetta – Gioia del Colle, diramazione della Foggia - Potenza. In prossimità dell'impianto vi è la SS 655 con caratteristiche di superstrada. L'impianto è interessato essenzialmente da traffico merci legato al settore automotive. È prevista la realizzazione di un nuovo apparato di stazione. È stata avviata l'analisi delle alternative progettuali per: - potenziamento dell'attuale stazione merci di S. Nicola di Melfi con adeguamento a modulo 750 m; - impianto dedicato al servizio viaggiatori per i dipendenti della Zona Industriale di S. Nicola di Melfi, stabilimento «FCA – Stellantis»; - nuova infrastruttura di collegamento tra S. Nicola di Melfi e la tratta Rocchetta S.A.L. – Potenza con shunt di Rocchetta S.A.L. Ulteriori interventi diffusi, finanziati da PNC, riguardano il potenziamento dei raccordi con impianti industriali e dei collegamenti di ultimo miglio (tra cui il collegamento con il Centro di Smistamento Merci della Marsica di Avezzano).

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

A) Genova Marittima Fuorimuro: In data 17/07/2024 si è conclusa l'attività negoziale dell'appalto multidisciplinare (opere civili + trazione elettrica + armamento e telecomunicazioni); in data 20/11/2024 è avvenuta la consegna delle prestazioni, in corso la progettazione esecutiva; Per quanto riguarda l'appalto IS (cabina e piazzale) è avvenuta in data 4/03/2025 la stipula della Convenzione. B) Potenziamento scalo Castelnuovo Garfagnana: Ultimato il sottopasso pedonale, il primo e il secondo marciapiede e le modiche piano regolatore generale di stazione, in fase di

Programma P060: Infrastrutturazione porti e terminali

attivazione gli ascensori. In corso di esecuzione la messa in opera di ascensori e l'adeguamento area scalo merci.C) Ripristino bretella Merci S. Maria Capua Vetere: Sono conclusi i primi interventi di rinnovo totale dell'armamento e risanamento della massicciata. Ultimato e approvato lo studio del piano di indagini per la caratterizzazione geotecnica meccanica delle opere civili, sono state avviate le attività negoziali per l'esecuzione delle suddette indagini. D) Potenziamento del terminale di Verona QE: La Progettazione Definitiva è stata ultimata a giugno 2023, per quanto riguarda i primi due Lotti. Nel novembre 2023 è stata sottoscritta la convenzione tra RFI, QETG e Consorzio ZAI per il proseguo delle attività relative al lotto 2. Nel Novembre 2023 è stata sottoscritta la convenzione tra RFI, QETG e Consorzio ZAI per il proseguo delle attività relative al 3° modulo, per il quale è in corso la Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, avviata a marzo 2024.E) Nuovo capolinea 5 Terre Express a La Spezia: Progettazione definitiva ed esecutiva completata. Sono in corso le attività relative ai settori Trazione Elettrica e Opere Civili. Restano da avviare le attività per il settore armamento.F) Collegamento area industriale Valle Ufita: A gennaio 2024 è stata ultimata la PFTE di tutto il progetto, avviata la procedura di assoggettabilità alla Verifica Preventiva per l'interesse archeologico e inviata l'istanza per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità VIA. In corso la revisione progettuale della Fase Funzionale 1 e sono in corso le interlocuzioni per la candidatura al finanziamento FESR Campania 21-27 per un valore di 130 Mio €.G) Hub di Alessandria: Ultimato il PFTE+ della prima fase funzionale, a dicembre 2024 è stata avviata l'attività negoziale, tutt'ora in corso. Per i restanti interventi è in corso la progettazione. In data 03/02/2025 è stata avviata ed è attualmente in corso la PFTE relativa al nuovo svincolo autostradale verso il terminal merciH) Interventi ambito S. Nicola di Melfi: Il nuovo apparato di stazione sarà attivato entro il 2025 ed entrerà a far parte dell'ACC – M Rocchetta/S.A.L. – S. Nicola di Melfi. In corso la realizzazione per quanto attiene al potenziamento dell'attuale impianto merci, nuovo impianto per servizio viaggiatori e nuovo collegamento da/per Potenza con shunt di Rocchetta S.A.L.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Il programma mira ad aumentare la capacità degli impianti merci.Gli interventi di potenziamento tecnologico e di centralizzazione dei fasci di presa e consegna permetterà alle IF di gestire la manovra in autoproduzione, con benefici in termini di efficienza.Tra le principali realizzazioni si segnalano:- Genova fuori Muro: l'intervento ha l'obiettivo di potenziare l'infrastruttura ferroviaria a servizio del Porto Storico di Genova attraverso la realizzazione di un nuovo impianto che consentirà sia una più rapida e razionale movimentazione delle merci, mediante passaggio ad una gestione completamente automatizzata con adeguati presidi in loco, sia la possibilità di effettuare treni lunghi fino a 740 metri con benefici complessivi sull'intera catena logistica.- Potenziamento scalo Castelnuovo Garfagnana:L'impianto avrà una capacità di circa 1 coppia al giorno di lunghezza 230 metri; Incremento dell'accessibilità; Riduzione dei minuti di ritardo derivanti da conflitti di circolazione.- Ripristino bretella Merci S. Maria Capua Vetere: garantire la possibilità di accesso allo scalo di Maddaloni Marcanise senza dover necessariamente invertire la marcia presso l'impianto di Cancellò.- Potenziamento Verona Quadrante Europa: aGli interventi in progetto consentiranno di aumentare la capacità complessiva del terminal intermodale di Verona Quadrante Europa, per offrire una adeguata risposta ad una crescente domanda di trasporto ferroviario combinato, destinata ad aumentare con il completamento e l'entrata in esercizio della Galleria di Base del Brennero, nonché lo sviluppo dell'AV/AC verso Est- upgrading PRG San Nicola di Melfi: migliore accessibilità passeggeri alla Zona Industriale di S. Nicola di Melfi con conseguente riduzione dell'uso dell'auto privata.- Collegamento area industriale Valle Ufita: creare le condizioni per uno sviluppo industriale dell'Irpinia e dell'intera Regione Campania; favorire lo shift modale per il trasporto delle merci nel Mezzogiorno a vantaggio della ferrovia.- Hub di Alessandria: Lo Scalo di Alessandria Smistamento viene reso più efficiente e rifunzionalizzato quale hub intermodale e retroportuale, con prerogative di "esclusività" sui rilanci ferro-ferro dei traffici internazionali, configurandosi come uno snodo fondamentale lungo il corridoio TEN-T Reno-Alpi, ampliando così la Catchment Area dei Porti di Genova e Savona oltralpe.Nell'ambito del programma rientrano anche interventi finalizzati a promuovere l'intermodalità da/verso poli croceristici, come ad esempio il nuovo capolinea 5 Terre Express.



	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	X
	Gestione spazi di stazione	X
	Intermodalità merci	X
	Intermodalità passeggeri	X
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

- Piemonte
- Liguria
- Veneto
- Campania
- Territorio Nazionale

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P060: Infrastrutturazione porti e terminali

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica								Obiettivi strategici						
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EELL	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Allegato MIMS al DEF	Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change	Adeguamento a standard tecnici
Porto di Genova		X		X				X		X					X
Hub di Alessandria (quota RFI)		X		X				X							X
Infrastrutturazione porti e terminali - interventi diffusi				X				X		X					X
Capolinea 5 terre express, potenziamento La Spezia Migliarina e scalo merci Castelnuovo Garfagnana				X				X		X					X
Adeguamento stazione Verona QE (quota RFI)				X				X		X					X
Ripristino bretella merci S.Maria Capua Vetere				X				X							X
Collegamento area industriale di Valle Ufita				X				X							X
Bretella merci di collegamento ad est della stazione di Padova Interporto										X					
Potenziamento del Collegamento Pedonale tra la Stazione Ferroviaria di Genova Piazza Principe Sotterranea e la Stazione Marittima di Genova															

QUADRO FINANZIARIO												milioni di euro
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2		
1.588,15	492,55	di cui:	327,00	49,26	0,00	0,00	31,69	84,60	0,00	14,12	1.081,48	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo							CdP-I agg.2025	Variazione di costo relativa ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (aggiunto CUP J91B21000410009 da riga NA026) e allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze			
1.602,94	-20,25	1,00				1.588,15		
Evoluzione coperture finanziarie							CdP-I agg.2025	Riduzione delle risorse per il mancato finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR del programma dei raccordi ferroviari, riclassificazione oggetti su altri interventi (A2001B, P221); ulteriore copertura con risorse proprie della Società per interventi non rientranti nel Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni			
545,64	-20,25	1,00	-10,99	7,15	-30,00	492,55		

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Potenziamento del Collegamento Pedonale tra la Stazione Ferroviaria di Genova Piazza Principe Sotterranea e la Stazione Marittima di Genova	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Bretella merci di collegamento ad est della stazione di Padova Interporto	133,39	1,00	132,39	124,85	8,53	0,93	0,76	0,00	0,00	0,16	0,02	0,44	5,00	132,62

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025														
Programma P060: Infrastrutturazione porti e terminali														
Hub di Alessandria (quota RFI)	371,58	91,58	280,00	85,73	285,86	1,31	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	371,58
Capolinea 5 terre express, potenziamento La Spezia Migliarina e scalo merci Castelnuovo Garfagnana	49,70	49,70	0,00	44,78	4,93	38,47	27,55	0,00	0,00	0,00	4,06	9,50	5,00	24,59
Ripristino bretella merci S.Maria Capua Vetere	18,09	18,09	0,00	17,44	0,66	9,10	8,90	0,00	0,00	0,00	8,27	0,53	5,00	9,12
Adeguamento stazione Verona QE (quota RFI)	110,85	5,50	105,35	0,98	109,87	2,83	2,64	0,00	0,38	0,02	0,32	1,54	5,00	108,20
Porto di Genova	88,80	74,68	14,12	71,23	17,57	46,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	86,96
Collegamento area industriale di Valle Ufita	186,00	1,00	185,00	126,26	59,74	0,73	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	185,37
Infrastrutturazione porti e terminali - interventi diffusi	624,73	245,99	378,75	186,92	437,81	117,48	89,82	30,04	8,89	22,67	9,05	9,92	12,05	536,39
	1.588,15	492,55	1.095,60	658,18	929,97	216,85	132,16	30,04	9,27	22,85	21,72	22,04	22,40	1.459,84

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Bretella merci di collegamento ad est della stazione di Padova Interporto	J91B21000410009	133,39	1,00	1%	0,76	76%	Progettazione
Bretella merci di collegamento ad est della stazione di Padova Interporto		133,39	1,00	1%	0,76	76%	
Potenziamento del collegamento pedonale tra la stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe Sotterranea e la Stazione Marittima di Genova	J34J25000260001	5,00	5,00	100%	0,00	0%	Progettazione
Potenziamento del Collegamento Pedonale tra la Stazione Ferroviaria di Genova Piazza Principe Sotterranea e la Stazione Marittima di Genova		5,00	5,00	100%	0,00	0%	
Upgrading porti e terminali		105,00	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Potenziamento dell'interporto di Verona Quadrante Europa	J64C20000020006	5,85	5,50	94%	2,65	48%	Realizzazione
Adeguamento stazione Verona QE (quota RFI)		110,85	5,50	5%	2,65	48%	
Potenziamento porti e terminali - Firenze	J84C20000050001	49,70	49,70	100%	31,63	64%	Realizzazione
Capolinea 5 terre express, potenziamento La Spezia Migliarina e scalo merci Castelnuovo Garfagnana		49,70	49,70	100%	31,63	64%	
Upgrading porti e terminali		280,00	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Hub intermodale di Alessandria Smistamento	J91G23000020001	91,58	91,58	100%	0,70	1%	Progettazione
Hub di Alessandria (quota RFI)		371,58	91,58	25%	0,70	1%	
Completamento bretella di Santa Maria Capua Vetere	J94J22000220001	18,09	18,09	100%	8,99	50%	Realizzazione
Ripristino bretella merci S.Maria Capua Vetere		18,09	18,09	100%	8,99	50%	
Bacino portuale di Sampierdarena - interventi Parco Fuori Muro	J44J22000150001	88,80	74,68	84%	1,84	2%	Progettazione
Porto di Genova		88,80	74,68	84%	1,84	2%	
PFTE Piattaforma Logistica Valle Ufita	J37H21006500008	131,00	1,00	1%	0,66	66%	Progettazione
Upgrading porti e terminali		55,00	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Collegamento area industriale di Valle Ufita		186,00	1,00	1%	0,66	66%	
Upgrading porti e terminali		426,50	48,75	11%	0,00	0%	Progettazione
Upgrading Terminali Merci - Milano	J47I10000010001	96,68	94,93	98%	24,50	26%	Realizzazione
Potenziamento impianti merci – Trieste	J24G19000000001	33,06	33,06	100%	12,64	38%	Realizzazione
Upgrading porti e terminali - BO	J94G18000010001	23,57	23,57	100%	21,60	92%	In ultimazione
Upgrading prestazionale linee di adduzione ai porti Core della Rete TEN-T - Roma	J54H16000760001	9,54	9,54	100%	9,50	100%	In ultimazione
Upgrading scali merci - Bari	J37J18000190001	7,70	7,70	100%	3,25	42%	Realizzazione
Upgrading prestazionale linee di adduzione ai porti Core della Rete TEN-T - Bologna	J44H16000380001	6,20	6,20	100%	6,09	98%	In ultimazione
Upgrading porti e terminali - TO	J67F19000350001	5,21	6,36	100%	4,96	78%	In ultimazione
Upgrading scali merci - Palermo	J67J18000400001	4,06	4,06	100%	1,96	48%	Realizzazione
Upgrading porti e terminali - GE	J97H21001480001	3,85	3,85	100%	3,79	99%	In ultimazione
Upgrading porti e terminali - Venezia	J97F20000230001	3,10	3,10	100%	2,73	88%	Realizzazione
Upgrading porti e terminali - Venezia	J96E19000210001	2,25	2,25	100%	2,22	99%	In ultimazione
Interventi di Manutenzione Straordinaria sui Terminali Merci gestiti da Terminali Italia – TO	J67D24000100005	1,53	1,53	100%	0,52	34%	Realizzazione
Potenziamento porti e terminali - Verona	J94C20000010001	0,67	0,67	100%	0,00	0%	Progettazione
Interventi di Manutenzione Straordinaria sui Terminali Merci gestiti da Terminali Italia – VR	J97D24000090005	0,40	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Interventi di Manutenzione Straordinaria sui Terminali Merci gestiti da Terminali Italia – MI	J97D24000080005	0,26	0,26	100%	0,00	0%	Progettazione
Upgrading porti e terminali - Venezia	J54J24000900001	0,13	0,13	100%	0,00	0%	Progettazione
Upgrading porti e terminali - GE	J97F20000220001	0,04	0,04	100%	0,04	97%	In ultimazione
Infrastrutturazione porti e terminali - interventi diffusi		624,73	245,99	39%	93,80	38%	

Progetto P087B: Ammodernamento e potenziamento rete ferroviaria Regione Abruzzo - Collegamento al porto di Vasto

Tabella A07-Programma porti e interporti - Ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi si inquadrano nell'ambito di un programma che mira a creare le condizioni per migliorare gli attuali servizi ferroviari all'interno della Regione Abruzzo e per loro successivi sviluppi, in attuazione dell'Accordo Quadro per l'utilizzo della capacità ferroviaria sottoscritto a novembre 2016. I principali interventi consistono in: - Nuovo collegamento tra la Stazione Porto di Vasto e il Porto di Punta Penna a servizio delle aree industriali di Piana S. Angelo e Valdisangro. Sono previsti interventi per il collegamento del porto all'IFN.- Ulteriori interventi sulle linee d'interesse della Regione Abruzzo come potenziamento delle sedi di incrocio sulle linee a semplice binario, PRG ed adeguamento tecnologico degli impianti.

Il progetto prevede la realizzazione del collegamento ferroviario del Porto di Punta Penna con la vicina stazione ferroviaria di Porto di Vasto attraverso il ripristino di una porzione del raccordo ferroviario esistente, non più in esercizio, che serviva l'area industriale di Punta Penna, l'adeguamento dell'impianto di stazione ed il prolungamento del tracciato ferroviario verso il porto, interessando il promontorio di punta Penna, in stretto affiancamento alla viabilità stradale di accesso al porto e la realizzazione di due aste sulla banchina in linea con quanto previsto dal PRP sull'ampliamento dell'attuale banchina di levante.

Abruzzo

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

In corso l'approvazione del PFTE per gara della fase 0, modifiche al PRG della stazione di Porto di Vasto. Di prossimo avvio l'iter ambientale sulla Fase 1 - adeguamento a modulo dei binari III e IV - e sulla Fase 2 - collegamento ferroviario a semplice binario del Porto di Vasto.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Realizzazione del collegamento del porto con la rete infrastrutturale ferroviaria;- Potenziamento del trasposto multimodale.

	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	X
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Abruzzo

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica	Obiettivi strategici
	Allegato MINS al DEF Tavoli tecnici di ascolto Altri Provvedimenti* Cofinanziamenti UE UE - workplan corridoi TEN-T AQ per l'utilizzo della capacità Fondo Sviluppo e Coesione Accordi EE.LL. Accordi Internazionali Interventi commissariati PNRR	Coesione sociale e territoriale Accessibilità e qualità stazioni Resilienza al climate change Adeguamento a standard tecnici Sviluppo tecnologico Sistemi regionali e metropolitani Potenziamento connessioni merci Sviluppo corridoi TEN-T Completamento valichi alpini Alta Velocità (AV)
Collegamento al porto di Vasto	X	

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P087B: Ammodernamento e potenziamento rete ferroviaria Regione Abruzzo - Collegamento al porto di Vasto

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
246,50	25,00		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,50

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l’affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell’investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all’art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
25,00			221,50			246,50
Variazione di costo è dovuta all'aggiornamento del quadro economico ad esito della PFTE.						

Evoluzione coperture finanziarie					
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni
25,00					25,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Collegamento al porto di Vasto	246,50	25,00	221,50	237,71	8,79	1,18	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	245,68
	246,50	25,00	221,50	237,71	8,79	1,18	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	245,68

CRONOPROGRAMMA														
CUP	Stato attuativo					Iter procedurale								
	CUP	Progettazione	Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
			6-2023	4-2026	10-2024	1-2027	-	-	-	-	-	-	-	8-2031
Collegamento al porto di Vasto	J81G23000080001	Progettazione	6-2023	4-2026	10-2024	1-2027	-	-	-	-	-	-	-	8-2031

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi, articolati per fasi funzionali, mirano al miglioramento dei collegamenti e al potenziamento degli impianti portuali, in attuazione dei protocolli di intesa del 15 giugno 2015 e del 10 novembre 2017.

Gli interventi sono articolati nei seguenti lotti: A) Opere previste nel "Protocollo Attuativo per la realizzazione di interventi migliorativi dell'accessibilità ferroviaria del Porto Core di Ravenna" del 2015 finalizzate ad aumentare la sagoma limite dei collegamenti ferroviari, eliminare un'interferenza tra la stazione ed il porto, migliorare la capacità del collegamento porto stazione. Gli interventi consistono in: 1 Sottopassaggio di via Canale Molinetto: Realizzazione sottopassaggio carrabile sostitutivo di passaggio a livello di via Canale Molinetto, km 73+423 della linea Ravenna-Rimini; 2- Prolungamento dorsale raccordo in destra Candiano; 3 Adeguamento alla sagoma P/C 80 del cavalcavia Teodorico. Demolizione dell'attuale ponte e ricostruzione di un nuovo cavalcavia ferroviario metallico che garantisca la sagoma PC80; 4- ripristino della funzionalità della bretella per arrivo/partenza direttamente dal raccordo in sinistra Candiano (opere anticipate fase 2) B) Opere previste nel «Protocollo d'intesa per lo sviluppo del nodo ferroviario di Ravenna e l'ottimizzazione del traffico merci» del 2017. Gli interventi consistono in: 1- Potenziamento dello scalo sinistra Candiano: Realizzazione di 7 ulteriori binari, modifiche al piano del ferro per l'ottimizzazione delle operazioni presso lo scalo, centralizzazione ed elettrificazione di tutto il fascio, adeguamento a modulo 750 metri del binario VI; 2-Potenziamento dello scalo destra Candiano: Centralizzazione ed elettrificazione dei binari esistenti del fascio base e del fascio pesa, realizzazione di 2 ulteriori binari, adeguamento a modulo 750 metri di 2 binari.

Emilia Romagna


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Fase 1. Opere 3-4 concluse. Progettazione definitiva dell'opera 1 conclusa, in corso Conferenza dei Servizi; sono stati forniti elementi progettuali integrativi richiesti dal Comune durante l'iter approvativo, progettazione definitiva dell'opera 2 conclusa ed in fase di condivisione con Autorità Portuale e Comune di Ravenna. Fase 2. Sx Candiano: Completato l'adeguamento del Progetto definitivo alle prescrizioni della CdS istruttoria; in corso la valutazione preliminare da parte del MASE sulla necessità di assoggettare l'intervento a procedura ambientale, all'esito della quale - se confermata la non necessità - si potrà indire a cura dell'Autorità Portuale del porto di Ravenna la CdS decisoria per l'approvazione del progetto. Dx Candiano: PFTE in corso di sviluppo.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

I principali benefici connessi agli interventi sono i seguenti: - sviluppo del traffico merci in afferenza al Porto di Ravenna; - realizzazione di itinerari/istadamenti della stazione di Ravenna per il passaggio di traffico merci con sagoma P/C80; - Incremento della regolarità con la soppressione di un'interferenza stradale molto trafficata con la linea ferroviaria; - spostamento del traffico merci dalla città (scalo in stazione) ai nuovi scali in destra e sinistra Candiano.

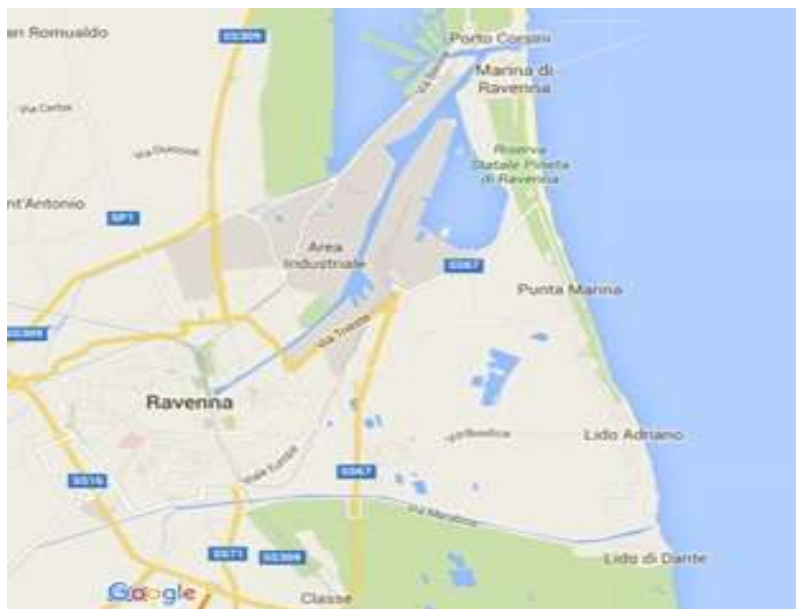

	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	X
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	X
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Emilia Romagna

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P142: Porto di Ravenna

	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change	Adeguamento a standard tecnici	Sviluppo tecnologico	Sistemi regionali e metropolitani	Potenziamento connessioni merci	Sviluppo corridoi TEN-T	Completamento valichi alpini	Alta Velocità (AV)
Intervento / Opere funzionali																					
Porto di Ravenna 1^ fase: Soppressione P.L. via Canale Molinetto, adeguamento cavalcavia Teodorico, prolungamento del sottopassaggio pedonale di stazione e adeguamento collegamento esistente dorsale sinistra Candiano							X														
Porto di Ravenna 2^ fase: Potenziamento collegamenti esistenti dorsali sinistra e destra Candiano					X													X			

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2		
137,90	86,40	di cui:	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	4,20	47,30	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE									
Evoluzione Costo									
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025			
137,90						137,90			
Evoluzione coperture finanziarie									
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025			
86,40						86,40			

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Porto di Ravenna 1^ fase: Soppressione P.L. via Canale Molinetto, adeguamento cavalcavia Teodorico, prolungamento del sottopassaggio pedonale di stazione e adeguamento collegamento esistente dorsale sinistra Candiano	23,50	23,50	0,00	21,33	2,17	12,41	12,26	0,94	4,59	5,66	0,43	0,57	5,79	11,20
Porto di Ravenna 2^ fase: Potenziamento collegamenti esistenti dorsali sinistra e destra Candiano	114,40	62,90	51,50	79,02	35,38	0,68	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	5,00	114,11
	137,90	86,40	51,50	100,36	37,54	13,09	12,56	0,94	4,59	5,66	0,43	0,77	0,18	125,32

CRONOPROGRAMMA

CUP		Stato attuativo	Iter procedurale											
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
			Iter autorizzativo	10-2020	3-2024	3-2018	12-2026	-	-	-	-	10-2027	7-2029	7-2029
Porto di Ravenna 1ª fase: Soppressione P.L. via Canale Molinetto, adeguamento cavalcavia Teodorico, prolungamento del sottopassaggio pedonale di stazione e adeguamento collegamento esistente dorsale sinistra Candiano														
			Iter autorizzativo	7-2023	4-2027	3-2023	6-2025	-	-	-	-	-	-	7-2033
Porto di Ravenna 2ª fase: Potenziamento collegamenti esistenti dorsali sinistra e destra Candiano														

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi si inquadrano nel programma di adeguamento prestazionale dei principali hub logistici e itinerari merci, con particolare riferimento agli assi portanti della mobilità rappresentati dai Core Network Corridors della rete TEN-T, in attuazione delle specifiche tecniche di interoperabilità ferroviaria (STI) emanate dalla UE e in risposta alle richieste avanzate degli operatori logistici. Gli interventi prioritari nell'ambito del programma riguardano l'allungamento dei moduli di stazione, per consentire la circolazione di treni merci lunghi fino a 740 metri, l'adeguamento del profilo degli ostacoli lungo la linea, per consentire il trasporto di semirimorchi e container high-cube di ultima generazione, ed il consolidamento della sede e del binario, per consentire il transito di convogli aventi massa per asse di 22,5 tonnellate.

Gli interventi consistono nell'attrezzaggio tecnologico e nella realizzazione di altre opere di allaccio alla rete ferroviaria nazionale del nuovo terminale in costruzione nell'area dell'EX Fascio Direzioni della stazione di Milano Smistamento che sarà gestito dalla società TERALP. La città di Milano sarà dotata di un terminal tecnologicamente avanzato in grado di soddisfare la futura domanda di trasporto merci su lunga distanza tra il capoluogo lombardo e le principali origini/destinazioni italiane ed europee. Il progetto è articolato in macro-interventi: - nuovo collegamento fra i binari dei fasci 'Arrivi' e 'Nord' di Milano Smistamento al nuovo binario a servizio dei raccordi entro il Piazzale di Mercitalia; - completamento rete ferroviaria di collegamento verso nuovo terminal, opere di bonifica ambientale e realizzazione strada di emergenza; - adeguamento tecnologico per la gestione tramite ACC di una parte dei binari del Fascio Arrivi adibendoli sia agli arrivi che alle partenze lato Milano Lambrate/Milano Rogoredo.

Lombardia

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Collegamento ferroviario: interventi iniziati nel gennaio 2019 con attivazione effettuata nel 2020. Opere di completamento: • Strada di emergenza completata; • Realizzazione interventi di collegamento a nuovo terminal Fase 1 – completati; • Realizzazione interventi di collegamento a nuovo terminal Fase 2 e 3 – dicembre 2026. ACC Fascio Arrivi: in fase di sviluppo la progettazione esecutiva.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Incremento di capacità e miglioramento della qualità dei servizi offerti nel terminal. La capacità dell'impianto passerà da 10 coppie di treni/giorno di lunghezza 650 m a 22 coppie di treni/giorno di lunghezza fino a 750 m.



	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	X
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lombardia

INQUADRAMENTO STRATEGICO**Priorità programmatica**

Allegato MMS al DEF
Tavoli tecnici di ascolto
Altri Provvedimenti*
Cofinanziamenti UE
UE - workplan corridoi TEN-T
AQ per l'utilizzo della capacità
Fondo Sviluppo e Coesione
Accordi EE.LL.
Accordi Internazionali
Interventi commissariati
PNRR

Obiettivi strategici

Coesione sociale e territoriale
Accessibilità e qualità stazioni
Resilienza al climate change
Adeguamento a standard tecnici
Sviluppo tecnologico
Sistemi regionali e metropolitani
Potenziamento connessioni merci
Sviluppo corridoi TEN-T
Completamento valichi alpini
Alta Velocità (AV)

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025																			
Progetto P173: Nuovo terminale Milano smistamento (interventi RFI)																			
Milano smistamento: attrezzaggio tecnologico nuovo terminale e opere di allaccio alla rete ferroviaria nazionale		X	X		X						X								
QUADRO FINANZIARIO																			
milioni di euro																			
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento								
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatiche di breve											
								Priorità 1	Priorità 2										
21,10	21,10	di cui:	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.																			
EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE																			
milioni di euro																			
Evoluzione Costo																			
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025													
21,10						21,10													
Evoluzione coperture finanziarie																			
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025													
21,10						21,10													
PIANO DELLA SPESA																			
						Quadro finanziario ed economico			OGV		Produzione								
						Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Milano smistamento: attrezzaggio tecnologico nuovo terminale e opere di allaccio alla rete ferroviaria nazionale						21,10	21,10	0,00	20,07	1,03	18,14	18,04	3,58	2,99	3,31	4,77	2,19	7,48	3,02
						21,10	21,10	0,00	20,07	1,03	18,14	18,04	3,58	2,99	3,31	4,77	2,19	1,24	3,02
CRONOPROGRAMMA																			
CUP						Stato attuativo		Iter procedurale											
								Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Nego.		Esecuzione		Funzionalità	
						Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine		
Milano smistamento: attrezzaggio tecnologico nuovo terminale e opere di allaccio alla rete ferroviaria nazionale						Realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	5-2020	1-2028	-	-	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

La stazione di Bari Lamasinata, interconnessa con lo scalo Ferruccio, l'interporto Regionale della Puglia ed il raccordo GTS, è una delle principali stazioni dedicate al traffico merci nel Mezzogiorno e senz'altro la più importante sulla direttrice adriatica. L'hinterland di riferimento della stazione comprende non solo la Puglia ma anche la Basilicata, il Molise e la Calabria, con un volume di traffico di 4.000 treni/anno. La stazione di Bari Lamasinata svolge la funzione di arrivo/partenza e presa/consegna per il terminal Ferruccio con una capacità di binari a 530 m, al di sotto degli attuali 550/600 m consentiti tra Bologna e Bari L. Il terminal intermodale di Ferruccio si estende su un'area di circa 250.000 mq, in parte proprietà di RFI ed in parte di Mercitalia Logistics. Al momento le attività di manovra per il trasferimento richiedono almeno 30'.

L'intervento è articolato nelle seguenti fasi funzionali: Fase 0, propedeutica rispetto ai successivi interventi, consiste nel potenziamento infrastrutturale e tecnologico dell'impianto attuale. Fase 1, di regime, consiste nella realizzazione di una nuova stazione merci con funzione arrivo/partenza e presa/consegna con modulo 750 m per il collegamento alla rete nazionale passante sulla linea adriatica.

Il territorio dove si realizza l'opera è prevalentemente pianeggiante ed è ubicato all'interno del tessuto urbano della città di Bari, in aree periferiche comunque ricomprese nell'ambito della città metropolitana di Bari.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

In corso Docfap per dibattito pubblico.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Già in fase 0:- semplificazione nella gestione delle manovre;- maggiore capacità ricettiva di impianto con incremento del modulo dei treni da poter effettuare. A regime si disporrà di un nuovo impianto con binari a modulo 750 m, ad elevata capacità ricettiva così da ampliare l'offerta commerciale nelle ore maggiormente richieste dalle II.FF. e con semplificazione delle manovre.



	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	X
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Puglia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	Altri Provedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Allegato MMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Cooperazione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change	Adeguamento a standard tecnici
Nuova stazione di Bari Lamasinata/Ferruccio fasi								X							X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P174: Scalo merci Bari Lamasinata

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve			
								Priorità 1	Priorità 2		
245,00	4,00	di cui:	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	238,50	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
245,00						245,00

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
4,00						4,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
			Fabbis.			Impegni	Pagam.			2021	2022	2023	2024	Oltre
	Costo	Risorse		Lavori	S.a.D.			AI 2019	2020					
Nuova stazione di Bari Lamasinata/Ferruccio fasi	245,00	4,00	241,00	0,07	244,93	1,50	0,81	0,00	0,00	0,00	0,19	0,01	5,00	244,19
	245,00	4,00	241,00	0,07	244,93	1,50	0,81	0,00	0,00	0,00	0,19	0,01	0,60	244,19

CRONOPROGRAMMA																		
			Stato attuativo				Iter procedurale											
			CUP			Progettazione	Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione	Funzionalità		
							Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine				
Nuova stazione di Bari Lamasinata/Ferruccio fasi			J37I12000160006		Progettazione	12-2021	11-2026	-	-	-	-	11-2026	6-2027	6-2027	1-2031	7-2031		

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi si inseriscono nel più ampio progetto di rifunzionalizzazione dello scalo di Orbassano, articolato su uno scenario di medio periodo ed uno di lungo periodo.

Gli interventi di fase 0 nell'ambito del programma riguardano: - sviluppo della progettazione definitiva di tutti gli interventi previsti per lo scenario di medio termine;interventi infrastrutturali per l'adeguamento e il potenziamento delle aree logistiche a supporto delle attività esistenti;- adeguamento dell'apparato IS a seguito delle modifiche apportate all'armamento ferroviario.Nella fase 0 sono previsti interventi preliminari, compatibili con la successiva configurazione d'impianto, in corrispondenza del fascio Modalhor, per la realizzazione di un nuovo binario di appoggio nell'area di raccordo al fine di migliorare le operazioni di manovra, nonché un ampliamento delle aree di sosta/movimentazione dei mezzi su gomma. Nella fase 1 sono previsti i lavori funzionali all'attivazione della nuova linea SFM5 attestata alla stazione S. Luigi di Orbassano, comprendenti altresì le prime opere di rifunzionalizzazione dello scalo, coerenti con il PRG complessivo dell'impianto. Nell'ambito di tali interventi verrà realizzato un nuovo ACC in sostituzione dell'attuale ACEI.

Inquadramento territorialeLo scalo di Orbassano è l'impianto merci operativo nell'ambito del nodo ferroviario di Torino. E' ubicato nella prima cintura sud ovest della Città, in adiacenza alla tangenziale stradale e all'interporto, nonché collegato a diversi operatori per traffico intermodale.Tipologia di opereGli interventi comprendono la realizzazione/prolungamento di binari con relativi adeguamenti impiantistici.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•Rifunzionalizzazione Scalo di Orbassano Fase 1:Relativamente agli interventi di armamento, trazione elettrica e segnalamento, funzionali all'attivazione della nuova linea SFM5 attestata alla stazione di S. Luigi di Orbassano, è stata ultimata la Progettazione Esecutiva a cura dell'Appaltatore, sono in corso le attività di verifica. Nel mese di novembre 2024 è avvenuta la consegna anticipata dei lavori relativi alla realizzazione dei due Fabbricati Tecnologici comprese le attività propedeutiche di BOE e la risoluzione dei sottoservizi interferenti.In data 29/05/2025 è avvenuta la consegna totale dei lavori.In merito alla realizzazione dell'ACC di Orbassano (Cabina) a Gennaio 2025 è stata ultimata e approvata la Progettazione Esecutiva a Marzo 2025 sono stati consegnati i lavori, attualmente in corso. •Scalo Torino-Orbassano:A Dicembre 2021 è stata attivata la Fase 0.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

L'intervento di prima fase consentirà un efficientamento e potenziamento dei servizi Modalhor ed il miglioramento della capacità dei binari del «fascio container».Al termine della realizzazione del Progetto è atteso un potenziamento dei collegamenti all'interno dell'interporto di Orbassano che consentirà la rifunzionalizzazione dello Scalo, in coerenza con il PRG complessivo dell'impianto e l'assetto futuro connesso al potenziamento della linea Torino – Lione.Con il completamento della Fase 1 sarà attivato il nuovo servizio SFM5 da Orbassano S.Luigi a Stura. Efficientamento della regolarità mediante ACC.

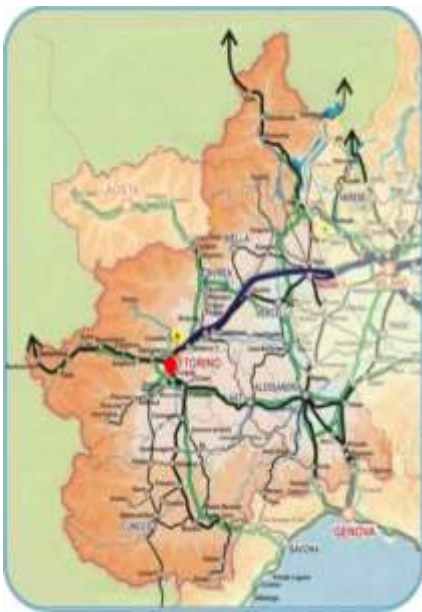

	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Piemonte

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P175: Scalo Torino Orbassano

Coesione sociale e territoriale																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro		
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento		
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2				
72,25	72,25	di cui:	59,25	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE											milioni di euro
Evoluzione Costo											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze						CdP-I agg.2025
72,25											72,25
Evoluzione coperture finanziarie											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni						CdP-I agg.2025
72,25											72,25

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
ACC Torino Orbassano	59,25	59,25	0,00	47,69	11,56	49,15	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	59,14
Scalo Torino Orbassano: interventi in fascio container	13,00	13,00	0,00	9,64	3,36	10,25	9,48	2,19	3,81	2,29	0,63	0,52	5,92	3,48
	72,25	72,25	0,00	57,33	14,92	59,40	9,64	2,19	3,81	2,29	0,63	0,52	0,18	62,62

CRONOPROGRAMMA														
CUP			Stato attuativo				Iter procedurale							
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
ACC Torino Orbassano	J84E21004550001	Realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	12-2022	12-2023	6-2023	11-2026	-
Scalo Torino Orbassano: interventi in fascio container	J74J18000000001	Esercizio	-	-	4-2018	12-2021	-	-	-	5-2019	7-2019	6-2021	12-2021	

Progetto P178: Nodo intermodale di Brindisi

Tabella A07-Programma porti e interporti - Ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto consiste nella realizzazione dei seguenti interventi:- nuova stazione elementare «Brindisi Intermodale» a sud dell'impianto di Brindisi, nel cuore dell'area industriale brindisina e a ridosso del porto, munita di n. 4 binari centralizzati a modulo 750 m per arrivo e partenza treni merci;- collegamento ferroviario della nuova stazione con la Linea Adriatica, tramite nuova linea elettrificata a semplice binario, con allaccio nel nuovo Bivio (PC) «Brindisi Sud».

L'intervento prevede la realizzazione del collegamento ferroviario dell'area retro-portuale del Porto di Brindisi con la rete nazionale, ivi compresa la realizzazione di una stazione elementare per il traffico merci. Il territorio dove si realizza l'opera è prevalentemente pianeggiante e l'intervento prevede l'attraversamento di aree poco urbanizzate.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

In corso la progettazione esecutiva per l'appalto principale e le attività negoziali per il Posto Pilota ACC.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

• Possibilità di terminalizzazione dei treni a servizio del porto e della zona industriale e della Piastra Logistica Intermodale Retro-portuale (PLIR) nella nuova stazione elementare. • Incremento della capacità di impianto da 2 coppie di treni/giorno di lunghezza 530 m a 7 treni/giorno di lunghezza sino a 750m. • Opportunità di valorizzazione delle aree attualmente occupate dallo scalo intermodale esistente in ambito stazione di Brindisi.



	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	X
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Puglia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Nodo intermodale di Brindisi	X				X										X						

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
87,46	87,46	di cui: 25,76	0,00	25,00	36,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P178: Nodo intermodale di Brindisi

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
87,46						87,46

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
87,46						87,46

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Nodo intermodale di Brindisi	87,46	87,46	0,00	40,69	46,77	6,97	2,49	1,25	0,05	0,05	0,63	0,40	6,25	84,56
	87,46	87,46	0,00	40,69	46,77	6,97	2,49	1,25	0,05	0,05	0,63	0,40	0,53	84,56

CRONOPROGRAMMA

CUP		Stato attuativo				Iter procedurale							
		Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Nego.		Esecuzione		Funzionalità	
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
Nodo intermodale di Brindisi	J54G18000140001	Realizzazione	2-2019	3-2025	8-2019	7-2023	-	-	9-2023	10-2024	4-2024	4-2026	12-2026

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi si inquadrano nel più ampio programma R.A.C.C.O.R.D.O. (Rail Access from Cost to Corridor) di rafforzamento dei collegamenti ferroviari tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto di Guasticce.

Gli interventi sono articolati nei seguenti lotti: A) collegamento diretto fra il Porto di Livorno e l'Interporto A. Vespucci di Guasticce. Tale intervento si realizza mediante un nuovo tratto di linea a singolo binario con un'estensione di circa 1.600 metri, necessario per mettere in comunicazione tratti di binari esistenti, e un'opera di scavalco di 362 metri per il sovra-attraversamento, in ambito stazione di Livorno Calambrone, della linea tirrenica Genova-Roma.B) nuovo tratto di linea per il collegamento dell'Interporto di Guasticce alla linea Vada-Collesalveti-Pisa con innesto diretto sia lato Vada che lato Collesalveti;C) bretella per il collegamento diretto tra la linea Firenze-Pisa e la linea Vada-Collesalveti-Pisa per by-passare l'abitato di Pisa.

L'intervento è interamente localizzato in Regione Toscana, Provincia di Livorno, essenzialmente nel Comune di Livorno, tranne un marginale interesse del Comune di Collesalveti per la localizzazione di alcune aree di cantiere. L'assetto geomorfologico dell'area in studio risulta essere assolutamente pianeggiante, tipico di una pianura alluvionale, con quote di superficie di circa 1,5-2,0 metri s.l.m; infatti, la zona oggetto dell'intervento si situa sull'orlo meridionale della Pianura di Pisa ed è riferibile a terreni di deposito di colmata, dunali ed alluvionali. L'area, si trova ad una quota leggermente superiore rispetto all'originario piano campagna a causa della messa in posto di materiale antropico, di riporto, per la realizzazione del piazzale al di sotto dello svincolo stradale che collega alla S.G.C. FI-PI-LI.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

A) Collegamento diretto porto-interporto: è in corso la fase realizzativa dello scavalco.B) Collegamento interporto a linea Collesalveti : Il PFTE ha ottenuto parere positivo con prescrizioni presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e sono in corso gli approfondimenti per il recepimento, già in questa fase, di alcune integrazioni/prescrizioni espresse nel parere, nonché le indicazioni emerse dal confronto con gli Enti Locali in merito agli aspetti idraulici. Considerato l'impatto sul progetto di alcune prescrizioni e input progettuali è stato chiesto alla Regione di avviare un tavolo di confronto.C) By-pass di Pisa: è stata avviata l'istruttoria ambientale presso il MASE tutt'ora in corso.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Possibilità di sviluppo dei traffici merci su ferro;- potenziamento del trasposto intermodale nave – ferro;- miglioramento dell'accessibilità del porto di Livorno verso il retroterra ed i mercati europei;- maggiore regolarità con ingresso su linea di Corridoio con bypass stazione di Pisa;- adeguamento prestazionale.



Capacità	X
Velocità	
Accessibilità	
Regolarità	
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	X
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Toscana

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P220: Potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce

	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change	Adeguamento a standard tecnici	Sviluppo tecnologico	Sistemi regionali e metropolitani	Potenziamento connessioni merci	Sviluppo corridoi TEN-T	Completamento valichi alpini	Alta Velocità (AV)
Intervento / Opere funzionali																					
Porto di Livorno: collegamento diretto Porto-Guasticce (scavalco della linea tirrenica ambito Livorno Calambrone)	X				X			X													
Porto di Livorno: Collegamento dell'interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti					X												X				
Porto di Livorno: Bretella di collegamento tra la linea Pisa-Vada via Collesalvetti e la linea Firenze-Pisa	X				X			X									X				

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve				
								Priorità 1	Priorità 2			
766,93	44,03	di cui:	17,90	0,93	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	722,90	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatiRFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
762,00			4,00	0,93		766,93
Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari ed a maggiori costi relativi ad opere in corso.						

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
39,10				4,93		44,03
Copertura appalto in corso per maggiori costi emersi nel corso della realizzazione e per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)						

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico						OGV		Produzione						
	Costo		Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Porto di Livorno: collegamento diretto Porto-Guasticce (scavalco della linea tirrenica ambito Livorno Calambrone)	31,93	31,93	0,00	28,78	3,15	25,02	2,81	1,19	0,20	0,36	0,14	1,24	6,19	28,63	
Porto di Livorno: Collegamento dell'interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti	438,00	6,10	431,90	433,61	4,39	4,57	3,34	0,01	0,59	0,00	0,94	2,70	5,01	433,57	
Porto di Livorno: Bretella di collegamento tra la linea Pisa-Vada via Collesalvetti e la linea Firenze-Pisa	297,00	6,00	291,00	289,85	7,15	5,93	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	293,90	
	766,93	44,03	722,90	752,23	14,70	35,51	7,94	1,20	0,79	0,36	1,08	3,94	3,46	756,10	

CRONOPROGRAMMA															
CUP				Stato attuativo				Iter procedurale							
				Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
				Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
Porto di Livorno: collegamento diretto Porto-Guasticce (scavalco della linea tirrenica ambito Livorno Calambrone)	J51D18000110003	Realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	6-2020	3-2021	-	-	7-2026	
Porto di Livorno: Collegamento dell'interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti	J94G18000060009	Progettazione	3-2020	4-2026	-	4-2026	-	-	-	4-2026	2-2027	2-2027	8-2032	1-2033	

Progetto P220: Potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce

Porto di Livorno: Bretella di collegamento tra la linea Pisa-Vada J94G18000060009 Progettazione - 2-2026 - 2-2026 - - 3-2026 1-2027 1-2027 10-2031 4-2032
via Collesalveti e la linea Firenze-Pisa

Progetto P251: Collegamento porto di Augusta

Tabella A07-Programma porti e interporti - Ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento si inserisce nel progetto di ampliamento del porto commerciale di Augusta e consiste nella realizzazione di una bretella ferroviaria che collega il nuovo parco ferroviario alla rete ferroviaria nazionale. L'obiettivo è quello di rispettare gli adempimenti previsti da Reg 1315/2013 per i porti Core, in ottica di sviluppo delle connessioni insulari e da/per il continente.

L'intervento è suddiviso in due fasi funzionali 1A e 1B, la cui prima fase funzionale (Fase 1A) prevede la realizzazione di un binario di Presa e Consegna (PEC) con modulo maggiore di 600 metri elettrificato e dotato di segnalamento, che è collegato alla variante della linea storica fino all'area di competenza RFI. Questa prima parte del progetto è dotata di tutte le dotazioni tecnologiche come da standard RFI.

Sicilia

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Aggiudicata la gara, in corso la progettazione esecutiva.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

•Sviluppo di traffico intermodale nave-ferro•Favorire lo shift modale per il trasporto delle merci a vantaggio della ferrovia.



- Capacità
- Velocità
- Accessibilità
- Regolarità
- Prestazioni (merci)
- Gestione dei rotabili
- Gestione spazi di stazione
- Intermodalità merci
- Intermodalità passeggeri
- Integrazione della rete
- Upgrade e sicurezza
- Efficientamento processi

LOCALIZZAZIONE

Sicilia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Collegamento porto di Augusta	X	X									x										X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
104,57	104,57	di cui: 11,10	0,00	0,00	93,47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P251: Collegamento porto di Augusta

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
104,57						104,57

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
104,57						104,57

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Collegamento porto di Augusta	104,57	104,57	0,00	75,40	29,17	3,72	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	102,03
	104,57	104,57	0,00	75,40	29,17	3,72	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	102,03

CRONOPROGRAMMA

CUP			Stato attuativo		Iter procedurale									
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Nego.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Collegamento porto di Augusta			C51B20000970006	Realizzazione	7-2022	9-2024	-	9-2024	-	-	-	-	-	12-2026

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025
Progetto P252: Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure zona industriale

Tabella A07-Programma porti e interporti - Ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede l'adeguamento della stazione di Vado Ligure Z.I funzionale al collegamento con il Porto di Vado e alla piattaforma Maersk. In particolare si prevede il rinnovo dell'apparato centrale di stazione, che avrà giurisdizione su tutti e sei i binari dello scalo, e la sistemazione del PRG dell'impianto con adeguamento di almeno un binario a modulo. All'interno del perimetro è compresa anche la soppressione del passaggio a livello di Via Sabazia, lato porto di Vado, l'adeguamento per la gestione delle merci pericolose, la progettazione dell'indipendenza della radice dei raccordi Porto ed Esso/Infineum e l'adeguamento stradale di via Leopardi, necessario nell'ambito dei lavori di PRG a regime.

L'impianto di Vado Ligure Zona Industriale è ubicato nel Comune di Vado Ligure in provincia di Savona ed è collegato alla rete nazionale Genova Ventimiglia attraverso l'impianto di Savona Parco Doria. L'impianto, che svolge funzione di scalo merci essenzialmente a servizio del Porto di Vado Ligure, è interamente in asset RFI, ma la gestione è temporaneamente affidata ad AdSP MALO e regolata con apposita Convenzione rinnovata 22/12/2020

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•Adeg. ACC Vado Ligure e SPL Sabazia: In data 28/11/2021 è stato attivato il nuovo ACC su ferro attuale con segnalamento basso di manovra. Sono in corso i lavori per la soppressione del passaggio a Livello di Via Sabazia. In data 18/10/2024 è stato stipulato il Contratto Applicativo per la riconfigurazione dell'ACC per la dismissione del PL di Via Sabazia. In data 23/10/2024 sono stati consegnati i lavori per la riconfigurazione dell'ACC per la dismissione del PL di Via Sabazia. •Nuovo PRG Vado Ligure: In data 17/02/2025 sono stati consegnati i lavori relativi all' appalto multidisciplinare del PRG di Vado Ligure. In data 27/09/2024 è stato pubblicato il bando dell'Appalto ACC di Cabina. In data 04/04/2025 è avvenuta l'aggiudicazione. È stata ultimata la progettazione degli interventi SCC-SCMT.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

L'intervento consentirà di gestire i futuri flussi provenienti dagli sviluppi logistici previsti nel Porto di Vado Ligure con un'infrastruttura adeguata sia in termini di capacità che di prestazioni: - Aumento della capacità teorica fino a 16/18 coppie treni/gg; - possibilità di gestire treni completi a standard 740 metri direttamente da/per gli impianti di origine/destino.



	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Liguria

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure zona industriale Fase 1					x					X					x						

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P252: Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure zona industriale

Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure zona industriale Fase 2	X	x	x
---	---	---	---

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Totale Risorse	Sezione 1 - Opere in corso finanziate							Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
96,27	96,27	di cui: 75,67	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatiIRFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l’affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell’investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all’art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
96,27						96,27

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
96,27						96,27

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure zona industriale Fase 1	18,30	18,30	0,00	13,70	4,60	13,81	5,67	0,00	0,00	2,08	1,18	0,62	5,00	12,22
Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure zona industriale Fase 2	77,97	77,97	0,00	69,02	8,95	40,02	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	77,97
	96,27	96,27	0,00	82,72	13,55	53,83	5,70	0,00	0,00	2,08	1,18	0,62	2,20	90,18

CRONOPROGRAMMA													
	CUP	Stato attuativo	Iter procedurale										
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure zona industriale Fase 1	J44D20000050009	Realizzazione	-	-	4-2021	1-2024	-	-	9-2022	8-2023	2-2021	12-2025	12-2025
Adeguamento e potenziamento impianto di Vado Ligure zona industriale Fase 2	J44D20000050009	Realizzazione	-	-	-	-	-	-	12-2023	5-2025	5-2024	1-2027	7-2026

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento di potenziamento dello scalo, in termini di capacità e di funzionalità, per adeguarlo alle future esigenze del traffico merci previste nel "Memorandum of Understanding", del 2012, con cui si è condiviso l'impegno alla realizzazione in Italia di tre nuovi terminali per il trasporto combinato, tra cui il Nuovo Terminale di Brescia a cura della società TerAlp (partecipata da Hupac e Mercitalia Logistics). La realizzazione di tale impianto terminale ed il conseguente nuovo traffico da/per lo Scalo di Brescia, rende necessario incrementare di capacità dello stesso scalo in modo tale da poter garantire la coesistenza dei traffici attuali con quelli indotti, secondo un nuovo modello di esercizio. Il progetto di messa a PRG dello Scalo di Brescia (denominato anche Brescia Fascio Merci) prevedono l'adeguamento a modulo 750 metri degli attuali binari I e II FM, che saranno destinati all'arrivo/partenza dei treni lato sia lato Milano che lato Verona/San Zeno e la realizzazione di 6 nuovi binari di circolazione, di cui 3 a modulo 750 metri destinati all'arrivo/partenza treni solo lato Milano.

L'intervento, da realizzarsi per fasi funzionali, consiste nel potenziamento del fascio Merci di Brescia, che nella configurazione finale avrà 17 binari di circolazione, di cui:- binari I÷IV: binari di corsa delle Linee Venezia LL e AV/AC;- binari i FM÷X FM: binari di A/P con modulo compreso tra 465 e 750 metri, alcuni dei quali potranno essere specializzati per la manovra e lo smistamento in piano di carri- binari XI FM÷XIII FM : binari di A/P di modulo pari a 750 metri. Le attività che attualmente vengono svolte sulla porzione di piazzale non interessata dai lavori di potenziamento potranno continuare secondo l'attuale modello di esercizio. Le operazioni di movimentazione che vengono svolte sugli attuali binari secondari XII÷XVII, che verranno demoliti, potranno essere effettuate sui futuri nuovi binari di circolazione appositamente realizzati. La creazione di ulteriori tre nuovi binari di A/P di modulo pari a 750 metri sarà funzionale ai traffici indotti dal nuovo terminale. Questi nuovi tre binari potranno essere utilizzati anche dalle imprese che attualmente operano in impianto, qualora manifestassero l'esigenza di effettuare treni di lunghezza maggiore rispetto agli attuali. Qualora il terminalista preveda l'elettificazione e l'attrezzaggio della radice del terminale con apparecchiature atte a consentire la partenza dei treni, potrà essere garantito l'inoltro diretto degli stessi verso Milano.

L'intervento si sviluppa nel Comune di Brescia. Gli interventi ricadono quasi esclusivamente in ambito ferroviario ad eccezione dell'asta di manovra da 750m il cui tracciato si sviluppa nell'area compresa tra la tangenziale di Brescia e il fiume Mella


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

In data 15/07/2024 sono stati consegnati i lavori delle opere di parte A (demolizione cabina TE e pesa), i lavori sono stati eseguiti ed ultimati nel mese di luglio 2024. In data 27/09/2024 l'appaltatore ha consegnato il Progetto Esecutivo, sono in corso le attività di verifica da parte dell'Organismo di Ispezione.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Incremento della capacità dell'impianto;- Adeguamento prestazionale con realizzazione di una nuova stazione a modulo 750m;- Velocizzazione dei movimenti di arrivo/partenza e presa/consegna.

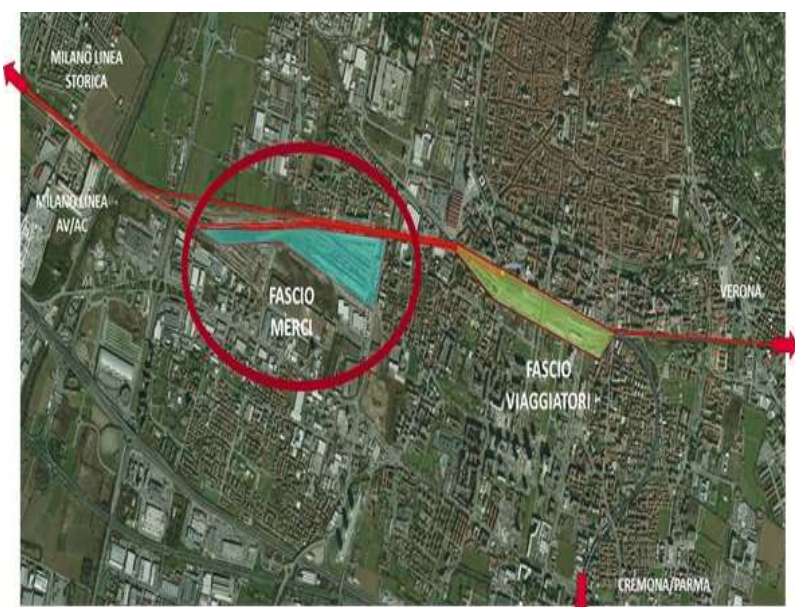

	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	X
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lombardia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica	Obiettivi strategici
------------------------	----------------------

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P256: Potenziamento infrastrutturale scalo di Brescia

	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																					
Potenziamento infrastrutturale scalo di Brescia					X										X						

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2			
82,19	82,19	di cui:	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE											milioni di euro
Evoluzione Costo											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze					CdP-I agg.2025	
82,19										82,19	
Evoluzione coperture finanziarie											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni					CdP-I agg.2025	
82,19										82,19	

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Potenziamento infrastrutturale scalo di Brescia	82,19	82,19	0,00	66,90	15,30	18,97	1,88	0,00	0,41	0,02	1,38	0,02	5,00	80,09
	82,19	82,19	0,00	66,90	15,30	18,97	1,88	0,00	0,41	0,02	1,38	0,02	0,28	80,09

CRONOPROGRAMMA																	
					Stato attuativo					Iter procedurale							
CUP					Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione	Funzionalità			
					Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine			
Potenziamento infrastrutturale scalo di Brescia					J84C19000370009	Realizzazione	2-2020	-	5-2021	12-2022	-	-	12-2022	11-2023	7-2023	5-2027	5-2027

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento consiste nel raddoppio delle linea Rosarno - S. Ferdinando e nell'adeguamento a PRG delle stazioni di Rosarno e S. Ferdinando, con realizzazione binari con modulo 750 e upgrade degli impianti. Il porto di Gioia Tauro è dotato di strutture ferroviarie intermodali allacciate alla stazione di San Ferdinando. Detta stazione è collegata, tramite una bretella elettrificata di circa 5 Km, alla linea tirrenica in corrispondenza della stazione di Rosarno. Gli asset su cui insistono la stazione di San Ferdinando e la bretella di collegamento con Rosarno sono stati assegnati a RFI a seguito di quanto disposto dall'art. 208 del DL 34/2020. Per tali infrastrutture sono previsti interventi di:- Raddoppio della bretella di collegamento- Sistemazione del PRG di Rosarno per la realizzazione di almeno un binario avente modulo pari a 750 m- Revisione del PRG della stazione di San Ferdinando per la realizzazione di binari aventi modulo pari a 750 m.

Per tali infrastrutture sono previsti interventi di:- Raddoppio della bretella di collegamento- Sistemazione del PRG di Rosarno per la realizzazione di almeno un binario avente modulo pari a 750 m- Revisione del PRG della stazione di San Ferdinando per la realizzazione di binari aventi modulo pari a 750 m.

NiaRosarno-SS. FerRosarno-S

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Sono state realizzate le attività di upgrade tecnologico della stazione di Rosarno (attivazione apparato centrale computerizzato), propedeutiche alle attività di revisione del piano regolatore generale. Concluse le attività propedeutiche alla realizzazione del piano regolatore generale di S. Ferdinando e attività trazione elettrica propedeutiche al piano regolatore generale di Rosarno. Gli interventi di modifica dei PRG e di raddoppio della bretella di collegamento sono in corso.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Potenziamento del trasporto multimodale. Miglioramento dell'accessibilità del porto. L'adeguamento agli standard richiesti dalla rete Core TEN-T consentirà di sviluppare nuovo traffico merci sul corridoio TEN-T Scandinavia-Mediterraneo. Sviluppo degli impianti raccordati alla stazione di San Ferdinando, che favoriscono l'intermodalità nave-ferro.



Capacità	X
Velocità	
Accessibilità	
Regolarità	
Prestazioni (merci)	X
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	X
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Calabria

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici			
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	UE - workplan corridoi TEN-T	AO per l'utilizzo della capacità	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T
Adeguamento PRG impianti di Rosarno e San Ferdinando	X										X			X

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P258: Linea Rosarno-S. Ferdinando: adeguamento PRG impianti di Rosarno e San Ferdinando

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
85,00	85,00	di cui:	15,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatIRFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l’affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell’investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all’art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
85,00						85,00

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
85,00						85,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	AI 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Adeguamento PRG impianti di Rosarno e San Ferdinando	85,00	85,00	0,00	81,81	3,19	38,12	18,19	0,00	0,00	0,00	1,17	7,73	5,00	68,68
	85,00	85,00	0,00	81,81	3,19	38,12	18,19	0,00	0,00	0,00	1,17	7,73	7,43	68,68

CRONOPROGRAMMA

CUP		Stato attuativo	Iter procedurale											
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Adeguamento PRG impianti di Rosarno e San Ferdinando	J44E21002660001	Realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	8-2025	5-2022	6-2026	-

Tabella A08-Programma aeroporti - Accessibilità su ferro

Potenziamento collegamenti ferroviari con gli aeroporti

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede una nuova linea a doppio binario che si stacca dalla Linea Mestre Trieste affiancando ad Est la bretella autostradale per l'Aeroporto Marco Polo per circa 4 km in superficie. A valle del Fiume Dese il tracciato continua in galleria a singolo binario verso l'aeroporto dove è prevista una stazione interrata passante a due binari collegata al terminal aeroportuale. Il tracciato prosegue poi a singolo binario realizzando un cappio e ricongiungendosi con il tratto in superficie. La lunghezza complessiva della linea è di circa 8 km di cui 3,4 Km in galleria. Quest'ultima soluzione consente di avere una linea passante nella stazione dell'aeroporto che permetterà di ridurre i tempi di stazionamento nel terminal e assicura una elevata capacità di trasporto. In questo tratto la linea è in sotterraneo per coerenza con il Masterplan dell'Aeroporto. In ambito aeroportuale verrà realizzata una stazione interrata di due binari, con un modulo dei marciapiedi di circa 330 m, che assicura l'accesso non solo ai treni regionali ma anche ai più lunghi treni viaggiatori (quella prevista nel Progetto Preliminare 2003 era una stazione di testa a 4 binari con modulo 250 m, anch'essa interrata).

L'intervento prevede la realizzazione di una nuova linea ferroviaria, diramata dalla linea storica esistente, in parte in rilevato e in parte in trincea, comprendente un nuovo ponte ad arco sul fiume Dese e una galleria per l'accesso alla nuova stazione ipogea. L'intervento permetterà di collegare l'infrastruttura nazionale con l'Aeroporto Marco Polo di Venezia


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

L'Appaltatore ha provveduto alla redazione e consegna della Progettazione Esecutiva, e si è proceduto alla Consegna dei Lavori in data 23/12/2023. I lavori sono in corso sull'intera estesa dell'intervento (pali di fondazione, diaframmi e jet grouting per la galleria). Ultimata e approvata la Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica del sottopasso ciclopeditonale nel Comune di Dese, in data 05/05/2025 è stata avviata la Progettazione Esecutiva attualmente in corso.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Realizzazione di una connessione intermodale tra l'Aeroporto Marco Polo e la rete ferroviaria esistente Venezia - Trieste, coerentemente con le direttive europee finalizzate al collegamento su ferro degli aeroporti core. La nuova infrastruttura consentirà l'istituzione di nuove relazioni AV e TPL da/per Venezia Aeroporto.

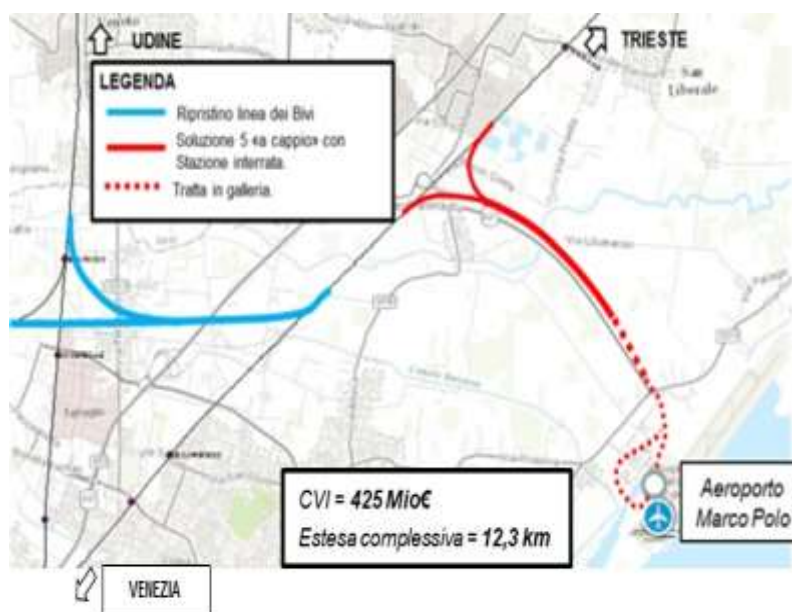

	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	X
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Veneto

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Intervento / Opere funzionali	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MILINS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento commissioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Collegamento ferroviario aeroporto di Venezia	X	X		X		X	X	X			X		X								

Progetto 0268: Collegamento ferroviario aeroporto di Venezia

milioni di euro

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
644.00						644.00

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
644,00						644,00

CRONOPROGRAMMA

CUP	Stato attuativo	Iter procedurale											
		Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Collegamento ferroviario aeroporto di Venezia	J51H03000170001	Realizzazione	1-2003	7-2025	2-2016	6-2022	10-2024	7-2025	-	-	12-2022	7-2026	12-2025

Tabella A08-Programma aeroporti - Accessibilità su ferro

Potenziamento collegamenti ferroviari con gli aeroporti

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il Progetto prevede di collegare l'aeroporto Valerio Catullo con la stazione di Verona Porta Nuova mediante una variante della linea Modena – Verona, di estesa pari a 4,5 Km., esterna all'abitato di Dossobuono con la realizzazione di una nuova stazione a servizio dell' Aeroporto e del territorio di Dossobuono stesso. L'intervento prevedeva inoltre la realizzazione di due nuove fermate di Villafranca e Madonna di Dossobuono. Era prevista la dismissione della linea storica e dell'attuale stazione di Dossobuono.

L'intervento si trova in ambito extra-urbano a Sud di Verona in direzione Mantova. L'attraversamento di questa zona caratterizzata dalla presenza di importanti infrastrutture stradali, ha imposto di realizzare il tratto in variante di Dossobuono interamente in scavo, mentre il tratto in raddoppio è a piano campagna.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Il progetto preliminare è stato sviluppato da RFI nel 2003 – dopo il parere positivo della Regione Veneto - è stato presentato al M.I.T. nel 2003 per l'approvazione del CIPE secondo le procedure di Legge Obiettivo. L'iter approvativo non è stato concluso e l'intervento è sospeso per mancanza di finanziamenti per le ulteriori fasi progettuali/realizzative. Il collegamento oggi si inquadra nella connessione complessiva di tre poli: Città di Verona-Aeroporto di Verona-Lago di Garda. RFI a Maggio 2022 ha sottoscritto con la Regione del Veneto un "Protocollo finalizzato all'approfondimento tecnico dei reciproci collegamenti tra Verona, l'Aeroporto di Verona e la sponda orientale del Lago di Garda", rimandando ad uno specifico Gruppo di Lavoro l'individuazione delle alternative progettuali da porre alla base di un successivo DOCFAP (comprensivo di Studio di Traffico e Analisi Costi – Benefici). Durante le interlocuzioni con la Regione Veneto si è condiviso di individuare alcune ipotesi di tracciato da condividere formalmente all'interno del Gruppo di Lavoro per addivenire al pacchetto complessivo da porre alla base del DOCFAP. Al momento RFI sta lavorando su diverse soluzioni alternative, anche in integrazione con il collegamento sul Garda.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Realizzazione di una connessione intermodale tra l'Aeroporto Catullo e la rete ferroviaria.



Capacità	
Velocità	
Accessibilità	X
Regolarità	
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Veneto

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica	Obiettivi strategici
	PNRR	Alta Velocità (AV)
Collegamento ferroviario aeroporto di Verona	Allegato MIMS al DEF Tavoli tecnico di ascolto Altri Provvedimenti* Cofinanziamenti UE UE - workplan corridoi TEN-T AQ per l'utilizzo della capacità Fondo Sviluppo e Coesione Accordi EE.LL. Accordi Internazionali Interventi commissariati	Coesione sociale e territoriale Accessibilità e qualità stazioni Resilienza al climate change Adeguamento a standard tecnici Sviluppo tecnologico Sistemi regionali e metropolitani Potenziamento connessioni merci Sviluppo corridoi TEN-T Completamento valichi alpini

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0269: Collegamento ferroviario aeroporto di Verona

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatorie di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
90,40	0,18		0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
90,40						90,40

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
0,18						0,18

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Collegamento ferroviario aeroporto di Verona	90,40	0,18	90,23	72,90	17,50	0,16	0,15	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	90,24
	90,40	0,18	90,23	72,90	17,50	0,16	0,15	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24

CRONOPROGRAMMA														
CUP	Stato attuativo					Iter procedurale								
						Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Nego.		Funzionalità
						Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	
Collegamento ferroviario aeroporto di Verona	J51H03000180001	Valutazione di fattibilità alternative progettuali				10-2002	7-2027	7-2027	8-2029	-	-	4-2029	11-2029	6-2036

Progetto I137: Collegamento ferroviario aeroporto di Bergamo

Tabella A08-Programma aeroporti - Accessibilità su ferro

Potenziamento collegamenti ferroviari con gli aeroporti

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento ferroviario tra l'aeroporto di Orio al Serio, che attualmente non è servito direttamente da alcun tipo di collegamento ferroviario, e la rete ferroviaria nazionale. L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo tratto di linea a doppio binario con l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio che si dirama dalla linea Bergamo-Rovato dalla stazione di Bergamo. La linea avrà una lunghezza complessiva di circa 6 km, di cui circa 1 km in affiancamento alla linea storica Bergamo-Rovato. Presso l'aeroporto sarà realizzata una nuova stazione di attestamento dotata di 4 binari, direttamente collegata con il terminal aeroportuale. Quest'azione di piano consentirà di attivare i collegamenti tra Milano e l'aeroporto di Orio al Serio in funzione di quanto previsto sulla base degli accordi con l'Accordo Quadro con la Regione Lombardia.

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario con l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio che si dirama dalla linea Bergamo-Rovato. La stazione «Aeroporto» sarà realizzata in superficie.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

In data 13/10/2023 è avvenuta la consegna della Progettazione Esecutiva delle opere di parte A (BOE, cantierizzazione, OOC per la realizzazione della Galleria Artificiale GA01B e deviazione provvisoria del ramo A del torrente Morla) e in data 03/02/2024 è avvenuta la consegna dei relativi lavori. In data 11/07/2024, a seguito della sottoscrizione del 1° AIM con il quale è stata suddivisa la Parte B in parte B1 e B2, è avvenuta la consegna dei lavori delle opere di parte B1. Il 20/05/2025 è stato stipulato il II AIM che prevede la suddivisione della Parte B2 in B2*ext e B3 è avvenuta la consegna di parte B2*ext. È in corso il completamento della progettazione esecutiva delle opere di parte B3.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Prolungamento di alcuni servizi attestati a Bergamo all'Aeroporto di Orio al Serio. Realizzazione nuovi marciapiedi a servizio dei viaggiatori. Incremento del bacino d'utenza dell'aeroporto grazie a nuove relazioni tra Milano e Orio.

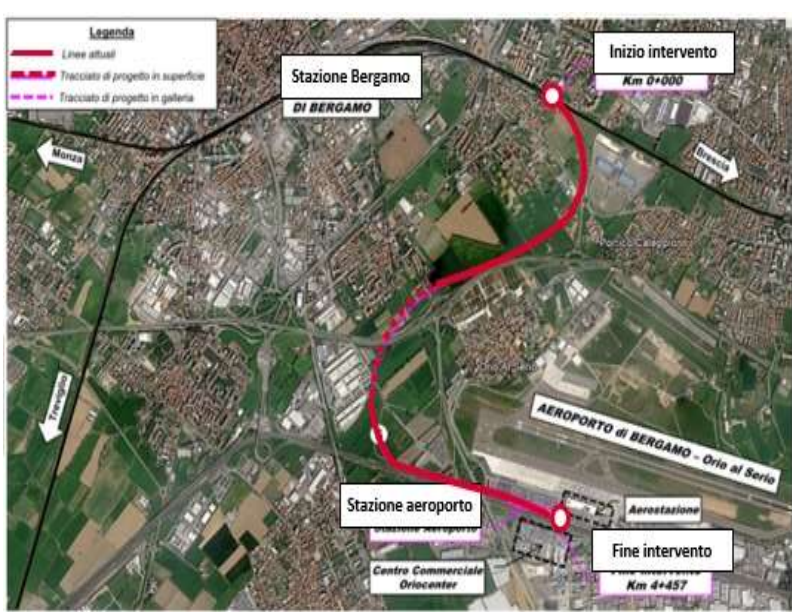

Capacità	
Velocità	
Accessibilità	X
Regolarità	
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	X
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	X
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lombardia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MINS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Collegamento ferroviario aeroporto di Bergamo	X	X				X	X			X	X	X									

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Tabella A08-Programma aeroporti - Accessibilità su ferro

Potenziamento collegamenti ferroviari con gli aeroporti

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto è suddiviso in tre lotti: Intervento 1: bretella di collegamento tra la tratta Maccarese – Aurelia e la tratta Maccarese - Ponte Galeria (bivio Maccarese); Intervento 2: quadruplicamento del tratto della linea Roma – Fiumicino tra Ponte Galeria e Fiumicino e bretella di collegamento tra la tratta Maccarese – Ponte Galeria e il nuovo tratto quadruplicato, con potenziamento/adeguamento della fermata di Fiera di Roma e la trasformazione in stazione di Parco Leonardo. Intervento 3: potenziamento della stazione di Fiumicino Aeroporto tramite la realizzazione di due nuovi binari, ubicati esternamente ai tre attuali, con il rifacimento della copertura di stazione.

Gli interventi si sviluppano nel territorio compreso tra la parte occidentale dell'area urbanizzata del Comune di Roma ed il litorale laziale del Comune di Fiumicino


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Completata la Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica. Di prossimo avvio il Dibattito Pubblico.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Possibilità di incrementare i servizi ferroviari veloci con l'aeroporto- Incremento dell'accessibilità e miglioramento dell'intermodalità- Ampliamento della catchment area incrementando in servizio anche nella parte Nord-Ovest di Roma

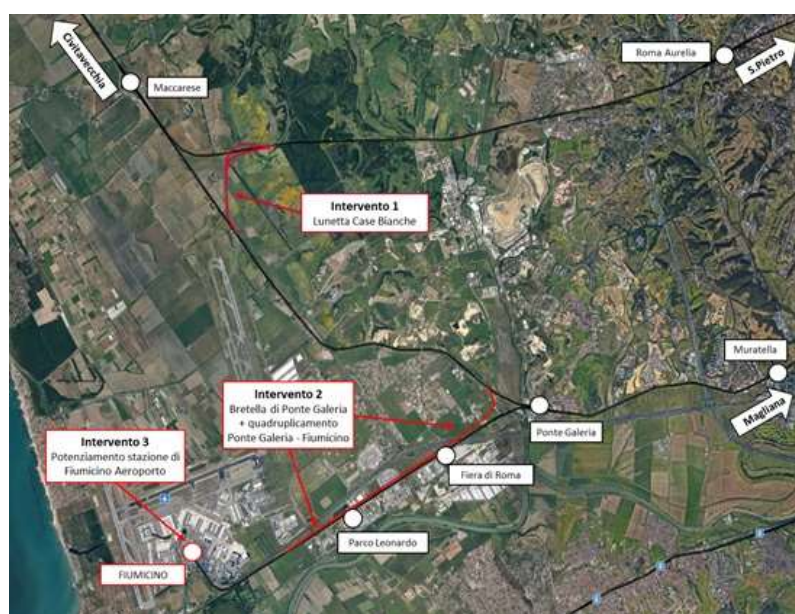

Capacità	X
Velocità	
Accessibilità	X
Regolarità	
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lazio

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Adeguamento a standard tecnici	Sviluppo tecnologico	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Ampliamento impianto Fiumicino Aeroporto, potenziamento tratta Fiumicino-Ponte Galeria e bretelle di collegamento con la linea Pisa-Roma							X				X	X									

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EEL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
1.226,50	16,00 di cui:	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.210,50

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto I138A: Potenziamento collegamenti ferroviari con aeroporto di Fiumicino - opere prioritarie

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
1.226,50						1.226,50

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
16,00						16,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Ampliamento impianto Fiumicino Aeroporto, potenziamento tratta Fiumicino-Ponte Galeria e bretelle di collegamento con la linea Pisa-Roma	1.226,50	16,00	1.210,50	1.172,33	54,18	3,90	3,47	0,00	0,06	0,40	1,16	0,16	5,00	1.222,67
	1.226,50	16,00	1.210,50	1.172,33	54,18	3,90	3,47	0,00	0,06	0,40	1,16	0,16	2,05	1.222,67

CRONOPROGRAMMA														
CUP			Stato attuativo				Iter procedurale							
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Ampliamento impianto Fiumicino Aeroporto, potenziamento tratta Fiumicino-Ponte Galeria e bretelle di collegamento con la linea Pisa-Roma	J94C19000270009	Progettazione	5-2020	3-2027	-	7-2027	-	-	7-2027	4-2028	4-2028	8-2034	1-2035	

Progetto P129: Collegamento ferroviario aeroporto di Genova

Tabella A08-Programma aeroporti - Accessibilità su ferro

Potenziamento collegamenti ferroviari con gli aeroporti

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto si inserisce lungo la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e nasce nell'ambito delle attività di progettazione svolte da RFI per il GATE (Genoa Airport a Train to Europe), oggetto della Decisione C(2013) 6941 del 15 ottobre 2013 della Commissione Europea, e regolate dal Protocollo di Intesa del 07/02/2014 siglato tra RFI, Regione Liguria, Comune di Genova, Aeroporto di Genova S.p.A. e Società per Cornigliano S.p.A. (Comitato Direttivo GATE). Il progetto prevede la realizzazione delle fermate di Erzelli e di Cornigliano e la realizzazione nella stazione di Sestri dell'ACC su ferro attuale e PRG finale. Rientrano nell'ambito del GATE anche una serie di attività funzionali al collegamento tra Aeroporto-fermata ferroviaria - Polo Tecnologico Erzelli oltre alle modifiche sulla viabilità nell'area interessata dalla realizzazione delle fermate .

Inquadramento territoriale Gli interventi si sviluppano nell'area del ponente cittadino lungo la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia interessando gli impianti delle stazioni di Sestri Ponente e Cornigliano per l'inserimento delle due nuove fermate di Erzelli-Aeroporto e della nuova fermata di Cornigliano. La nuova fermata di Cornigliano sostituirà la fermata esistente e la nuova posizione, verso levante, risponde alle previsioni del PUC al fine di coprire un maggiore bacino di utenza. La nuova fermata di Erzelli/Aeroporto sarà collegata, lato mare, con l'aeroporto Cristoforo Colombo tramite un collegamento Cableway e, lato monte, con il Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Erzelli (GREAT Campus). Tipologia di opere Le due nuove fermate (Erzelli/Aeroporto e Cornigliano) sono funzionali al processo di metropolitizzazione ferroviaria sulla fascia costiera previsto nella pianificazione del vigente PUC. Inoltre la fermata Erzelli Aeroporto si inquadra nello scenario più ampio definito dal Libro Bianco dei Trasporti del 28 marzo 2011 il cui obiettivo principale è di garantire l'intermodalità ferro-aria . Nel caso specifico, la possibilità di migliorare il collegamento tra l'Aeroporto di Genova con la linea ferroviaria è agevolata dalla vicinanza tra le due infrastrutture.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Fermate Erzelli-Aeroporto e Cornigliano È in corso la realizzazione degli interventi relativi alle fermate di Erzelli /Aeroporto e Cornigliano. Intervenuta la stipula dell'appalto SCC-SCMT correlato alla realizzazione delle fermate. In corso di formalizzazione al CCT (Comitato Consultivo Tecnico) il parere sulla risoluzione del contratto relativo alla realizzazione delle fermate. Nuovo sistema di collegamento "Moving Walkway" Correlato a tale intervento vi è il nuovo sistema "Moving Walkway" per il collegamento della fermata di Erzelli con l'Aeroporto di Genova. L'opera sarà finanziata da RFI e sarà realizzata dal Comune di Genova. A tal fine è in corso la predisposizione di apposita convenzione tra le parti interessate. ACC e PRG Sestri Ponente: In data 06/11/2024 è stata avviata la Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica della variante di tracciato della linea Genova-Ventimiglia in corrispondenza degli stabilimenti della cantieristica navale di Sestri Ponente, comprensivo della nuova fermata di Sestri Ovest nonché la rivisitazione del progetto definitivo dell'ACC di Sestri e del progetto del nuovo PRG. La progettazione è attualmente in corso.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Gli obiettivi principali dell'investimento sono quelli di assicurare l'interscambio con altre modalità (Libro Bianco dei Trasporti 2011) e attuare il processo di metropolitizzazione ferroviaria sulla fascia costiera previsto nella pianificazione del vigente PUC. Inserimento in offerta commerciale di servizi cadenzati fino a 15' da/per Genova.



INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P129: Collegamento ferroviario aeroporto di Genova

	Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change	Adeguamento a standard tecnici	Sviluppo tecnologico	Sistemi regionali e metropolitani	Potenziamento connessioni merci	Sviluppo corridoi TEN-T	Completamento valichi alpini	Alta Velocità (AV)		Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR
Intervento / Opere funzionali																						
Moving walkway – Collegamento stazione Genova – aeroporto																						
Fermate di Erzelli/Aeroporto e Cornigliano est										X		X				X	X	X	X			
ACC e PRG Sestri Ponente										X		X				X	X		X			

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro		
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento		
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve					
								Priorità 1	Priorità 2				
101,10	101,10	di cui:	99,53	0,17	0,80	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00		

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE										milioni di euro
Evoluzione Costo										
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025				
98,60			2,33	0,17		101,10	Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari. Si registre, inoltre, un incremento legato all'inserimento della progettazione della variante Fincantieri.			

Evoluzione coperture finanziarie													
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025							
98,60		-0,09		0,17	2,42	101,10	Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche) e per maggiori esigenze derivanti da accordi con EE.LL.						

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
			Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
	Costo	Risorse												
Moving walkway – Collegamento stazione Genova – aeroporto	28,33	28,33	0,00	0,00	28,33	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	28,33
Fermate di Erzelli/Aeroporto e Cornigliano est	52,27	52,27	0,00	26,26	26,01	38,02	14,11	1,53	0,55	2,19	2,15	3,51	5,17	38,03
ACC e PRG Sestri Ponente	20,50	20,50	0,00	3,35	17,15	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	20,50
	101,10	101,10	0,00	29,61	71,49	67,29	14,11	1,53	0,55	2,19	2,15	3,51	4,31	86,86

CRONOPROGRAMMA													
CUP	Stato attuativo				Iter procedurale								
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	
Moving walkway – Collegamento stazione Genova – aeroporto	Realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fermate di Erzelli/Aeroporto e Cornigliano est	J44C14000020002	Realizzazione	7-2014	6-2020	6-2015	4-2022	-	-	11-2020	6-2022	11-2021	6-2026	6-2026
ACC e PRG Sestri Ponente	J44C14000020002	Progettazione	-	-	11-2024	7-2026	-	-	8-2026	9-2027	4-2027	7-2030	6-2030

Progetto P227: Collegamento ferroviario aeroporto di Brindisi

Tabella A08-Programma aeroporti - Accessibilità su ferro

Potenziamento collegamenti ferroviari con gli aeroporti

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo collegamento dedicato tra la stazione di Brindisi C.le e l'Aeroporto del Salento, che si dirama dalla linea ferroviaria Brindisi – Bari/Taranto. Il progetto prevede le seguenti opere:- realizzazione di un nuovo collegamento a singolo binario che inizia dalla linea a doppio binario Bari-Lecce, lato Brindisi, e termina nella nuova stazione di Brindisi Aeroporto con lunghezza totale di circa 6,2 km;- nuova bretella a singolo binario, lato Bari, di collegamento tra la linea Bari-Lecce e il nuovo collegamento con l'aeroporto, di sviluppo pari a circa 0,8 km;- nuova bretella a singolo binario, di collegamento tra la linea Bari – Brindisi e la linea Brindisi–Taranto per consentire i collegamenti diretti all'aeroporto anche lato Taranto, di sviluppo pari circa a 1 km;- nuova stazione di Brindisi Aeroporto, che prevede due binari di stazionamento serviti da due marciapiedi esterni.

L'intervento prevede la realizzazione del collegamento ferroviario dell'aeroporto del Salento (aeroporto di Brindisi) con la rete nazionale, ivi compresa la realizzazione di una fermata presso l'aeroporto stesso. Il territorio dove si realizza l'opera è prevalentemente pianeggiante e l'intervento prevede l'attraversamento di aree poco urbanizzate.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Completata la progettazione esecutiva, in corso la fase realizzativa.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Come previsto nell'AQ con Regione Puglia del 2021, sono previste relazioni Bari – Brindisi Aeroporto – Lecce ed il prolungamento di alcune relazioni Taranto – Brindisi su Brindisi Aeroporto. Dal momento che Lecce è punto di interscambio con Ferrovie Sud Est, inoltre, è atteso il collegamento ferroviario dell'Aeroporto del Salento con altre località di interesse turistico quali Gallipoli, Gagliano ed Otranto.



Capacità	
Velocità	
Accessibilità	X
Regolarità	
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	X
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Puglia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani
Collegamento ferroviario aeroporto di Brindisi															

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P227: Collegamento ferroviario aeroporto di Brindisi

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
161,00	161,00		40,20	0,00	60,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
153,00			8,00			161,00
Variazione di costo per l'adeguamento del valore delle opere ad esito della Progettazione Esecutiva.						

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
153,00				8,00		161,00
Copertura appalto in corso per maggiori costi emersi ad esito della PE						

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Collegamento ferroviario aeroporto di Brindisi	161,00	161,00	0,00	129,87	31,13	87,43	5,41	2,01	0,14	0,71	0,55	0,11	7,01	155,93
	161,00	161,00	0,00	129,87	31,13	87,43	5,41	2,01	0,14	0,71	0,55	0,11	1,56	155,93

CRONOPROGRAMMA														
CUP	Stato attuativo					Iter procedurale								
	Realizzazione	3-2019	3-2025	7-2019	10-2024	Prog.Prel.	Prog.Def.	Prog.Esec.	Attiv.Negoz.	Esecuzione	Funzionalità	6-2023	6-2026	12-2026
						Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio
Collegamento ferroviario aeroporto di Brindisi	J31D19000000001	Realizzazione	3-2019	3-2025	7-2019	10-2024	6-2023	10-2024	-	-	-	6-2023	6-2026	12-2026

Progetto P249: Collegamento ferroviario aeroporto di Olbia

Tabella A08-Programma aeroporti - Accessibilità su ferro

Potenziamento collegamenti ferroviari con gli aeroporti

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento, previsto anche nell'ambito dell'Accordo Quadro TPL tra RFI e Regione Sardegna, consiste nella realizzazione di un nuovo tratto di linea per il collegamento tra l'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e l'Aeroporto di Olbia. Il tracciato di progetto è stato modificato a seguito delle interlocuzioni con Regione Sardegna e Comune di Olbia. In particolare esso si estende dal PM Bivio Micaleddu, che consente la connessione diretta anche con la linea esistente tra Olbia e Ozieri Chilivani, e si attesta nella futura Stazione Olbia Aeroporto minimizzando l'impatto sul territorio.

Nel perimetro del progetto è, inoltre, previsto il potenziamento infrastrutturale della nuova Stazione di Olbia Terranova con il miglioramento dell'accessibilità.

Sardegna

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

In corso i lavori per le opere civili e la progettazione esecutiva degli interventi tecnologici. Potenziamento della nuova stazione di Olbia Terranova: sono in corso i lavori, mentre per i 2 PL sono ultimate le relative progettazioni ed espletati i relativi iter autorizzativi. In particolare, è stato approvata l'opera la soppressione del PL di Via Portogallo.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Integrazione servizio con aeroporto di Olbia e incremento dell'accessibilità al servizio ferroviario. L'intervento, oltre ad intercettare i flussi prettamente stagionali da/per l'aeroporto (3 milioni di passeggeri nel 2018 e terzo aeroporto a livello Nazionale come tasso di crescita con +12%), consente anche di intercettare la mobilità legata al polo commerciale nell'area dell'aeroporto. In aggiunta l'opera può essere oggetto anche di un ulteriore sviluppo per il potenziamento dell'intermodalità. L'elettificazione si pone come funzionale in ottica di sostenibilità ambientale, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 rispetto agli attuali valori legati alla trazione diesel e un relativo minore impatto ambientale a livello locale con un notevole beneficio sociale in termine di riduzione dei costi esterni del sistema di trasporto ferroviario.



Capacità	
Velocità	
Accessibilità	X
Regolarità	
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	X
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Sardegna

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici											
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale	
Collegamento ferroviario aeroporto di Olbia	X	X			X						x											X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P249: Collegamento ferroviario aeroporto di Olbia

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatiche di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
231,04	230,08		63,81	0,27	13,00	153,00	0,00	0,00	0,05	0,91	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
278,04		-47,00				231,04
Variazione di costo relativa ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (spostato CUP J74J23000740001 nella riga P201)						

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
226,23		-2,00			5,85	230,08
Copertura dei fabbisogni indifferibili connessi agli extraoneri degli appalti in corso						

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Collegamento ferroviario aeroporto di Olbia	231,04	230,08	0,96	192,63	38,41	134,56	10,64	0,00	0,00	0,01	0,77	6,95	5,00	219,83
	231,04	230,08	0,96	192,63	38,41	134,56	10,64	0,00	0,00	0,01	0,77	6,95	3,48	219,83

CRONOPROGRAMMA														
</														

Tabella A08-Programma aeroporti - Accessibilità su ferro

Potenziamento collegamenti ferroviari con gli aeroporti

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede un collegamento diretto tra l'aeroporto di Trapani – Birgi “Vincenzo Florio” e la rete ferroviaria nazionale, promuovendo l'intermodalità ferro – aria mediante realizzazione di un punto di interscambio lungo la tratta ferroviaria a singolo binario Trapani – Marsala (sulla Palermo - Trapani via Castelvetro). La soluzione progettuale prevede la realizzazione della fermata, corredata di viabilità stradale e pedonale per il collegamento all'aerostazione e di un'area di parcheggio di interscambio accessibile dalla strada provinciale, con annesso aree a verde.

Sicilia

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Avviata la fase realizzativa con la consegna dei lavori di fase A (parte delle OOC relative al fabbricato viaggiatori, muri di contenimento del rilevato ferroviario, rifacimento livelletta, lavori di armamento), in corso la progettazione esecutiva per gli interventi di fase B (restanti opere).

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

•Promuovere l'intermodalità e sostenere il trasporto collettivo, con soluzioni maggiormente sostenibili. •Ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente circostante attraverso il contenimento dei consumi energetici con produzione di energia da fotovoltaico, la massimizzazione delle superfici permeabili dei suoli e la raccolta di acque piovane da destinare ai servizi igienici. La realizzazione della nuova infrastruttura crea le condizioni per nuove opportunità di servizio sulla linea Palermo-Trapani (via Castelvetro), attualmente interessata da un traffico di 24 treni/giorno.



Capacità	
Velocità	
Accessibilità	X
Regolarità	
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	X
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Sicilia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici			
	PNRR	Accordi Internazionali	Accordi EELL	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Intermodalità e accessibilità aeroporto Trapani Birgi	X									x			X	

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
47,78	47,78	di cui: 11,78	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P250: Intermodalità e accessibilità Trapani Birgi

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
47,78						47,78

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
47,78						47,78

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Intermodalità e accessibilità aeroporto Trapani Birgi	47,78	47,78	0,00	37,70	10,09	33,36	1,94	0,00	0,00	0,01	0,17	0,31	5,00	46,39
	47,78	47,78	0,00	37,70	10,09	33,36	1,94	0,00	0,00	0,01	0,17	0,31	0,90	46,39

CRONOPROGRAMMA

CUP		Stato attuativo				Iter procedurale							
		Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Nego.		Esecuzione		Funzionalità	
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
Intermodalità e accessibilità aeroporto Trapani Birgi	J61B21003450001	Realizzazione	12-2021	12-2023	-	12-2023	-	-	12-2023	10-2024	5-2024	2-2026	6-2026

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il tracciato del Progetto Preliminare si sviluppa nel territorio di 14 Comuni della Provincia di Torino con interconnessioni con la linea storica nei pressi di Chiusa San Michele, Avigliana e attraverso lo scalo merci di Orbassano. Nell'ambito dell'Osservatorio sono state individuate, in linea con l'accordo Italia – Francia del 2012 ed il D. Lgs. n.71/2014, 3 fasi funzionali per la tratta nazionale (Project Review), di cui la fase prioritaria (Fase 1a) è costituita dalla nuova linea in variante Avigliana – Orbassano, inclusi gli interventi di adeguamento allo scalo di Orbassano conseguenti all'ingresso della nuova linea.

Inquadramento territoriale Gli interventi per l'infrastruttura ferroviaria di adduzione al tunnel di base trasfrontaliero nello scenario di Tappa 1 interessano la bassa Valle di Susa nel tratto più prossimo all'ambito urbano/suburbano di Torino. In particolare il nuovo tratto di linea da Avigliana allo scalo di Orbassano interessa il territorio della cosiddetta "Collina Morenica di Rivoli", con un tracciato da realizzare prevalentemente in galleria. **Tipologia di opere** Realizzazione di nuovo tratto di linea a doppio binario prevalentemente in galleria (2 canne a singolo binario) tra Avigliana (sulla linea storica Modane-Torino) e lo scalo di Orbassano e interventi di adeguamento dello scalo merci connessi all'ingresso della nuova linea.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Ultimata la Progettazione Definitiva, sono in corso approfondimenti finalizzati all'ottimizzare delle tempistiche di realizzazione e alla fasizzazione degli interventi. A seguito dell'invio del progetto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la necessità presentata dal Commissario di anticipare i lavori relativi all'estensione dell'ACC nello scalo di Orbassano è in corso lo sviluppo della progettazione.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Il progetto consentirà un incremento complessivo di capacità passando di 10 treni/ora/direzione dell'attuale linea a 20 treni/ora/direzione sul complesso delle due linee. Al contempo verrà migliorata anche la regolarità della circolazione attraverso la specializzazione dei traffici sulle due linee. Per i treni LP che percorreranno la nuova linea potrà conseguirsi anche una riduzione dei tempi di percorrenza. possibilità di gestire treni di lunghezza fino a 750 metri nell'impianto di Torino Orbassano.

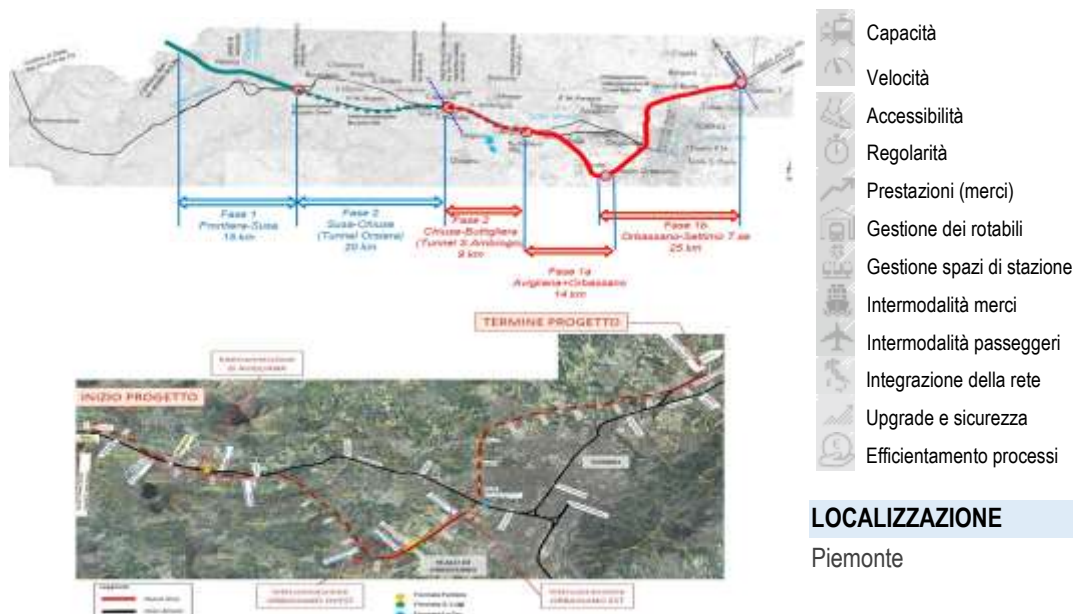**LOCALIZZAZIONE**

Piemonte

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Sezione nazionale Torino-Lione 1^ fase (quadruplicamento Avigliana-Orbassano e scalo Orbassano)	X	X					X	X			X	X	X								

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0241A: Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione opere prioritarie

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
2.989,54	809,27	di cui: 49,38	750,00	0,00	0,00	9,89	0,00		0,00	0,00	2.180,27

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						CdP-I agg.2025	
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze		
1.700,15			1.289,39			2.989,54	Variazione del costo dovuta all'aggiornamento del quadro economico ad esito della Progettazione Definitiva della tratta Avigliana – Orbassano la cui stima originaria era stata valutata ad esito della Progettazione Preliminare sviluppata nel 2012.

Evoluzione coperture finanziarie						CdP-I agg.2025	
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni		
827,43					-18,16	809,27	Rimodulazione della copertura su interventi parzialmente finanziati a favore di ulteriori fabbisogni maggiormente prioritari (P215)

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV				Produzione				
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Sezione nazionale Torino-Lione 1 ^a fase (quadruplicamento Avigliana-Orbassano e scalo Orbassano)	2.989,54	809,27	2.180,27	2.245,31	744,23	64,74	50,82	39,11	0,01	0,04	0,75	11,01	5,52	2.929,25
	2.989,54	809,27	2.180,27	2.245,31	744,23	64,74	50,82	39,11	0,01	0,04	0,75	11,01	9,38	2.929,25

CRONOPROGRAMMA

	CUP	Stato attuativo	Iter procedurale										
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Nego.		Esecuzione	Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
Sezione nazionale Torino-Lione 1^ fase (quadruplicamento Avigliana-Orbassano e scalo Orbassano)	J11H03000030008	Progettazione	10-2002	11-2018	11-2014	3-2026	-	-	1-2023	12-2026	2-2021	12-2033	10-2033

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025
Progetto 0241B: Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione completamento

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi di completamento riguardano:Tappa 1 bis (scenario post Tappa 1) nuova linea Orbassano – Settimo Torinese (Gronda Merci di Torino);Tappa 2 (scenario post Tappa 1) nuova linea Avigliana – Bussoleno.

Inquadramento territorialeGli interventi di adduzione al tunnel di base transfrontaliero sulla tratta nazionale, successivi alla Tappa 1, comprendono la realizzazione del nuovo tracciato quasi interamente in galleria tra Susa e Avigliana, che interessa i rilievi della bassa Valle di Susa lato sponda destra del Fiume Dora Riparia, nonché la cosiddetta "Gronda merci" di collegamento dello scalo di Orbassano con la linea AC/AV Torino-Milano in prossimità di Settimo Torinese. Quest'ultima opera interessa il territorio dei comuni della cintura ovest e nord torinese, fortemente urbanizzati.
Tipologia di opereGli interventi comprendono la realizzazione di nuovi tratti di linea a doppio binario.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Progetto preliminare completato nel 2010 e non inviato al CIPE in quanto non finanziato.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

La realizzazione anche della Gronda Merci in prosecuzione alla tratta Avigliana – Orbassano consentirà, a valle della Tappa 1a, un ulteriore sviluppo del traffico merci sul Corridoio Mediterraneo permettendo di sfruttare in maniera ottimale il nuovo collegamento transfrontaliero.L'eliminazione del flusso merci Est – Ovest nel nodo di Torino consentirà, inoltre, un incremento del modello di esercizio regionale e suburbano del Nodo di Torino.

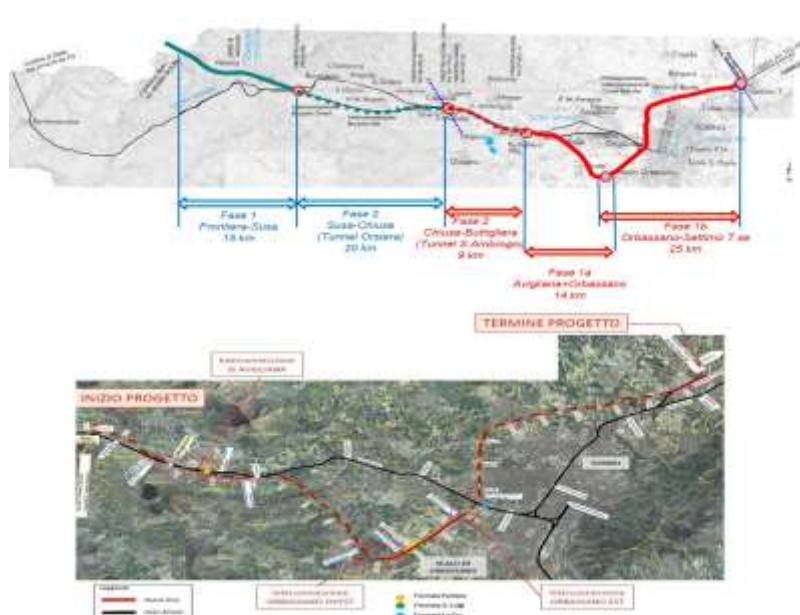

Capacità	X
Velocità	
Accessibilità	
Regolarità	
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Piemonte

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici			
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change
Cintura di Torino (nuova linea Orbassano-Settimo Torinese)	X						X					X		
Sezione nazionale Torino-Lione 2ª fase (quadruplicamento Bussoleno-Avigliana)	X						X					X		

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0241B: Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione completamento

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
2.692,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,85

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
2.692,85						2.692,85

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
0,00						0,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Cintura di Torino (nuova linea Orbassano-Settimo Torinese)	1.744,00	0,00	1.744,00	1.662,64	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.744,00
Sezione nazionale Torino-Lione 2^ fase (quadruplicamento Bussoleno-Avigliana)	948,85	0,00	948,85	918,35	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	948,85
	2.692,85	0,00	2.692,85	2.580,99	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,85

CRONOPROGRAMMA													
	CUP		Stato attuativo				Iter procedurale						
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
Cintura di Torino (nuova linea Orbassano-Settimo Torinese)	J11H03000030008	Valutazione di fattibilità alternative progettuali	-	-	7-2027	10-2029	-	-	6-2030	6-2031	3-2031	10-2037	12-2037
Sezione nazionale Torino-Lione 2ª fase (quadruplicamento Bussoleno-Avigliana)	J11H03000030008	Progettazione	-	-	7-2027	5-2029	-	-	1-2030	2-2031	2-2031	1-2035	3-2035

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025
Progetto P215: Adeguamento linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede i seguenti interventi:1) Realizzazione del sistema ERTMS L2 (Baseline 3) con contestuale realizzazione dell'ACCM della tratta Bussoleno – Avigliana.2) Soppressione PL alla pK 35+570 e alla pK 36+540 nel Comune di Borgone.3) Adeguamento alle specifiche di interoperabilità STI PRM delle fermate Sant'Ambrogio, Borgone e Bruzolo.4) Realizzazione delle precedenze di modulo 750 m con la realizzazione di due PM.5) Adeguamento del sistema Energia con la realizzazione di due nuove SSE (Avigliana e Borgone) adeguamento linea di contatto da 540 mmq con feeder da 230 mmq.6) Demolizione linea primaria (funzionalmente sostituita dalle SSE)7) Risanamento acustico di tutta la tratta8) Rinnovo TE.

Gli interventi previsti, oltre a garantire la transitabilità della sagoma P/C 80, comprendono rinnovo dell'armamento, verifiche e adeguamento di opere civili lungo linea per la risoluzione puntuale di interferenze, l'adeguamento degli impianti tecnologici per la gestione e controllo della circolazione, la realizzazione di precedenze con modulo 750 m, il potenziamento degli impianti di trazione elettrica ed interventi di adeguamento nelle stazioni ed interventi di mitigazione acustica.

Inquadramento territorialeGli interventi sulla tratta nazionale di adduzione al tunnel di base transfrontaliero, nello scenario di Tappa 1, comprendono l'adeguamento del tratto della linea storica Modane - Torino tra Bussoleno e Avigliana, per circa 21 Km. Si tratta di una linea a doppio binario che percorre la bassa Valle di Susa in territorio pianeggiante, solcato dal sedime del Fiume Dora Riparia, dall'autostrada del Frejus e da due Strade Statali. Tipologia di opereGli interventi di adeguamento comprendono nuove tecnologie per i distanziamento dei treni, due nuove sottostazioni elettriche di alimentazione della linea, due nuovi posti di movimento con binario di precedenza a modulo 750 metri, il completamento della soppressione PL sulla tratta, nonché interventi di mitigazione acustica.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

1) Sono in corso i lavori nell'ambito del piano nazionale per l'attrezzaggio ERTMS sulla rete RFI.2) In corso l'iter autorizzativo.3) Lavori in corso.4) Sono in corso le attività propedeutiche per l'avvio del procedimento di autorizzazione localizzativa. 5, 6) A dicembre 2024 è stata avviata l'attività negoziale, tutt'ora in corso. 7) A giugno 2024 è stata avviata la progettazione, attualmente in corso.8) Attività propedeutiche per l'avvio dell'adeguamento del progetto definitivo.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Aumento capacità da 10 a 12 treni/h per direzione e della regolarità della linea.Incremento prestazionale della linea con adeguamento a modulo 750 metri e sagoma P/C80.



	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	X
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Piemonte

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P215: Adeguamento linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana

	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF		Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																						
Adeguamento linea Torino-Modane 1^ fase - potenziamento tecnologico e 2^ adeguamento prestazionale		X	X	X			X	X														

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2		
249,70	129,90	di cui:	44,90	0,00	0,00	0,00	4,00	81,00	0,00	8,10	111,70	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE										milioni di euro
Evoluzione Costo										
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025				
241,59			8,11			249,70	Variazione del costo relativo a maggiori costi emersi all'esito della Progettazione esecutiva relativa alla realizzazione del sistema ERTMS L2 e contestuale realizzazione dell'ACCM della tratta Bussoleno – Avigliana, a seguito di adeguamento della progettazione definitiva della viabilità stradale nell'ambito dell'iter autorizzativo per la realizzazione degli interventi di soppressione dei PL e per l'adeguamento della Progettazione definitiva nell'ambito dell'iter autorizzativo per la realizzazione di due nuove SSE di Avigliana e Borgone.			

Evoluzione coperture finanziarie											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025					
111,74					18,16	129,90	Copertura appalto in corso per maggiori costi emersi ad esito della PE				

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Adeguamento linea Torino-Modane 1^ fase - potenziamento tecnologico e 2^ adeguamento prestazionale	249,70	129,90	119,80	233,22	16,48	34,75	5,54	1,24	0,21	0,20	0,03	1,96	6,24	243,38
	249,70	129,90	119,80	233,22	16,48	34,75	5,54	1,24	0,21	0,20	0,03	1,96	2,68	243,38

CRONOPROGRAMMA															
CUP			Stato attuativo				Iter procedurale								
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità		
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine			
Adeguamento linea Torino-Modane 1^ fase - potenziamento tecnologico e 2^ adeguamento prestazionale			J74G18000150009	Realizzazione	-	-	9-2024	10-2027	-	-	5-2021	7-2028	1-2022	3-2030	12-2027

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento è previsto nella Dichiarazione d'intenti Italia - Svizzera del 17/12/2012. Nell'ambito del progetto «Nodo di Novara - Passante ferroviario merci», è stata definita una prima fase funzionale per il nodo di Novara individuando i seguenti interventi prioritari: FASE 1A Bivio in linea per inizio della bretella merci su tratto di linea Vignale-Novara C.le in prossimità della radice sud dell'impianto di Vignale e binario di precedenza sul linea Domodossola; Nuova Bretella merci a semplice binario per l'accesso all'impianto di Novara Boschetto da nord; Viabilità sostitutive per la soppressione di n. 5 PL interferiti; Prima fase PRG di Boschetto con creazione radice per l'ingresso da nord dei treni di autostrada viaggiante con annesso nuovo terminal per tale servizio e relativa viabilità di accesso. FASE 1B - PRG di Vignale e Boschetto (completamento).

Inquadramento territoriale Considerando la distribuzione dei flussi di trasporto nell'Europa centro-meridionale, la rilevanza del territorio di Novara deriva dalla collocazione lungo la direttrice transpadana all'incrocio con l'asse Genova-Sempione-Rotterdam, che lo rende snodo logistico di rilevanza europea. Al nodo di Novara convergono le linee da/per Torino (Francia), Milano (est Europa), Domodossola (Svizzera), Alessandria/Genova, Biella. **Tipologia di opere** Gli interventi di prima fase riguardano la realizzazione della nuova linea da Vignale per l'accesso allo scalo Boschetto da nord e interventi di rifunzionalizzazione dello scalo.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Acquisito parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 04/10/2021. E' stata ultimata la Progettazione Definitiva e in data 19/10/2021 il MITE ha avviato l'istanza per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Acquisito in data 22/12/2021 il parere Regionale sull'iter di VIA. A dicembre 2023 è stata ultimata la progettazione definitiva di adeguamento a modulo 750 mt nello scalo Boschetto su apparato attuale. La successiva fase realizzativa è prevista in altro progetto d'investimento.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Miglioramento della regolarità della circolazione nel nodo, grazie alla riduzione delle interferenze nell'impianto di Novara C.le (l'accesso dei treni merci da Nord verso il terminal di Novara Boschetto bypasserà l'impianto di Novara C.le); Incremento delle prestazioni per il traffico merci, grazie all'adeguamento a modulo 750m dei binari di arrivo e partenza dei treni; Riduzione dell'attuale impatto acustico derivante dalla circolazione dei treni merci all'interno dell'abitato di Novara.

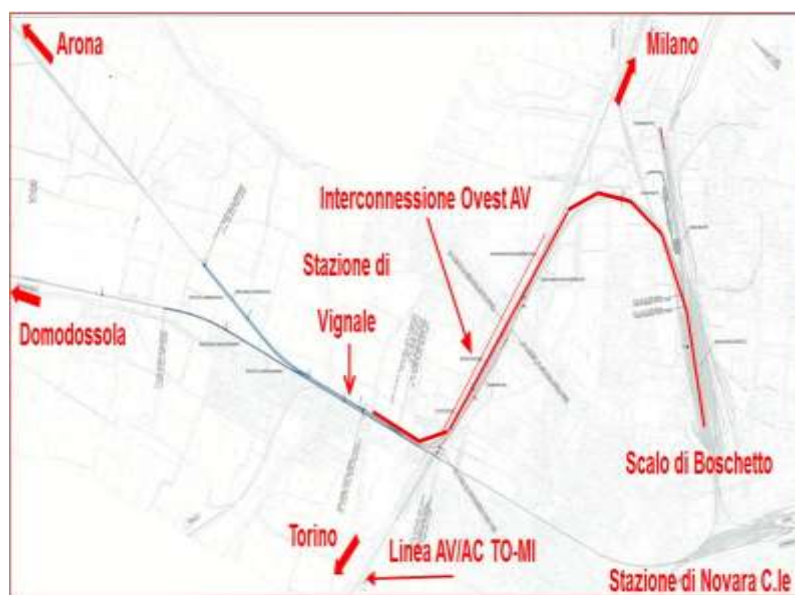

	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Piemonte

INQUADRAMENTO STRATEGICO**Priorità programmatica**

Allegato MMS al DEF
Tavoli tecnici di ascolto
Altri Provvedimenti*
Cofinanziamenti UE
UE - workplan corridoi TEN-T
AQ per l'utilizzo della capacità
Fondo Sviluppo e Coesione
Accordi EE.LL.
Accordi internazionali
Interventi commissariati
PNRR

Obiettivi strategici

Coesione sociale e territoriale
Accessibilità e qualità stazioni
Resilienza al climate change
Adeguamento a standard tecnici
Sviluppo tecnologico
Sistemi regionali e metropolitani
Potenziamento connessioni merci
Sviluppo corridoi TEN-T
Completamento valichi alpini
Alta Velocità (AV)

Intervento / Opere funzionali

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0223A: Nodo di Novara 1^ fase

Sistemazione Novara Boschetto e PRG Vignale	X	X	X
---	---	---	---

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatiche di breve			
								Priorità 1	Priorità 2		
190,50	5,70	di cui:	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
190,50						190,50

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
5,70						5,70

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Sistemazione Novara Boschetto e PRG Vignale	190,50	5,70	184,80	168,55	21,96	3,83	3,13	1,93	0,02	0,10	1,07	0,02	5,79	187,36
	190,50	5,70	184,80	168,55	21,96	3,83	3,13	1,93	0,02	0,10	1,07	0,02	0,00	187,36

CRONOPROGRAMMA															
CUP	Stato attuativo				Iter procedurale										
	CUP				Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità
					Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
Sistemazione Novara Boschetto e PRG Vignale	J11H02000130001	Progettazione	-	-	10-2018	6-2029	-	-	12-2027	7-2030	1-2029	7-2034	2-2035		

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi di completamento del Nodo di Novara sono i seguenti:- messa a PRG dell'impianto di Novara C.le ; - realizzazione del passante merci; - realizzazione dell'interconnessione di Novara Est; - realizzazione del collegamento diretto AV – FNM;- realizzazione nuova fermata AV Novara.

Inquadramento territorialeConsiderando la distribuzione dei flussi di trasporto nell'Europa centro-meridionale, la rilevanza del territorio di Novara deriva dalla collocazione lungo la direttrice transpadana all'incrocio con l'asse Genova-Sempione-Rotterdam, che lo rende snodo logistico di rilevanza europea. Al nodo di Novara convergono le linee da/per Torino(Francia), Milano (est Europa), Domodossola (Svizzera), Alessandria/Genova, Biella.Tipologia di opereGli interventi di riassetto del nodo di Novara comprendono la nuova linea Passante merci in galleria per la connessione della linea del Sempione con la Novara-Alessandria, nonché interventi di sistemazione a PRG di Novara Centrale e dello scalo Boschetto.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Progetto Preliminare ultimato nel 2011. Intervento sospeso per mancanza di finanziamenti.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Eliminazione delle interferenze a Novara Centrale con separazione dei flussi viaggiatori e merci;- Incremento della capacità e delle prestazioni per il traffico merci.

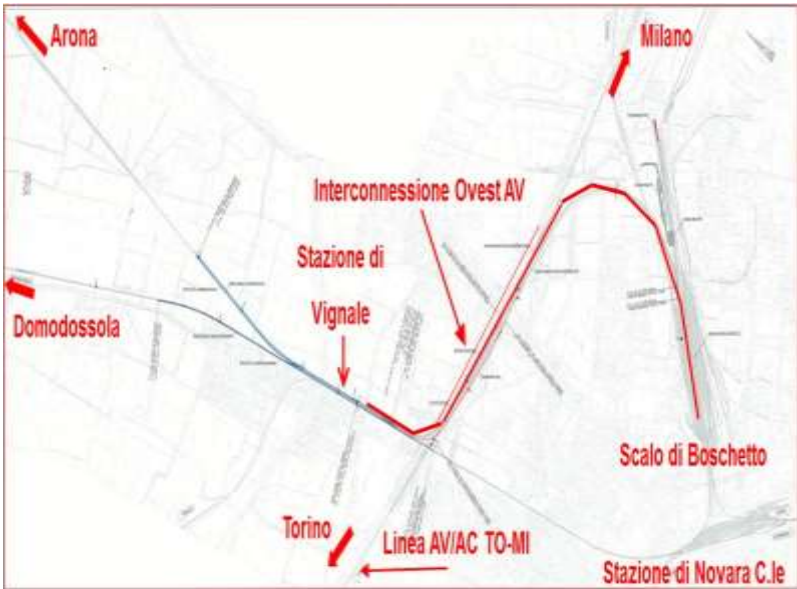

- Capacità
- Velocità
- Accessibilità
- Regolarità
- Prestazioni (merci)
- Gestione dei rotabili
- Gestione spazi di stazione
- Intermodalità merci
- Intermodalità passeggeri
- Integrazione della rete
- Upgrade e sicurezza
- Efficientamento processi

X

LOCALIZZAZIONE

Piemonte

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani
Nodo di Novara: Passante merci (include progettazioni pregresse per opere di scavalco linee Novara-Mortara e Novara-Milano)					X									X	

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0223B: Nodo di Novara completamento

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
392,53	6,97		6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,56

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
392,53						392,53

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
6,97						6,97

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Nodo di Novara: Passante merci (include progettazioni pregresse per opere di scavalco linee Novara-Mortara e Novara-Milano)	392,53	6,97	385,56	310,51	82,02	6,97	6,87	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	385,56
	392,53	6,97	385,56	310,51	82,02	6,97	6,87	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,56

CRONOPROGRAMMA														
CUP			Stato attuativo				Iter procedurale							
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
Nodo di Novara: Passante merci (include progettazioni pregresse per opere di scavalco linee Novara-Mortara e Novara-Milano)	J11H02000130001	Progettazione	7-2004	9-2018	5-2005	5-2032	-	-	1-2033	9-2033	10-2033	3-2041	3-2041	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento prevede un raddoppio in sede di circa 35 km, di cui 14 km da Vignale a Oleggio e 21 km da Oleggio ad Arona. Il progetto prevede la realizzazione in prima fase del raddoppio in affiancamento nella tratta Vignale – Oleggio, nonché la sistemazione del PRG di Vignale e Oleggio, le opere stradali per la soppressione di tutti i passaggi a livello pubblici e privati, l'adeguamento di località di servizio e fermate, la nuova S.S.E. di Oleggio, il rifacimento degli apparati centrali, realizzazione di un nuovo sistema di comando e regolazione della circolazione che permetta la gestione dal Posto Centrale di Torino Lingotto della linea e degli impianti. L'intervento è previsto nella Dichiarazione d'intenti Italia-Svizzera del 18.09.2014.

Inquadramento territoriale Il territorio interessato dalla linea Vignale-Oleggio-Arona è costituito da pianura irrigua ricadente nella provincia di Novara, delimitata a Nord dalle prime propaggini delle prealpi, a Est dal Fiume Ticino, ad Ovest dal Fiume Sesia a sud dalla città di Novara. Il tracciato è pianeggiante e rettilineo. Tipologia di opere Raddoppio della linea in affiancamento al binario esistente e opere di viabilità per la soppressione dei passaggi a livello.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•Raddoppio tratta Vignale-Oleggio: In data 22/06/2022 RFI ha trasmesso al MIT l'analisi costi benefici relativa al raddoppio Vignale-Oleggio-Arona. È in corso il PFTE relativo al PRG di Oleggio, che sarà suddiviso in due lotti funzionali: - Lotto 1: precedenza; - Lotto 2: PRG di stazione e interventi per messa a STI. •Raddoppio tratta Oleggio-Arona: Progetto Preliminare ultimato nel 2004. Attività sospese per mancanza di finanziamenti.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

L'obiettivo primario dell'investimento è incrementare la capacità sull'Asse Arona – Novara consentendo di gestire con adeguati margini la coesistenza dei traffici dal Sempione al Gottardo e la regolarità della circolazione grazie sia alle nuove caratteristiche infrastrutturali sia all'accentramento delle operazioni di gestione e regolazione della circolazione dal Posto Centrale di Torino Lingotto.

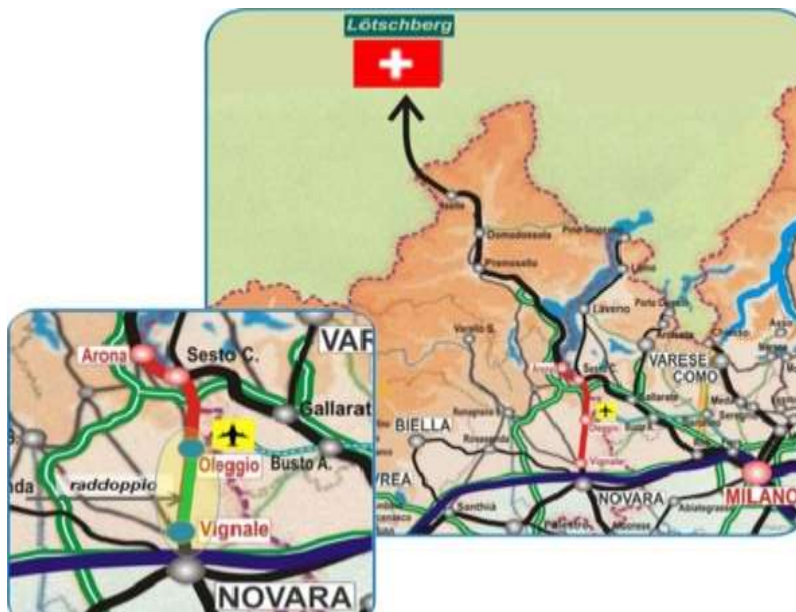

	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Piemonte

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Raddoppio Vignale-Oleggio	X				X			X				X									
Raddoppio Oleggio-Arona	X				X							X									

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0264A: Accesso al Sempione: raddoppio Vignale-Oleggio-Arona

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatorie di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
424,00	6,44	di cui: 6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	417,56

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
424,00						424,00

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
6,44						6,44

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Vignale-Oleggio	264,00	6,44	257,56	222,15	41,85	6,44	1,97	2,97	0,02	0,02	0,03	0,03	5,02	260,94
Raddoppio Oleggio-Arona	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	160,00
	424,00	6,44	417,56	382,15	41,85	6,44	1,97	2,97	0,02	0,02	0,03	0,03	0,00	420,94

CRONOPROGRAMMA

	CUP	Stato attuativo	Iter procedurale										
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
Raddoppio Vignale-Oleggio	J11H03000130001	Progettazione	6-2003	1-2026	9-2018	3-2030	-	-	6-2027	2-2028	2-2028	8-2029	12-2029
Raddoppio Oleggio-Arona	J11H03000130001	Progettazione	-	-	-	-	-	-	4-2030	1-2031	2-2031	1-2035	6-2035

Progetto 0277: Potenziamento Seregno-Bergamo

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto, strettamente correlato al potenziamento della linea Chiasso-Milano, prevede la realizzazione di un itinerario di by-pass del nodo ferroviario di Milano dedicato al traffico merci (gronda est), a servizio dei terminali in area est di Milano. Gli interventi consistono nella realizzazione di una nuova linea, a vocazione esclusiva merci, di cui parte in affiancamento alla Seregno – Carnate – Bergamo per un'estesa di circa 34 km, che consente il collegamento tra il corridoio Reno-Alpi e il corridoio Mediterraneo. In uscita da Seregno è previsto un raddoppio in sede fino a Lesmo mentre la tratta successiva si sviluppa in variante che affianca il futuro tracciato dell'Autostrada "Pedemontana". La linea termina a Levate, dove si connette alla Bergamo - Treviglio.

La nuova linea, a vocazione esclusiva merci, si sviluppa per circa 34 km, di cui parte in affiancamento alla Seregno – Carnate – Bergamo, che viene raddoppiata. E' previsto un raddoppio in sede nella tratta Seregno - Lesmo (5 km); la tratta successiva (circa 29 km) è prevista in variante, con circa 15 km in affiancamento alla futura Pedemontana lombarda. La linea termina a Levate, dove si connette alla Bergamo - Treviglio.

Il tracciato di progetto, con andamento ovest-est risulta interconnesso ad ovest con la nuova linea veloce Monza-Chiasso da cui proviene il traffico merci internazionale transalpino, e ad est con la linea Bergamo-Treviglio. Il progetto prevede il raddoppio in sede nella tratta Seregno - Lesmo (5 km); la tratta successiva (circa 29 km) è prevista in variante, con circa 15 km in affiancamento alla futura Pedemontana lombarda. La linea termina a Levate, dove si connette alla Bergamo - Treviglio.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

La progettazione preliminare è stata approvata con prescrizioni dal CIPE nel 2005.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

L'intervento ha l'obiettivo di creare un itinerario specializzato per il traffico merci per i flussi con origine/destino dal valico di Chiasso verso est (Veneto) e sud (Genova) by-passando il nodo di Milano.

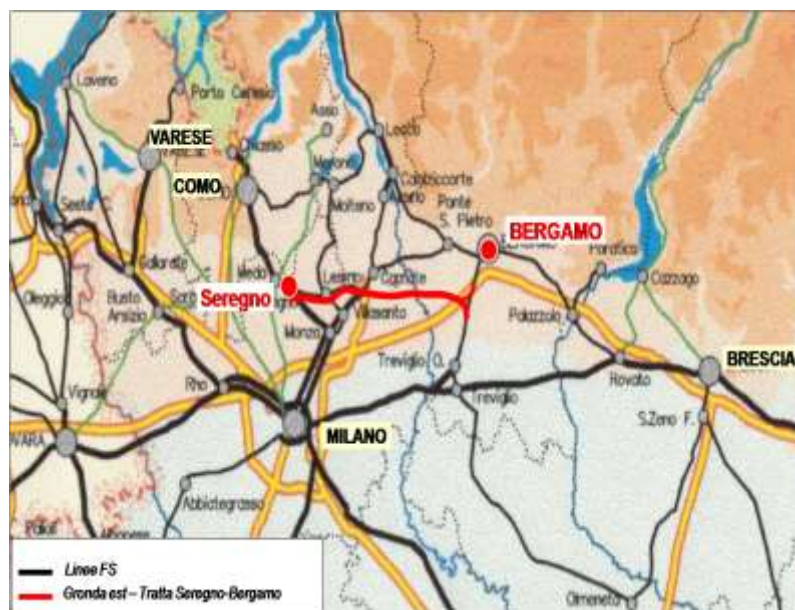

	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lombardia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici									
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale		
Potenziamento Seregno-Bergamo (gronda est di Milano)					X							X								

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0277: Potenziamento Seregno-Bergamo

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve			
								Priorità 1	Priorità 2		
1.000,00	82,63	di cui:	82,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,37	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
1.000,00						1.000,00

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
82,63						82,63

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
			Fabbis.											Oltre
	Costo	Risorse		Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Potenziamento Seregno-Bergamo (gronda est di Milano)	1.000,00	82,63	917,37	57,60	942,40	13,15	12,01	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	986,85
	1.000,00	82,63	917,37	57,60	942,40	13,15	12,01	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,85

CRONOPROGRAMMA																
			Stato attuativo				Iter procedurale									
			CUP			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione	Funzionalità	
				Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine			
Potenziamento Seregno-Bergamo (gronda est di Milano)			J31H03000210008	Progettazione	10-2002	12-2005	9-2008	11-2026	-	-	7-2027	5-2028	5-2028	3-2036	6-2035	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento rappresenta un primo lotto funzionale del quadruplicamento della tratta ferroviaria compresa fra Tortona e Voghera e nello specifico riguarda il potenziamento della stazione di Tortona, al fine di migliorare la fluidità dei traffici in accesso al realizzando Terzo valico dei Giovi sulle relazioni Milano-Genova e Torino-Alessandria.

Il progetto è articolato in più fasi; la prima riguarda l'attivazione di un ACC su una configurazione del ferro pressoché coincidente con l'attuale a meno di interventi finalizzati allo scopo di predisporre l'impianto per il futuro innesto della linea del Terzo Valico, ottimizzare la configurazione del piano del ferro per le connessioni con gli impianti raccordati e predisporre l'impianto per l'attrezzaggio e implementazione dell'ERTMS/ETCS di Livello 2. La seconda parte del progetto implementerà, in fasi successive, tutte le modifiche necessarie al raggiungimento della configurazione finale di PRG e ACC. Per quanto attiene i fabbricati tecnologici è prevista la realizzazione di un Gestore d'Area per il controllo degli enti del Bivio «Terzo Valico» e di due Gestori d'Area per quelli di stazione; sono previsti anche per la parte di stazione a servizio dei viaggiatori interventi ai marciapiedi ed ai sottopassi pedonali. Oltre alle due macrofasi sopra descritte è previsto il rifacimento del blocco Tortona-Voghera propedeutico alla sovrapposizione del sistema ERTMS/ETCS L2.

Gli interventi consistono nel quadruplicamento della tratta ferroviaria compresa fra Tortona e Voghera, prevalentemente in affiancamento ai binari esistenti per circa 16 km, e nella realizzazione di un'opera di scavalco presso Ponte Curone che consentirà l'indipendenza dei flussi sulle due direttrici interferenti.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Sono in corso tutte le lavorazioni per la realizzazione del PRG e dell'ACC di Tortona su ferro attuale. Per quanto riguarda il rifacimento del blocco Tortona-Voghera per i lavori di piazzale e cabina è stata ultimata la verifica della Progettazione Esecutiva a cura dell'appaltatore, in corso l'approvazione. Per i lavori di Cabina è stata ultimata la Progettazione Esecutiva, in corso la verifica. Sono in corso di contrattualizzazione i lavori di armamento per la posa dei giunti.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Aumentare la regolarità d'esercizio, grazie all'ammodernamento delle tecnologie di governo dell'impianto e all'inserimento nel sistema integrato di supervisione della circolazione- Riduzione di numerose interferenze d'impianto, anche in previsione dell'innesto nell'impianto del 3° valico dei Giovi- Adeguamento dell'accessibilità in stazione grazie all'adeguamento dei marciapiedi e sottopassi- Adeguamento prestazionale a modulo 750 metri

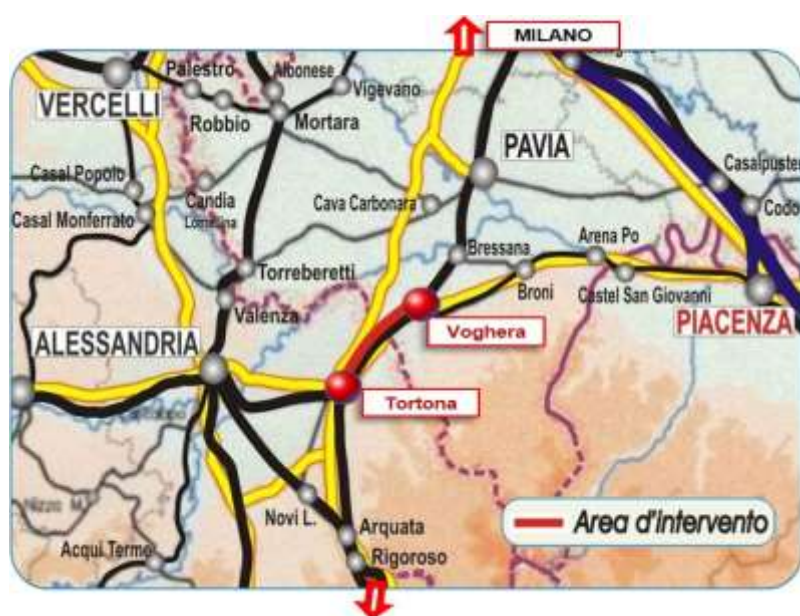

Capacità	
Velocità	
Accessibilità	
Regolarità	X
Prestazioni (merci)	X
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Piemonte

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Progetto 0286A: Quadruplicamento Tortona-Voghera opere prioritarie

Coesione sociale e territoriale	
Accessibilità e qualità stazioni	
Resilienza al climate change	
Adeguamento a standard tecnici	
Sviluppo tecnologico	
Sistemi regionali e metropolitani	
Potenziamento commissioni merci	X
Sviluppo corridoi TEN-T	
Completamento valichi alpini	
Alta Velocità (AV)	
Allegato MIMS al DEF	
Tavoli tecnici di ascolto	
Altri Provvedimenti*	
Cofinanziamenti UE	
UE - workplan corridoi TEN-T	X
AQ per l'utilizzo della capacità	X
Fondo Sviluppo e Coesione	
Accordi EE.LL.	
Accordi Internazionali	
Interventi commissariati	X
PNRR	X
Intervento / Opere funzionali	
PRG e ACC Tortona	

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate							Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/FEN, PON- FSE)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve Priorità 1	Priorità 2	
103.74	103.74	di cui:	103,67	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
103,67				0,07		103,74	Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
103,67				0,07		103,74
Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)						

Produzione

	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
PRG e ACC Tortona	103,74	103,74	0,00	94,88	8,86	24,26	11,60	0,04	0,71	1,07	1,97	4,19	5,04	93,11
	103,74	103,74	0,00	94,88	8,86	24,26	11,60	0,04	0,71	1,07	1,97	4,19	2,65	93,11

	CUP	Stato attuativo	Iter procedurale										
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione	Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
PRG e ACC Tortona	J64G18000130009	Realizzazione	-	-	5-2018	9-2023	-	-	1-2026	9-2026	9-2026	5-2028	6-2028

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento prevede il quadruplicamento della attuale linea per circa 16 km, prevalentemente in affiancamento ai binari esistenti. Sono previsti interventi minimali al PRG di Voghera, in radice lato Tortona, per il conseguimento di due binari di precedenza a modulo 750 metri. La tratta Voghera - Tortona appartiene funzionalmente alle due direttrici, Milano - Genova e Torino – Piacenza (Direttrice Mediopadana).

Gli interventi consistono nel quadruplicamento della tratta ferroviaria compresa fra Tortona e Voghera , prevalentemente in affiancamento ai binari esistenti per circa 16 km, e nella realizzazione di un'opera di scavalco presso Ponte Curone che consentirà l'indipendenza dei flussi sulle due direttrici interferenti.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

A seguito del Decreto Semplificazione è stata ultimata la documentazione progettuale a livello di Progetto di Fattibilità Tecnico Economica. A marzo 2022 il PFTE è stato inoltrato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il parere di competenza, acquisito in data 6/10/2022. A marzo 2022 è stato avviato il Dibattito Pubblico. Il 1/12/2022 si è tenuto l'incontro conclusivo del Dibattito Pubblico. In data 01/02/2023 è stata acquisita la relazione finale del Coordinatore del Dibattito Pubblico. È stato ultimato l'adeguamento del PFTE e in data 29/04/2024 è stata inviata al MASE e al MIC l'istanza per avvio dell'iter VIA e convocata dal Commissario Straordinario l'Intesa Stato-Regione. Nel mese di maggio 2024 è stato avviato l'arricchimento del PFTE per gara. Nel mese di dicembre 2024 è stata avviata la Conferenza dei Servizi.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Il quadruplicamento tra Tortona e Voghera consente la separazione dei flussi di traffico tra i collegamenti Torino/Alessandria - Piacenza e le relazioni Milano – Genova garantendo una riduzione delle interferenze negli impianti ed un contestuale incremento di capacità da 10 a 20 treni/h per direzione e riduzione dei tempi di percorrenza verso Milano; L'intervento va inserito nell'insieme dei progetti a supporto del Corridoio Reno – Alpi andando a risolvere una delle potenziali criticità.



	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Piemonte
Lombardia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Quadruplicamento Tortona-Voghera		X				X	X	X	X					X	

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0286B: Quadruplicamento Tortona-Voghera

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatorie di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
900,00	21,36		18,01	0,80	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	878,64

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
900,00						900,00

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
21,36						21,36

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Quadruplicamento Tortona-Voghera	900,00	21,36	878,64	853,63	46,37	19,02	9,07	6,36	0,00	0,00	1,56	2,78	5,00	888,29
	900,00	21,36	878,64	853,63	46,37	19,02	9,07	6,36	0,00	0,00	1,56	2,78	1,01	888,29

CRONOPROGRAMMA														
CUP	Stato attuativo					Iter procedurale								
	CUP	Iter	Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
Quadruplicamento Tortona-Voghera	J71H92000020011	Iter autorizzativo	3-2005	9-2025	12-2008	9-2025	-	-	9-2025	7-2026	7-2026	8-2031	4-2030	

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede la realizzazione di un complesso a 4 binari da Rho a Parabiago, la successiva prosecuzione con un nuovo 3° binario fino alla stazione di Gallarate, con un collegamento Rho Fiera – Malpensa attraverso la realizzazione del cosiddetto “Raccordo Y” tra la linea RFI e la linea Ferrovie Nord Milano all’altezza della stazione di Busto Arsizio. Il potenziamento si sviluppa complessivamente per 31,5 km circa, di cui circa 8 km relativi alla tratta da Rho a Parabiago.

L’intervento è suddiviso in due lotti funzionali:1. quadruplicamento tra le stazioni di Rho e Parabiago (circa 8 km) con inserimento di una nuova fermata in località Nerviano; fase propedeutica alla sistemazione a PRG della stazione di Rho per la razionalizzazione dei flussi di traffico provenienti dal Passante e diretti a Novara, messa a PRG della stazione di Parabiago; realizzazione della bretella di collegamento a raso della linea Gallarate-Rho con la linea FNM Saronno-Malpensa (raccordo Y per Malpensa).2. triplicamento della linea tra Parabiago e Gallarate.

L'intervento si colloca nelle province di Milano e Varese.La zona interessata dal tracciato in progetto è caratterizzata da una morfologia pianeggiante, corrispondente al livello fondamentale della pianura, con variazioni di quote estremamente limitate, dell'ordine di pochi metri. Sono presenti inoltre alcune scarpate artificiali in corrispondenza di cave, per lo più di sabbia e ghiaia, ed un fitto reticolato di canali artificiali e rogge scavate prevalentemente a scopo irriguo.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•Triplicamento tratta Parabiago-Gallarate: Sono in corso le attività propedeutiche per l'avvio della revisione progettuale. •Quadruplicamento Rho-Parabiago e raccordo a Y per Malpensa: A giugno 2023 è stata bandita la gara per l'affidamento dell'Appalto Integrato. Ad ottobre 2023 è intervenuta l'aggiudicazione definitiva e a novembre 2023 si è proceduto con la consegna delle prestazioni. A inizio agosto 2024 è stata effettuata la consegna delle attività propedeutiche. Per quanto riguarda le opere di Parte A (prolungamenti di sottovia esistenti per successiva realizzazione allargamento della sede esistente) ad agosto 2024 sono stati consegnati i lavori, attualmente in corso. Nel mese di dicembre 2024 sono stati consegnati i lavori delle opere di Parte B ed è in corso la verifica della Progettazione Esecutiva delle opere di Parte C. •Completam.Quadruplicamento e PRG Rho: È in corso l'adeguamento del PD

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Incremento della capacità della linea da 10 tr/h a 24 tr/h (tratta Rho – Parabiago);- attivazione nuovi servizi suburbani secondo Accordo Quadro;- incremento della regolarità attraverso la separazione dei flussi di traffico.La messa a PRG della stazione di Rho, nell’ambito del quadruplicamento della tratta Rho-Parabiago, prevedrà la razionalizzazione dei flussi di traffico in impianto attraverso la realizzazione di un’opera di scavalco e la velocizzazione a 100 km/h dei principali itinerari di stazione.



	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lombardia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica	Obiettivi strategici
------------------------	----------------------

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0294: Potenziamento linea Gallarate-Rho

	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF		Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																						
Quadruplicamento Rho-Parabiago e raccordo a Y per Malpensa	X	X	X			X	X				X			X		X						
Quadruplicamento Rho-Parabiago e raccordo a Y per Malpensa (opere di completamento)		X	X			X	X				X			X		X						
Triplificazione Parabiago-Gallarate		X	X			X	X				X			X		X						

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro		
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento		
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2			
1.023,67	632,18	di cui:	632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,50		

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzativi. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE										milioni di euro
Evoluzione Costo										
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025				
969,68			54,00			1.023,67	Variazione del costo ad esito della Progettazione Definitiva e per l'erogazione del contributo al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi per interventi di adeguamento del Canale derivatore Valle Olona.			

Evoluzione coperture finanziarie											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025					
632,18						632,18					

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Altro
Quadruplicamento Rho-Parabiago e raccordo a Y per Malpensa	463,31	463,31	0,00	311,58	151,73	341,31	35,88	14,66	0,29	0,37	0,12	7,68	5,12	435,67
Quadruplicamento Rho-Parabiago e raccordo a Y per Malpensa (opere di completamento)	233,86	158,07	75,80	164,86	69,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	233,86
Triplificazione Parabiago-Gallarate	326,50	10,80	315,70	5,94	320,56	4,67	4,67	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	321,83
	1.023,67	632,18	391,50	482,37	541,31	345,98	40,55	19,34	0,29	0,37	0,12	7,68	4,52	991,36

CRONOPROGRAMMA														
CUP					Stato attuativo									
					Iter procedurale									
					Prog.Prel.	Prog.Def.	Prog.Esec.	Attiv.Negoz.	Esecuzione	Funzionalità				
					Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine		
Quadruplicamento Rho-Parabiago e raccordo a Y per Malpensa	J31J05000010001	Realizzazione	-	-	9-2008	6-2023	12-2011	-	6-2011	3-2024	11-2023	12-2026	12-2026	
Quadruplicamento Rho-Parabiago e raccordo a Y per Malpensa (opere di completamento)	J31J05000010001	Realizzazione	-	-	-	-	-	-	4-2027	9-2027	9-2027	12-2035	12-2035	
Triplificazione Parabiago-Gallarate	J31J05000010001	Iter autorizzativo	-	-	9-2008	12-2029	-	-	5-2030	8-2030	2-2030	8-2035	2-2033	

Progetto 0335: Quadruplicamento Pavia-Milano Rogoredo

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede il quadruplicamento, per fasi funzionali, della linea Milano-Genova in ingresso al nodo di Milano tra Pavia e Milano Rogoredo per un'estesa di circa 26 km, con specializzazione delle linee per tipologia di traffico.

Il progetto è articolato in due fasi funzionali: Fase 1: quadruplicamento della tratta tra Milano Rogoredo e Pieve Emanuele (finanziato), con realizzazione di una nuova coppia di binari da Milano Rogoredo, stazione già predisposta per l'innesto della nuova linea, a Pieve Emanuele per un'estesa di circa 11 km e la trasformazione in fermata della stazione di Locate Triulzi. Fase 2: completamento del quadruplicamento tra Pieve Emanuele e Pavia (da finanziare), con realizzazione di una nuova coppia di binari per un'estesa di 18 km, con la trasformazione in fermata delle stazione di Certosa di Pavia. La linea sarà gestita tramite ACC-M dal Posto Centrale di Milano Greco Pirelli.

Il quadruplicamento in oggetto, a partire dall'uscita della stazione Milano Rogoredo, prosegue in affiancamento alla linea storica e su una nuova sede e si sviluppa a sud di Milano, estendendosi per circa 30 km lungo l'attuale linea ferroviaria tra i nodi di Milano Rogoredo e Pavia. La linea ferroviaria esistente, lungo la quale si sviluppa il progetto in esame, attraversa un'area pianeggiante debolmente inclinata verso sud. Le quote vanno da 115 m s.l.m. presso il nodo di Milano Rogoredo a 75 m s.l.m. in coincidenza della stazione di Pavia. Generalmente il tracciato si svilupperà in rilevato, dovranno essere previste delle opere (generalmente ponti) adatte al superamento dei numerosi corsi d'acqua, sia artificiali che naturali.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•Quadruplicamento Rogoredo-Pieve Emanuele: In data 29/05/2023 sono state consegnate le prestazioni all'Appaltatore, in data 17/11/2023 sono stati consegnati i lavori propedeutici. In data 11/07/2024 è avvenuta la consegna dei lavori delle opere di Parte A (prolungamento sottopassi e attività di demolizione), in data 25/10/2024 è avvenuta la consegna dei lavori delle opere di Parte B (OCC e infrastrutturali). In data 09/04/2025 è stata approvata in linea tecnica la Progettazione Esecutiva delle opere di parte C ed è seguita la consegna dei lavori in data 15/04/2025. •Quadruplicamento Pieve Emanuele-Pavia: In data 14/05/2025 è avvenuta la consegna del PD adeguato alle prescrizioni emerse dall'iter VIA. Sono in corso le attività necessarie per l'avvio dell'iter con commissario straordinario sul PD

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Incremento della capacità dagli attuali 10 treni/h per direzione a 20 treni/h per direzione; separazione tra i traffici suburbani, regionali, lunga percorrenza e merci; Istituzione di un nuovo servizio suburbano da/per Pieve Emanuele secondo quanto previsto in AQ.



Capacità	X
Velocità	
Accessibilità	
Regolarità	X
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lombardia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica				Obiettivi strategici			
Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.
Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR					
Intervento / Opere funzionali				Coesione sociale e territoriale			
				Accessibilità e qualità stazioni			
				Resilienza al climate change			
				Adeguamento a standard tecnici			
				Sviluppo tecnologico			
				Sistemi regionali e metropolitani			
				Potenziamento connessioni merci			
				Sviluppo corridoi TEN-T			
				Completamento valichi alpini			
				Alta Velocità (AV)			

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0335: Quadruplicamento Pavia-Milano Rogoredo

Quadruplicamento Rogoredo-Pieve Emanuele	X	X		X	X		X		X		X
Quadruplicamento Pieve Emanuele-Pavia		X		X	X		X		X		X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/ITEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
987,46	349,06	di cui:	349,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	635,50

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo							CdP-I agg.2025	Variazione del costo per incremento del valore delle opere ad esito della Progettazione Esecutiva.
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze			
963,66			23,80			987,46		

Evoluzione coperture finanziarie						CdP-I agg.2025	Copertura appalto in corso per maggiori costi emersi ad esito della PE
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni		
328,16				20,90		349,06	

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Quadruplicamento Rogoredo-Pieve Emanuele	343,26	340,36	2,90	295,17	48,09	236,57	24,56	4,13	0,95	0,37	0,00	2,46	5,58	320,66
Quadruplicamento Pieve Emanuele-Pavia	644,20	8,70	635,50	615,80	28,40	8,47	7,23	4,09	0,00	0,33	0,04	3,06	5,75	636,35
	987,46	349,06	638,40	910,97	76,49	245,04	31,80	8,22	0,95	0,69	0,04	5,52	15,04	957,01

CRONOPROGRAMMA														
CUP		Stato attuativo	Iter procedurale											
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
Quadruplicamento Rogoredo-Pieve Emanuele	J47109000030009	Realizzazione	11-2011	12-2016	1-2018	12-2022	-	-	-	12-2024	2-2025	12-2026	12-2026	
Quadruplicamento Pieve Emanuele-Pavia	J47109000030009	Progettazione	-	12-2025	1-2018	12-2025	-	-	1-2026	11-2026	11-2026	12-2030	12-2030	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il collegamento diretto Torino-Genova utilizza il Corridoio ferroviario tra le località di Genova Piazza Principe, Novi Ligure, Alessandria, Torino Lingotto e Torino Porta Nuova. Il tracciato si sviluppa con una lunghezza totale di 159 km. La velocità in rango C e P è abbastanza simile, nel tratto ligure lungo 69 km ha velocità comprese tra i 115 e i 180 km/h, escluso il nodo di Genova; mentre nel restante tratto piemontese lungo 90 km ha velocità comprese tra gli 80 e i 180 km/h, con esclusione del nodo di Torino.

Gli interventi sono articolati nelle seguenti fasi: Gli interventi di 1^a fase riguardano: rinnovo e/o adeguamento del sistema di distanziamento di tipo BAcf (ERSC) in luogo dell'attuale Bacc per gestire le velocità fino a 200 km/h nella tratta Torino – Alessandria; adeguamento del SCMT per gestire la nuova fiancata nella tratta interessata dalla velocizzazione; Realizzazione dell'ACCM nella tratta Trofarello – Alessandria; rinnovo dei binari di corsa e rinnovamento della massicciata in alcuni tratti di linea; verifica delle opere d'arte presenti in linea per valutarne la compatibilità con l'innalzamento della velocità; verifica e progettazione di eventuali interventi di sostituzione o rinforzo delle opere d'arte; Gli interventi di 2^a fase riguardano: interventi di rinforzo/ sostituzione delle opere d'arte nelle tratte interessate dalla velocizzazione; varianti di tracciato a Castello D'Annone e Alessandria; riconfigurazioni SCMT, ACCM, e SCC per lavori di 2^a fase; adeguamento della linea di contatto alle modifiche di tracciato dei binari e scambi; analoghe lavorazioni all'armamento sui tratti di linea non interessati dall'attivazione di 1^a fase; analoghe lavorazioni alla Trazione Elettrica sui tratti di linea non interessati dall'attivazione di 1^a fase.

Inquadramento territoriale La linea ferroviaria Torino-Genova attraversa i territori di due regioni (Piemonte e Liguria) e tocca quattro capoluoghi (Torino, Asti, Alessandria, Genova) su un tracciato di 160 Km. Il territorio interessato è in parte pianeggiante, in parte collinare (territorio del Monferrato tra Villanova e Asti, con livellette fino al 12 per mille), in parte con caratteristiche di linea di valico, nella zona appenninica tra Novi Ligure e Genova. **Tipologia di opere** Gli interventi per la velocizzazione riguardano la tratta Torino-Novì Ligure, in previsione del completamento del Terzo Valico dei Giovi. Comprendono verifiche e eventuali adeguamenti delle opere d'arte, nonché interventi al binario, alla trazione elettrica e agli impianti di segnalamento.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

In data 23/02/2021 è stata conseguita l'attivazione della fase 0 del PRG di Asti. In data 2/12/2022 è stata conseguita l'attivazione dell'ACC di Asti fase 1 a. In data 23/06/2024 è stata conseguita l'attivazione dell'ACC di Asti fase 1 b. Attualmente, sono in corso gli interventi agli impianti di sicurezza e relative messa a PRG. Inoltre, sono completate le verifiche delle opere d'arte presenti in linea al fine di verificare la compatibilità con gli incrementi di sollecitazione derivanti dalle maggiori velocità previste. Nel mese di dicembre 2024 è stata conseguita l'attivazione dell'ACC di Villafranca.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

-Riduzione dei tempi di percorrenza a circa 1h al completamento di tutti gli interventi programmati sull'itinerario- Miglioramento della qualità della circolazione: per tutte le tipologie di servizio, riduzione dei minuti di ritardo derivanti da indisponibilità degli apparati che gestiscono la circolazione- Adeguamento modulo di linea 750 metri



	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Piemonte

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Progetto P131: Velocizzazione linea Torino-Genova

Coesione sociale e territoriale
Accessibilità e qualità stazioni
Resilienza al climate change
Adeguamento a standard tecnici
Sviluppo tecnologico
Sistemi regionali e metropolitani
Potenziamento compressioni merci
Sviluppo corridoi TEN-T
Completamento valichi alpini
Alta Velocità (AV)
Allegato MINS al DEF
Tavoli tecnici di ascolto
Altri Provedimenti*
Cofinanziamenti UE
UE - workplan corridoi TEN-T
AQ per l'utilizzo della capacità
Fondo Sviluppo e Coesione
Accordi EE.LL.
Accordi Internazionali
Interventi commissariati
PNRR

Velocizzazione Torino-Genova 1^ fase (potenziamento tecnologico e rettifiche di tracciato)

Velocizzazione Torino-Genova 2^ fase (varianti di tracciato)

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate							Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (CELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatiche di breve		
								Priorità 1	Priorità 2	
207.23	75.53	di cui:	75.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	31.70	100.00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
175,00			31,70	0,53		207,23

L'aumento di costo è relativo ad un affinamento delle stime degli interventi tecnologici a finire. Si segnala, inoltre, una variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari.

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
75,00				0,53		75,53

Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)

Produzione

	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Velocizzazione Torino-Genova 1^ fase (potenziamento tecnologico e rettifiche di tracciato)	107,23	75,53	31,70	101,45	5,78	58,50	55,68	24,95	7,19	7,90	6,29	4,35	15,40	51,49
Velocizzazione Torino-Genova 2^ fase (varianti di tracciato)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	100,00
	207,23	75,53	131,70	101,45	105,78	58,50	55,68	24,95	7,19	7,90	6,29	4,35	5,06	151,49

CRONOPROGRAMMA

[illegible]

Progetto P133: Velocizzazione linea Milano-Genova

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede interventi di upgrade infrastrutturali e tecnologici finalizzati al collegamento in un'ora tra Milano e Genova, concentrati sulla tratta Milano Rogoredo – Tortona (circa 70 km). L'intervento consentirà di innalzare in varie tratte la velocità massima sino a 180/200 km/h.

Il progetto prevede:- l'inserimento dell'impianto di Voghera all'interno del sistema ACC-M/SCC-M della tratta in oggetto;- l'adeguamento prestazionale a modulo 750 metri nella stazione di Bressana B.;- la realizzazione della nuova località di PM Turago, dotata di binari a modulo 750 metri, e la contestuale trasformazione di Certosa di Pavia in fermata con l'adeguamento dell'accessibilità (nuovo sottopasso);- interventi di adeguamenti diffusi alle opere civili e al tracciato per l'innalzamento della velocità di linea.Gli interventi permetteranno l'aumento della regolarità della linea e saranno propedeutici alla velocizzazione del collegamento Milano - Genova e all'installazione dell'ERTMS /ETCS L2.

Gli interventi previsti si effettuano sulla linea ferroviaria esistente che attraversa un'area pianeggiante.Generalmente il tracciato si sviluppa in rilevato.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Nel mese di luglio 2024 è stata ultimata la Progettazione Esecutiva, in data 11/07/2024 è avvenuta la consegna dei lavori delle opere di Parte A (prolungamento sottopassi e attività di demolizione). In data 09/08/2024 è stata ultimata la Progettazione Esecutiva delle opere di Parte B (OCC e infrastrutturali) e in data 27/09/2024 è stata ultimata la Progettazione Esecutiva delle opere di Parte C (tecnologie ferroviarie). Sono attualmente in corso le attività di verifica della progettazione esecutiva di Parte C.In data 25/10/2024 è avvenuta la consegna dei lavori delle Opere di Parte B.È stata ultimata la progettazione relativa agli interventi da realizzare sul ponte del fiume Po, in data 23/05/2024 sono state avviate le attività negoziali. In data 04/02/2025 è avvenuta la consegna parziale dei lavori con riferimento ai soli lavori ferroviari. Per i restanti interventi in data 18/04/2025 è avvenuta la consegna dei lavori ad esclusione di quelli insistenti sul sedime stradale.Sono in corso i lavori relativi agli interventi alle opere d'arte con luce inferiore a tre metri nella tratta Milano-Pavia. In data 27/11/2022 è stata attivato l'ACCM nella tratta Pavia (i)-Voghera (e), mentre in data 23/06/2024 è stata attivata la seconda fase relativa all'upgrading dell'ACC di Voghera e della riconfigurazione ACCM Pavia (i)-Voghera (i).

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Riduzione tempi di percorrenza: Genova-Milano in circa 1h, al completamento di tutti gli interventi programmati sull'itinerario (incluso Terzo Valico dei Giovi);Miglioramento della qualità e regolazione della circolazione;Predisposizione linea per successiva installazione dell'ERTMS;Adeguamento prestazionale a modulo 750 metri.



	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lombardia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Progetto P133: Velocizzazione linea Milano-Genova

	CUP	Stato attuativo	Iter procedurale										
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
Velocizzazione Milano-Genova 1ª fase - potenziamento tecnologico e 2ª fase - rettifiche di tracciato e piccole varianti	J84H17000480001	Realizzazione	3-2018	2-2019	1-2018	12-2022	5-2023	7-2024	-	11-2023	12-2019	1-2027	12-2026

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma prevede l'adeguamento prestazionale e il potenziamento tecnologico ed infrastrutturale della Rete TEN-T Core Merci coincidente con il corridoio Mare del Nord - Reno - Mediterraneo, nonché sul linee di adduzione di particolare interesse per il traffico merci. Gli interventi principali consistono in:- rinnovo degli impianti di linea e di stazione con la rimodulazione del distanziamento ed i necessari adeguamenti infrastrutturali dei piani regolatori delle stazioni, attività propedeutiche all'installazione del sistema ERTMS;- velocizzazione delle linee e degli impianti (velocizzazione degli itinerari deviati, realizzazione sottopassi, movimenti contemporanei nelle sedi di incrocio sul semplice binario,...);- adeguamento prestazionale (allungamento modulo di linea, adeguamento sagoma, adeguamento della sede e della piattaforma per riclassifica massa assiale).

Le principali realizzazioni riguardano:A) Risoluzione interferenze stradali linea Luino: soppressione di 15 PL, individuati secondo una lista di priorità condivisa con Regione Lombardia e Provincia di Varese, tramite realizzazione di viabilità alternativa. Gli interventi sono localizzati in: Comune di Ispra e Laveno (soggetto attuatore Provincia Varese); Comune di Luino; Comune di Maccagno; Comune di Sangiano e di Taino-Angera (soggetto attuatore Provincia Varese).B) potenziamento tecnologico Chiasso-Milano (fasi): L'intervento è previsto nella Dichiarazione d'intenti Italia-Svizzera del 18.09.2014. Il progetto prevede la realizzazione dell' ACC-M per la gestione della tratta Monza – Chiasso sia ramo passeggeri sia ramo merci, con sede nel Posto Centrale di Milano Greco Pirelli, il rinnovo tecnologico di tutte le stazioni della linea e del tratto antenna Seregno-Carnate con la contestuale adozione di sistema di distanziamento a 4' ed alcuni interventi di adeguamento infrastrutturale nelle Località di Servizio (modifiche al piano del ferro, modulo a 750m nella stazione di Desio). La seconda fase prevede l'estensione dell'ACCM nella tratta Bivio Rosales -Como S.G.- Chiasso. L'intervento è propedeutico alla successiva installazione dell'ERTMS L2 sovrapposto in prima fase.C) Potenziamento tecnologico Nodo di Genova e linea Milano - Genova (fasi): nell'ambito del nodo di Genova sono previsti i seguenti interventi: realizzazione del PP-ACC di Genova Piazza Principe con adeguamenti PRG, rinnovo del piazzale IS e realizzazione di nuovi fabbricati/locali destinati alle tecnologie; upgrading tecnologico tramite l'inserimento nell'ACCM Centro delle tratte Bivio Fegino – Bivio PC/Bersaglio – Genova Piazza Principe, Ronco Scrivia – Genova Rivarolo; modifica PRG impianto Bivio PC/Bersaglio. Ripristino del binario III nelle stazioni di Genova Pontedecimo e Genova Rivarolo; modifica TE a Q.vio Torbella al fine di rendere indipendenti le linee Bastioni e Sussidiaria; nuovo apparato per Genova S. Limbania sul ferro attuale; integrazione impianti a tecnologia statica con «ACCM Sud» e nuove tratte e RSC; riconfigurazione SCCM Circolazione e D&M del nodo di Genova; upgrading/Riconfigurazioni RBC Terzo Valico e direttrice Genova – Milano; upgrading in tecnologia I&C dei sistemi periferici di Informazione al Pubblico della tratta Genova Rivarolo – Arquata;D) Interventi diffusi di adeguamento prestazionale per lo sviluppo del traffico merci (modulo, massa assiale e sagoma) delle linee del corridoio e di tratte afferenti, in sinergia alle ulteriori realizzazioni previste nell'ambito dei progetti di sviluppo infrastrutturale.

PiemonteLombardiaLiguria

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

A) Risoluzione interferenze stradali linea LuinoIn data 22/12/2020 è stato sottoscritto un nuovo Accordo tra Regione Lombardia, Provincia di Varese e RFI nel quale sono stati ridefiniti i quadri economici e i cronoprogrammi degli interventi. Interventi nel Comune di Ispra: in corso l'attività negoziale.Interventi in Comune di Laveno: i lavori sono in corso.Interventi nel Comune di Luino: lavori in corso, nello specifico i lavori sono sospesi in attesa di risoluzione delle interferenze con i sottoservizi. Interventi in Comune di Maccagno: a seguito dell'esito negativo dell'attività negoziale (gara deserta) si prevede di affidare a Infrarail l'attività di PE e Realizzazione.Interventi di Sangiano: in corso lo sviluppo della PFTE.Interventi in Comune di Taino-Angera: in corso la redazione del PFTE che prevede l'ottenimento di una variante urbanistica finalizzata alla pubblica utilità.B) Potenziamento tecnologico Chiasso-Monza (fasi)A Luglio 2018 è stato attivato l'ACCM tratta Carimate – Chiasso (via Monte Olimpino 2 linea Merci).A Dicembre 2020 è stato attivato l'ACCM tratta Monza – Carimate.A Giugno 2022 è stata attivato l'interfacciamento dell'impianto di Chiasso. Nel mese di gennaio 2025 è stata approvata progettazione esecutiva sviluppata dall'Appaltatore relativa all'ACCM tratta Bivio Rosales – Chiasso via Monte Olimpino 1 (linea passeggeri che transita attraverso Como S. Giovanni). C) Potenziamento tecnologico Nodo di Genova e linea Milano - Genova (fasi)Completamento tecnologico nodo di GenovaSono in corso le attività propedeutiche per la contrattualizzazione degli RBC del Nodo di Genova. Nel mese di gennaio 2025 è stato avviato il PFTE del completamento SCC della tratta S. Quirico-Tortona.Upgrading tecnologico tratta Tortona (e) – Bivio FeginoRevamping ACC Ronco Scrivia (i) e Mignanego(i): è in corso la realizzazione.ACCM S. Quirico (i) - Ronco Scrivia (i): ultimata la progettazione esecutiva da parte dell'appaltatore, sono in corso le attività di verifica.ACCM tratta Ronco Scrivia (e) - Tortona (e) - Cabina: ultimata la progettazione esecutiva da parte dell'appaltatore, sono in corso le attività di verifica.ACCM tratta Ronco Scrivia (e) - Tortona (e) - Piazzale: ultimata la verifica della progettazione esecutiva, sono in corso le attività propedeutiche per la consegna dei lavori.D) Interventi diffusi di adeguamento prestazionale per lo sviluppo del traffico merci In realizzazione: Sagoma Linea Milano – Tortona, modulo linea Torino – Genova (In avvio adeguamento modulo Asti), Sagoma Linea Novara – Alessandria – Novi Ligure, Adeguamento a D4/D4L Trofarello – Fossano – Cuneo/San Giuseppe di Cairo, modulo Novara – Domodossola (via Borgomanero e via Arona) (ultimati lavori Gravellona Toce, Cressa Fontaneto e Borgo Ticino e avviati lavori ACC Baragge), Sagoma Linea Milano – Domodossola (tratta Arona-Domodossola)In progettazione: Modulo Linea Milano – Tortona, Modulo Linea Milano – Domodossola, Sagoma Linea Milano – Domodossola (tratta Domodossola-Iselle), modulo linea Torino – Bussoleno, modulo linea Torino – Milano, modulo Novara – Domodossola (via Borgomanero e via Arona) (In corso progettazione Pettenasco), Sagoma Linea Novara – Domodossola (via Arona) (In progettazione tratta Oleggio-Domodossola); In attività negoziale: Modulo Novara – Alessandria – Novi LigureAttivati: Sagoma Linea Chiasso, Sagoma Linea Luino, Sagoma Linea Milano – Domodossola (tratta Milano-Rho-Gallarate), Modulo Linea Milano – Chiasso, Modulo Linea Luino (porto Valtravaglia), Modulo Linea Luino; Modulo Linea Milano – Chiasso, modulo Novara – Domodossola (Borgo Ticino)

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P221: Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Mare del Nord-Reno-Mediterraneo e linee afferenti

- Efficiamento e potenziamento tecnologico delle infrastrutture- Miglioramento dei livelli di servizio e della sicurezza delle infrastrutture- Adeguamento a STI corridoi merci- Eliminazione colli di bottigliaRisoluzione interferenze stradali linea Luino: miglioramento delle regolarità e aumento della sicurezza.Potenziamento tecnologico Chiasso-Monza: aumento della capacità della linea (da 10 a 12 treni/h), grazie all'adozione di sistema di distanziamento a 4'; miglioramento dei livelli di puntualità e regolarità; omogeneità tecnologica sull'intero itinerario.Potenziamento tecnologico nodo di Genova: completamento dell'upgrading tecnologico su tutto il nodo di Genova ed estensioni delle funzionalità ERTMS; incremento della regolarità della circolazione grazie al rinnovo degli apparati e delle tratte di blocco del Nodo; aumento della potenzialità e dell'omogeneità di gestione delle linee dal Posto Centrale di Genova Teggia; miglioramenti puntuali della circolazione.



	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficiamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Piemonte

Lombardia

Liguria

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica						Obiettivi strategici			
	PNRR	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF
Potenziamento tecnologico linea Chiasso-Milano (fasi)		X	X			X	X	X		
Adeguamento prestazionale (modulo, sagoma, massa assiale) corridoio Reno-Alpi e linee afferenti		X	X			X	X	X		
Potenziamento tecnologico Nodo di Genova e linea Milano - Genova (fasi)		X	X			X		X		
Adeguamento sagoma linea Luino		X	X			X		X		
Adeguamento sagoma linea Domodossola via Arona e altri adeguamenti prestazionali corridoio Reno-Alpi e linee afferenti		X	X			X		X		
Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Mare del Nord-Reno-Mediterraneo e linee afferenti - interventi diffusi		X	X			X		X		

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P221: Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Mare del Nord-Reno-Mediterraneo e linee afferenti

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatiche di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
2.026,85	1.223,86		846,15	62,30	0,00	0,00	26,31	289,10	0,00	224,45	578,54

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
2.006,22		20,63				2.026,85
Variazione del costo ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (aggiunto CUP J37I05000020001 da riga P222)						

Evoluzione coperture finanziarie					
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni
1.204,82		41,26			-22,21
Coprertura dei fabbisogni indifferibili connessi alla prosecuzione del programma					

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Adeguamento prestazionale (modulo, sagoma, massa assiale) corridoio Reno-Alpi e linee afferenti	615,73	588,68	27,05	574,50	41,22	450,58	426,72	286,26	22,92	38,91	24,93	26,10	64,30	188,06
Potenziamento tecnologico linea Chiasso-Milano (fasi)	94,00	94,00	0,00	81,88	12,12	74,20	56,95	42,79	8,21	4,95	2,60	1,06	15,90	32,81
Adeguamento sagoma linea Luino	120,00	120,00	0,00	117,62	2,38	119,78	119,61	100,86	13,34	5,34	0,09	0,00	30,64	0,38
Potenziamento tecnologico Nodo di Genova e linea Milano - Genova (fasi)	170,08	110,00	60,08	121,73	48,35	16,70	7,00	0,00	1,21	0,31	0,72	1,19	5,00	162,82
Adeguamento sagoma linea Domodossola via Arona e altri adeguamenti prestazionali corridoio Reno-Alpi e linee afferenti	206,41	206,41	0,00	201,62	4,79	91,68	52,82	20,47	12,60	4,67	1,66	1,00	25,47	154,85
Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Mare del Nord-Reno-Mediterraneo e linee afferenti - interventi diffusi	820,63	104,77	715,86	26,04	794,59	19,43	19,04	7,38	0,34	7,55	1,87	0,78	11,13	801,56
	2.026,85	1.223,86	802,98	1.123,39	903,46	772,38	682,14	457,76	58,62	61,73	31,87	30,13	46,25	1.340,49

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Interventi upgrading della rete merci - MI	J37I05000020001	215,40	215,40	100%	195,76	91%	In ultimazione
Interventi upgrading della rete merci - TO	J47I05000020001	143,29	143,29	100%	104,74	73%	Realizzazione
Upgrading prestazionale corridoio Reno - Alpi - Milano	J84H17001080001	83,60	83,60	100%	81,13	97%	In ultimazione
Upgrading prestazionale corridoio Reno-Alpi-Torino	J94H17000420001	65,03	55,93	86%	2,18	4%	Realizzazione
Risoluzione interferenze stradali valico di Luino	J84H17000290001	61,00	43,05	71%	11,23	26%	Realizzazione
TO - upgrading linee merci	J67I17000020001	26,73	26,73	100%	24,49	92%	In ultimazione
Upgrading prestazionale corridoio Reno-Alpi-Genova	J34H17000720001	17,98	17,98	100%	9,14	51%	Realizzazione
Upgrading prestazionale corridoio Reno-Alpi (adeguamento modulo e sagoma linea - ulteriore fase)	J94H14000240001	2,70	2,70	100%	2,70	100%	In ultimazione
Adeguamento prestazionale (modulo, sagoma, massa assiale) corridoio Reno-Alpi e linee afferenti		615,73	588,68	96%	431,37	73%	
Potenziamento tecnologico linea Chiasso-Monza	J74F13000000001	94,00	94,00	100%	61,20	65%	Realizzazione
Potenziamento tecnologico linea Chiasso-Milano (fasi)		94,00	94,00	100%	61,20	65%	
Upgrading prestazionale corridoio Reno-Alpi (adeguamento modulo e sagoma linea - ulteriore fase)	J94H14000240001	120,00	120,00	100%	119,62	100%	In ultimazione
Adeguamento sagoma linea Luino		120,00	120,00	100%	119,62	100%	
Completamento tecnologico nodo di Genova	J34E21001960001	100,00	40,00	40%	0,06	0%	Progettazione
Upgrading tecnologico della tratta Tortona (esclusa) - bivio Fegino	J96E19000010009	70,08	70,00	100%	8,20	12%	Realizzazione
Potenziamento tecnologico Nodo di Genova e linea Milano - Genova (fasi)		170,08	110,00	65%	8,25	8%	
MI - upgrading linee merci	J97J18000070001	206,41	206,41	100%	57,26	28%	Realizzazione
Adeguamento sagoma linea Domodossola via Arona e altri adeguamenti prestazionali corridoio Reno-Alpi e linee afferenti		206,41	206,41	100%	57,26	28%	
Completamento upgrading direttrice Liguria - Alpi		793,25	81,89	10%	0,00	0%	Progettazione
GE - upgrading linee viaggiatori	J97I17000060001	20,38	20,38	100%	19,09	94%	In ultimazione

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P221: Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Mare del Nord-Reno-Mediterraneo e linee afferenti

Modifica del sistema di alimentazione elettrica della stazione di Ventimiglia	J34J23000580001	7,00	2,50	36%	0,01	0%	Progettazione
Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Mare del Nord-Reno-Mediterraneo e linee afferenti - interventi diffusi		820,63	104,77	13%	19,10	18%	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto ricomprende gli interventi di sviluppo del nodo ferroviario di Genova, il Terzo Valico dei Giovi e i collegamenti di ultimo miglio con il Porto storico di Genova in coerenza con quanto disposto dal DL n. 32/2019 "Sblocca cantieri". L'intervento è articolato in tre macro-interventi: - Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole; - Potenziamento scalo Campasso e itinerario Bivio Fegino – Parco Campasso – ex bivio S.Limbania; - Tratta AV/AC Terzo valico dei Giovi.

In particolare il progetto è suddiviso in interventi nel Nodo e nella Tratta. **Nodo** La realizzazione degli interventi del Nodo permetterà un aumento della capacità delle linee afferenti il Nodo di Genova, con un potenziale conseguente incremento della frequenza dei treni, attraverso la separazione dei treni regionali e metropolitani da quelli a lunga percorrenza e treni merci, nonché il collegamento tra l'ultimo miglio del Terzo Valico dei Giovi e il Porto di Prà –Voltri e il porto storico di Genova. In particolare il progetto prevede: quadruplicamento della linea Genova-Ventimiglia tra le stazioni di Voltri e Sampierdarena mediante la realizzazione della nuova Galleria Polcevera quale prolungamento, lato levante, della bretella di Prà, con allaccio verso est alla linea succursale dei Giovi in prossimità del Bivio Polcevera. Realizzazione dell'ACC su ferro attuale a Sampierdarena; sestuplicamento della tratta Principe - Brignole mediante il prolungamento delle due esistenti gallerie S.Tomaso e Colombo fino a Genova Brignole, eliminando di fatto le attuali interferenze a raso generate agli innesti delle predette gallerie all'interno delle Gallerie Traversata Nuova e Traversata Vecchia. Realizzazione dell'ACC su ferro attuale a Genova Brignole; sistemazione a PRG della stazione di Voltri; adeguamento/riattivazione dell'itinerario Bivio Fegino- Parco Campasso – ex Bivio S. Limbania e potenziamento dello Scalo Campasso con realizzazione di 8 binari a modulo 750 metri centralizzati e controllati dal nuovo ACC di stazione su un' area di circa 48.500 mq complessivi. **Tratta** A partire dal Bivio Fegino e fino alla Piana di Novi, tranne un breve tratto allo scoperto nel comune di Arquata Scrivia, in corrispondenza di Libarna, la nuova linea si sviluppa attraverso la Galleria di Valico e Galleria Serravalle per poi correre allo scoperto fino alla galleria artificiale di Pozzolo e quindi svilupparsi, di nuovo all'aperto, fino all'innesto sulla esistente linea Pozzolo – Tortona. A Novi Ligure e' altresì prevista l'interconnessione con la linea storica Genova – Torino. Le opere principali del Progetto Terzo Valico dei Giovi sono: Galleria di Valico (27 km): doppia canna, by-pass ogni 500 m e 4 finestre di accesso intermedio (per motivi costruttivi e di sicurezza); Galleria di Serravalle (7 km): doppia canna, by-pass ogni 500 m; Galleria Artificiale Pozzolo (2 km).

Il Terzo Valico, di lunghezza complessiva di circa 53 km, attraversa 2 regioni (Liguria e Piemonte) 2 province (Genova e Alessandria) e 14 comuni, ha origine nel Nodo di Genova in corrispondenza del Bivio Fegino e si sviluppa fino alla piana di Novi interamente in galleria, ad eccezione di un unico breve tratto allo scoperto nel comune di Arquata Scrivia in corrispondenza di Libarna. **Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole** è suddiviso in tre aree di intervento ognuna con una sua autonoma funzionalità: **¶ Quadruplicamento Voltri - Sampierdarena:** costituito dal prolungamento, lato levante, della bretella di Genova Voltri, con allaccio verso est alla linea succursale dei Giovi in prossimità del Bivio Polcevera e realizzazione del quadruplicamento della linea Genova-Ventimiglia tra le stazioni di Voltri e Sampierdarena. **¶ Sestuplicamento Genova P.Principe - Genova Brignole:** costituito dalla realizzazione di due nuove gallerie di collegamento tra le stazioni di Principe e Brignole e relativo adeguamento del PRG di Brignole (1° fase); **¶ PRG finale di Voltri:** consistente nella realizzazione di nuova stazione di Genova Voltri, una nuova fermata Palmaro e il potenziamento dello scalo di Prà mare. Il parco ferroviario denominato "Parco Campasso" è situato nella parte occidentale rispetto allo sviluppo longitudinale della città di Genova, in corrispondenza dello sbocco verso il mare del corridoio appenninico della direttrice di Bolzaneto e dei Giovi, che dal punto di vista morfologico corrisponde al basso corso del torrente Polcevera, che sfocia poco a valle nel Mar Tirreno, tra il bacino di Sampierdarena ad Est e la zona industriale Cornigliano. Il potenziamento dello scalo retroportuale di Campasso è finalizzato all'efficientamento delle interconnessioni tra la rete ferroviaria ed il porto di Genova ed è inserito nell'ambito degli interventi datti a garantire il collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico, la Linea Succursale dei Giovi e la tratta ferroviaria Bivio Fegino – Campasso – Porto Storico. Il Potenziamento Genova - Campasso prevede il ripristino del collegamento ferroviario, di lunghezza complessiva pari a circa 5km, a doppio binario tra B. Fegino e Parco Rugna in area portuale. L'intervento prevede inoltre il ripristino e il potenziamento dello Scalo di Campasso con modulo 750m.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

• **Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi:** Relativamente al Terzo valico dei Giovi, ad oggi sono in realizzazione tutti e 6 i lotti costruttivi con un avanzamento economico, compresi i lavori di cui al XIII Atto Modificativo, pari a circa il 60%. L'avanzamento complessivo degli scavi al 31.05.2025 è pari a circa il 90% su 87,5 km totali. Per quanto riguarda gli interventi relativi al PRG di Rivalta Scrivia ad Agosto 2021 è stato attivato l'ACC compreso l'adeguamento a modulo 750 mt dei binari 4 e 5 (Fase 3). In data 23/12/2023 è avvenuta l'attivazione di: PRG di Rivalta Scrivia, tratta a singolo binario Rivalta-Bivio Tortona e innesto del Terzo Valico a Bivio Tortona sulla linea storica Alessandria-Piacenza. In data 14.12.2023 è stato stipulato con il GC il Tredicesimo Atto Modificativo. In data 09/06/2024 è stato attivato il doppio binario del tratto Rivalta-Bivio Tortona. • **Nodo di Genova:** Sestuplicamento Genova Principe-Genova Brignole In data 26/06/2020 sono stati affidati al GC Consorzio COCIV i lavori di completamento delle opere civili delle Gallerie Colombo e S. Tomaso, per le quali sono in via di ultimazione le opere di finitura ed accessorie. In data 30/06/2024 è stato attivato l'ACCM-M su ferro attuale di Genova Brignole. Nel mese di dicembre 2024 è stata avviata la progettazione del completamento del PRG di Brignole e Terralba (fuori dal perimetro del Progetto Unico). **Quadruplicamento Voltri-Sampierdarena** Nel 2016 è stato attivato l' ACCM di Voltri. In data 22/11/2022 è stata affidata al GC la progettazione ed esecuzione dei lavori del Quadruplicamento della tratta Voltri-Sampierdarena e della Galleria Facchini 1 (già attivata ad agosto 2023). È completata la realizzazione del Camerone d'innesto del binario d'interconnessione pari del Terzo Valico con la galleria Polcevera e sono in fase realizzativa l'armamento e le attività tecnologiche di seconda fase all'interno del prolungamento della bretella di Prà. In data 07/01/2025 è stato attivato l'innesto in corretto tracciato della Bretella di Prà. **Collegamento Bivio Fegino-Campasso-Porto storico** Per quanto riguarda l'itinerario Campasso in data 15/11/2023 è stato firmato il Quinto Atto integrativo con il GC e ad oggi risultano avviate le attività realizzative da parte del General Contractor e sono in fase di completamento le restanti attività propedeutiche. Completano funzionalmente il progetto gli interventi di adeguamento del collegamento fra Calata Sanità-Bettolo e Bivio S. Limbania, fuori perimetro del Progetto Unico, ma oggetto della Convenzione tra RFI e AdSP del 19/01/2019;

Progetto P234: Nodo di Genova e Terzo valico dei Giovi

sono stati consegnati i lavori per fasi; sono in corso gli interventi di adeguamento della Galleria Molo Nuovo, di realizzazione del nuovo fabbricato ACC e di risoluzione delle interferenze con le condotte idriche e del gas. Inoltre, a seguito del rinvenimento del Molo Nuovo sono in corso le interlocuzioni con la Soprintendenza. In data 11/12/2024 sono state contrattualizzate con il General Contractor le Opere Tecnologiche dell'itinerario Campasso e, a seguito dell'emissione del decreto di approvazione del progetto definitivo da parte del Commissario Straordinario, la nuova copertura del tratto di linea in prossimità di Via Ardoino. Ad oggi risultano avviate le attività realizzative da parte del General Contractor e sono in fase di completamento le restanti attività propedeutiche. PRG di Voltri Il PRG di Genova Voltri è suddiviso in due Fasi funzionali: La prima fase, relativa ad alcuni interventi tecnologici e del piano del ferro nell'attuale impianto di Genova Prà, è stata completata. La seconda fase prevede il completamento del potenziamento dello scalo merci in configurazione con 7 binari a modulo 750 m, il completamento del piano del ferro e degli interventi tecnologici connessi oltre alla realizzazione della nuova stazione di Genova Prà e la nuova fermata di Genova Palmaro. In merito al potenziamento del Fascio Merci di Voltri a dicembre 2019 è stato attivato il raddoppio del binario d'ingresso al PSA (Voltri Terminal) e ad aprile 2023 è stato attivato il segnalamento alto. Relativamente alla seconda fase, è stato ultimato lo sviluppo del PFTE del PRG di Voltri ed è in corso la Progettazione Definitiva a cura del GC. •Potenz. Infrastrutturale Voltri-Brignole (fase): La prima fase del progetto, relativa ad alcuni interventi tecnologici e del piano del ferro nell'attuale impianto di Genova Prà, è stata completata. In merito al potenziamento del Fascio Merci di Voltri a dicembre 2019 è stato attivato il raddoppio del binario d'ingresso al PSA (Voltri Terminal), a Dicembre 2020 sono stati attivati in assetto definitivo il 5° e 6° binario del fascio arrivi/partenze e il completamento del raddoppio del collegamento di ingresso al porto con i restanti due binari del fascio. Ad aprile 2023 è stato attivato il segnalamento alto. In data 30/06/2024 è stato attivato l'ACCM-M su ferro attuale di Genova Brignole. Nel mese di dicembre 2024 è stata avviata la progettazione del completamento del PRG di Brignole e Terralba. Sono in corso attività relative all'affidamento degli incarichi riguardo agli interventi di bonifica della falda del sito ferroviario di Genova Terralba. •Collegamento Porto Storico-Bivio Fegino (Conto Terzi): Completano funzionalmente il progetto gli interventi di adeguamento del collegamento fra Calata Sanità-Bettolo e Bivio S. Limbania, fuori perimetro del Progetto Unico, ma oggetto della Convenzione tra RFI e AdSP del 19/01/2019. Ad oggi risultano avviate le attività realizzative da parte del General Contractor e sono in fase di completamento le restanti attività propedeutiche. •Parco Rugna (Conto Terzi): Il 19/12/2022 sono stati consegnati i lavori di fase A (cantierizzazioni, bonifica ordigni bellici, demolizione fabbricati e pensiline), a Maggio 2023 sono stati consegnati i lavori della fase B1 (galleria Molo Nuovo) in data 29/07/2024 è avvenuta la consegna totale dei lavori, attualmente in corso. Sono in corso le attività per la stipula del CA su un nuovo AQ per la realizzazione degli interventi di cabina. In data 01/08/2024 è stato stipulato il Contratto Applicativo di Armamento ed è attualmente in corso la progettazione degli interventi.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Il progetto consentirà il superamento dei limiti prestazionali delle linee di collegamento tra la città di Genova e la pianura Padana e il riassetto complessivo del nodo e dei collegamenti con il porto storico e con il terminal di Voltri. Nello specifico gli interventi consentiranno: - Eliminazione dei colli di bottiglia nel nodo di Genova, grazie alla separazione dei flussi di traffico passeggeri a lunga percorrenza e merci da quelli metropolitani-regionali e all'incremento dell'offerta di trasporto e della frequenza dei treni regionali e metropolitani (da 10 a 12 treni/h sulla relazione Voltri-Brignole);- Unitamente agli altri interventi programmati sulla direttrice al medesimo orizzonte temporale gli interventi consentiranno: incremento capacità secondo obiettivi di servizio AQ vigenti RFI-Regioni Lombardia e Liguria; tempi di percorrenza LP GE-MI in circa 1h10'; riduzione tempi di percorrenza tra Torino e Genova per i servizi lunga percorrenza; incremento prestazioni merci (capacità, modulo 750 metri, P/C 80 e massa assiale D4) tra il sistema portuale di Genova e la pianura padana;- Potenziamento dell'impianto retroportuale di Genova Campasso, del Fascio Merci di Genova Voltri e dell'impianto di Rivalta Scrivia con possibilità di gestire treni completi a standard 740 m direttamente da/per gli impianti di origine/destino- Miglioramento del governo del traffico grazie alla realizzazione delle nuove tecnologie e piena interoperabilità grazie all'adozione di ERTMS L2.



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	X
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Piemonte
Liguria

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Progetto P234: Nodo di Genova e Terzo valico dei Giovi

CRONOPROGRAMMA						
CUP	Stato attuativo		Iter procedurale			
	Prog.Prel.	Prog.Def.	Prog.Esec.	Attiv.Negoz.	Esecuzione	Funzionalità

Progetto P234: Nodo di Genova e Terzo valico dei Giovi

[illegible]

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto comprende :- il raddoppio delle tratta San Lorenzo – Ospedaletti; - il raddoppio della tratta Andora – San Lorenzo; Il raddoppio della tratta Andora – San Lorenzo si configura come l'estensione del raddoppio del tratto San Lorenzo – Ospedaletti dell'estesa di circa 24 Km attivato nel 2001. Il tracciato tra San Lorenzo e Andora si sviluppa in variante per circa 19 km, di cui circa 16 km in galleria. Sul nuovo tracciato sono collocate la nuova stazione di Imperia, la fermata di Diano e la stazione di Andora, punto di connessione con la linea in esercizio verso Genova.

Inquadramento territoriale Il raddoppio della linea fra S. Lorenzo al Mare ed Andora si sviluppa, completamente in variante rispetto al tracciato storico, su un tratto di circa 19 km, di cui 16 km in galleria. La morfologia del territorio, ha comportato inoltre la realizzazione di viadotti per la presenza dei torrenti che intervallano le nuove gallerie lungo linea. Sul nuovo tracciato sono collocate la stazione di Imperia, che sostituisce le due attuali stazioni cittadine di Oneglia e Porto Maurizio, la fermata di Diano e la stazione di Andora, punto di connessione con la linea in esercizio verso Genova. Tipologia di opere La nuova opera contribuirà all'aumento della capacità di traffico, alla riduzione dei tempi di percorrenza, all'ammodernamento degli standard prestazionali ed all'incremento dei livelli di sicurezza (eliminazione dei passaggi a livello, eliminazione tratte esposte a erosione marina e a rischi idrogeologici, adeguamento standard idraulici delle opere d'arte, attrezzaggio di sicurezza delle gallerie).

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Nel 2001 è stato attivato il raddoppio nella tratta San Lorenzo – Ospedaletti. Nel 2016 è stato attivato il raddoppio nella tratta Andora – San Lorenzo.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

La realizzazione ha reso possibile l'aumento della capacità di traffico, la riduzione dei tempi di percorrenza, ammodernamento degli standard prestazionali e l'incremento dei livelli di sicurezza (eliminazione dei passaggi a livello sulle tratte costiere dismesse, eliminazione tratte esposte a erosione marina e a rischi idrogeologici, adeguamento standard idraulici delle opere d'arte, attrezzaggio di sicurezza delle gallerie).



Capacità	X
Velocità	
Accessibilità	
Regolarità	
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Liguria

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica		Obiettivi strategici	
	PNRR	Accordi Internazionali Interventi commissariati	Allegato MINS al DEF Tavoli tecnici di ascolto Altri Provvedimenti* Cofinanziamenti UE UE - workplan corridoi TEN-T AQ per l'utilizzo della capacità Fondo Sviluppo e Coesione Accordi EE.II. Accordi Internazionali	Alta Velocità (AV) Completamento valichi alpini Sviluppo corridoi TEN-T Potenziamento connessioni merci Sistemi regionali e metropolitani Sviluppo tecnologico Adeguamento a standard tecnici Resilienza al climate change Accessibilità e qualità stazioni Coesione sociale e territoriale
Raddoppio Andora - S.Lorenzo e completamento raddoppio S.Lorenzo - Ospedaletti			X	X

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0077: Raddoppio Genova-Ventimiglia 1^ fase

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve Priorità 1	Priorità 2	
691,53	690,00		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
691,53						691,53

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
690,00						690,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Andora - S.Lorenzo e completamento raddoppio S.Lorenzo - Ospedaletti	691,53	690,00	1,53	521,43	170,10	672,46	632,00	664,08	1,50	1,21	1,81	0,86	6,89	21,46
	691,53	690,00	1,53	521,43	170,10	672,46	632,00	664,08	1,50	1,21	1,81	0,86	0,62	21,46

CRONOPROGRAMMA

CUP	Stato attuativo				Iter procedurale									
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione	Funzionalità
					Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine
Raddoppio Andora - S.Lorenzo e completamento raddoppio S.Lorenzo - Ospedaletti	J71H92000020008	Esercizio	-	-	11-1999	4-2025	11-1999	9-2025	12-2010	4-2014	3-2004	4-2019	12-2016	

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025
Progetto 0289: Completamento raddoppio Genova-Ventimiglia: tratta Andora-Finale Ligure

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede la realizzazione del raddoppio della tratta Andora-Finale dell'estesa di 31,4 km, di cui 24 km in galleria, completamente in variante rispetto al tracciato attualmente in esercizio. Nell'ambito del progetto è compresa anche la realizzazione della nuova stazione di Albenga e delle fermate di Alassio (in galleria), Borghetto - Ceriale - Loano e Pietra Ligure. Saranno soppressi n° 14 Passaggi a Livello. Verranno dismessi gli impianti di Laigueglia, Alassio, Albenga, Ceriale, Borghetto S. Spirito, Pietra Ligure e BORGIO VEREZZI.

Inquadramento territoriale Il progetto prevede la realizzazione del raddoppio della tratta Andora-Finale dell'estesa di km 31,4, di cui 25 km in galleria, completamente in variante rispetto al tracciato attualmente in esercizio. Nell'ambito del progetto è compresa anche la realizzazione della nuova stazione di Albenga e delle fermate di Alassio (in galleria), Borghetto - Ceriale - Loano e Pietra Ligure. Tipologia di opere La nuova opera contribuirà all'aumento della capacità di traffico, alla riduzione dei tempi di percorrenza, all'ammodernamento degli standard prestazionali ed all'incremento dei livelli di sicurezza (eliminazione dei passaggi a livello, eliminazione tratte esposte a erosione marina e a rischi idrogeologici, adeguamento standard idraulici delle opere d'arte, attrezzaggio di sicurezza delle gallerie).


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

A Dicembre 2021 è stata completata la rivisitazione della progettazione con l'adeguamento tecnico/funzionale alle più recenti norme e alle specifiche tecniche di interoperabilità ed è stato reiterato il vincolo preordinato all'esproprio. Ad esito della progettazione è emersa una nuova stima del costo a vita intera del progetto. La Regione Liguria ha trasmesso la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1233 del 23/12/2021 con la quale ha espresso l'intesa sulla localizzazione dell'opera. In data 12/07/2024 è stato inviato il progetto al Consiglio dei Lavori Pubblici. In data 29/07/2024 è stata sottoscritta l'Ordinanza da parte del Commissario Straordinario ai fini dell'avvio dell'iter autorizzativo. In data 06/08/2024 sono state avviate le procedure di VIA delle parti variate del PD rispetto al PP e di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nella Delibera CIPE n. 91 del 29 luglio 2005. È in corso l'aggiornamento del progetto che recepirà le osservazioni sulla viabilità espresse dal CSLLPP per successiva condivisione con il MASE e convocazione della CdS. Sono stati effettuati incontri specifici con i Comuni di Albenga e Borghetto Santo Spirito per esporre e concordare le modifiche ad alcune viabilità che verranno presentate in sede di Conferenza di Servizi.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

La realizzazione del progetto contribuirà all'aumento della capacità di traffico, alla riduzione dei tempi di percorrenza, all'ammodernamento degli standard prestazionali, all'incremento dei livelli di sicurezza (eliminazione dei passaggi a livello presenti sulla tratta costiera da dismettersi, eliminazione tratte esposte a erosione marina e a rischi idrogeologici, adeguamento standard idraulici delle opere d'arte, attrezzaggio di sicurezza delle gallerie).

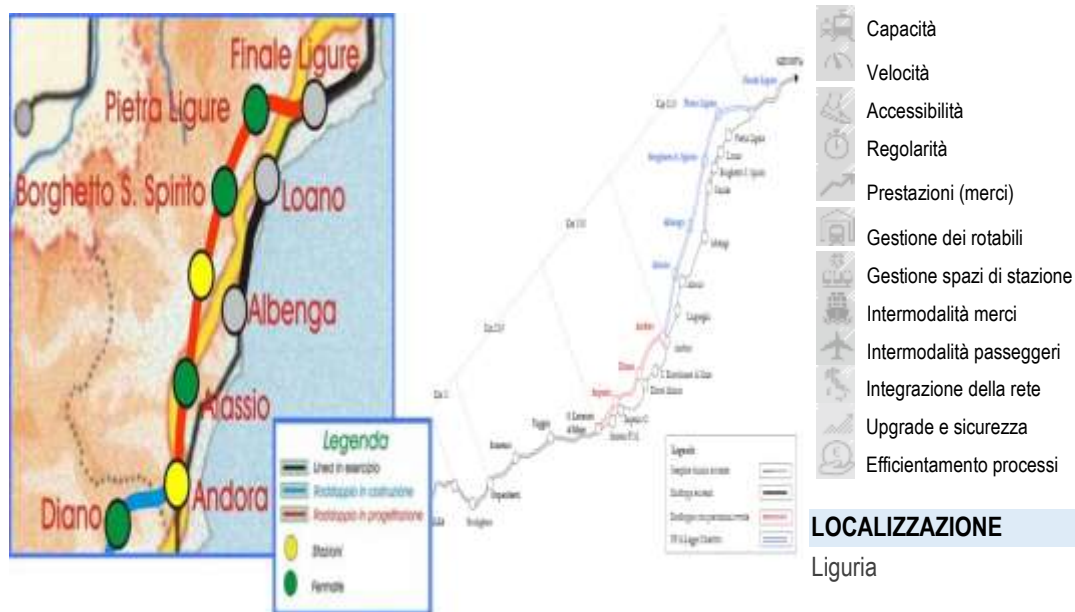

LOCALIZZAZIONE

Liguria

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0289: Completamento raddoppio Genova-Ventimiglia: tratta Andora-Finale Ligure

	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change	Adeguamento a standard tecnici	Sviluppo tecnologico	Sistemi regionali e metropolitani	Potenziamento connessioni merci	Sviluppo corridoi TEN-T	Completamento valichi alpini	Alta Velocità (AV)
Intervento / Opere funzionali																					
Raddoppio Andora-Finale Ligure	X					X				X							X			X	

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve				
								Priorità 1	Priorità 2			
2.576,00	51,00	di cui:	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00		

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE												milioni di euro	
Evoluzione Costo													
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze							CdP-I agg.2025	
2.416,60			159,40									2.576,00	Variazione del costo dovuta all'aggiornamento del quadro economico alle nuove Tariffe.
Evoluzione coperture finanziarie													
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni							CdP-I agg.2025	
51,00												51,00	

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Andora-Finale Ligure	2.576,00	51,00	2.525,00	2.243,86	332,14	48,91	37,56	29,75	0,01	0,03	7,87	6,04	5,00	2.532,00
	2.576,00	51,00	2.525,00	2.243,86	332,14	48,91	37,56	29,75	0,01	0,03	7,87	6,04	0,30	2.532,00

CRONOPROGRAMMA														
CUP					Stato attuativo									
					Iter procedurale									
					Prog.Prel.	Prog.Def.	Prog.Esec.	Attiv.Negoz.	Esecuzione	Funzionalità				
					Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
Raddoppio Andora-Finale Ligure	J71J04000000008	Iter autorizzativo	8-2002	7-2005	10-2005	4-2026	-	-	7-2026	3-2027	3-2027	9-2035	3-2035	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma prevede l'adeguamento prestazionale e il potenziamento tecnologico ed infrastrutturale della Rete TEN-T Core Merci coincidente con il corridoio Mare del Nord - Reno - Mediterraneo, nonché sul linee di adduzione di particolare interesse per il traffico merci. Gli interventi principali consistono in:- rinnovo degli impianti di linea e di stazione con la rimodulazione del distanziamento ed i necessari adeguamenti infrastrutturali dei piani regolatori delle stazioni, attività propedeutiche all'installazione del sistema ERTMS- velocizzazione delle linee e degli impianti (velocizzazione degli itinerari devianti, realizzazione sottopassi, movimenti contemporanei nelle sedi di incrocio sul semplice binario,...)- adeguamento prestazionale (allungamento modulo di linea, adeguamento sagoma, adeguamento della sede e della piattaforma per riclassifica massa assiale).

Le principali realizzazioni riguardano: A) potenziamento tecnologico della direttrice Torino-Padova: insieme di interventi tra cui alcuni a carattere infrastrutturale per l'adeguamento di impianti, la rivisitazione del sistema di distanziamento su alcune tratte conseguenti alla modifica del modello di esercizio o per omogeneità, la riconfigurazione e/o modifica degli apparati compresa la riconfigurazione del sistema ACCM/SCCM e modifica all'assetto della giurisdizione dei Posti Centrali tra cui quelli di Milano e Verona. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di tutte le tecnologie per gli impianti della direttrice e del Posto Centrale di comando/controllo di Milano, con il rinnovo della maggior parte degli impianti di linea e di stazione e con la rimodulazione del distanziamento ed i necessari adeguamenti infrastrutturali dei piani regolatori delle stazioni. Nello stesso ambito vengono attrezzati i nodi di Torino e Milano. B) ACC di Verona PN e ACC-M di Nodo: L'intervento in oggetto, prevede: 1. Sostituzione delle 4 cabine (ACEI-ACE) con un nuovo apparato a tecnologia computerizzata (PPACC); 2. Ampliamento dell'attuale Posto Centrale di Verona mediante costruzione di nuovo fabbricato ad esso attiguo con nuovi locali atti ad ospitare le postazioni operatore per la gestione della circolazione di competenza di Circolazione Area Verona; 3. Realizzazione del nuovo SCCM per una migliore gestione della circolazione ferroviaria nell'area di competenza di Circolazione Area Verona; 4. Realizzazione dell'ACCM di Nodo e ACC Bivi Dossobuono, San Massimo e Santa Lucia. C) ACC Verona Quadrante Europa: L'intervento in oggetto, prevede la sostituzione dell'ACEI con un nuovo apparato a tecnologia computerizzata (ACC) che dovrà garantire tutti gli itinerari ed i movimenti contemporanei consentiti dall'attuale piano del ferro. L'attrezzaggio di Verona QE con il nuovo apparato ACC si prefigura come un mero upgrade tecnologico, riferito sostanzialmente all'attuale stato del ferro, necessario per rendere possibili gli interventi infrastrutturali previsti in altri progetti di investimento e finalizzati al potenziamento funzionale dello scalo stesso ed alla realizzazione dei lavori della nuova penetrazione AV/AC Brescia – Verona. D) Nuovo PRG di Padova C.le: L'intervento complessivo di modifica e adeguamento del PRG esistente della stazione di Padova C.le interessa l'area dell'impianto attuale con estensione verso sud in direzione Bologna fino all'impianto di Padova Campo Marte e verso nord sulla linea per Bassano del Grappa fino al Bivio Altichiero. Ad ovest, in direzione Milano, l'intervento è delimitato dal tratto d'ingresso della futura linea AV/AC Brescia-Verona-Padova, prevista in affiancamento alla linea storica. L'ingresso dei futuri binari AV in stazione è previsto con il sottoattraversamento delle attuali linee Padova Campo Marte – Bivio Altichiero e Padova – Bassano, superate le quali i nuovi binari risalgono repentinamente verso la parte centrale dell'impianto per terminare con l'allaccio a nord sui binari alti della stazione. Il nuovo assetto dei marciapiedi prevede complessivamente 10 binari, con il posizionamento dei nuovi binari AV nella parte alta di stazione e la realizzazione di un nuovo marciapiede esterno all'ultimo binario; E) Interventi diffusi di adeguamento prestazionale per lo sviluppo del traffico merci (modulo, massa assiale e sagoma) delle linee del corridoio e di tratte afferenti, in sinergia alle ulteriori realizzazioni previste nell'ambito dei progetti di sviluppo infrastrutturale.

Piemonte Lombardia Liguria Veneto Friuli Venezia Giulia

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

A) Potenziamento tecnologico della direttrice Torino-Padova Interventi già attivati: Posto Centrale di Milano Greco Pirelli, tratta Pioltello – Romano, Nodo di Milano, tratta Brescia(e) -Sommacampagna, tratta Avigliana – Torino P.S., tratta Verona P.N. – Padova, Nodo di Torino, tratta Rho (e) – Novara (e), tratta Carmagnola – Torino Porta Susa (e), tratta Romano (e) – Ospitaletto, tratta Milano G.P. – Monza Remotizzazione delle postazioni operatore presso il PCS di Verona per la gestione della tratta Brescia – Verona (Sommacampagna), estensione del SCCM nella tratta Carimate – Chiasso e della tratta Monza - Carimate, realizzazione di nuovo marciapiede a servizio del binario 13 nella stazione di Milano Greco Pirelli, modifiche al PRG di Rovato, sostituzione dei teleindicatori nella stazione di Padova C.le. Tratta Torino P.S.(i) – Torrazza(e): in corso i lavori. Interfacciamento CTC Chivasso-Aosta con il nuovo PP-ACC di Chivasso: terminata verifica del Progetto Esecutivo. Si procederà a stretto giro con la Consegna dei Lavori. Realizzazione di un nuovo Posto di Rilevamento RTB ed adeguamenti tecnologici all'impianto RTB di Chivasso: in chiusura verifica della Progettazione Esecutiva. B) ACC di Verona PN e ACC-M di Nodo 1. Consegna lavori eseguita a dicembre 2022. In corso la realizzazione. 2. Ultimata la progettazione esecutiva, sono in corso le attività di verifica. In corso la progettazione definitiva relativa allo spostamento degli apparati tecnologici (banchi, server, cablaggi) dall'attuale fabbricato al nuovo fabbricato. 3. Completate le prime 2 fasi di attivazione dell'SCC-M (Brennero e BS-PD), in data 04/04/2025 sono stati consegnati i lavori. 4. Da avviare la progettazione definitiva. C) ACC Verona Quadrante Europa Ultimata la Progettazione Definitiva. A gennaio 2025 è stata ultimata l'attività negoziale, in data 17/03/2025 è stata avviata la progettazione esecutiva. D) Nuovo PRG di Padova C.le Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica è stato ultimato. È in corso la predisposizione della documentazione per l'avvio del Dibattito Pubblico. E) Interventi diffusi di adeguamento prestazionale per lo sviluppo del traffico merci In realizzazione: modulo Brescia-Verona-Padova (Sommacampagna, Verona Porta Nuova, Progettazione a Verona Porta Vescovo, Vicenza), massa assiale Padova-Bologna, In progettazione: modulo Padova – Bologna, modulo Padova – Venezia – Trieste, massa assiale Venezia – Trieste, modulo Linea Milano – Piacenza; Attivati: Sagoma linea Milano-Piacenza;

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Efficientamento e potenziamento tecnologico delle infrastrutture- Miglioramento dei livelli di servizio e della sicurezza delle infrastrutture- Adeguamento a STI corridoi merci- Eliminazione colli di bottiglia Gli interventi previsti consentono migliore fluidità nella circolazione; regolarità di

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P222: Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Mediterraneo e linee afferenti

esercizio e miglioramento dei livelli di puntualità; aumento di capacità della linea. Potenziamento tecnologico Torino-Padova: migliore fluidità nella circolazione; regolarità di esercizio e miglioramento dei livelli di puntualità; aumento di capacità della linea; adeguamento modulo di linea a 750 m. ACC di Verona PN e ACC-M di Nodo: In particolare le realizzazioni consentiranno: -un miglioramento della gestione degli impianti di circolazione; -l'incremento degli standard di regolarità, puntualità e qualità del traffico ferroviario; -la gestione delle modifiche all'impianto di Verona Porta Nuova finalizzate a migliorare la gestione del traffico all'interno del Nodo di Verona ed a consentire la realizzazione della penetrazione della linea AV/AC Brescia - Verona - Padova nella località di Verona Porta Nuova (interventi previsti in altri progetti di investimento). ACC Verona QE: In particolare la realizzazione del nuovo ACC di Verona Quadrante Europa consentirà: -un miglioramento della gestione degli impianti sia in fase normale sia in fase di degrado; -l'incremento degli standard di regolarità, puntualità e qualità del traffico ferroviario; -la gestione delle modifiche all'impianto di Verona Quadrante Europa finalizzate a migliorare i movimenti con i Terminal ed a consentire la realizzazione della penetrazione della linea AV/AC Brescia - Verona - Padova nel Nodo di Verona (interventi previsti in altri progetti di investimento). Nuovo PRG di Padova C.le: gli interventi in progetto hanno come finalità quella di consentire la compatibilità plano-altimetrica dei futuri binari AV in ingresso da ovest. La configurazione del nuovo PRG consentirà, inoltre, la separazione tra i flussi AV e Regionali, aumentando così anche la capacità complessiva anche a beneficio dei treni merci.



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Piemonte
Lombardia
Liguria
Veneto
Emilia Romagna

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica						Obiettivi strategici			
	PNRR	Accordi Internazionali Interventi commissariati	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Altri Provedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)
Linea Torino-Padova: potenziamento tecnologico e adeguamento prestazionale (modulo e sagoma)	X		X			X	X	X		X
Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Mediterraneo e linee afferenti - interventi diffusi	X		X			X	X			X
Adeguamento prestazionale (modulo, sagoma, massa assiale) corridoio Mediterraneo e linee afferenti			X	X		X	X			X
PRG e ACC di Verona Quadrante Europa			X			X	X			X
PRG di Padova			X			X	X			X
ACC di Verona PN e ACC-M di Nodo			X			X	X			X

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P222: Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Mediterraneo e linee afferenti

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate							Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
2.741,40	1.372,34	di cui: 1.327,97	7,64	11,50	1,00	19,60	4,63	0,00	78,59	1.290,47

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatIRFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo							CdP-I agg.2025	Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari, allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati e ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (spostato CUP J37I05000020001 alla riga P221)
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze			
2.774,79	-15,00	-20,63		2,24			2.741,40	

Evoluzione coperture finanziarie							CdP-I agg.2025	Rimodulazione della copertura su interventi parzialmente finanziati a favore di ulteriori fabbisogni maggiormente prioritari. Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche) e con risorse proprie della Società per interventi non rientranti nel Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni			
1.432,20	-15,00	-41,30	-0,04	2,91	-6,44		1.372,34	

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Altre
Linea Torino-Padova: potenziamento tecnologico e adeguamento prestazionale (modulo e sagoma)	903,07	903,07	0,00	807,42	95,65	833,57	776,16	677,56	22,51	28,94	22,32	15,50	45,81	115,16
PRG e ACC di Verona Quadrante Europa	34,59	30,00	4,59	33,79	0,80	0,94	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	5,00	33,76
ACC di Verona PN e ACC-M di Nodo	137,05	106,05	31,00	120,73	16,32	65,30	17,15	0,31	0,95	2,50	4,37	3,50	5,01	119,08
Adeguamento prestazionale (modulo, sagoma, massa assiale) corridoio Mediterraneo e linee afferenti	63,02	63,02	0,00	56,48	6,53	50,82	45,43	23,92	1,64	6,70	5,89	3,96	14,81	17,57
PRG di Padova	782,60	2,30	780,30	748,31	34,29	1,48	1,46	0,00	0,00	0,00	0,01	1,46	5,00	781,13
Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Mediterraneo e linee afferenti - interventi diffusi	821,08	267,90	553,17	180,45	640,62	178,64	170,33	106,13	21,54	18,91	15,16	7,61	42,10	647,50
	2.741,40	1.372,34	1.369,06	1.947,19	794,21	1.130,75	1.011,13	807,92	46,64	57,05	47,74	32,74	35,11	1.714,20

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Potenziamento Tecnologico Torino - Padova	J47I09000010001	773,07	773,07	100%	736,59	95%	In ultimazione
Completamento tecnologico della direttrice Torino-Padova	J64H17000220001	130,00	130,00	100%	58,52	45%	Realizzazione
Linea Torino-Padova: potenziamento tecnologico e adeguamento prestazionale (modulo e sagoma)		903,07	903,07	100%	795,11	88%	
Centralizzazione delle cabine IS di Verona Porta Nuova con predisposizione degli impianti di gestione della circolazione per la prevista penetrazione della linea AV/AC	J14F18000020001	137,05	106,05	77%	22,12	21%	Realizzazione
ACC di Verona PN e ACC-M di Nodo		137,05	106,05	77%	22,12	21%	
ACC di Verona Quadrante Europa	J34J22000220001	34,59	30,00	87%	0,92	3%	Progettazione
PRG e ACC di Verona Quadrante Europa		34,59	30,00	87%	0,92	3%	
Interventi upgrading della rete merci - TO	J47I05000020001	40,27	40,27	100%	28,29	70%	Realizzazione
Upgrading prestazionale corridoio Mediterraneo	J94H17000560001	20,00	20,00	100%	19,88	99%	In ultimazione
TS - upgrading linee merci	J34J23000140001	2,75	2,75	100%	0,35	13%	Realizzazione
Adeguamento prestazionale (modulo, sagoma, massa assiale) corridoio Mediterraneo e linee afferenti		63,02	63,02	100%	48,52	77%	
Progettazione di fattibilità tecnico economica del PRG di Padova C.le funzionale all'ingresso della linea AV/AC Vicenza-Padova ed al riordino dei flussi afferenti la stazione	J22H22000390001	782,60	2,30	0%	1,47	64%	Progettazione
PRG di Padova		782,60	2,30	0%	1,47	64%	
Completamento upgrading direttrice trasversale		608,47	55,30	9%	0,00	0%	Progettazione
Potenziamento tecnologico e infrastrutturale della linea Genova - Ventimiglia	J34H16000350001	63,15	63,15	100%	62,58	99%	In ultimazione
Upgrading tecnologie linea AV/AC Torino-Milano	J34H15001050001	46,20	46,20	100%	34,85	75%	Realizzazione

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P222: Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Mediterraneo e linee afferenti

GE - Interventi diffusi di potenziamento tecnologico ed infrastrutturale linee regionali	J96J17000460001	26,42	26,42	100%	23,89	90%	In ultimazione
Potenziamento tecnologico Genova - La Spezia	J34F18000010009	19,87	19,87	100%	19,21	97%	In ultimazione
Interventi diffusi di upgrading infrastrutturale e tecnologico ambito direttrice trasversale	J67J18000390001	16,80	16,80	100%	16,77	100%	In ultimazione
Fire Fighting Points linea Genova-Ventimiglia	J94C19000260001	15,50	15,50	100%	5,22	34%	Realizzazione
VE - upgrading linee viaggiatori	J17I17000050001	14,70	14,70	100%	9,23	63%	Realizzazione
Upgrading prestazionale corridoio Mediterraneo - VR	J24J24000940002	5,85	5,85	100%	0,00	0%	Progettazione
Tratta AV/AC Milano-Bologna: interventi di adeguamento dei cavalcavia nel comune di Piacenza	J34H17000140001	3,66	3,66	100%	3,06	84%	Realizzazione
Milano, upgrading infrastrutturali e tecnologici diffusi	J87G21000020001	0,30	0,30	100%	0,00	0%	Progettazione
Milano, upgrading infrastrutturali e tecnologici diffusi	J97F20000260001	0,15	0,15	100%	0,00	0%	Progettazione
Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Mediterraneo e linee afferenti - interventi diffusi		821,08	267,90	33%	174,82	65%	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento si inserisce nell'ambito del programma di interventi di quadruplicamento della linea Fortezza-Verona, di estesa pari a circa 180 km, ed è finalizzato al potenziamento dell'accesso da sud al nuovo valico del Brennero

Il Lotto 1 consiste nella realizzazione del nuovo tratto di linea tra Fortezza e Ponte Gardena e le relative interconnessioni con la linea esistente a Ponte Gardena nord. Esso rappresenta la continuità funzionale della nuova Galleria di Base del Brennero in quanto l'attuale linea ferroviaria, in quella tratta, presenta basse velocità di esercizio (80÷90 km/h in rango A) e, soprattutto, elevate pendenze (fino al 23 ‰). La nuova soluzione riduce al 12,5‰ la pendenza massima della linea. Il tracciato si sviluppa per circa 25 km, dal PM di Fortezza al bivio per Ponte Gardena e prevede la realizzazione di due gallerie collegate da un tratto, in viadotto, sull'Isarco. Nell'ambito del Lotto 1 sono già stati realizzati alcuni interventi a Ponte Gardena tra cui la realizzazione dell' ACC.

Il Lotto 1 "Fortezza — Ponte Gardena" ricade interamente nella Provincia Autonoma di Bolzano, attraversando 8 comuni (Fortezza, Varna, Bressanone, Veltuno, Funes, Chiusa, Laion e Ponte Gardena). Il ramo principale della nuova infrastruttura si sviluppa per circa 22,5 km e presenta due interconnessioni alla linea esistente nell'ambito dell' impianto di Ponte Gardena, anch'esse in galleria. Il tracciato si caratterizza per la presenza di opere quasi interamente in sotterraneo costituite da due principali gallerie naturali di linea denominate rispettivamente "Scaleres", di 15,4 km circa, e "Gardena", di 6,3 km circa, intervallate da un breve tratto allo scoperto in attraversamento della Valle dell'Isarco, il cui viadotto costituisce l'opera di maggiore significatività architettonica dell'intero lotto


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Gli interventi a Ponte Gardena sono stati attivati nel 2016 con la realizzazione dell'ACC. Relativamente all'appalto inerente la progettazione esecutiva e i lavori di adeguamento della viabilità podereale per l'accesso alle aree di emergenza poste agli imbocchi delle interconnessioni di Ponte Gardena, in data 03/10/2023 sono stati consegnati i lavori, in corso la realizzazione. Relativamente all'appalto principale i lavori di parte A, consistenti nelle opere provvisionali di imbocco delle finestre di Forch, Funes e della discenderia di Chiusa, sono stati consegnati in data 30/11/2022 mentre la consegna dei lavori delle opere di Parte B, avvenuta in data 13/10/2023, consistono in attività di scavo in meccanizzato della finestra di Forch, attività di scavo in tradizionale della finestra di Chiusa, attività di montaggio della TBM presso la finestra di Funes e realizzazione delle viabilità accessorie.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

•Incremento prestazionale della linea al fine di sfruttare in maniera ottimale il nuovo tunnel del Brennero con eliminazione dei vincoli legati alla pendenza massima sulla linea e conseguente incremento della massa rimorchiabile dei treni nella tratta Fortezza-Ponte Gardena (Lotto 1). •Eliminazione dei colli di bottiglia sull'asse del Brennero e conseguente aumento della capacità per lo sviluppo dei traffici sul Corridoio Scandinavo – Mediterraneo. •Separazione dei traffici merci da quelli passeggeri con benefici in termini di capacità e velocità commerciale.

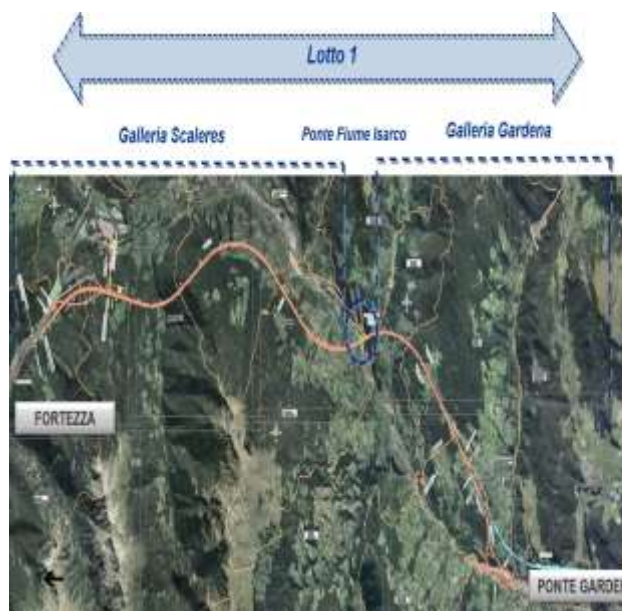

	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	X
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Trentino Alto Adige

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0292A: Accesso al Brennero lotto 1 - Fortezza-Ponte Gardena

	PNRR	Interventi commissariati	Accordi internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF		Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																						
Quadruplicamento Fortezza - Ponte Gardena	X	X					X	X			X		X	X								

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR	Altro UE	Altro	Priorità 1	Priorità 2		
						nuovi progetti	(CEF/TEN, PON-FESR)	(EELL, Terzi, autofinanziamento)				
1.522,62	1.522,62		1.363,98	1,02	0,00	0,00	157,62	0,00	0,00	0,00		

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE											milioni di euro
Evoluzione Costo											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025					
1.521,60				1,02		1.522,62	Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari				
Evoluzione coperture finanziarie											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025					
1.521,60				119,82	-118,80	1.522,62	Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)				

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Quadruplicamento Fortezza - Ponte Gardena	1.522,62	1.522,62	0,00	1.242,47	280,14	1.270,89	121,74	51,62	0,91	3,12	4,98	19,38	8,63	1.385,66
	1.522,62	1.522,62	0,00	1.242,47	280,14	1.270,89	121,74	51,62	0,91	3,12	4,98	19,38	56,95	1.385,66

CRONOPROGRAMMA														
CUP					Stato attuativo									
										Iter procedurale				
					Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione	
					Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine
Quadruplicamento Fortezza - Ponte Gardena	J94F04000020001	Realizzazione	-		11-2010	11-2010	3-2017		10-2014	4-2015	8-2020	8-2022	9-2019	5-2030

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento si inserisce nell'ambito del programma di interventi di quadruplicamento della linea Fortezza-Verona, di estesa pari a circa 180 km, ed è finalizzato al potenziamento dell'accesso da sud al nuovo valico del Brennero

La tratta in ingresso Verona si sviluppa per una lunghezza di circa 9.5 km a partire dalla località S. Massimo, nei pressi della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, in affiancamento al tracciato ferroviario esistente fino a circa 500 m a nord del Forte Chievo poco a sud dell'abitato di Parona. Da qui il tracciato abbandona quello esistente e devia in direzione nord-ovest per 2,5 km circa fino a incontrare l'attuale linea ferroviaria nei pressi dell'abitato di Settimo di Pescantina, e proseguire, in affiancamento alla stessa, fino al nuovo bivio di connessione con la linea esistente che verrà realizzato in prossimità della stazione di Pescantina.

Il Lotto 4, tratta in ingresso Verona, si sviluppa per una lunghezza di circa 9.5 km a partire dalla località S. Massimo, nei pressi della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, in affiancamento al tracciato ferroviario esistente fino a circa 500 m a nord del Forte Chievo poco a sud dell'abitato di Parona. Da qui il tracciato abbandona quello esistente e devia in direzione nord-ovest per 2.5 km circa fino a incontrare l'attuale linea ferroviaria nei pressi dell'abitato di Settimo di Pescantina, e proseguire, in affiancamento alla stessa, fino al nuovo bivio di connessione con la linea esistente che verrà realizzato in prossimità della stazione di Pescantina. La nuova linea ferroviaria ha uno sviluppo essenzialmente in rilevato, realizzato in stretto affiancamento alla linea esistente; le opere significative che caratterizzano questo intervento sono costituite dalle due gallerie artificiali S. Massimo, dal nuovo ponte sul fiume Adige e dalla galleria artificiale Parona nei pressi dell'aeroporto di Boscomantico. Sono previste inoltre opere d'arte minori per la risoluzione delle interferenze con le viabilità e con corsi d'acqua minori. Il Lotto 4 ricade interamente nella Provincia di Verona, interessando i comuni di Verona, S. Pietro in Cariano e Pescantina.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Ultimata la fase di «Project Review» del Progetto Preliminare del 2014. È stato sottoscritto tra RFI, Regione Veneto, Provincia di Verona e i Comuni interessati, l'Integrazione del Protocollo di intesa sottoscritto per la revisione ed aggiornamento del Progetto Preliminare. Sulla base delle suddette intese, RFI ha ultimato lo sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica. Sono in corso le attività propedeutiche per l'avvio del Dibattito Pubblico.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Razionalizzazione dei flussi da nord in ingresso al nodo di Verona, con specializzazione delle linee per i flussi merci al servizio del terminale Quadrante Europa e per i flussi viaggiatori diretti al nodo.



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	X
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Veneto

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0292B: Accesso al Brennero lotto 4 - Ingresso nel nodo di Verona

	PNRR	Interventi commissariati	Accordi internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF		Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																						
Ingresso a Verona	X						X	X					X	X								

QUADRO FINANZIARIO												milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento		
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2			
1.235,03	149,40	di cui:	148,63	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	1.085,63		

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE												milioni di euro	
Evoluzione Costo													
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze							CdP-I agg.2025	Aggiornamento dei quadri economici, ad esito delle prescrizioni dell'iter autorizzativo per il Lotto 4 - ingresso Verona
1.187,10			47,93									1.235,03	
Evoluzione coperture finanziarie													
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni							CdP-I agg.2025	
149,40												149,40	

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Ingresso a Verona	1.235,03	149,40	1.085,63	1.134,35	100,68	4,99	4,94	2,03	0,05	1,39	0,16	0,28	5,04	1.230,08
	1.235,03	149,40	1.085,63	1.134,35	100,68	4,99	4,94	2,03	0,05	1,39	0,16	0,28	1,04	1.230,08

CRONOPROGRAMMA														

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento si inserisce nell'ambito del programma di interventi di quadruplicamento della linea Fortezza-Verona, di estesa pari a circa 180 km, ed è finalizzato al potenziamento dell'accesso da sud al nuovo valico del Brennero

Il tracciato si sviluppa tra le località di Prato Isarco e Bronzolo, interamente in galleria (Val d'Ega) per una estesa di circa 10 km, con ulteriori 4 km circa di interconnessioni. Obiettivo dell'intervento è la realizzazione di uno shunt dell'abitato di Bolzano per il transito dei treni merci.

Il Lotto 2 "Circonvallazione di Bolzano" si sviluppa quasi interamente in galleria (galleria Val d'Ega) nel massiccio a est di Bolzano in spnda sinistra dell'Isarco e dell'Adige, comprese le interconnessioni di Prato Isarco a Nord e di Bronzolo a Sud. Tutto l'intervento ricade nella Provincia Autonoma di Bolzano.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

In data 14/03/2025 è stato ultimato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica. In seguito saranno avviate le attività propedeutiche per l'avvio del Dibattito Pubblico.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Incremento della capacità della linea. Migliore offerta in termini di regolarità e riduzione dei tempi di percorrenza. Specializzazione dei flussi e recupero di capacità in impianto.



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	X
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Trentino Alto Adige

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Accordi internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Travoli tecnici di ascolto	Allegato MMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani
Circonvallazione di Bolzano	X				X						X	X			

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELI, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
1.570,00	18,80 di cui:	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.551,20

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0292C: Accesso al Brennero lotto 2- Circonvallazione di Bolzano

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
851,60			718,40			1.570,00	Aggiornamento dei quadri economici, ad esito della progettazione definitiva per la circonvallazione di Bolzano

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
18,80						18,80

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Circonvallazione di Bolzano	1.570,00	18,80	1.551,20	681,01	888,99	5,26	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	5,00	1.567,34
	1.570,00	18,80	1.551,20	681,01	888,99	5,26	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,42	1.567,34

CRONOPROGRAMMA

		CUP		Stato attuativo		Iter procedurale											
						Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
						Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Circonvallazione di Bolzano	J94F04000020001	Progettazione	3-2022	7-2026	-	-	-	-	8-2026	2-2027	2-2027	2-2030	6-2030				

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento si inserisce nell'ambito del programma di interventi di quadruplicamento della linea Fortezza-Verona, di estesa pari a circa 180 km, ed è finalizzato al potenziamento dell'accesso da sud al nuovo valico del Brennero

Il progetto ha origine in località Roncafort, nei pressi dell'interporto di Trento, procedendo in stretto affiancamento alla linea storica per circa 2,5 km, per poi portarsi in prossimità della sede dell'ex scalo Filzi, da cui ha origine la galleria di Trento, che termina presso la località Acquaviva con la galleria Trento, dell'estesa di circa 12 km a doppia canna. L'obiettivo complessivo dell'intervento è la realizzazione del quadruplicamento della tratta compresa tra gli abitati di Trento e Rovereto, con shunt dei rispettivi abitati per il transito dei treni merci.

L'intervento si sviluppa completamente nella valle dell'Adige nella Provincia Autonoma di Trento

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

A settembre 2022 è stata avviata l'attività negoziale, successivamente a Febbraio 2023 è avvenuta l'aggiudicazione con consegna delle prestazioni all'Appaltatore con decorrenza dal 02/03/2023. A luglio 2023 con Atto Integrativo Modificativo n.1 è avvenuta la suddivisione delle opere di Parte A o in due distinte sotto-parti, denominate "Parte A1" e "Parte A2". A settembre 2023 è stata completata la realizzazione di lavori relativi allo spostamento della Linea Trento-Malè (Parte A1). Per le restanti opere anticipate è stata ultimata e approvata la progettazione esecutiva delle opere di parte A2 relative all'imbocco SUD, in data 10/06/2024 sono stati consegnati i lavori. Per le restanti opere di parte A2, relative all'imbocco nord, in data 13/11/2024 è avvenuta la consegna dei lavori a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo. Per le opere di Parte B in data 12/07/2024 è stata effettuata la consegna della Progettazione Esecutiva da parte dell'Appaltatore, è in corso l'attività di verifica. In data 21/12/2023 è avvenuta la consegna delle prestazioni dell'appalto tecnologico IS, con decorrenza dei termini al 11/01/2024. Allo stato attuale sono in corso le attività di verifica della progettazione esecutiva.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Incremento della capacità della linea. Migliore offerta in termini di regolarità e riduzione dei tempi di percorrenza. Specializzazione dei flussi e recupero di capacità negli impianti.



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	X
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Trentino Alto Adige

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi E.E.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Circonvallazione di Trento (lotto 3a) e progettazione preliminare lotti 3a e 3b		X					X						X	X							

Progetto 0337A: Accesso al Brennero lotto 3a - Circonvallazione di Trento

milioni di euro

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

La variazione di costo è imputabile alla circonvallazione di Trento ad esito della progettazione esecutiva per varianti in corso d'opera

Copertura appalto in corso per maggiori costi emersi nel corso della progettazione

CRONOPROGRAMMA

	CUP	Stato attuativo	Iter procedurale											
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Circonvallazione di Trento (lotto 3a) e progettazione preliminare lotti 3a e 3b	J41C090000000005	Realizzazione	6-2014	10-2025	3-2025	7-2026	2-2023	3-2023	9-2022	6-2023	3-2023	5-2030	12-2026	

Progetto 0337B: Accesso al Brennero lotto 3b - Circonvallazione di Rovereto

[illegible]

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0337B: Accesso al Brennero lotto 3b - Circonvallazione di Rovereto

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
363,95			2.074,18			2.438,13	Variazione del costo dovuta all'aggiornamento del valore delle opere relativo alla Circonvallazione di Rovereto ad esito dell'ultimazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali.

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
0,00						0,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Circonvallazione di Rovereto	2.438,13	0,00	2.438,13	2.341,02	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2.438,13
	2.438,13	0,00	2.438,13	2.341,02	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,13

CRONOPROGRAMMA

CUP		Stato attuativo				Iter procedurale							
		Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Circonvallazione di Rovereto	J41C09000000005	Valutazione di fattibilità alternative progettuali	-	-	-	-	-	1-2027	7-2027	8-2027	8-2034	6-2032	

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento si inserisce nell'ambito del programma di interventi di quadruplicamento della linea Fortezza-Verona, di estesa pari a circa 180 km, ed è finalizzato al potenziamento dell'accesso da sud al nuovo valico del Brennero

I lotti di completamento riguardano: Lotto 5 tratto Bronzolo – Trento Nord con un' estesa di Km. 48,5. L'obiettivo del lotto è dare continuità alla direttrice collegando i lotti prioritari 2 (Circonvallazione di Bolzano) e 3 (Circonvallazione di Trento e Rovereto) Lotto 6 tratto Rovereto (località Marco) - Pescantina con un' estesa di Km. 41,9. L'obiettivo del lotto è dare continuità alla direttrice collegando i lotti prioritari 3 (Circonvallazione di Trento e Rovereto) e 4 (Ingresso a Verona) Lotto 7 tratto Ponte Gardena – Prato Isarco con un' estesa di Km. 20,1, l'obiettivo del lotto è dare continuità alla direttrice collegando i lotti prioritari 1 (Fortezza – Ponte Gardena) e 2 (Circonvallazione di Bolzano).

Provincia Autonoma di Bolzano Provincia Autonoma di Trento Veneto


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Accesso al Brennero lotto 7: Ponte Gardena – Bolzano (Prato Isarco): in corso project review su studi di fattibilità del 2003
Accesso al Brennero lotto 5: Bolzano (Bronzolo) – Trento (Roncafort): in corso project review su studio di Fattibilità sviluppato da PA di Bolzano e Trento ultimato nel 2009
Accesso al Brennero lotto 6: Rovereto- Pescantina: in corso project review su studi di fattibilità sviluppati da PA Trento nel 2009 e da Provincia di Verona nel 2013.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Incremento della capacità della linea. Migliore offerta in termini di regolarità e riduzione dei tempi di percorrenza. Specializzazione dei flussi.

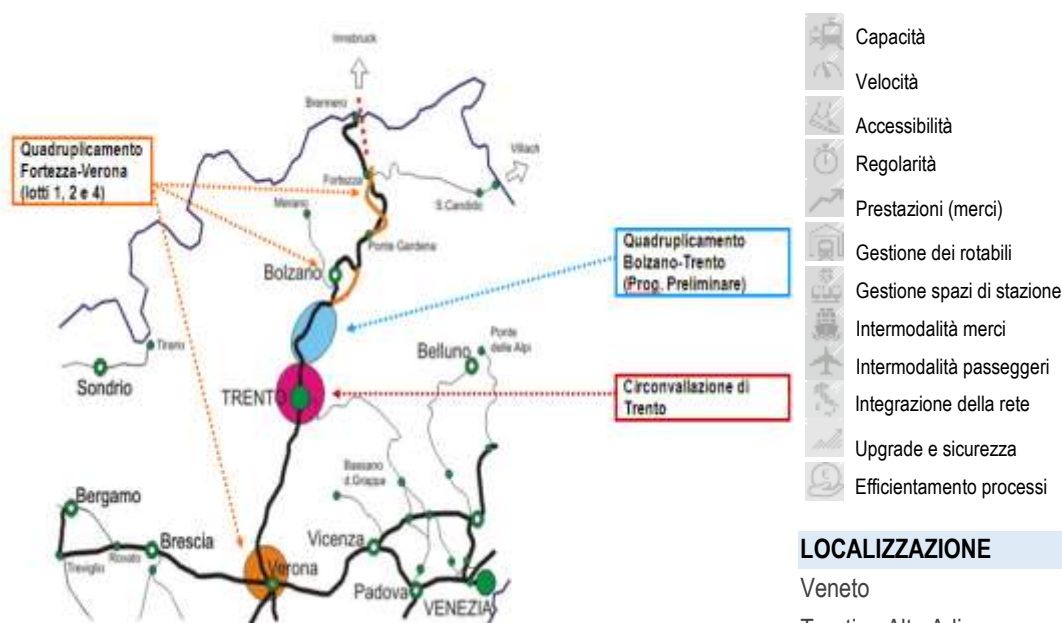**LOCALIZZAZIONE**

Veneto
Trentino Alto Adige

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica						Obiettivi strategici					
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi E.E.L.L.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workshop corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MINS al DEF	
Accesso al Brennero: lotti di completamento (fasi)							X					X X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Progetto I085: Accesso al Brennero lotti di completamento (fasi)

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
2.500,00						2.500,00

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrig	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
0,00						0,00

CRONOPROGRAMMA

[illegible]

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto di potenziamento del tracciato Venezia Mestre – Trieste prevede l'eliminazione di punti singolari o tratte che condizionano l'attuale velocità di tracciato per far viaggiare i treni ad una velocità massima di 200 Km/h e ridurre i tempi di viaggio a poco più di un'ora, circa 30 minuti in meno rispetto all'attuale percorrenza. I principali interventi dei lotti prioritari riguardano: Potenziamento tecnologico con rinnovo del sistema di distanziamento della linea storica Venezia Mestre - Trieste Centrale nella tratta Mestre – Ronchi Sud; Adeguamento delle opere d'arte per la rimozione di tutte le limitazioni in D4L presenti in linea; Soppressione di PL (interventi prioritari).

L'intervento prevede in prima fase di realizzare un upgrading tecnologico degli impianti nelle località esistenti. In una seconda fase, invece, prevede la realizzazione di alcune varianti di tracciato e dei nuovi Posti di Movimento con binari a 750 m, con lo scopo di rettificare il tracciato e aumentare le prestazioni della linea. In corrispondenza di tali varianti verranno realizzate nuove opere d'arte sui fiumi Tagliamento e Isonzo. Nel progetto sarà prevista anche la soppressione di tutti i Passaggi a Livello esistenti sulla tratta, alcuni mediante la realizzazione di cavalcaviaferrovia, altri con la realizzazione di sottopassi.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Potenziamento tecnologico: è in corso la realizzazione Sono state consegnate le prestazioni nel mese di novembre 2024 relative all'Appalto per le modifiche delle tecnologie proprietarie, in corso la verifica; è stata ultimata la progettazione esecutiva relativa all'Appalto relativo all'ERTMS (interventi di piazzale), in corso la verifica; sono stati consegnati i lavori SCMT relativi al PRG di San Giorgio di Nogaro Fase 2 nonché a dicembre 2024 sono stati consegnati anche i lavori di armamento. Sono conclusi i lavori di PRG nella Stazione di Cervignano A.G. Adeguamento codifica massa assiale: è in corso la verifica della progettazione degli interventi alle Opere d'Arte per l'eliminazione delle limitazioni alla categoria D4.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Migliorare le prestazioni del tracciato ferroviario; Eliminare le criticità esistenti (raggi delle curve, passaggi a livello); Innalzare la velocità della linea ferroviaria fino a 200 km/h; Adeguamento della linea a modulo 750 m; Recupero fino a 10' sugli attuali tempi di viaggio tra Venezia Mestre e Trieste con i Lotti Prioritari; Aumentare la capacità di linea da 7 treni/h a 10 treni/h; Migliorare le prestazioni in termini di regolarità del servizio.



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	X
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Veneto
Friuli Venezia Giulia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica				Obiettivi strategici			
PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE
							Altri Provvedimenti*
							Tavoli tecnici di ascolto
							Allegato MIMS al DEF
Intervento / Opere funzionali				Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
						Sistemi regionali e metropolitani	Adeguamento a standard tecnici
						Sviluppo tecnologico	Resilienza al climate change
							Accessibilità e qualità stazioni
							Coesione sociale e territoriale

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0365A: Potenziamento Venezia-Trieste lotti prioritari

Potenziamento tecnologico Venezia-Trieste, rimozione limitazione massa assiale D4 e altri interventi infrastrutturali su linea storica	X	X		X			X		X
--	---	---	--	---	--	--	---	--	---

QUADRO FINANZIARIO												milioni di euro
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2		
250,68	229,48	di cui:	225,89	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE										milioni di euro
Evoluzione Costo										
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025				
219,16			28,00	3,52		250,68	Variazione di costo relativo ad una variante emersa in fase di Progettazione esecutiva dell'appalto multidisciplinare.Inoltre, si segnala un incremento delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari.			

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
219,16				3,52	6,79	229,48
Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche); ulteriore rimodulazione da intervento 0365B per prosecuzione attività in corso						

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Potenziamento tecnologico Venezia-Trieste, rimozione limitazione massa assiale D4 e altri interventi infrastrutturali su linea storica	250,68	229,48	21,21	207,45	43,23	142,21	56,22	5,81	-0,27	2,70	4,55	16,50	6,55	193,12
	250,68	229,48	21,21	207,45	43,23	142,21	56,22	5,81	-0,27	2,70	4,55	16,50	28,27	193,12

CRONOPROGRAMMA																
			Stato attuativo				Iter procedurale									
CUP																
					Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine				
Potenziamento tecnologico Venezia-Trieste, rimozione limitazione massa assiale D4 e altri interventi infrastrutturali su linea storica			J34H16000620009	Realizzazione	11-2017	11-2027	11-2017	2-2026	5-2021	9-2022	3-2020	5-2027	6-2021	8-2030	12-2027	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto di potenziamento del tracciato Venezia Mestre – Trieste prevede l'eliminazione di punti singolari o tratte che condizionano l'attuale velocità di tracciato per far viaggiare i treni ad una velocità massima di 200 Km/h e ridurre i tempi di viaggio a poco più di un'ora, circa 30 minuti in meno rispetto all'attuale percorrenza. I principali interventi di completamento riguardano: •Interventi infrastrutturali: soppressione di tutti i Passaggi a Livello pubblici e privati, 2 Nuovi PM a modulo 750 m a San Donà di Piave e a Fossalta di Portogruaro, varianti di tracciato Portogruaro, Latisana e nuovo ponte sul fiume Isonzo. •Variante tratta tra Ronchi e Aurisina.

L'intervento prevede in prima fase di realizzare un upgrading tecnologico degli impianti nelle località esistenti. In una seconda fase, invece, prevede la realizzazione di alcune varianti di tracciato e dei nuovi Posti di Movimento con binari a 750 m, con lo scopo di rettificare il tracciato e aumentare le prestazioni della linea. In corrispondenza di tali varianti verranno realizzate nuove opere d'arte sui fiumi Tagliamento e Isonzo. Nel progetto sarà prevista anche la soppressione di tutti i Passaggi a Livello esistenti sulla tratta, alcuni mediante la realizzazione di cavalcaferrovia, altri con la realizzazione di sottopassi.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Interventi infrastrutturali: È in corso la VIA per le Varianti Portogruaro e Isonzo e i nuovi Posti di movimento. Soppressione dei PL: in corso l'iter autorizzativo. Variante Ronchi – Aurisina e Latisana: Sono in corso confronti con gli enti locali per la definizione di una soluzione condivisa per la redazione del PFTE.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

•Migliorare le prestazioni del tracciato ferroviario; •Eliminare le criticità esistenti (raggi delle curve, passaggi a livello); •Innalzare la velocità della linea ferroviaria fino a 200 km/h; •Adeguamento della linea a modulo 750 m; •Recupero fino a 30' sugli attuali tempi di viaggio tra Venezia Mestre e Trieste con i Lotti di completamento; •Aumentare la capacità di linea da 7 treni/h a 10 treni/h; •Migliorare le prestazioni in termini di regolarità del servizio.



Capacità	X
Velocità	X
Accessibilità	
Regolarità	X
Prestazioni (merci)	X
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	X
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Veneto

Friuli Venezia Giulia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici			
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.II.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MINS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T
Progettazioni pregresse tratta Venezia - Ronchi dei Legionari				X			X					X		X

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0365B: Potenziamento Venezia-Trieste completamento

Progettazioni pregresse tratta Ronchi dei Legionari - Trieste	X	X	X	X
Varianti Portogruaro, Latisana e Isonzo	X	X	X	X
Variante Ronchi-Aurisina	X	X	X	X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
1.580,90	51,72		41,72	0,00	0,00	0,00	5,73	4,26	0,00	0,00	1.529,18

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
1.580,90						1.580,90

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
58,51					-6,79	51,72
Rimodulazione a favore di intervento 0365A per prosecuzione attività in corso						

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Varianti Portogruaro, Latisana e Isonzo	795,21	25,31	769,90	742,94	52,27	22,26	15,57	14,31	0,00	0,10	2,74	1,45	5,13	776,62
Variante Ronchi-Aurisina	785,69	26,40	759,28	746,19	39,49	10,40	8,43	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	775,28
	1.580,90	51,72	1.529,18	1.489,14	91,76	32,66	24,01	24,72	0,00	0,10	2,74	1,45	0,00	1.551,90

CRONOPROGRAMMA												
CUP		Stato attuativo				Iter procedurale						
		Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
Varianti Portogruaro, Latisana e Isonzo	Iter autorizzativo	9-2004	12-2010	4-2020	12-2025	-	-	2-2026	8-2026	1-2027	7-2032	12-2030
Variante Ronchi-Aurisina	Valutazione di fattibilità alternative progettuali	11-2002	5-2028	-	-	-	-	7-2028	3-2029	4-2029	12-2034	6-2031

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento rappresenta un primo lotto funzionale funzionale allo sviluppo dei traffici merci nell'orizzonte di breve-medio periodo. Gli interventi consistono nell'adeguamento a STI della linea storica Bivio Aurisina-Villa Opicina-Confini di Stato.

Gli interventi previsti e finalizzati al potenziamento della linea Bivio Aurisina – Villa Opicina sono sostanzialmente divise in due fasi. Fase 1 – la prima fase prevede la realizzazione del nuovo ACC della stazione di Villa Opicina con i correlati interventi di armamento, opere civili e trazione elettrica. Fase 2 - la seconda fase prevede la soppressione del passaggio a livello presente nell'ex Stazione di Prosecco ed il potenziamento tecnologico della tratta Bivio Aurisina – Villa Opicina.

L'intervento interessa la Stazione di Villa Opicina e la tratta tra Bivio Aurisina e il confine di Stato e prevede la soppressione del PL nei pressi dell'ex Stazione di Prosecco, con la realizzazione di un cavalcaferrovia, e l'upgrading tecnologico della linea esistente con l'obiettivo di adeguare a STI gli impianti


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Fase 1 PRG e ACC di Villa Opicina – È in corso la realizzazione. Fase 2 opere sostitutive Soppressione PL Prosecco – Per quanto riguarda la soppressione del passaggio a livello di Prosecco, è in corso la Progettazione Esecutiva a cura dell'appaltatore. Fase 3 Upgr. tecn. Bivio Aurisina - Villa Opicina: relativamente al potenziamento tecnologico della tratta Bivio Aurisina-V. Opicina ultimata la verifica della progettazione esecutiva, la consegna dei lavori è avvenuta nel mese di aprile 2025.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

•Eliminazione delle limitazioni al peso assiale e adeguamento a modulo 750m dell'impianto di Villa Opicina, per adeguare la tratta alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI); •Gestione centralizzata della circolazione della tratta B. Aurisina – Villa Opicina da ACC-M di Monfalcone; •Incremento della capacità con valori standard di una linea a doppio binario, con contestuale soppressione dei passaggi a livello rimasti in linea; •Miglioramento della regolarità del servizio ferroviario anche nell'ottica di potenziamento del servizio transfrontaliero tra Italia e Slovenia; •Velocizzazione degli itinerari devianti a 60 km/h.

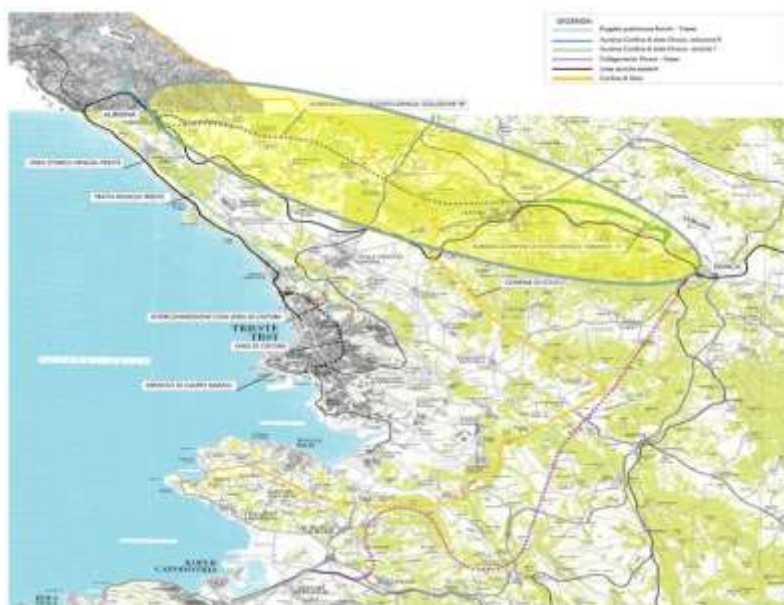

Capacità	X
Velocità	
Accessibilità	
Regolarità	X
Prestazioni (merci)	X
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Friuli Venezia Giulia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi internazionali	Accordi E.E.L.L.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani
Upgrade linea storica bivio Aurisina-Confini di Stato (fase 0 Nuova linea Trieste-Divaca) - comprende anche progettazione preliminare nuova linea	X	X					X	X				X			

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 1604A: Upgrading infrastrutturale e tecnologico linea linea Trieste-Divaca

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
70,95	70,95		47,50	1,22	0,00	4,23	18,00	0,00	0,00	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
70,11				0,84		70,95
						Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari
Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
70,11				0,84		70,95
						Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)

PIANO DELLA SPESA

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico						OGV				Produzione				
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre	
Upgrade linea storica bivio Aurisina-Confini di Stato (fase 0 Nuova linea Trieste-Divaca) - comprende anche progettazione preliminare nuova linea	70,95	70,95	0,00	53,73	17,22	47,86	13,90	4,03	0,41	0,17	3,42	5,12	5,08	55,75	
	70,95	70,95	0,00	53,73	17,22	47,86	13,90	4,03	0,41	0,17	3,42	5,12	2,05	55,75	

CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA														
	CUP	Stato attuativo	Iter procedurale											
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Upgrade linea storica bivio Aurisina-Confini di Stato (fase 0 Nuova linea Trieste-Divaca) - comprende anche progettazione preliminare nuova linea	J71C10000030007	Realizzazione	7-2012	9-2015	7-2015	12-2022	-	-	7-2020	2-2024	10-2021	5-2025	-	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi si sviluppano attorno alla città di Udine ed in particolare nei Comuni di Udine, Pradamano, Palazzolo e Pavia. Verranno potenziate le tratte di accesso alla stazione di Udine e alla linea di cintura, realizzando raddoppi di binario e nuovi bivi sui sedimi già predisposti in passato. Inoltre verrà realizzato un nuovo Posto di Movimento nei pressi dell'attuale Bivio Cargnacco a servizio della Zona Industriale di Udine con la contestuale soppressione dei PL insistenti sul futuro PM, con realizzazione di opere sostitutive (sottovia) con lo scopo di spostare il traffico merci da Udine Parco alla zona Sud nei pressi della ZIU.

attualità dati: 30/06/2025

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

Friuli Venezia Giulia

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025													
Progetto 1940: Nodo di Udine													
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR		
Intervento / Opere funzionali													
Revisione fascio Sacca e ACC Udine Centrale su piano ferro attuale					X	X	X	X		X		X	X
Nuovo PM Cagnacco, PRG di Udine Centrale, PRG Udine C.le, PRG/ACC Udine Bivi (ex Udine Parco), raddoppio della linea di cintura tra PM VAT, bretella tra linea Gorizia e linea per Cervignano					X	X						X	X

QUADRO FINANZIARIO										milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve Priorità 1	Priorità 2	
340,48	180,13	di cui:	153,55	1,23	1,00	22,45	0,00	1,90	0,00	0,00	160,35

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE											milioni di euro
Evoluzione Costo											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025					
340,00				0,48		340,48	Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari				
Evoluzione coperture finanziarie											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025					
128,65				0,48	51,00	180,13	Copertura interventi prioritari appalto in corso e adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)				

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Altre
Revisione fascio Sacca e ACC Udine Centrale su piano ferro attuale	54,13	54,13	0,00	41,83	12,30	37,12	20,55	2,26	0,35	2,20	2,53	7,30	5,48	33,24
Nuovo PM Cagnacco, PRG di Udine Centrale, PRG Udine C.le, PRG/ACC Udine Bivi (ex Udine Parco), raddoppio della linea di cintura tra PM VAT, bretella tra linea Gorizia e linea per Cervignano	286,35	126,00	160,35	267,60	18,75	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	286,35
	340,48	180,13	160,35	309,43	31,05	37,22	20,55	2,26	0,35	2,20	2,53	7,30	6,26	319,59

CRONOPROGRAMMA															
CUP	Stato attuativo				Iter procedurale										
	Realizzazione	Iter autorizzativo	Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità		
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	
Revisione fascio Sacca e ACC Udine Centrale su piano ferro attuale	J54H17000130009	Realizzazione	-	-	6-2017	2-2027	-	-	10-2025	7-2026	9-2021	12-2025	7-2026		
Nuovo PM Cagnacco, PRG di Udine Centrale, PRG Udine C.le, PRG/ACC Udine Bivi (ex Udine Parco), raddoppio della linea di cintura tra PM VAT, bretella tra linea Gorizia e linea per Cervignano	J54H17000130009	Iter autorizzativo	-	-	-	-	-	-	5-2025	9-2027	6-2026	10-2029	8-2030		

Progetto I131: Ripristino linea dei bivi di Venezia Mestre

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento prevede il ripristino dell'attuale linea tra bivio Marocco e l'ex Bivio Carpenedo con alcune modifiche all'innesto sulla VE-TS. Il ripristino della Linea dei Bivi è connesso agli interventi in corso nell'ambito del Corridoio Baltico Adriatico e si pone quale principale obiettivo quello di evitare il passaggio del traffico merci attraverso il nodo di Venezia Mestre, liberando nel contempo capacità per il traffico regionale e metropolitano.

In sintesi gli interventi previsti per il ripristino della Linea prevedono: -la connessione diretta con la linea lenta Padova-Mestre tramite opera di scavalco, -la riattivazione della tratta Bivio Marocco-Bivio Carpenedo, con immissione sulla tratta Mestre-Trieste e sul futuro collegamento Ferroviario con l'Aeroporto di Venezia; -il prolungamento della Linea dei Bivi oltre la diramazione per la futura bretella Aeroporto, in affiancamento alla Linea Venezia-Trieste, al fine di evitare la sovrapposizione del traffico merci in direzione Est-Ovest con il traffico regionale metropolitano; -la realizzazione - in corrispondenza di Bivio Carpenedo nel tratto a Est - di un nuovo collegamento dalla Stazione Aeroporto per la direttrice Portogruaro/Trieste-il completamento dell'assetto infrastrutturale, con il ripristino, in sede esistente, dei raccordi di collegamento tra la Linea dei Bivi e le Linee per Bassano e Udine. Nell'ambito del Progetto è prevista la soppressione dei Passaggi a Livello ricadenti sulle tratte da ripristinare e l'installazione di barriere antirumore ad esito di specifico studio di impatto acustico previsto dalla normativa vigente.

L'intervento verrà realizzato nell'ambito della cintura urbana di Mestre, sul sedime della vecchia linea ferroviaria dei bivi. L'intervento prevede il ripristino del vecchio tracciato della linea dei bivi con l'adeguamento ai nuovi standard previsti dalle norme vigenti.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Ultimato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica. Sono in corso approfondimenti per individuare una Fase Funzionale per il proseguo delle attività.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Separazione dei traffici merci rispetto a quello viaggiatori, riducendo le interferenze nel nodo di Venezia e garantendo continuità di capacità ai corridoi Mediterraneo e Baltico Adriatico.

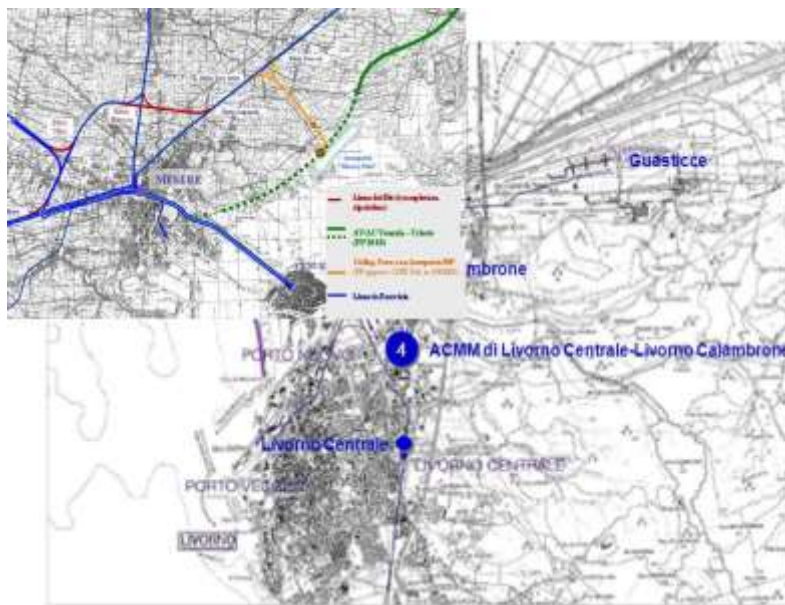

Capacità	
Velocità	
Accessibilità	
Regolarità	X
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Veneto

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MINS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Ripristino linea dei bivi di Venezia Mestre							X	X							X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto I131: Ripristino linea dei bivi di Venezia Mestre

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatorie di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
180,00	1,43		1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,57

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
180,00						180,00

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
1,43						1,43

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Ripristino linea dei bivi di Venezia Mestre	180,00	1,43	178,57	138,41	41,59	1,43	1,43	1,30	0,01	0,13	0,00	0,00	6,09	178,57
	180,00	1,43	178,57	138,41	41,59	1,43	1,43	1,30	0,01	0,13	0,00	0,00	0,00	178,57

CRONOPROGRAMMA														
	CUP	Stato attuativo				Iter procedurale								
		Progettazione	Prog.Prel.		Progettazione	Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Nego.		Esecuzione		Funzionalità
			Inizio	Fine		Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
Ripristino linea dei bivi di Venezia Mestre	J14H16000530009	Progettazione	9-2017	1-2026	-	1-2026	-	-	-	2-2027	11-2028	12-2027	1-2033	6-2031

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma prevede l'adeguamento prestazionale e il potenziamento tecnologico ed infrastrutturale della Rete TEN-T Core Merci coincidente con il corridoio Mare del Nord - Reno - Mediterraneo, nonché sul linee di adduzione di particolare interesse per il traffico merci. Gli interventi principali consistono in:- rinnovo degli impianti di linea e di stazione con la rimodulazione del distanziamento ed i necessari adeguamenti infrastrutturali dei piani regolatori delle stazioni, attività propedeutiche all'installazione del sistema ERTMS- velocizzazione delle linee e degli impianti (velocizzazione degli itinerari devianti, realizzazione sottopassi, movimenti contemporanei nelle sedi di incrocio sul semplice binario,...)- adeguamento prestazionale (allungamento modulo di linea, adeguamento sagoma, adeguamento della sede e della piattaforma per riclassifica massa assiale).

Le principali realizzazioni riguardano: A) potenziamento tecnologico della direttrice Bologna-Padova: Realizzazione di un Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACCM) ubicato nel Posto Centrale di Bologna per la gestione centralizzata dell'intera tratta. I principali interventi riguardano:-realizzazione Interconnessione AV/AC Bologna – Padova con stazione di Bologna C.le AV;-trasformazione di tutti gli impianti delle località sulla tratta da tecnologia elettromeccanica a tecnologia computerizzata;-riconfigurazione della stazione di Rovigo con fasi di Piano Regolatore Generale e Trazione Elettrica (PRG/TE).Fasi Progetto-Realizzazione bivio Navile per interconnessione con la stazione di Bologna C.le AV/AC;-1^ fase ACCM : tratta Bologna (e) - Occhiobello (i);-2^ fase ACCM : tratta Occhiobello (e) - Padova Campo Marte (e);- Riconfigurazione PRG/TE stazione di Rovigo;B) Lunetta di Gorizia: l'intervento prevede il collegamento della linea Udine-Gorizia-Monfalcone con l'attuale linea che collega Gorizia – Nuova Gorica.In ambito del progetto ADRIA-A, nello specifico, gli interventi previsti per il nodo di Gorizia sono:-Realizzazione lato Italia di una nuovo raccordo ("lunetta") in modo da consentire l'itinerario diretto tra Sagrado (Monfalcone) e Nova Gorica senza inversioni di marcia a Gorizia Centrale;-Ripristino lato Slovenia del raccordo ("lunetta") un tempo esistente e successivamente smantellato (dopo il 1945) tra Vrtojba e Prvačina, in modo da consentire l'itinerario diretto da Gorizia Centrale verso Sežana senza inversioni di marcia a Nova Gorica.Tali realizzazioni restano di competenza dei rispettivi Paesi.Sulla base di una recente revisione del progetto preliminare, sviluppato nel 2012 da «Serfer S.r.l, RFI ha individuato una prima fase funzionale del costo pari a 15 M€ che comprende i seguenti interventi:- realizzazione di un nuovo tratto di linea a singolo binario per un'estesa complessiva di circa 1,4 Km;- rifacimento, in leggera variante a singolo binario, di un tratto di linea storica, lato Slovenia, di estesa pari a circa 260 m;- elettrificazione del nuovo collegamento;- elettrificazione della linea Gorizia C.le – Nuova Gorica fino al deviatoio in ingresso al raccordo SDAG;- adeguamento dell'attuale apparato ACEI di Gorizia, legato agli interventi infrastrutturali connessi.;C) Upgrading tecnologico della tratta Udine - Ronchi dei Legionari nord: gli interventi proposti hanno lo scopo di provvedere alla realizzazione dell'ACCM Udine – Ronchi dei Legionari Nord e con Posto Centrale Multistazione presso il Posto Centrale di Venezia Mestre con tutte le opere di armamento necessarie ad aumentare le funzionalità degli impianti sul tratto di linea interessato e la riconfigurazione dei sistemi di supervisione per la gestione del nuovo ACCM; L'investimento è di tipo tecnologico con adeguamenti puntuali di tipo infrastrutturale ed è ricompreso in un programma più ampio che prevede la velocizzazione dell'intera dorsale Bologna- Lecce che consentirà di raggiungere la velocità di 200 Km/h per circa 300 km di linea.D)Upgrading tecnologico Bologna-Lecce- tratta Bologna-Rimini: sono previsti interventi diffusi sul territorio che realizzano modifiche puntuali al tracciato ferroviario e alle stazioni, adeguamenti puntuali di opere d'arte, armamento e TE, upgrade dei sistemi di distanziamento dei treni e di gestione della circolazione (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione. Nello specifico gli interventi consistono in:adeguamento dell'armamento ferroviario e delle opere d'arte e lavori di adeguamento marciapiedi a standard TPL e pensiline ambito stazioni;realizzazione ACC-M Internalizzato, per fasi: - fasi 1-2-3 tratta Castelbolognese (e) - Villa Selva (e); tratta Villa Selva (i) – Rimini (e); PP-ACC Castelbolognese) già attivate;- Fasi 4-5: tratta Castelbolognese (e) – Castel San Pietro (e) e stazione di Castel San Pietro – in progettazione;Nell'ambito del medesimo progetto, a beneficio del trasporto ferroviario delle merci, è stato adeguato a modulo 750 metri l'impianto di Villa Selva, ed è di prossima attivazione l'adeguamento di Mirandola. Con il progressivo potenziamento degli impianti tecnologici, verrà attivata anche la velocizzazione di linea su più fasi:- tratta Castelbolognese (e)- Rimini (e) in fase di certificazione;- tratta Bologna S. Vitale-Castelbolognese – prevista attivazione entro il 2028.Nell'ambito del medesimo progetto, a beneficio del trasporto ferroviario delle merci, è stato adeguato a modulo 750 metri l'impianto di Villa Selva, ed è di prossima attivazione l'adeguamento di PM Mirandola. Con il progressivo potenziamento degli impianti tecnologici, verrà attivata anche la velocizzazione di linea in due fasi:- tratta Castelbolognese (e)- Rimini (e) in fase di certificazione;- tratta Bologna S. Vitale-Castelbolognese – prevista attivazione entro il 2027.E) Upgrading tecnologico Bologna-Lecce: tratta Rimini-Ancona-Pescara: L'investimento è di tipo tecnologico con adeguamenti puntuali di tipo infrastrutturale ed è ricompreso in un programma più ampio che prevede la velocizzazione dell'intera dorsale Bologna- Lecce che consentirà di raggiungere la velocità di 200 Km/h per circa 300 km di linea.Nella tratta Rimini-Ancona-Pescara sono previsti interventi diffusi sul territorio che realizzano modifiche puntuali al tracciato ferroviario e alle stazioni, adeguamenti puntuali di opere d'arte, armamento e TE, upgrade dei sistemi di distanziamento dei treni e di gestione della circolazione (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione. Nello specifico gli interventi, in fase di ultimazione, hanno riguardato il potenziamento tecnologico con rinnovo del sistema di distanziamento, l'adeguamento degli impianti di Informazione al pubblico delle tratte Rimini-Ancona e Porto D'Ascoli- Montenero, il trasferimento Posto Centrale SCC da Bari a Pescara C.le, l'adeguamento telecomando DOTE Pescara C.le, la posa cavi a fibra ottica Cattolica-Ancona e l'incremento potenzialità del cavo Fibra Ottica Ancona-P.to D'Ascoli-Montenero.F) Upgrading tecnologico Bologna-Lecce: tratta Pescara – Termoli - Foggia: L'investimento è di tipo tecnologico con adeguamenti puntuali di tipo infrastrutturale ed è ricompreso in un programma più ampio che prevede la velocizzazione dell'intera dorsale Bologna- Lecce che consentirà di raggiungere la velocità di 200 Km/h per circa 300 km di linea.Nella tratta Pescara-Termoli-Foggia sono previste minime rettifiche di tracciato e di gallerie, innalzamenti locali di soprelevazione, adeguamento armamento ferroviario e opere d'arte, upgrading tecnologico di alcuni impianti, nuovo sistema di distanziamento, adeguamento stazioni e marciapiedi. Sono previste diverse fasi di attivazione: Francavilla – Ortona;Ortona – Porto di Vasto;Porto di Vasto – Termoli e Pescara PN – FrancavillaTermoli – Foggia con Posto Centrale ubicato a Bari Lamasinata.G) Velocizzazione Termoli – Foggia - Brindisi: La dorsale Adriatica è oggetto di interventi di potenziamento, prevalentemente di tipo tecnologico, che consentono una velocità massima potenziale di 200 km/h. Contestualmente agli adeguamenti tecnologici, è in avvio uno studio in merito ad adeguamenti puntuali di opere d'arte, armamento e trazione elettrica per la velocità di 200 km/h

Programma P223: Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Baltico-Adriatico e linee afferenti

sulla Pescara – Termoli. Interventi analoghi e per la medesima finalità sono previsti sulle tratte PM Lesina – San Severo e Bari – Brindisi.H) Upgrading tecnologico Bologna-Lecce: tratta Foggia-Bari-Brindisi: L'investimento è di tipo tecnologico con adeguamenti puntuali di tipo infrastrutturale ed è ricompreso in un programma più ampio che prevede la velocizzazione dell'intera dorsale Bologna- Lecce che consentirà di raggiungere la velocità di 200 Km/h per circa 300 km di linea.Nella tratta Foggia-Bari-Brindisi la velocizzazione consiste in minime rettifiche di tracciato, innalzamenti puntuali di sopraelevazione, adeguamento armamento ferroviario e opere d'arte, upgrading tecnologico di alcuni impianti, nuovo sistema di distanziamento, adeguamento stazioni e marciapiedi. Sono previste diverse fasi di attivazione: subtratta Bari-Brindisi, di cui si prevede l'attivazione per fasi entro il 2026: Bari Torre a Mare - Mola di Bari; Mola di Bari - Fasano e Fasano - Monopoli; Monopoli - Ostuni e Ostuni – Brindisi subtratta Foggia-Bari, di cui si prevede l'attivazione per fasi entro il 2026: Molfetta-Bari; Trinitapoli-Molfetta; Foggia-Trinitapoli. Il progetto prevede inoltre l'adeguamento a modulo 750 della stazione di Incoronata.I) Upgrading tecnologico Bologna-Lecce: tratta Brindisi-Lecce: L'investimento è di tipo tecnologico con adeguamenti puntuali di tipo infrastrutturale ed è ricompreso in un programma più ampio che prevede la velocizzazione dell'intera dorsale Bologna- Lecce che consentirà di raggiungere la velocità di 200 Km/h per circa 300 km di linea. Nella tratta Foggia-Bari-Brindisi la velocizzazione consiste in minime rettifiche di tracciato, innalzamenti puntuali di sopraelevazione, adeguamento armamento ferroviario e opere d'arte, upgrading tecnologico di alcuni impianti, nuovo sistema di distanziamento, adeguamento stazioni e marciapiedi. L) Interventi diffusi di adeguamento prestazionale per lo sviluppo del traffico merci (modulo, massa assiale e sagoma) delle linee del corridoio e di tratte afferenti, in sinergia alle ulteriori realizzazioni previste nell'ambito dei progetti di sviluppo infrastrutturale.

Le Regioni interessate dagli interventi sono: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Molise, Puglia

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

A) Potenziamento tecnologico della direttrice Bologna-Padova: Attivazione bivio Navile conseguita nel 2017; 1^a fase ACCM : in data 30 Marzo 2023 è avvenuta la consegna lavori e sono attualmente in corso le attività di realizzazione nella tratta S. Pietro in Casale – Occhiobello; sono in corso le attività di verifica relative all'Appalto CTC e TSS tratta Bologna-Ferrara; 2^a fase ACCM:- Sono in corso i lavori dell'ACCM per la realizzazione della tratta Occhiobello (e) - Monselice (i) la cui prima fase di attivazione riguarderà la tratta Occhiobello (e) – Rovigo (i). Sono in corso i lavori di Piazzale (realizzazione di canalizzazioni e attraversamenti).- Sono state ultimate le attività di verifica della Progettazione Esecutiva dei lavori riguardanti Piazzali e Fabbri per la realizzazione dell'ACC-M della tratta Monselice (i) - Padova CM (e) e in data 17/12/2024 sono stati consegnati i lavori.-In corso le attività propedeutiche per l'avvio del PFTE per la riconfigurazione PRG/TE della stazione di Rovigo B) Lunetta di Gorizia: Per quanto riguarda gli interventi a carico di RFI (intervento 1), in data 18/10/2022 è stata avviata la CdS e in data 30/09/2024 è pervenuto il parere Unico da parte della Regione FVG. In data 31/10/2024 è avvenuta chiusura della CdS, sono in corso le attività propedeutiche per l'avvio dell'attività negoziale.C) Upgrading tecnologico della tratta Udine - Ronchi dei Legionari nord: Ultimata la progettazione definitiva, le attività di verifica si sono concluse in data 11/07/2024. Le attività negoziali potranno essere avviate una volta acquisiti i finanziamenti necessari. D)Upgrading tecnologico Bologna-Lecce- tratta Bologna-Rimini: Velocizzazione tratta Castelbolognese (e) – Castel San Pietro (e): Attivazione prevista a marzo 2026; l'attivazione della stazione di Castel San Pietro è prevista per il 2027 Velocizzazione tratta Castel San Pietro (e) – Bivio San Vitale (e): Sono da avviare le fasi progettuali e realizzative in pendenza dei finanziamenti con attivazione prevista per il 2028 Apparato Centrale Computerizzato Rimini: Sono da avviare le fasi progettuali e realizzative in pendenza dei finanziamenti. E) Upgrading tecnologico Bologna-Lecce: tratta Rimini-Ancona-Pescara: Le lavorazioni principali sono state completate e sono in corso opere accessorie e di completamento. Per il trasferimento del Posto Centrale Sistema di Comando e Controllo da Bari a Pescara C.le., le attività relative agli apparati di Posto Centrale sono state completate e messe in esercizio a luglio 2024 le apparecchiature di diagnostica dei posti periferici attivati nel 2025. In fase di avvio le attività relative all'installazione dei posti periferici di circolazione che si concluderanno presumibilmente nel 2026, intervento del valore di 1,5M€ su progetto dedicato.F) Upgrading tecnologico Bologna-Lecce: tratta Pescara – Termoli - Foggia: Sono in corso, i lavori di potenziamento tecnologico sulle tratte:•Francavilla(i) – Ortona(e): attivata a Maggio 2023;•Ortona(i) – Porto di Vasto(e);•Porto di Vasto(i) – Termoli(e);•Pescara PN(e) – Francavilla(i) (con codifica dei binari di corsa di Pescara C.le e Pescara PN).

Tutte le attività per gli interventi previsti necessitano di un coordinamento con i progetti di investimento ricadenti sul territorio di Ortona (PRG di stazione, adeguamento PC80 gall. Storica Castello, raddoppio a nord, gestione traffico merci per il porto di Ortona).Relativamente al completamento della velocizzazione della tratta Termoli-Foggia sono in corso lavori su:•tratta San Severo – Rignano Garganico (lavori di cabina e piazzale)•tratta San Severo – Apricena (lavori di piazzale)•tratta Rignano Garganico – Foggia (Posa Fibra Ottica).Da avviare i lavori per SCMT sulla tratta Termoli-Foggia.G) Velocizzazione Termoli – Foggia - Brindisi: Sono in fase di completamento gli interventi di rinnovo binari di alcuni tratti di linea, nonché di modifiche piano regolatore generale di alcune stazioni sulla Bari – Brindisi. Interventi analoghi sono previsti sulla tratta PM Lesina – San Severo. Sono in fase di esecuzione interventi di manutenzione straordinaria su alcune opere civili della linea Bari-Brindisi. Tramite indagini e relazioni tecniche, si sta inoltre verificando la capacità delle opere di resistere all'incremento della velocità. Sono state riconosciute ulteriori risorse per 12 milioni per finalizzare l'intervento anche alla luce dell'aumento delle tariffe.H) Upgrading tecnologico Bologna-Lecce: tratta Foggia-Bari-Brindisi: Sub tratta Foggia - Bari•Interventi di completamento sulle tratte: Pescara - Termoli, Termoli - Foggia, Bari Torre a Mare - Brindisi e Foggia – Barletta•Upgrading Foggia – Bari (compl.): progettazione esecutiva consegnata, in corso le verifiche •ACCM Bari PN – Molfetta: progettazione esecutiva consegnata, in corso le verifiche;•SCC di Pescara e RTB Pescara-Termoli: in corso le attività di riconfigurazione SCC e completamento RTB•PRG Incoronata: progettazione in corso.Sub tratta Bari - Brindisi•Bari Torre a Mare –Mola - Fasano: lavori in corso.I) Upgrading tecnologico Bologna-Lecce: tratta Brindisi-Lecce: •ACCM Brindisi (i)- Lecce (e): attivato;•ACCM Brindisi – Fasano: lavori in corso;•PRG di Lecce: attivato, in corso lavori di completamento.L) Interventi diffusi di adeguamento prestazionale per lo sviluppo del traffico merci In realizzazione: Modulo Venezia – Trieste (San Giorgio di Nogaro), Modulo Bivio d'Aurisina – Villa Opicina, In progettazione: Modulo Udine – Palmanova – Cervignano (PM Cargnacco), Modulo Udine – Gorizia – Ronchi dei Legionari, Massa assiale Venezia – Trieste, Massa assiale Udine – Cervignano, sagoma e massa assiale Casarsa - Portogruaro (Rilievi ed indagini per D4 completate), Modulo Venezia – Trieste (PM Latisana),Attivazione: modulo Cervignano Smistamento (17/12/2023), Modulo Udine – Palmanova – Cervignano (Stazione di Palmanova).I190

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Potenziamento tecnologico Bologna - Padova: Incremento potenzialità della linea e miglioramento delle condizioni di gestione della circolazione;

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P223: Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Baltico-Adriatico e linee afferenti

Incremento affidabilità dei sistemi e dunque della regolarità della circolazione; Per tutte le tipologie di servizi abbattimento dei minuti di ritardo derivanti da indisponibilità degli apparati che gestiscono la circolazione Lunetta di Gorizia: incremento della capacità grazie all'eliminazione manovre parassite. Maggiori benefici saranno visibili in uno scenario di regime in cui, con la completa elettrificazione della tratta Gorizia – Nova Gorica e con il ripristino e l'elettrificazione della lunetta di collegamento, lato Slovenia, verso Prvacina, la configurazione del nodo di Gorizia si completerebbe assumendo uno schema definitivo ad "H" risultando così perfettamente "permeabile", senza cambi di direzione qualunque sia l'esigenza di un suo futuro attraversamento Upgrading tecnologico Udine - Ronchi•Superamento obsolescenze tecnologiche, migliorando le potenzialità degli impianti; •Aumento della capacità di linea da 6 a 10 treni/h per direzione mediante il rinnovo del sistema di distanziamento;•Migliore gestione delle indisponibilità e più efficiente programmazione dei lavori, evitando interruzioni di linea, grazie alla banalizzazione del blocco di distanziamento;•Aumento prestazioni funzionali grazie ad interventi di adeguamento dei PRG nelle stazioni consentendo di velocizzare alcuni itinerari e ottenere binari con modulo 750m;•Recupero personale di stazione grazie ai nuovi apparati che consentiranno l'impresenziamento degli impianti;•Predisposizione tecnologica degli apparati di stazione finalizzati ad attivare le funzionalità ETCS in coerenza con la programmazione del Piano ERTMS.Upgrading tecnologico Bologna-Lecce: tratta Rimini-Ancona-Pescara:Unitamente agli altri interventi programmati sulla direttrice gli interventi consentiranno un recupero dei tempi di viaggio per i servizi passeggeri lunga percorrenza fino a 24' sulla relazione Bologna-Bari e 35' sulla relazione Bologna-Lecce.



Capacità	X
Velocità	
Accessibilità	
Regolarità	X
Prestazioni (merci)	X
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	X
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Veneto
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Marche
Abruzzo
Molise
Puglia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica						Obiettivi strategici			
	PNRR	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE
Adeguamento del tracciato e velocizzazione Adriatica: tratta Foggia-Bari-Lecce	X		X	X			X			
Adeguamento del tracciato e velocizzazione Adriatica: tratta Pescara-Termini-Iscia	X		X				X			
Adeguamento del tracciato e velocizzazione Adriatica: tratta Bologna-Rimini	X		X				X			

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025												
Programma P223: Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Baltico-Adriatico e linee afferenti												
Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Baltico-Adriatico e linee afferenti - interventi diffusi	X		X	X					X	X	X	
Linea Bologna - Padova: potenziamento tecnologico	X			X					X	X	X	
Adeguamento del tracciato e velocizzazione Adriatica: tratta Rimini-Ancona-Pescara			X			X				X	X	
Adeguamento prestazionale (modulo, sagoma, massa assiale) corridoio Baltico-Adriatico e linee afferenti				X	X				X	X	X	
Upgrading tecnologico linea Udine - Ronchi dei Legionari Nord				X					X	X	X	
Lunetta di Gorizia (collegamento diretto Goriza-Nova Gorica)				X					X	X	X	

QUADRO FINANZIARIO												milioni di euro
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2		
3.396,50	1.552,87	di cui:	1.085,26	39,90	182,00	208,34	1,94	35,44	0,00	128,65	1.714,98	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
3.393,12				3,38		3.396,50
Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari						
Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
1.584,50				8,38	-40,00	1.552,87
Copertura dei fabbisogni indifferibili connessi agli extraoneri degli appalti in corso e per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche). Rimodulazione della copertura su interventi parzialmente finanziati a favore di ulteriori fabbisogni maggiormente prioritari						

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Adeguamento del tracciato e velocizzazione Adriatica: tratta Bologna - Rimini	116,40	116,40	0,00	97,22	19,18	84,48	71,00	17,21	13,41	11,68	10,78	7,97	15,13	45,29
Adeguamento del tracciato e velocizzazione Adriatica: tratta Rimini-Ancona-Pescara	20,00	20,00	0,00	19,33	0,67	20,00	19,89	2,43	3,79	8,61	2,02	2,99	7,43	0,04
Adeguamento del tracciato e velocizzazione Adriatica: tratta Pescara-Termini-Foggia	137,19	137,19	0,00	121,64	15,56	123,11	62,36	22,78	9,57	13,52	6,28	9,42	13,85	67,11
Adeguamento del tracciato e velocizzazione Adriatica: tratta Foggia-Bari-Lecce	429,47	398,22	31,25	371,80	57,67	232,49	165,08	53,23	5,07	6,73	25,27	51,28	17,79	262,60
Lunetta di Gorizia (collegamento diretto Gorizia-Nova Gorica)	24,02	24,00	0,02	22,81	1,21	1,23	0,37	0,00	0,01	0,25	0,00	0,02	5,00	23,68
Linea Bologna - Padova: potenziamento tecnologico	223,48	223,48	0,00	196,16	27,31	141,63	31,11	10,13	1,12	2,19	1,80	6,76	7,44	192,45
Adeguamento prestazionale (modulo, sagoma, massa assiale) corridoio Baltico-Adriatico e linee afferenti	324,18	143,48	180,70	310,95	13,23	47,43	42,30	20,20	2,86	1,90	3,54	7,79	9,08	282,37
Upgrading tecnologico linea Udine - Ronchi dei Legionari Nord	54,04	6,00	48,04	51,55	2,49	1,53	0,81	0,00	0,00	0,01	0,39	0,56	5,00	52,95
Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Baltico-Adriatico e linee afferenti - interventi diffusi	2.067,72	484,11	1.583,61	386,65	1.681,07	374,15	314,16	185,84	18,02	43,39	28,76	8,68	37,78	1.756,40
	3.396,50	1.552,87	1.843,62	1.578,11	1.818,39	1.026,07	707,07	311,83	53,85	88,27	78,85	95,47	85,35	2.682,88

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
BO - upgrading linee merci	J87J18000230001	62,40	62,40	100%	42,13	68%	Realizzazione
Upgrade tecnologico e prestazionale linea Adriatica. Interventi tecnologici tratta Bologna - Rimini. Ulteriore fase	J44C20002260001	54,00	54,00	100%	33,48	62%	Realizzazione
Adeguamento del tracciato e velocizzazione Adriatica: tratta Bologna -Rimini		116,40	116,40	100%	75,62	65%	
Velocizzazione Adriatica e Upgrading tecnologico - AN	J86E19000400001	20,00	20,00	100%	19,98	100%	In ultimazione

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025							
Programma P223: Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Baltico-Adriatico e linee afferenti							
Adeguamento del tracciato e velocizzazione Adriatica: tratta Rimini-Ancona-Pescara		20,00	20,00	100%	19,98	100%	
Upgrading tecnologico e prestazionale linea Adriatica - Interventi tecnologici intera tratta Pescara-Lecce	J64H14000450001	83,06	83,06	100%	57,57	69%	Realizzazione
Velocizzazione Adriatica: completamento upgrading tecnologico linea Adriatica tratta Pescara - Lecce (Termoli - Foggia)	J46E19000130001	50,64	50,64	100%	15,63	31%	Realizzazione
Velocizzazione tratta Pescara - Termoli	J44E22002770001	3,50	3,50	100%	0,27	8%	Realizzazione
Adeguamento del tracciato e velocizzazione Adriatica: tratta Pescara-Termoli-Foggia		137,19	137,19	100%	73,48	54%	
Completamento potenziamento tecnologico linea Adriatica	J34E21001360001	138,05	110,56	80%	9,06	8%	Realizzazione
Velocizzazione Adriatica: upgrading tecnologico Foggia-Bari-Brindisi	J36I18000060001	95,76	92,00	96%	14,71	16%	Realizzazione
Velocizzazione Adriatica fino a 200 km/h - ambito Bari	J44E22002780009	92,39	92,39	100%	66,67	72%	Realizzazione
PRG e ACC Lecce	J69B12000050001	73,27	73,27	100%	65,58	90%	Realizzazione
Velocizzazione Bari-Lecce	J59B12000020001	15,00	15,00	100%	12,20	81%	Realizzazione
Velocizzazione Napoli-Bari	J39B12000040001	15,00	15,00	100%	6,42	43%	Realizzazione
Adeguamento del tracciato e velocizzazione Adriatica: tratta Foggia-Bari-Lecce		429,47	398,22	93%	174,64	44%	
Lunetta di Gorizia	J84H20002450001	24,02	24,00	100%	0,38	2%	Progettazione
Lunetta di Gorizia (collegamento diretto Goriza-Nova Gorica)		24,02	24,00	100%	0,38	2%	
Potenziamento tecnologico Linea Bologna-Padova (seconda fase)	J54H16001160001	153,23	153,23	100%	23,19	15%	Realizzazione
Upgrading tecnologico Bologna-Padova (1^ fase)	J54H14000530001	70,25	70,25	100%	17,26	25%	Realizzazione
Linea Bologna - Padova: potenziamento tecnologico		223,48	223,48	100%	40,45	18%	
Adeguamento a modulo della linea Adriatica, tratte Rimini - Brindisi e Bari - Taranto	J24E22000170001	275,00	94,30	34%	0,46	0%	Progettazione
Upgrading prestazionale corridoi Mediterraneo e Baltico-Adriatico (adeguamento modulo linea - fase)	J34H14000540001	36,98	36,98	100%	35,78	97%	In ultimazione
Upgrading prestazionale corridoio Baltico-Adriatico-Bologna	J44H17000430001	8,20	8,20	100%	5,83	71%	Realizzazione
VE - upgrading linee merci	J17D22000190001	4,00	4,00	100%	1,97	49%	Realizzazione
Adeguamento prestazionale (modulo, sagoma, massa assiale) corridoio Baltico-Adriatico e linee afferenti		324,18	143,48	44%	44,04	31%	
Upgrading tecnologico della tratta Udine - Ronchi dei Legionari Nord	J26G21004560001	54,04	6,00	11%	1,12	19%	Progettazione
Upgrading tecnologico linea Udine - Ronchi dei Legionari Nord		54,04	6,00	11%	1,12	19%	
Completamento upgrading direttrice Adriatico - Ionica		1.399,23	30,10	2%	0,00	0%	Progettazione
Completamento upgrading direttrice Venezia - Trieste/Udine		258,19	37,41	14%	0,00	0%	Progettazione
Interventi di upgrade tecnologico e prestazionale - BA	J84C20001910001	151,12	151,12	100%	103,79	69%	Realizzazione
Completamento SCC Adriatica	J17I10000040001	73,01	65,01	89%	63,13	97%	Realizzazione
BA - upgrading linee viaggiatori	J87I17000030001	38,90	39,20	100%	35,12	90%	In ultimazione
TS - upgrading linee viaggiatori	J37J18000080001	31,92	31,92	100%	31,68	99%	In ultimazione
Interventi diffusi di upgrading infrastrutturale e tecnologico ambito Ancona	J87F19000120001	22,70	36,70	100%	18,39	50%	Realizzazione
Upgrading prestazionale Corridoio Scandinavia - Mediterraneo Direttrice Adriatica	J74H17000600001	21,70	21,70	100%	21,06	97%	In ultimazione
Upgrading prestazionale corridoio Scandinavia - Mediterraneo - Bari	J87D17000050001	20,85	20,85	100%	20,73	99%	In ultimazione
Upgrading linea Adriatica. Ulteriori interventi AN	J87J18000270001	20,00	20,00	100%	19,97	100%	In ultimazione
Interventi diffusi di upgrading infrastrutture e tecnologico ambito Venezia	J17J18000360001	12,33	12,33	100%	6,42	52%	Realizzazione
AN - upgrading linee viaggiatori	J87I17000020001	10,50	10,50	100%	10,46	100%	In ultimazione
AN - upgrading linee merci	J87D22000560001	6,06	6,06	100%	2,42	40%	Realizzazione
Interventi per lo sviluppo del traffico merci - Ancona	J74H20000990001	1,20	1,20	100%	1,18	99%	In ultimazione
Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Baltico-Adriatico e linee afferenti - interventi diffusi		2.067,72	484,11	23%	334,36	69%	

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto di raddoppio della tratta Parma-Vicofertile che si svilupperà a partire dalla stazione di Parma, per circa 8 Km complessivi fino a Vicofertile, dei quali i primi 5 Km circa in variante di tracciato ed i restanti 3 Km in affiancamento alla linea esistente. Rispetto al tracciato sviluppato nel Progetto Preliminare del 2004, è stata apportata una variante di tracciato in corrispondenza dell'ingresso in stazione di Parma che prevede la divisione del flusso pari e dispari. I due binari (pari e dispari) procedono su sedi separate in affiancamento a nord e sud alla linea esistente Mi-Bo: il BP percorre il tracciato studiato nel preliminare mentre il BD si innesta sui binari bassi viaggiando in affiancamento a sud della linea Milano-Bologna.

Inquadramento territorialeLa linea Pontremolese (Parma – La Spezia) è parte integrante del corridoio plurimodale Ti.Bre. (Tirreno-Brennero).La linea ferroviaria Pontremolese, è una delle principali trasversali della rete e collega, attraverso un percorso di circa 112 km, le stazioni di Parma e Fidenza, con Vezzano Ligure e Sarzana sulla direttrice tirrenica. Proprio questa funzione di collegamento porta l'itinerario ad essere utilizzato per l'inoltro dei treni merci a servizio dei porti dell'Alto Tirreno.L'orografia del territorio attraversato dalla linea è estremamente varia, estendendosi , attraverso l'appennino, dalla costa tirrenica alla pianura padana.Tipologia di opereIl progetto classificato, tra gli obiettivi strategici di “sviluppo della rete merci”, ha come obiettivo l'incremento della potenzialità della linea. La realizzazione delle opere consente di dotare la linea di adeguate caratteristiche funzionali, finalizzate allo sviluppo del traffico merci, che superino le limitazioni di prestazione per eccessi di pendenza, composizione dei convogli e sagoma di transitabilità.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

La Progettazione Preliminare è stata approvata con Delibera CIPE n. 18 del 8 maggio 2009. Nel giugno 2011 è stato inoltrato al MIT il Progetto Definitivo per l'attivazione dell'iter autorizzativo secondo la L.O. ma venne successivamente sospeso per mancanza di finanziamenti.Successivamente alla conclusione della conferenza di Servizi, il Commissario straordinario con l'Ordinanza n.4 del 16 ottobre 2024, per quanto previsto al comma 1-quater dell'art. 44 del DL 77/2021, ha approvato il progetto definitivo.L'avvio delle attività negoziali sarà possibile previa completa copertura finanziaria dell'intervento.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

La realizzazione del tratto di raddoppio fra Parma e Vicofertile contribuirà a:- all'incremento della capacità della tratta ed all'incremento della regolarità della circolazione;- risolvere le interferenze con la viabilità ordinaria con soppressione dei PL urbani;- dismissione della tratta storica all'interno di Parma;- utilizzo dell'area sovrastante la Galleria Parma per realizzare opere di interesse pubbliche quali strade, parcheggi, aree verdi;- determinare potenziali opportunità di rigenerazione dei luoghi attraversati dall'infrastruttura di progetto in coerenza con le prospettive di sviluppo pianificate dalla città di Parma.



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Emilia Romagna

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0276A: Completamento raddoppio asse ferroviario Pontremolese - 1^ fase

	Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change	Adeguamento a standard tecnici	Sviluppo tecnologico	Sistemi regionali e metropolitani	Potenziamento connessioni merci	Sviluppo corridoi TEN-T	Completamento valichi alpini	Alta Velocità (AV)		Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR
Intervento / Opere funzionali																						
Raddoppio Parma-Vicofertile							X	X				X									X	

QUADRO FINANZIARIO												milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento		
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2			
508,00	359,91	di cui:	306,95	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,09	0,00		

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE												milioni di euro	
Evoluzione Costo													
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze							CdP-I agg.2025	
486,40			21,60									508,00	Aggiornamento dei quadri economici, ad esito delle prescrizioni dell'iter autorizzativo nella tratta Parma - Vicofertile

Evoluzione coperture finanziarie							
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
359,90						359,91	

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Parma-Vicofertile	508,00	359,91	148,09	429,84	78,16	9,90	9,14	5,75	0,00	0,00	0,00	2,66	5,00	498,85
	508,00	359,91	148,09	429,84	78,16	9,90	9,14	5,75	0,00	0,00	0,00	2,66	0,73	498,85

CRONOPROGRAMMA														
CUP														
					Stato attuativo					Iter procedurale				
					Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione	
					Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine
Raddoppio Parma-Vicofertile					J81H02000000001	Iter autorizzativo	-	-	6-2010	10-2024	-	-	12-2025	10-2028

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto costituisce il completamento del programma di potenziamento della trasversale La Spezia-Parma per il miglioramento dei collegamenti tra i porti dell'alto Tirreno e la regione padana.

La 2^a fase di completamento del raddoppio dell'asse ferroviario riguarda:- il raddoppio della tratta Vicofertile-Collecchio-Osteriazza (località di servizio posta oltre Fornovo). Il Progetto prevede il raddoppio della attuale linea a semplice binario, parte in affiancamento e parte in variante;- il raddoppio della tratta Berceto-Pontremoli-Chiesaccia. Il Progetto prevede la realizzazione di una nuova galleria di valico in variante tra Berceto e Pontremoli e la realizzazione di una nuova tratta a doppio binario tra Pontremoli-Chiesaccia.L'opera prioritaria per l'abbattimento dell'attuale pendenza del 25 per mille (tra Pontremoli e Borgotaro) è la galleria di shunt prevista tra Pontremoli e Berceto, di lunghezza pari a circa 22 km. Sempre lungo la tratta che va da Berceto a Chiesaccia vi sono altre sei gallerie più corte, oltre a numerosi viadotti.

Inquadramento territorialeLa linea Pontremolese (Parma – La Spezia) è parte integrante del corridoio plurimodale Ti.Bre. (Tirreno-Brennero).La linea ferroviaria Pontremolese, è una delle principali trasversali della rete e collega, attraverso un percorso di circa 112 km, le stazioni di Parma e Fidenza, con Vezzano Ligure e Sarzana sulla direttrice tirrenica. Proprio questa funzione di collegamento porta l'itinerario ad essere utilizzato per l'inoltro dei treni merci a servizio dei porti dell'Alto Tirreno.L'orografia del territorio attraversato dalla linea è estremamente varia, estendendosi , attraverso l'appennino, dalla costa tirrenica alla pianura padana.Tipologia di operell progetto classificato, tra gli obiettivi strategici di “sviluppo della rete merci”, ha come obiettivo l'incremento della potenzialità della linea. La realizzazione delle opere consente di dotare la linea di adeguate caratteristiche funzionali, finalizzate allo sviluppo del traffico merci, che superino le limitazioni di prestazione per eccessi di pendenza, composizione dei convogli e sagoma di transitabilità.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

La Progettazione Preliminare è stata approvata dal CIPE nel 2009 (perfezionando così l'intesa Stato - Regioni sulla localizzazione dell'opera e apponendo il vincolo preordinato all'esproprio, oggi scaduto). In considerazione di quanto rappresentato nella Delibera CIPE del 2009, in cui si ritenevano prioritari i sub-lotti Parma-Vicofertile e Collecchio-Osteriazza, nel febbraio 2024 è stata avviata la progettazione definitiva del raddoppio della tratta Vicofertile – Collecchio – Osteriazza, attualmente in corso. Nell'ambito della progettazione definitiva sono in corso approfondimenti con il Consorzio della Bonifica Parmense e Regione Emilia-Romagna per definire le soluzioni progettuali in materia di idraulica.Inoltre è in corso uno studio per l'individuazione di alcuni interventi puntuali di potenziamento dei principali impianti sulla linea Pontremolese propedeutici al futuro intervento di raddoppio.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Il completamento del raddoppio dell'asse consentirà: - Miglioramento dell'offerta dei servizi regionali;- Riduzione dei tempi di percorrenza;- Bilanciamento dei traffici generati dal Porto di La Spezia;- Upgrading infrastrutturale.



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Emilia Romagna

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica	Obiettivi strategici
------------------------	----------------------

Progetto 0276B: Completamento raddoppio asse ferroviario Pontremolese - 2^ fase

CUP		Stato attuativo				Iter procedurale											
						Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
						Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
Raddoppio Vicofertile-Fornovo(Osteriazza) e Berceto-Chiesaccia		J81H020000000001	Progettazione	10-2002	5-2009	2-2024	9-2028	-	-	7-2027	3-2030	1-2028	7-2039	7-2039			

Programma P224: Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Scandinavia - Mediterraneo e linee afferenti

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma prevede l'adeguamento prestazionale e il potenziamento tecnologico ed infrastrutturale della Rete TEN-T Core Merci coincidente con il corridoio Mare del Nord - Reno - Mediterraneo, nonché sul linee di adduzione di particolare interesse per il traffico merci. Gli interventi principali consistono in:- rinnovo degli impianti di linea e di stazione con la rimodulazione del distanziamento ed i necessari adeguamenti infrastrutturali dei piani regolatori delle stazioni, attività propedeutiche all'installazione del sistema ERTMS- velocizzazione delle linee e degli impianti (velocizzazione degli itinerari deviati, realizzazione sottopassi, movimenti contemporanei nelle sedi di incrocio sul semplice binario,...)- adeguamento prestazionale (allungamento modulo di linea, adeguamento sagoma, adeguamento della sede e della piattaforma per riclassifica massa assiale).

Le principali realizzazioni riguardano: A) Upgrading tecnologico Brennero-Verona: la linea Verona Brennero fa parte del corridoio interoperabile Scandinavo – Mediterraneo della Rete Core ed il suo upgrade tecnologico rappresenta un intervento propedeutico all'implementazione del programma ERTMS.B) Upgrade del Sistema di Distanziamento della Linea Bologna-Verona (fasi): La linea Bologna - Verona, di lunghezza pari a 114 km, è prevalentemente caratterizzata da velocità massime di rango C pari a 195 km/h e distanziamento di specifica commerciale di 6', conseguiti mediante attrezzaggio tecnologico con Blocco Automatico Banalizzato 3/3. La tratta San Felice sul Panaro - Poggio Rusco - Nogara, di circa 40 km, è invece attrezzata con blocco conta assi. Questo attrezzaggio limita la velocità commerciale a 150 km/h e le tre sezioni di blocco determinano una specifica di distanziamento commerciale pari a 9'. Il progetto si articola in due fasi: 1^ Fase riguarda le tratte San Felice sul Panaro - Poggio Rusco, Nogara – Poggio Rusco e Crevalcore – San Felice. 2^ Fase riguarda le tratte Nogara - Bivio S. Lucia e Bivio Tavernelle - Crevalcore. In virtù dell'estensione dell'attivazione ACCM su tutta la linea diventa necessario realizzare un Upgrading dei sistemi di supervisione dei posti centrali di Bologna e Verona. Inoltre verrà realizzata l'elettificazione della tratta Poggio Rusco – raccordo ferroviario di Revere Scalo (circa 6 km). C) Potenziamento tecnologico Bologna – Piacenza (fasi): L'intervento consiste nel rinnovo tecnologico della linea storica Bologna - Piacenza mediante la realizzazione di un Apparato Centrale Multistazione (ACC-M) ubicato nel Posto Centrale di Bologna per la gestione centralizzata dell'intera tratta. Sono inoltre previsti interventi di piano regolatore nella stazione di Modena e Parma e di modifiche puntuali al piano del ferro in altri impianti. 1^ fase ACC-M: -Progettazione degli impianti sulla direttrice; -Inserimento dei Posti Periferici ACC di Lavino, Castelfranco Emilia e Quattro Ville Sud nel sistema multistazione ACCM del nodo di Modena; 2^ fase ACC-M: -Realizzazione di un nuovo apparato Multistazione, rinnovo del sistema di distanziamento e degli impianti di stazione di Modena e Rubiera e ACCM Rubiera – Reggio Emilia D) Upgrading tecnologico Roma - Napoli via Formia: - Tratta Campoleone-Formia: nell'ambito di questo intervento sono previste le opere tecnologiche (cabine e piazzali), di linea e di stazione, per la realizzazione di Apparati Centrali Computerizzati Multistazione sulle tratte Campoleone-Formia (con PCM, posto centrale multistazione, presso il fabbricato PCS, Posto Centrale Satellite, di Roma Termini), i relativi fabbricati, nonché alcuni interventi infrastrutturali finalizzati ad un rightsizing dei piani regolatori ed alla creazione delle condizioni per l'impresenziamento degli impianti. E' prevista inoltre l'implementazione della rete di telecomunicazione e del sistema di trasmissione dati, nonché la realizzazione di un nuovo sistema di telefonia selettiva di linea e di stazione. - Tratta Formia-Villa Literno: realizzazione dell'upgrade tecnologico al fine di realizzare l'ACCM Formia (e) - Villa Literno (i) ed implementare gli impianti per il comando e controllo dei treni dal Centro di Coordinamento Circolazione della linea, nonché PRG di Minturno; E) Upgrading tecnologico Linea AV/AC Roma - Napoli: opere tecnologiche (cabine e piazzali) per la realizzazione dell'upgrade degli Apparati Centrali Computerizzati Multistazione sulla tratta Roma- Napoli AV (con posto centrale PCM presso il fabbricato PCS di Roma Termini). E' previsto, inoltre, il rinnovo del sistema DOTE e del sistema di comando e controllo degli apparati TE; F) Upgrading tecnologico Linea DD Firenze-Roma 2° fase: L'intervento prevede interventi di adeguamento armamento, sulla trazione elettrica e sulle opere d'arte per la velocizzazione e si articola in due step:- PM Rovezzano – 1° bivio Chiusi Nord (velocizzazione DD)- 1° bivio Chiusi Nord – Orte (completamento velocizzazione DD) G) Adeguamento prestazionale linea Taranto – Gioia Tauro: La linea jonica, in particolare la tratta Taranto-Metaponto-Sibari, che poi prosegue fino a Paola sulla linea tirrenica, costituisce il corridoio di collegamento tra il porto di Gioia Tauro e la direttrice adriatica. Con il presente progetto si vuole potenziare prestazionalmente la tratta con l'adeguamento di alcuni impianti a modulo 750 metri e adeguamento a sagoma PC80 della linea e contestuale adeguamento della TE. Gli impianti interessati sono Nocera Tirinese, S. Pietro a Maida, Sibari e Rosarno. H) Interventi diffusi di adeguamento prestazionale per lo sviluppo del traffico merci (modulo, massa assiale e sagoma) delle linee del corridoio e di tratte afferenti, in sinergia alle ulteriori realizzazioni previste nell'ambito dei progetti di sviluppo infrastrutturale. Nell'ambito del programma è prevista la Velocizzazione Firenze-Pisa a beneficio dei servizi AV o eventuali servizi regionali veloci effettuati con materiale rotabile di ultima generazione.

Veneto Trentino Alto Adige Emilia Romagna Toscana Umbria Lazio Campania Calabria

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

A) Upgrading tecnologico Brennero-Verona Fase 1 Tratta ACC-M Trento-Trento Roncafort: attivato in data 27/10/2024. Fase 2 Tratta ACC-M Trento Roncafort (e)-Bolzano (e): sono in corso i lavori di piazzale e di cabina relativi alla tratta Trento Roncafort-Bronzolo; in data 01/04/2025 sono stati consegnati i lavori di piazzale relativi alla tratta Bronzolo-Bolzano. Fase 3 Tratta ACC-M Bolzano (e)-Le Cave (e): in corso la progettazione esecutiva dei lavori di piazzale. Fase 4 Tratta ACC-M Trento (e)-Ala (i): Terminata la progettazione definitiva, in corso la verifica. Fase 5 Tratta ACC-M Bivio S. Massimo-Ala: progettazione da avviare. Fase 6 Tratta ACC-M Brennero (e) – Le Cave (i): progettazione da avviare. B) Upgrade del Sistema di Distanziamento della Linea Bologna-Verona (fasi I e II): 1^ fase: Tratta San Felice sul Panaro - Poggio Rusco: attivazione del Blocco Automatico Banalizzato 3/3 a dicembre 2018; Tratta Poggio Rusco (i) – San Felice sul Panaro (i) attivato ACCM a dicembre 2021; Tratta Nogara (i) – Poggio Rusco (e) attivato ACCM a dicembre 2024; 192 Tratta Crevalcore – San Felice sul Panaro (e) è attualmente in corso di realizzazione l'ACCM; 2^ fase: Tratta Poggio Rusco-Raccordo ferroviario Revere Scalo, elettificazione attivata a dicembre 2021; Tratta Bivio Tavernelle – Crevalcore, in corso di realizzazione l'ACCM; Tratta Nogara-Bivio S. Lucia, sono in corso le attività propedeutiche per la contrattualizzazione degli interventi. C) Potenziamento tecnologico Bologna – Piacenza 1^ Fase ACC-MA Ottobre 2022 è

Programma P224: Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Scandinavia - Mediterraneo e linee afferenti

stato attivato l'ACC-M tratta Rubiera (e) – Santa Viola (e) ed inserimento dei Posti Periferici ACC di Castelfranco Emilia, Lavino e Quattro Ville Sud nel sistema multistazione ACCM del Nodo di Modena. Nel mese di febbraio 2025 si è conclusa l'attività negoziale per la realizzazione del PP/ACC di Modena ed è stata avviata la progettazione esecutiva. 2^ Fase ACC-M In data 25/07/2023 è stata avviata la Conferenza dei Servizi relativa all'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del PP/ACC di Rubiera e tratta Rubiera – Reggio Emilia, l'iter autorizzativo si è concluso in data 09/01/2024. In data 09/10/2024 sono state ultimate le attività di verifica relative alla progettazione. Potenziamento tecnologico Roma - Napoli via Formia Tratta Campoleone-Formia ACCM della tratta Campoleone – Latina attivato nel secondo semestre 2019. In corso i lavori per l'ACCM della tratta Latina – Formia. Tratta Formia-Villa Literno Interventi di cabina dell'ACCM Formia(e) - Villa Literno(i): lavori in corso; Interventi di piazzale dell'ACCM Formia(e) - Villa Literno(i): lavori in corso; E' in corso di progettazione l'intervento di inserimento in SCCM della tratta Villa-Formia contestuale all'ACCM PRG di Minturno: progettazione definitiva in corso. D) Upgrading tecnologico linea AV/AC Roma-Napoli In corso di realizzazione l'appalto ACC-M; E' in corso la progettazione esecutiva del rinnovo del DOTE; L'upgrading dell'SCC-M fase 1 attivato; E' in corso attività negoziale del rinnovo dell'SCC-M fase 2; E' in corso la progettazione esecutiva dell'upgrading RBC. F) Adeguamento prestazionale linea Taranto – Gioia Tauro Gli interventi sono stati progettati e sono in fase di realizzazione. Sono in fase di ultimazione gli interventi di rinnovo trazione elettrica della tratta S. Lucido – Longobardi e l'adeguamento del piano regolatore generale nella stazione di Sibari.

Sono di prossimo avvio gli interventi per il piano regolatore generale di Nocera Terinese e San Pietro a Maida. Attivazione della linea previsto entro giugno 2026. H) In realizzazione: Modulo Brennero-Verona 1^ fase, Moduli linea Tirrenica (4 impianti), Sagoma Civitavecchia- Roma-Pomezia, Massa Assiale Civitavecchia- Roma-Pomezia, Sagoma Roma-Napoli via Cassino, Sagoma modulo e peso assiale Linea Caserta – Foggia, Sagoma Bari-Taranto e Bari-Brindisi, Sagoma Taranto-Sibari-Paola-Gioia T., Moduli Taranto-Sibari-Paola-Gioia Tauro. H) Interventi diffusi di adeguamento prestazionale per lo sviluppo del traffico merci In realizzazione: Modulo Brennero-Verona 1^ fase, Moduli linea Tirrenica (4 impianti), Sagoma Civitavecchia- Roma-Pomezia, Massa Assiale Civitavecchia- Roma-Pomezia, Sagoma Roma-Napoli via Cassino, Sagoma modulo e peso assiale Linea Caserta – Foggia, Sagoma Bari-Taranto e Bari-Brindisi, Sagoma Taranto-Sibari-Paola-Gioia T., Moduli Taranto-Sibari-Paola-Gioia Tauro; In progettazione: Modulo Brennero-Verona; Modulo Civitavecchia- Roma-Pomezia; Modulo Roma-Napoli via Cassino;

Progettazione da avviare: Modulo e Sagoma Napoli-Salerno-Battaglia-Sapri, Modulo e Sagoma Linea Salerno - Paola; Attivati/In certificazione: Sagoma Pisa-Livorno/La Spezia e Chiarone-Civitavecchia

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

• Upgrade tecnologico Brennero-Verona: 'Ammodernamento tecnologico ACCM Verona-Brennero con conseguente miglioramento in termini di prestazione della linea e delle attività manutentive. Preparazione della tecnologia per l'incremento del Sistema ERTMS Livello 2 Sovrapposto; • Upgrade del Sistema di Distanziamento della Linea Bologna-Verona: Incremento di capacità dagli attuali 5 treni/h a 10 treni/h, per i servizi di lungo percorso recupero di percorrenza fino a 5' e maggiore regolarità dell'esercizio ferroviario; • Potenziamento tecnologico Bologna – Piacenza (fasi I, II e III): Rinnovo tecnologico degli apparati che gestiscono la circolazione dell'intera tratta; maggiore affidabilità degli impianti; Migliore gestione della circolazione e riduzione dei ritardi derivanti dall'obsolescenza/indisponibilità degli apparati. • Potenziamento tecnologico linea Roma-Napoli via Formia: per tutti i servizi, riduzione del 50% dei minuti di ritardo per indisponibilità rilevanti che necessitano dell'attivazione della circolazione a binario unico; per la tratta Campoleone – Formia, per i Regionali, recupero medio di 1,7 minuti per i treni con origine/ termine corsa; eliminazione di alcuni invii attualmente programmati grazie alle modifiche al piano del ferro in talune stazioni; nuovi spazi di stazione in alcuni impianti oggetto di upgrading dell'apparato; • Upgrading tecnologico Linea AV/AC Roma - Napoli: Al completamento di tutti gli interventi previsti sulla linea: - per tutti i servizi, riduzione del 50% dei minuti di ritardo per indisponibilità rilevanti che necessitano dell'attivazione della circolazione a binario unico; - per la tratta Campoleone – Formia, per i Regionali, recupero medio di 1,7 minuti per i treni con origine/ termine corsa; - eliminazione di alcuni invii attualmente programmati grazie alle modifiche al piano del ferro in talune stazioni; - nuovi spazi di stazione in alcuni impianti oggetto di upgrading dell'apparato. • Velocizzazione Firenze-Pisa: l'intervento consentirà una velocità massima di 180 km/h e una riduzione dei tempi di percorrenza sulla relazione, a beneficio dei servizi AV o eventuali servizi regionali veloci effettuati con materiale rotabile di ultima generazione. L'obiettivo dell'intervento è di recuperare fino a 5' sull'intera tratta origine-destino. • Upgrading tecnologico Linea DD Firenze-Roma 2° fase: Miglioramento gestione della circolazione sia in situazioni di normale esercizio che di degrado, e di performance della linea con impatto positivo sulla regolarità dell'esercizio ferroviario; Rimozione dell'obsolescenza tecnologica con notevoli benefici sulla disponibilità del sistema e la relativa manutenibilità.

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P224: Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Scandinavia - Mediterraneo e linee afferenti



	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	X
	Gestione spazi di stazione	X
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	X
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	X

LOCALIZZAZIONE

Lombardia

Veneto

Trentino Alto Adige

Friuli Venezia Giulia

Emilia Romagna

Toscana

Marche

Umbria

Lazio

Campania

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Intervento / Opere funzionali	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Coessione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change	Adeguamento a standard tecnici	Sviluppo tecnologico	Sistemi regionali e metropolitani	Potenziamento connessioni merci	Sviluppo corridoi TEN-T	Completamento valichi alpini	Alta Velocità (AV)
Potenziamento tecnologico linea Roma-Napoli via Formia	X			X	X		X									X	X				
Adeguamento prestazionale (modulo, sagoma, massa assiale) corridoio Scandinavia-Mediterraneo e linee afferenti	X			X	X		X									X	X				
Upgrading tecnologico Linea AV/AC Roma - Napoli	X			X			X									X	X				
Linea Verona-Bologna: potenziamento tecnologico	X			X			X									X	X				
Linea Brennero-Verona: potenziamento tecnologico	X			X			X									X	X				
Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Scandinavia - Mediterraneo e linee afferenti - interventi diffusi	X			X			X									X	X				
Linea Milano - Bologna: potenziamento tecnologico				X			X									X	X				
Upgrade tecnologico linea DD Firenze-Roma 2ª fase							X	X													

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P224: Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Scandinavia - Mediterraneo e linee afferenti

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
4.185,54	1.972,44		1.676,98	5,16	30,00	228,98	0,00	31,32	49,00	122,54	2.041,56

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
4.201,96	-20,62			4,19		4.185,54
Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari e allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.						

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
2.047,66	-20,62			4,81	-59,41	1.972,44
Rimodulazione della copertura su interventi parzialmente finanziati a favore di ulteriori fabbisogni maggiormente prioritari. Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche) e con risorse proprie della Società per interventi non rientranti nel Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria						

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Linea Brennero-Verona: potenziamento tecnologico	185,26	181,13	4,13	171,26	14,00	77,21	28,47	0,00	7,94	3,37	5,56	6,20	5,00	154,35
Linea Verona-Bologna: potenziamento tecnologico	143,23	123,23	20,00	137,63	5,60	85,28	70,15	22,00	3,62	11,16	10,82	9,62	10,08	74,64
Linea Milano - Bologna: potenziamento tecnologico	128,72	80,00	48,72	121,19	7,53	28,11	25,76	6,98	7,18	3,49	4,72	1,78	8,14	102,72
Potenziamento tecnologico linea Roma-Napoli via Formia	201,79	191,83	9,95	180,16	21,62	134,41	48,33	25,48	4,58	3,66	7,31	8,85	15,81	146,56
Adeguamento prestazionale (modulo, sagoma, massa assiale) corridoio Scandinavia-Mediterraneo e linee afferenti	384,35	377,15	7,20	349,33	35,01	248,86	196,55	112,55	22,22	15,37	10,77	20,64	30,79	186,41
Upgrade tecnologico linea DD Firenze-Roma 2^ fase	200,45	200,45	0,00	193,37	7,08	198,18	190,98	85,80	19,07	54,23	17,89	11,41	42,04	5,91
Upgrading tecnologico Linea AV/AC Roma - Napoli	168,08	168,08	0,00	145,13	22,94	125,58	36,00	1,38	1,03	2,33	5,78	9,61	5,71	121,91
Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Scandinavia - Mediterraneo e linee afferenti - interventi diffusi	2.773,67	650,57	2.123,10	508,28	2.265,38	470,90	404,29	83,72	33,16	122,31	101,06	35,47	37,60	2.366,42
	4.185,54	1.972,44	2.213,10	1.806,36	2.379,18	1.368,53	1.000,53	337,91	98,78	215,93	163,89	103,57	106,54	3.158,92

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Upgrade tecnologico Verona - Brennero	J64C19000290009	140,43	140,43	100%	32,43	23%	Realizzazione
ACC di Bolzano	J36G21015190001	44,83	40,70	91%	2,12	5%	Realizzazione
Linea Brennero-Verona: potenziamento tecnologico		185,26	181,13	98%	34,55	19%	
Upgrade del sistema di distanziamento linea Bologna-Verona	J54H17000210001	143,23	123,23	86%	72,60	59%	Realizzazione
Linea Verona-Bologna: potenziamento tecnologico		143,23	123,23	86%	72,60	59%	
Potenziamento tecnologico Bologna-Piacenza (prima fase)	J64H17000130001	128,72	80,00	62%	26,18	33%	Realizzazione
Linea Milano - Bologna: potenziamento tecnologico		128,72	80,00	62%	26,18	33%	
Upgrading e banalizzazione del regime di circolazione sulla tratta Campoleone - Villa Literno	J49B12000060001	133,04	133,04	100%	51,95	39%	Realizzazione
Potenziamento tecnologie linea Roma-Napoli via Formia (ulteriore fase)	J14G18000190001	58,74	58,74	100%	6,99	12%	Realizzazione
Adeguamento tecnologie linea Roma-Napoli via Formia - tratta sud	J16I18000020001	10,00	0,05	0%	0,05	100%	Progettazione
Potenziamento tecnologico linea Roma-Napoli via Formia		201,79	191,83	95%	58,99	31%	
Interventi di upgrading per il business merci - Roma	J47F19000250001	90,61	90,61	100%	38,72	43%	Realizzazione
Upgrading prestazionale corridoio Scandinavia - Mediterraneo (adeguamento modulo linea e sagoma - fase)	J84H14001320001	80,77	73,57	91%	45,62	62%	Realizzazione
Adeguamento prestazionale linea Taranto - Gioia Tauro	J54E21004790008	80,00	80,00	100%	8,31	10%	Realizzazione
Upgrading prestazionale corridoio Scandinavia - Mediterraneo (adeguamento modulo linea e sagoma - fase)	J54H14000440001	49,72	49,72	100%	46,76	94%	In ultimazione

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025							
Programma P224: Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Scandinavia - Mediterraneo e linee afferenti							
Upgrading prestazionale corridoio Scandinavia - Mediterraneo (adeguamento modulo linea e sagoma - fase) BO	J84H14001280001	42,75	42,75	100%	37,91	89%	Realizzazione
Upgrading prestazionale corridoio Scandinavia - Mediterraneo (adeguamento modulo linea e sagoma - fase)	J94H14000130001	13,50	13,50	100%	5,71	42%	Realizzazione
FI - upgrading linee merci	J87J18000240001	10,70	10,70	100%	10,50	98%	In ultimazione
VR - upgrading linee merci	J97D22000410001	9,10	9,10	100%	4,06	45%	Realizzazione
Upgrading prestazionale corridoio Scandinavia - Mediterraneo area tirrenica - Roma	J54H17000750001	5,20	5,20	100%	4,03	77%	Realizzazione
Adeguamento prestazionale linee - RC	J27J18000360001	2,00	2,00	100%	1,73	86%	Realizzazione
Adeguamento prestazionale (modulo, sagoma, massa assiale) corridoio Scandinavia-Mediterraneo e linee afferenti		384,35	377,15	98%	203,35	54%	
Adeguamento a standard AV/AC della linea DDma Roma-Firenze 2^ fase	J44H17000110001	200,45	200,45	100%	195,99	98%	In ultimazione
Upgrade tecnologico linea DD Firenze-Roma 2^ fase		200,45	200,45	100%	195,99	98%	
Upgrading tecnologie linea AV/AC Roma - Napoli - fasi ACC-M e SCC-M	J16E20000000001	142,33	142,33	100%	36,50	26%	Realizzazione
Upgrading tecnologico linea AV/AC Roma-Napoli	J16J16001210001	25,75	25,75	100%	16,01	62%	Realizzazione
Upgrading tecnologico Linea AV/AC Roma - Napoli		168,08	168,08	100%	52,51	31%	
Completamento upgrading direttrice dorsale e tirrenica		2.243,61	120,51	5%	0,00	0%	Progettazione
Potenziamento tecnologico e infrastrutturale ambito Napoli	J97J18000360001	149,22	149,22	100%	84,95	57%	Realizzazione
Interventi di upgrade tecnologico e prestazionale - AN	J84C20001890001	98,08	98,08	100%	96,62	99%	In ultimazione
VR - upgrading linee viaggiatori	J97I17000090001	81,70	81,70	100%	78,62	96%	In ultimazione
Eliminazione riduzioni di velocità sulla linea AV/AC Firenze - Bologna - Piacenza	J97F19000160001	37,51	37,51	100%	37,46	100%	In ultimazione
BO - upgrading linee viaggiatori	J87I17000040001	30,68	30,68	100%	28,14	92%	In ultimazione
RM - upgrading linee viaggiatori	J57I17000060001	21,70	21,70	100%	19,03	88%	Realizzazione
Modifica ACC e PRG Roma Tiburtina (binari est)	J84H20002460001	19,00	19,00	100%	15,34	81%	Realizzazione
Interventi diffusi di upgrading infrastrutturale e tecnologico ambito Firenze	J87J18000710001	18,30	18,30	100%	15,78	86%	Realizzazione
Interventi di upgrading prestazionale e tecnologico ambito linee - FI	J84C20001870001	15,00	15,00	100%	14,88	99%	In ultimazione
Roma - Interventi infrastrutturali e tecnologici diffusi	J54G18000040001	12,67	12,67	100%	12,24	97%	In ultimazione
Attrezzaggio tecnologico del nuovo collegamento diretto tra gli impianti portuali di Livorno e l'interporto di Guasticce	J91B21004120001	12,00	12,00	100%	2,80	23%	Realizzazione
NA - upgrading linee merci	J97D22000430001	8,80	8,80	100%	1,31	15%	Realizzazione
Ancona, interventi infrastrutturali e tecnologici diffusi	J87D22000110001	7,37	7,37	100%	1,58	21%	Realizzazione
Interventi prestazionali e di upgrading tecnologico - ambito Bari	J87H22000370001	7,00	7,00	100%	2,94	42%	Realizzazione
Ancona, interventi infrastrutturali e tecnologici diffusi	J87F19000250001	5,80	5,80	100%	5,76	99%	In ultimazione
Interventi upgrading della rete merci - RM	J87I05000080001	3,00	3,00	100%	3,00	100%	In ultimazione
Ancona, interventi infrastrutturali e tecnologici diffusi	J87H21002960001	1,15	1,15	100%	1,07	93%	In ultimazione
RC - upgrading linee merci	J27D22000160001	1,07	1,07	100%	0,09	8%	Realizzazione
Adeguamento prestazionale e upgrading corridoio TEN-T Scandinavia - Mediterraneo e linee afferenti - interventi diffusi		2.773,67	650,57	23%	421,61	65%	

Progetto P261: Potenziamento linea Bologna-Prato

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto ha lo scopo di adeguare la linea agli standard prestazionali delle reti merci TEN-T con adeguamento della sagoma a P/C 80 mediante interventi sulle gallerie e conseguimento del modulo 750 metri negli impianti di Monzuno e Vaiano. Contestualmente è stato avviato il rinnovo tecnologico degli apparati di stazione mediante la realizzazione di un Apparato Centrale Computerizzato Multistazione su tutta la linea al fine di garantire benefici in termini di regolarità ed affidabilità infrastrutturale. Sono previsti inoltre, interventi nelle stazioni di Pianoro, Monzuno-Vado, Grizzana, S. Benedetto Val di Sambro- Castiglione dei P., Vernio, Vaiano per il miglioramento delle condizioni di accessibilità, abbattimento delle barriere architettoniche e generale restyling dei fabbricati, compreso il rinnovo dei dispositivi di informazione al pubblico, per offrire alla clientela dei servizi regionali un livello superiore di qualità nell'accesso ed utilizzo del sistema ferroviario.

Emilia Romagna/Toscana

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

I lavori delle opere civili della tratta Bologna – Prato vengono eseguiti in 3 fasi, come concordato con gli Enti regionali di Emilia-Romagna e Toscana: • Fase 1 - tratto Vernio – Prato: lavori ultimati; • Fase 2 - tratto Pianoro - San Benedetto Val di Sambro: lavori ultimati; • Fase 3 - tratto San Benedetto V.S. – Vernio: lavori in corso. Inoltre, è in corso la realizzazione dell'apparato ACC-M sulla tratta Bologna – Prato per fasi : • Pianoro (i) – Monzuno (i): attivato; • Monzuno (e) – San Benedetto Val di Sambro (e): attivato; • San Benedetto Val di Sambro (i) – Vernio (i): attivato; • Vernio (e) – Prato (e): lavori in corso.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

L'intervento consentirà lo sviluppo del Core Networks Corridor Scandinavia-Mediterraneo, di interesse per l'Italia, per semirimorchi e autostrada viaggiante (sagoma PC 80).



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	X
	Gestione spazi di stazione	X
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Emilia Romagna

Toscana

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Linea Bologna-Prato-Firenze: adeguamento prestazionale (sagoma, modulo) e potenziamento tecnologico	X						X								X		X				

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P261: Potenziamento linea Bologna-Prato

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatorie di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
565,34	526,64		479,98	0,01	0,00	46,65	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
565,34						565,34

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
526,64						526,64

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Linea Bologna-Prato-Firenze: adeguamento prestazionale (sagoma, modulo) e potenziamento tecnologico	565,34	526,64	38,70	539,45	25,89	475,79	355,57	40,49	6,18	96,11	45,31	76,90	16,61	206,08
	565,34	526,64	38,70	539,45	25,89	475,79	355,57	40,49	6,18	96,11	45,31	76,90	94,26	206,08

CRONOPROGRAMMA													
CUP	Stato attuativo				Iter procedurale								
	Realizzazione	Prog.Prel.		3-2022	Prog.Def.		4-2023	Prog.Esec.		3-2020	Attiv.Negoz.		10-2017
		Inizio	Fine		Inizio	Fine		Inizio	Fine		inizio	Fine	
Linea Bologna-Prato-Firenze: adeguamento prestazionale (sagoma, modulo) e potenziamento tecnologico		-	-	9-2023			7-2023			12-2027			6-2026

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi hanno riguardato il raddoppio, per fasi funzionali, della linea Bari-Taranto e la realizzazione di una bretella per il collegamento tra la linea Bari - Taranto e la linea Taranto - Metaponto. Le tratte Acquaviva-Gioia del Colle, Castellaneta-Palagianello-Massafra (compresa la variante di Palagianello) e Massafra-Bellavista-Taranto sono già state in esercizio. I lavori in corso di completamento riguardano il raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto. Gli interventi consistono nella realizzazione di una nuova linea di 10,5 km circa a doppio binario che si sviluppa in variante rispetto al tracciato attuale ed attraversa i comuni di Bari, Modugno e Bitetto, utilizzando nel tratto terminale lato Bitetto 2 km circa di sede già realizzata. Il nuovo tracciato bypassa l'abitato di Modugno e si sviluppa per quasi tutta la sua estensione in trincea profonda. La velocità di tracciato è 200 km/h, pari a quella prevista per la linea Bari - Taranto, a meno del tratto iniziale, di innesto di circa 1,1 km, che sarà percorso a 100 km/h. Le opere previste:- nuovo apparato telecomandabile di Bitetto;- 2 fermate (Villaggio Lavoratori, Modugno);- km 10,5 di nuova linea in variante;- interventi di riambientalizzazione.

Il territorio dove si realizza l'opera è prevalentemente pianeggiante ed è ubicato nei Comuni di Bitetto, Modugno e Bari. Il tracciato si sviluppa prevalentemente in trincea profonda e presenta 15 gallerie artificiali, 2 viadotti e un'opera scatolare di attraversamento del canale Lamasinata (esistente).

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

L'attivazione è stata conseguita il 26 luglio 2020. Sono in corso le attività di completamento del raddoppio e di dismissione della linea storica.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Incremento della capacità (da 4 treni/h nei due sensi di marcia a 6 treni/h), in coerenza con i livelli della domanda di TPL cadenzato previsto dall'Accordo Quadro (RFI - Regione Puglia) e con lo sviluppo del traffico merci sul Porto di Taranto. Miglioramento della regolarità della circolazione. Migliore gestione dei rotabili con la realizzazione di nuovi marciapiedi presso gli impianti di Villaggio del lavoratore e Modugno.



Capacità	X
Velocità	
Accessibilità	
Regolarità	X
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Puglia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici			
	PNRR	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF		Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Raddoppio Bari S.Andrea - Bitetto e Castellaneta-Palagianello e interventi di completamento tratte già raddoppiate, bretella di collegamento Bari-Taranto-Metaponto						X	X				X		X	

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Progetto 0100: Raddoppio Bari-Taranto

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

Evoluzione coperture finanziarie

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Altro
Raddoppio Bari S.Andrea - Bitetto e Castellaneta-Palagianello e interventi di completamento tratte già raddoppiate, bretella di collegamento Bari-Taranto-Metaponto	498,58	487,58	11,00	322,00	176,58	475,18	441,83	445,14	12,69	3,65	1,88	3,21	23,32	31,27
	498,58	487,58	11,00	322,00	176,58	475,18	441,83	445,14	12,69	3,65	1,88	3,21	0,73	31,27

CRONOPROGRAMMA

	CUP	Stato attuativo	Iter procedurale										
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Nego.		Esecuzione	Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
Raddoppio Bari S.Andrea - Bitetto e Castellaneta-Palagianello e interventi di completamento tratte già raddoppiate, bretella di collegamento Bari-Taranto-Metaponto	J71H920000300008	Esercizio	9-2002	10-2004	11-2004	8-2006	7-2000	7-2009	5-2004	12-2011	10-2005	12-2025	7-2020

Progetto 0142A: Raddoppio Pescara-Bari 1^ fase

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto complessivo del raddoppio della linea Pescara – Bari interessa le Regioni Abruzzo, Molise e Puglia e comprende interventi in parte da tempo attivati e interventi in fase di realizzazione: - Completamento tratte di raddoppio fra Ortona e Termoli e fra Apricena e San Severo (interventi da tempo conclusi). - Raddoppio a Nord di Ortona (interventi in corso) - PRG e ACCM di Foggia (interventi in corso).

In territorio abruzzese gli interventi in corso riguardano il raddoppio della tratta a nord di Ortona mediante la realizzazione, di una nuova galleria a semplice binario (circa 1 km) in aggiunta a quella già in esercizio. In territorio pugliese gli interventi in corso riguardano la realizzazione di un nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC) per la gestione della circolazione nel nodo di Foggia. L'intervento consiste nella velocizzazione degli itinerari a 60 km/h, razionalizzazione del piano del ferro, modulo merci a 750 metri, gestione del nuovo impianto di Cervaro, realizzazione del segnalamento plurimo per la gestione della bretella di collegamento tra le linee Bari–Foggia e Foggia–Napoli e realizzazione del nuovo ACCM Foggia – PM Cervaro con comando da Posto centrale ACCM di Bari Lamasinata.

L'intervento è interamente compreso nell'ambito della stazione di Foggia. Il territorio dove si realizza l'opera è prevalentemente pianeggiante


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Il raddoppio a nord di Ortona, attraverso la realizzazione di una nuova galleria (binario pari), è stato attivato nel 2018. Sono in corso di completamento gli interventi su opere civili, armamento, TE, IS, LFM, SRT per l'adeguamento della galleria storica lato mare (binario dispari).

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Il completamento del raddoppio della direttrice Adriatica a nord di Ortona consente: Il miglioramento nella gestione della circolazione con eliminazione dei perditempo medi di 3-5 minuti per consentire l'incrocio ai treni che si avvicinano contemporaneamente al tratto a semplice binario l'aumento della capacità, con possibilità di inserimento di nuovi servizi sulla tratta Pescara – Termoli l'incremento delle prestazioni per consentire il trasporto di semirimorchi e container high cube. Il PRG di Foggia consentirà: miglioramento della regolarità della circolazione grazie alla suddivisione dei flussi per stazioni elementari e alla centralizzazione del governo del traffico; miglioramento e aumento dei servizi sulla tratta Pescara – Termoli.

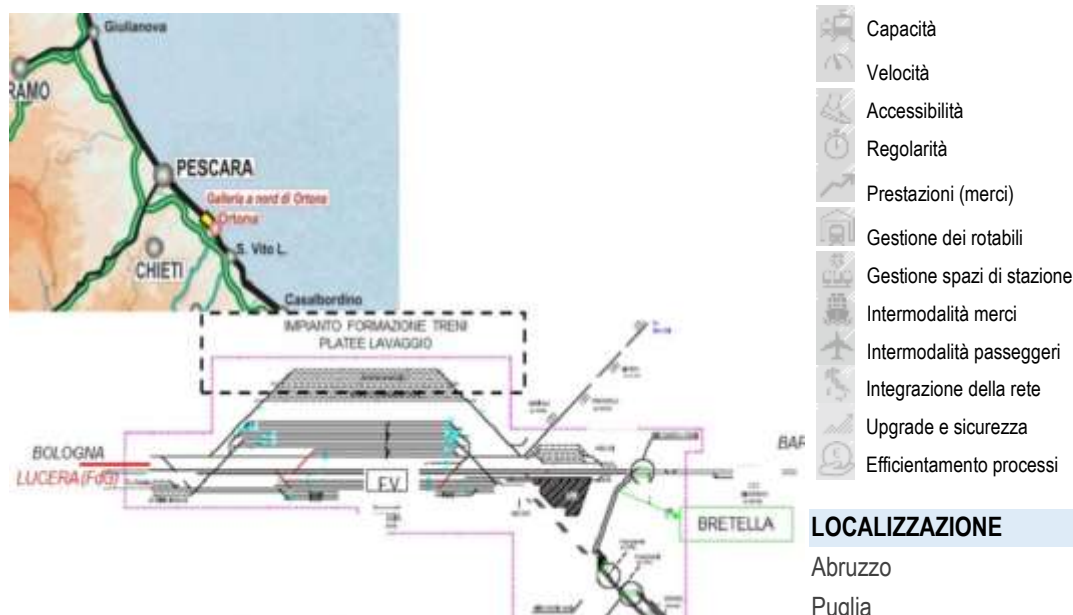

LOCALIZZAZIONE

Abruzzo

Puglia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica											Obiettivi strategici									
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento commissioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Completamento raddoppio Ortona-Casalbordino, Vasto-Salvo e Lesina-San Severo (opere già in esercizio)	X						X					X			X						

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0142A: Raddoppio Pescara-Bari 1^ fase

e Raddoppio tratta a nord della stazione di Ortona

PRG e ACC Foggia	X	X		X	X			X	X
------------------	---	---	--	---	---	--	--	---	---

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
318,79	318,79	di cui:	276,79	39,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
318,79						318,79

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
318,79						318,79

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Completamento raddoppio Ortona-Casalbordino, Vasto-Vasto S.Salvo e Lesina-San Severo (opere già in esercizio) e Raddoppio tratta a nord della stazione di Ortona	238,39	238,39	0,00	209,90	28,49	237,85	212,93	235,08	0,20	0,24	0,13	0,13	6,51	2,06
PRG e ACC Foggia	80,40	80,40	0,00	65,38	15,02	61,62	35,33	23,82	2,66	1,77	3,27	0,50	11,03	44,99
	318,79	318,79	0,00	275,28	43,51	299,48	248,25	258,90	2,86	2,01	3,40	0,63	3,94	47,06

CRONOPROGRAMMA														
CUP			Stato attuativo				Iter procedurale							
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Completamento raddoppio Ortona-Casalbordino, Vasto-Vasto S.Salvo e Lesina-San Severo (opere già in esercizio) e Raddoppio tratta a nord della stazione di Ortona	J71H92000000007	Esercizio	-	-	-	-	1-2001	-	4-2005	3-2012	1-2000	12-2025	12-2018	
PRG e ACC Foggia	J71H92000000007	Realizzazione	3-2025	7-2025	11-2010	2-2025	1-2014	2-2025	3-2013	6-2021	1-2014	7-2027	6-2026	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto completa il programma di raddoppio della direttrice Adriatica nella tratta Pescara – Bari ed interessa le Regioni Molise e Puglia.

Il progetto, inizialmente suddiviso in tre lotti funzionali (lotto 1: tratta Ripalta – Lesina interamente in Regione Puglia; lotto 2: tratta Termoli – Campomarino interamente nel territorio della Regione Molise; lotto 3: raddoppio tra Campomarino e Ripalta a cavallo tra Molise e Puglia) è attualmente articolato in due lotti funzionali: Lotto 1: Ripalta – Lesina: totalmente in affiancamento tra Ripalta e Lesina. Lotto 2: Termoli-Ripalta: parte in variante e parte in affiancamento, che recepisce la prescrizione della regione Molise.

Il territorio dove si realizza il Lotto 1 Ripalta - Lesina è prevalentemente pianeggiante. L'intervento è in affiancamento alla linea esistente tra Ripalta a Lesina ed, essendo l'area interessata da rischio idrogeologico, è prevista la realizzazione di opere quali tombini di trasparenza e il viadotto Ripalta. Il territorio dove si realizza il Lotto 2: Termoli - Ripalta è prevalentemente pianeggiante con zone collinari. L'intervento è parte in affiancamento e parte in variante di tracciato per allontanare la linea ferroviaria adriatica dalla costa. Sono previsti 15 viadotti e una galleria.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Lotto 1: in corso la fase realizzativa con interventi per la realizzazione di viadotti, sottovia, armamento, TE, IS e mitigazione ambientale; Lotto 2: in corso la fase realizzativa con interventi per la realizzazione di viadotti, sottovia, rilevati e trincee, armamento e TE.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

• Incremento della capacità da 4 treni/h a 10 treni/h nei due sensi di marcia. • Miglioramento della regolarità della circolazione. • Riduzione dei tempi di percorrenza per i servizi lungo percorso.

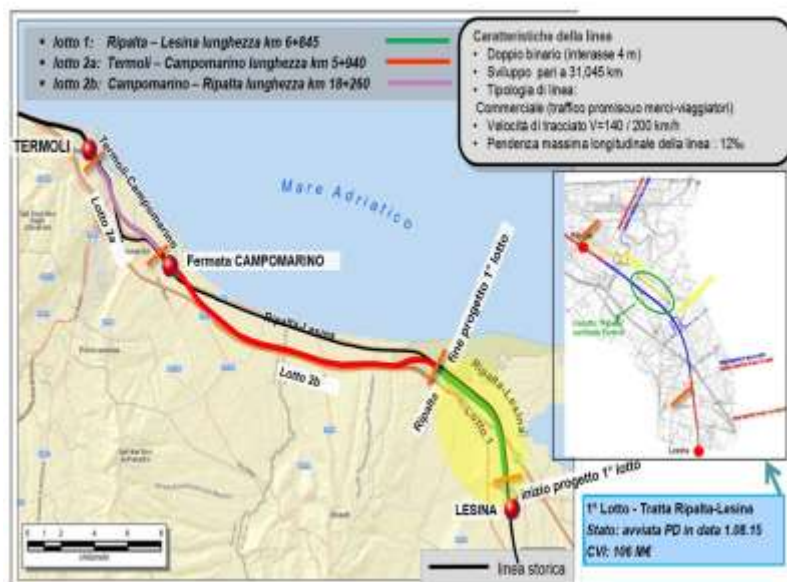

Capacità	X
Velocità	X
Accessibilità	
Regolarità	X
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Molise

Puglia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Accordi internazionali	Accordi EE LL	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani
Raddoppio Ripalta-Lesina	X	X					X				X		X		
Raddoppio Termoli-Ripalta		X		X							X			X	

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0142B: Completamento raddoppio Pescara-Bari (tratta Termoli-Lesina)

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve			
								Priorità 1	Priorità 2		
700,00	700,00	di cui:	542,00	0,00	150,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
700,00						700,00

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
700,00						700,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Ripalta-Lesina	108,90	108,90	0,00	80,82	28,08	102,03	58,01	11,54	0,50	0,90	3,81	17,26	5,13	46,92
Raddoppio Termoli-Ripalta	591,10	591,10	0,00	484,85	106,25	486,21	32,00	7,78	0,13	3,61	0,51	2,21	5,80	544,42
	700,00	700,00	0,00	565,67	134,33	588,24	90,01	19,32	0,63	4,51	4,31	19,47	60,41	591,35

CRONOPROGRAMMA														
CUP			Stato attuativo				Iter procedurale							
							Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.	
							Inizio		Fine		Inizio		Fine	
Raddoppio Ripalta-Lesina	J71H92000000007	Realizzazione	6-2007	1-2015	9-2002	12-2017	2-2001	-	10-2018	3-2021	3-2021	12-2026	12-2026	
Raddoppio Termoli-Ripalta	J71H92000000007	Realizzazione	3-2025	-	10-2016	6-2021	-	-	10-2021	6-2023	7-2022	4-2028	12-2028	

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi si inquadrano nel programma di riassetto del Nodo di Falconara e mirano a realizzare un collegamento diretto tra il Nord Italia e Roma via Orte, eliminando la necessità d'invertire la direzione di marcia dei treni a Falconara Marittima, e alla rilocalizzazione della linea ferroviaria per risolvere l'interferenza con la raffineria API di Falconara.

Gli interventi di 1^a fase consistono nella realizzazione di:- variante a doppio binario (4,4 km) della linea Adriatica tra le stazioni di Montemarciano e Falconara M. (variante di Falconara), compresa la modifica del piano di stazione di Falconara M.; - bretella di collegamento tra la variante di Falconara e la linea Orte-Falconara, a semplice binario (1,5 km), con possibilità di raddoppio al completamento del raddoppio della intera linea Orte-Falconara;- Nuovo PRG di Falconara M. mediante la dismissione dell'attuale scalo merci (parziale, in fase 1) e delocalizzazione dell'attuale SSE. L'attuale stazione di Falconara conserva solo 5 dei binari del piazzale adibito a servizio viaggiatori ed è adeguata a modulo 750 m.

Dal punto di vista geomorfologico, le aree interessate dall'intervento sito non presenta particolari emergenze; l'area infatti risulta da pianeggiante a subpianeggiante con quote che oscillano quasi sempre tra 2 e 5 m s.l.m.L'intervento in argomento prevede solo opere di scavalco delle viabilità e dei corsi d'acqua interferiti dalla linea. L'opera d'arte principale è costituita dal viadotto Esino e dal ponte in acciaio sul fiume Esino.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

A seguito di inadempienze dell'appaltatore si era provveduto alla rescissione del contratto relativo ai lavori, successivamente revocata. Attualmente sono in corso incontri tecnici tra RFI, Direzione Lavori, Impresa e con il CCT per definire il corretto iter contrattuale; nel frattempo è stata formalizzata la richiesta di parere al CCT per accertare la sussistenza delle condizioni per la risoluzione del contratto e sono recentemente riprese le attività realizzative su modesti fronti di lavoro.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Incremento prestazioni e capacità complessiva della rete, grazie alla possibilità di istradare i treni merci e passeggeri tra Roma e il Nord Italia su un nuovo itinerario alternativo al Corridoio Scandinavia - Mediterraneo già adeguato a P/C 45.- Miglioramento nella gestione della circolazione.- 176Più agevole collegamento merci con la stazione di Jesi Interporto grazie alla realizzazione della bretella a semplice binario.

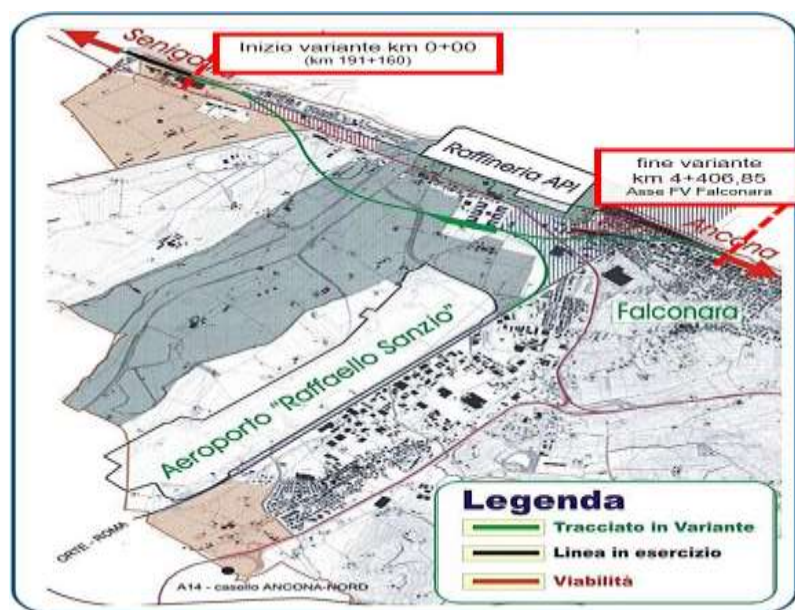

Capacità	X
Velocità	
Accessibilità	
Regolarità	
Prestazioni (merci)	X
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Marche

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Variante Falconara e bretella di collegamento tra la linea Orte-Falconara direzione nord e la variante di Falconara verso nord		X					X								X			X			

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0297A: Nodo di Falconara 1^ fase

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
174,82	174,82		23,25	151,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatIRFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						CdP-I agg.2025	Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze		
174,00				0,82			
Evoluzione coperture finanziarie						CdP-I agg.2025	Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni		
174,00				0,82			

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Variante Falconara e bretella di collegamento tra la linea Orte-Falconara direzione nord e la variante di Falconara verso nord	174,82	174,82	0,00	111,10	63,72	123,66	48,65	35,16	2,47	7,44	1,72	2,92	8,56	118,36
	174,82	174,82	0,00	111,10	63,72	123,66	48,65	35,16	2,47	7,44	1,72	2,92	6,75	118,36

CRONOPROGRAMMA

	CUP	Stato attuativo	Iter procedurale											
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Variante Falconara e bretella di collegamento tra la linea Orte-Falconara direzione nord e la variante di Falconara verso nord	J31J05000030011	Realizzazione	3-2022	3-2025	5-2006	8-2011	-	-	12-2013	8-2015	12-2015	3-2025	12-2026	

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi completano il programma di riassetto del Nodo di Falconara. Il progetto precedentemente prevedeva la realizzazione dei seguenti macro-interventi: nuova stazione di Montemarciano con la dismissione della attuale stazione. In seguito ad approfondimenti progettuali ed alle verifiche urbanistico-ambientali è stato necessario individuare un nuovo sito per riallocare le funzioni previste a Montemarciano. La realizzazione della nuova stazione con funzione stazionamento e verifica treni merci è attualmente prevista in una nuova località tra le stazioni di Osimo e Loreto. Tale stazione prevede la realizzazione di 3 nuovi binari di precedenza con modulo 750m per lo stazionamento e la verifica tecnica a cura del PdM su treni merci. Tale nuovo impianto risulta necessario al fine di garantire la piena funzionalità del nuovo assetto del Nodo di Falconara ed è complementare al progetto della variante di Falconara

L'area interessata dall'intervento risulta prevalentemente di tipo pianeggiante e subpianeggiante con quote del terreno che oscillano tra i 2 m e i 5 m s.l.m.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

A luglio 2024 il PTFE è stato trasmesso al Provveditorato interregionale per la Toscana, le Marche e l'Umbria. A dicembre 2024 è stata avviata la CdS e lo screening VIA presso il MASE.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Unitamente agli altri interventi di adeguamento prestazionale della direttrice Adriatica realizzati nell'ambito del programma di upgrading dei corridoi Scandinavia-Mediterraneo porti Adriatico e Mezzogiorno e Baltico-Adriatico, il progetto consentirà di razionalizzare e incrementare le prestazioni dell'offerta merci, grazie all'adeguamento a modulo 750 m a sud di Osimo, e un miglioramento della regolarità della circolazione.

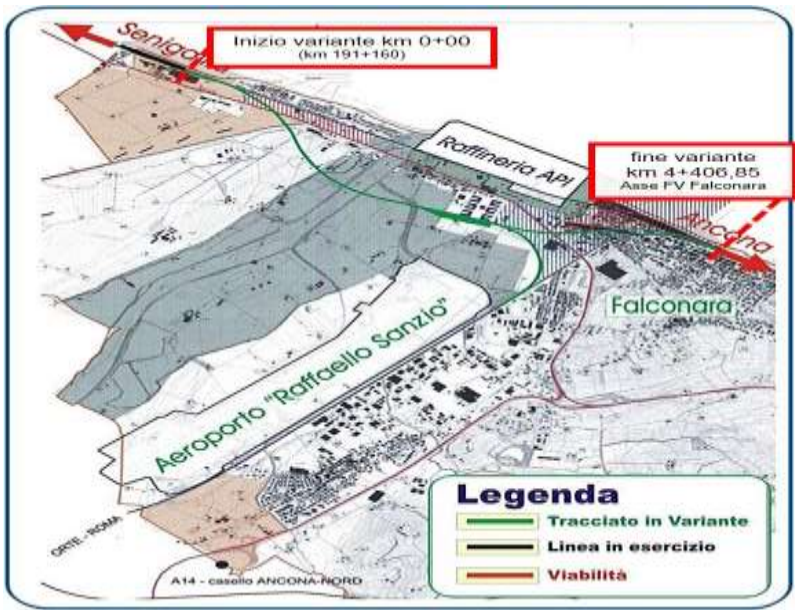

	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Marche

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Nuova stazione Osimo		X			X		X							X	

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0297B: Nodo di Falconara completamento

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve			
								Priorità 1	Priorità 2		
123,29	7,60	di cui:	6,60	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	115,69	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
123,29						123,29

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
36,00					-28,40	7,60
Rimodulazione della copertura su interventi parzialmente finanziati a favore di ulteriori fabbisogni maggiormente prioritari						

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Nuova stazione Osimo	123,29	7,60	115,69	34,88	88,40	2,87	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	5,00	122,35
	123,29	7,60	115,69	34,88	88,40	2,87	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,04	122,35

CRONOPROGRAMMA													
Stato attuativo							Iter procedurale						
CUP													
	Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità		
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine			
Nuova stazione Osimo	J31J05000030011	Iter autorizzativo	5-2020	5-2025	10-2021	10-2026	-	-	10-2026	7-2027	7-2027	11-2030	4-2031

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Varianti di tracciato tratta Bivio S.Antonello-Sibari e upgrading prestazionale. La realizzazione delle opere è suddivisa in quattro lotti indipendenti: Lotto 1): Rinnovo linea TE. Potenziamento linea di contatto da 320 a 440 mmq da Castiglione Cosentino a Trebisacce. Lotto 2) e 2.1): Adeguamenti a Piano Regolatore Generale stazioni. Messa a modulo merci a 750 m della stazione di Amendolara, velocizzazione itinerari a 60 km/h, realizzazione sottopassaggio pedonale e marciapiede di servizio h55 e L=150/250 m, semplificazione impianti delle stazioni di Amendolara, Rocca Imperiale e San Marco Roggiano. Lotto 3): Interventi nelle località Cassano, Tarsia e Torano. Realizzazione di rettifiche di tracciato (circa 10,5 km) a Cassano, Torano e Tarsia. Nuova travata metallica di 5 campate per complessivi 260 m sul torrente Esaro Grondo. Soppressione PL di Torano con realizzazione di viabilità alternativa. Messa a modulo merci a 750 m della stazione di Torano con realizzazione di sottopassaggio pedonale e marciapiede di servizio h55 e L=150/250 m. Trasformazione di Tarsia in fermata con realizzazione marciapiede di servizio h55 e L=150/250 m. Soppressione dell'Impianto di Cassano. Spostamento di due PL a seguito degli interventi di rettifica curve. Lotto 4): Varianti di tracciato. Soppressione PL e realizzazione di viabilità alternativa in prossimità della stazione di Acri con soppressione della stazione e rettifiche di tracciato per circa 3 km.

L'intervento si sviluppa nella provincia di Cosenza, lungo la linea Metaponto - Sibari - Bivio S. Antonello, e riguarda interventi tecnologici ed infrastrutturali lungolinea e in ambito stazione, finalizzati al potenziamento della linea.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

L'intervento è stato attivato nel 2019

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Gli interventi prioritari per il potenziamento della linea Metaponto - Sibari - Cosenza hanno l'obiettivo di incrementare i livelli prestazionali per il traffico merci in adduzione ai porti ed agli scali della regione Calabria (modulo di linea portato a 750m e codifica per il trasporto combinato a P/C80) e di creare le condizioni per ridurre i tempi di percorrenza dei servizi tra Cosenza e Sibari.

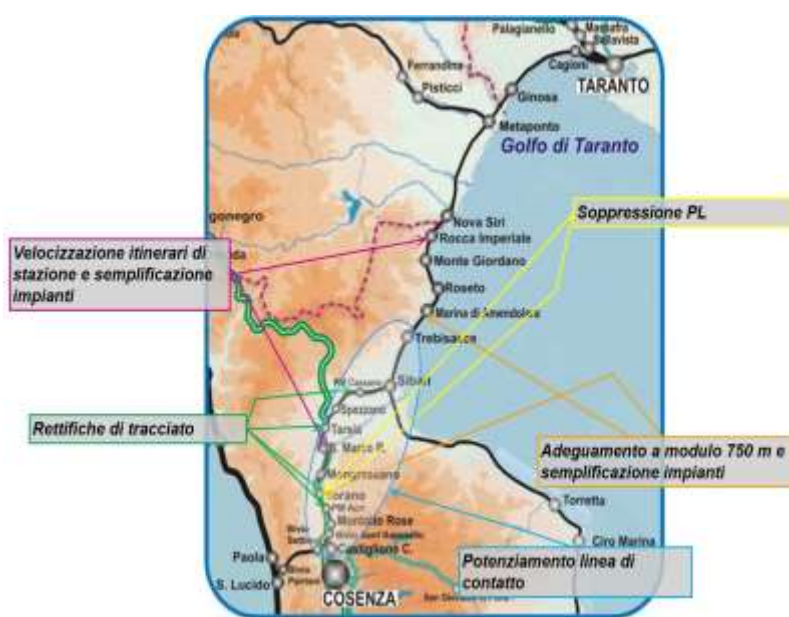

	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Calabria

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Accordi internazionali	Accordi EELL	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani
Metaponto-Sibari-Paola: potenziamento linea di contatto, adeguamento a modulo 750 m e semplificazione impianti, rettifiche di tracciato località Cassano, Tarsia e Torano e variante di Acri					X	X				X				X	

Progetto 0311A: Potenziamento Metaponto-Sibari-Bivio S.Antonello opere prioritarie

milioni di euro

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

Evoluzione coperture finanziarie

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Metaponto-Sibari-Paola: potenziamento linea di contatto, adeguamento a modulo 750 m e semplificazione impianti, rettifiche di tracciato località Cassano, Tarsia e Torano e variante di Acri	161,89	161,89	0,00	127,65	34,24	161,15	155,69	146,91	2,78	0,95	1,06	0,49	11,58	5,53
	161,89	161,89	0,00	127,65	34,24	161,15	155,69	146,91	2,78	0,95	1,06	0,49	4,17	5,53

CUP	Stato attuativo				Iter procedurale								
	Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità		
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine			
Metaponto-Sibari-Paola: potenziamento linea di contatto, adeguamento a modulo 750 m e semplificazione impianti, rettifiche di tracciato località Cassano, Tarsia e Torano e variante di Acri	J84F05000030001	Esercizio	1-2006	12-2012	4-2011	6-2014	9-2012	7-2014	11-2012	4-2016	8-2013	1-2026	10-2019

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto si inserisce nell'ambito degli interventi per il potenziamento del collegamento fra il porto Gioia Tauro ed il corridoio Scandinavia-Mediterraneo versante adriatico. Gli interventi interessano la linea ionica nella tratta Metaponto - Sibari e la trasversale Sibari - Bivio S. Antonello (Castiglione Cosentino) e sono articolati in due distinti interventi. Gli interventi consistono nella realizzazione di una variante di 9 Km tra le stazioni di Montegiordano e Amendolara con gallerie per circa 6 Km.

L'intervento si sviluppa sulla linea Metaponto - Sibari, e riguarda la realizzazione di una variante di tracciato di circa 9 km di cui 6 in galleria. L'intervento è finalizzato a bypassare una zona in frana ed al potenziamento della linea.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Nel 2006 elaborato ed approvato il progetto preliminare. Intervento sospeso per mancanza di finanziamenti per il completamento della fase progettuale e per la fase realizzativa.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Unitamente agli altri investimenti sulla linea ionica, gli interventi previsti consentiranno di eliminare le criticità infrastrutturali attualmente presenti nei tratti oggetto di intervento ed ottenere un potenziamento della direttrice in termini di prestazioni e tempi di percorrenza.



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Basilicata
Calabria

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Accordi internazionali	Accordi EEL	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani
Variante Montegiordano-Amendolara										X	X		X		X
Rettifiche curve ed adeguamento linea Metaponto-Sibari-Paola										X	X			X	

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0311B: Potenziamento Metaponto-Sibari-Bivio S.Antonello

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
256,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,34

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatiIRFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
256,34						256,34

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
0,00						0,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Variante Montegiordano-Amendolara	215,00	0,00	215,00	193,44	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	215,00
Rettifiche curve ed adeguamento linea Metaponto-Sibari-Paola	41,34	0,00	41,34	36,56	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	41,34
	256,34	0,00	256,34	230,00	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,34

CRONOPROGRAMMA														
CUP	Stato attuativo				Iter procedurale									
	CUP	Valutazione di fattibilità alternative progettuali	-	5-2027	-	5-2027	-	-	7-2027	6-2027	6-2027	10-2031	10-2031	
Variante Montegiordano-Amendolara	J84F05000030001	Valutazione di fattibilità alternative progettuali	-	5-2027	-	5-2027	-	-	7-2027	6-2027	6-2027	10-2031	10-2031	
Rettifiche curve ed adeguamento linea Metaponto-Sibari-Paola	J84F05000030001	Valutazione di fattibilità alternative progettuali	-	4-2027	-	4-2027	-	-	5-2027	9-2027	9-2027	9-2028	3-2028	

Progetto P245: Adeguamento e velocizzazione linea ferroviaria jonica - tratta Sibari-Melito Porto Salvo e trasversale Lamezia Terme - Catanzaro Lido

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi in corso sono compresi nel protocollo di Intesa tra MIT, RFI e Regione Calabria per «l'adeguamento e velocizzazione della linea ferroviaria Jonica, nella tratta Sibari-Melito Porto Salvo», che prevede opere civili e rinnovo binari, risanamento acustico, realizzazione di nuovi sottopassi e/o adeguamento di quelli esistenti, potenziamento tecnologico, soppressione PL e interventi propedeutici alla velocizzazione della linea. Sono da realizzare anche interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico ed elettrificazione sulle tratte: Lamezia - Catanzaro Lido e Catanzaro Lido - Sibari, nonché l'elettrificazione della tratta Catanzaro Lido - Melito PS, e progettazione e realizzazione della Bretella di Sibari. In particolare sono previsti interventi alle opere civili, nel tratto compreso fra Sibari e Crotone, finalizzati all'incremento prestazionale ed in coerenza con il previsto upgrade tecnologico della linea in ambiente ERTMS.

Gli interventi previsti si effettuano sulla linea ferroviaria esistente che attraversa l'area costiera orientale della Regione Calabria

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•Adeguamento e velocizzazione linea ferroviaria jonica Tratta Sibari-Melito Porto Salvo Interventi alle opere civili: Gli interventi sono in parte in realizzazione e in parte in progettazione. Completate le verifiche delle opere d'arte per l'individuazione degli interventi di adeguamento delle stesse, propedeutici all'istituzione della velocità di rango "C". In fase di consegna i lavori di consolidamento/rinnovo delle suddette opere d'arte. Completate le attività di rinnovo con risanamento della massicciata ad esclusione del rinnovo Brancaleone-Melito in corso di ultimazione. Completato l'adeguamento del piano regolatore generale delle stazioni di Villapiana, Montegiordano, Trebisacce, Botricello, Rossano e Mirto. In corso piano regolatore generale di Cropani. Interventi ai sottopassi: Attivati i sottopassi di Villapiana, Trebisacce, Montegiordano, Botricello e Mirto. In corso la realizzazione del sottopasso di Mirto e in corso la progettazione definitiva dei restanti sottopassi. Interventi di potenziamento tecnologico: Attivato l'ACC di Crotone, il PRG di Mirto e il PRG di Rossano. In corso gli adeguamenti degli ACEI e le modifiche ai PRG. È stata ultimata la progettazione definitiva dell'upgrading tecnologico da CTC in SCCM, di prossima approvazione. •Potenziamento e elettrificazione Lamezia-Catanzaro Lido: Lavori in corso. •Sottopassi Linea Jonica: Attivati i sottopassi di Villapiana, Trebisacce, Montegiordano, Mirto e Botricello, in corso i lavori di completamento a Botricello. Da avviare la progettazione dei sottopassi di Rossano, Cropani, Gioiosa Bovalino e Palizzi, attualmente non finanziata. •Upgrading tecnologico Linea Jonica: Attivato il PRG di Mirto. Adeguamenti ACEI e modifiche PRG in corso nella stazione di Cropani e riconfigurazione SCMT e modifiche IS nella stazione di Mirto. Progettazione per l'upgrading CTC in SCCM della rete calabrese in corso. In corso posa nuovo cavo a 64 fibre ottiche tratta Melito di Porto Salvo-Lamezia Terme C.le. •Completamento dell'elettrificazione della linea Jonica: Completato il PFTE, è stato inviato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ha riscontrato formulando osservazioni, solo il progetto della tratta Catanzaro lido-Roccella Jonica. In corso riscontro alle osservazioni del CSLPP. •Bretella di Sibari: In corso iter autorizzativo sulla Progettazione esecutiva. •Elettrificazione Catanzaro Lido-Crotone-Sibari: Lavori in corso.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Al conseguimento di tutti gli interventi previsti:- Miglioramento della qualità del servizio ferroviario e nuove opportunità di servizio;- Miglioramento dell'accessibilità al servizio ferroviario mediante l'innalzamento dei marciapiedi e la realizzazione di sottopassi pedonali nelle principali stazioni;- Potenziamento dei collegamenti fra linea jonica e linea tirrenica e miglioramento dell'accessibilità e intermodalità con Lamezia Terme;- Miglioramento dei collegamenti fra dorsale jonica e dorsale tirrenica senza soluzioni di continuità riconducibili ai diversi sistemi di trazione;- Recupero tempo di percorrenza nelle tratte Sibari-Catanzaro Lido, Catanzaro Lido-Reggio Calabria C.le, Lamezia Terme - Catanzaro Lido;- Riduzione dell'inquinamento ambientale ed emissioni;- Creare le condizioni per l'istituzione di nuovi servizi di collegamento diretto tra i versanti Jonico e tirrenico (Bretella di Sibari).



	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	X
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Calabria

Progetto P245: Adeguamento e velocizzazione linea ferroviaria jonica - tratta Sibari-Melito Porto Salvo e trasversale Lamezia Terme - Catanzaro Lido

INQUADRAMENTO STRATEGICO

	Priorità programmatica										Obiettivi strategici									
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento commissioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																				
Elettrificazione linea jonica tratta Catanzaro Lido - Crotone - Sibari							X		X	X										
Potenziamento Lamezia Terme - Settingiano e elettrificazione Lamezia-Catanzaro Lido							X		X	X										
Adeguamento e velocizzazione linea ferroviaria jonica Tratta Sibari-Melito Porto Salvo							X			X			X			X				
Bretella di Sibari										X			X			X				
Completamento elettrificazione linea jonica				X									X			X				

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Totale Risorse	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2			
1.325,97	1.074,19	di cui: 173,29	0,54	368,00	340,06	0,00	192,30	0,00	0,00			251,78

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo							CdP-I agg.2025	Variazione del costo per l'aggiornamento del quadro economico ad esito del Progetto di fattibilità tecnico economica. Inoltre, si segnala una variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari.
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze			
1.407,64			-81,76	0,09		1.325,97		
Evoluzione coperture finanziarie							CdP-I agg.2025	Copertura con risorse PR FESR Calabria 2021-2027. Ulteriore copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche). Rimodulazione della copertura su interventi parzialmente finanziati a favore di ulteriori fabbisogni maggiormente prioritari.
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni			
941,77		0,02		192,39	-60,00	1.074,19		

PIANO DELLA SPESA

	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Altre
Elettrificazione linea jonica tratta Catanzaro Lido - Crotone - Sibari	200,09	200,09	0,00	166,56	33,53	148,25	58,63	15,46	3,76	3,27	4,79	26,29	13,40	142,12
Potenziamento Lamezia Terme - Settingiano e elettrificazione Lamezia-Catanzaro Lido	238,10	238,10	0,00	195,04	43,06	191,88	11,28	0,93	0,27	0,35	1,90	6,77	5,05	226,83
Adeguamento e velocizzazione linea ferroviaria jonica Tratta Sibari-Melito Porto Salvo	447,54	369,90	77,64	402,99	44,56	231,52	174,32	68,24	36,06	17,11	14,95	28,93	40,07	269,80
Bretella di Sibari	72,00	72,00	0,00	63,10	8,90	30,61	1,36	0,00	0,00	0,00	0,01	0,68	5,00	70,49
Completamento elettrificazione linea jonica	368,24	194,10	174,14	0,00	368,24	1,39	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	5,00	366,91
	1.325,97	1.074,19	251,78	827,69	498,28	603,65	246,92	84,63	40,09	20,73	21,64	63,92	18,81	1.076,14

CRONOPROGRAMMA

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P245: Adeguamento e velocizzazione linea ferroviaria jonica - tratta Sibari-Melito Porto Salvo e trasversale Lamezia Terme - Catanzaro Lido

	CUP	Stato attuativo	Iter procedurale										
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Nego.		Esecuzione		Funzionalità
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
Elettrificazione linea jonica tratta Catanzaro Lido - Crotone - Sibari	J37I12000110001	Realizzazione	9-2020	6-2022	1-2019	10-2023	-	-	10-2023	10-2024	8-2018	3-2026	12-2026
Potenziamento Lamezia Terme - Settingiano e elettrificazione Lamezia-Catanzaro Lido	J37I12000110001	Realizzazione	2-2019	6-2022	1-2019	10-2023	-	-	-	-	4-2024	6-2027	12-2026
Adeguamento e velocizzazione linea ferroviaria jonica Tratta Sibari-Melito Porto Salvo		Realizzazione	-	-	11-2018	6-2026	-	-	1-2026	6-2026	4-2018	10-2030	12-2025
Bretella di Sibari	J21G22000050001	Realizzazione	6-2022	5-2024	-	5-2024	-	-	5-2024	3-2025	11-2024	4-2026	12-2026
Completamento elettrificazione linea jonica		Valutazione di fattibilità alternative progettuali	7-2022	7-2025	-	-	-	-	9-2025	10-2029	6-2026	7-2033	12-2033

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

La dorsale Adriatica è una direttrice fondamentale che collega le più importanti città ed aree produttive dell'Italia centro-meridionale con il nord del paese. La linea ferroviaria è per la maggior parte a doppio binario, ad esclusione della tratta Termoli-Lesina, interamente elettrificata e gestita in telecomando. Inoltre a seguito dei recenti interventi infrastrutturali per l'adeguamento a codifica di trasporto combinato P/C80, la linea consente il trasporto intermodale di semirimorchi e autostrada viaggiante. Sulla linea sono in corso una serie di interventi finalizzati a ridurre fino ad ulteriori 30 minuti le percorrenze tra Bologna e Lecce. Sono in valutazione interventi sia per il potenziamento del trasporto merci che passeggeri mediante lo studio di una nuova linea a doppio binario con caratteristiche AV/AC.

Gli interventi di 1^ fase comprendono: A) Nodo di Bari Sud: Variante Bari C.le-Bari Torre a Mare; il progetto di rivisitazione della tratta a sud di Bari prevede lo spostamento della linea lato monte del tratto Bari C.le - Bari Torre a Mare, l'attivazione delle nuove fermate di Bari Campus, Bari Executive, Triggiano e il quadruplicamento della linea tra Bari C.le e Bari Executive, stazione di diramazione per la linea FSE, per un'estesa di circa 10,5 km. Le aree corrispondenti al vecchio tracciato potranno essere soggette a riqualificazione urbanistica. Tra gli interventi in progetto vi è anche l'opera d'arte per la risoluzione dell'intersezione della variante ferroviaria con la SS 16. Tale interferenza viene risolta mediante un innalzamento della livelletta stradale per circa 1,4 Km (opera anticipata denominata «variante ANAS»); B) Nodo Bari Nord: Variante Bari S.Spirito - Palese; il progetto preliminare del 2008 prevedeva l'interramento in sede della linea Adriatica RFI Bologna – Bari nel tratto tra le stazioni di Bari S. Spirito e Bari Palese, per una estesa di circa 8 km. Nel corso dell'iter approvativo del progetto preliminare, nel dicembre 2010, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale ha espresso la seguente prescrizione: "...valutare, in analogia con quanto previsto per la tratta a sud, la possibilità di realizzare un percorso alternativo in distacco dall'attuale sedime di progetto, posto ad ovest di esso, con lo scopo di evitare l'attraversamento e l'interferenza con aree fortemente urbanizzate". Nel 2018 e 2019, con un studio di Perfettibilità delle alternative al progetto preliminare del 2009 è stato individuato il tracciato migliore a seguito di un'analisi multicriteria. L'intervento ha una estesa di circa 10 km, prevalentemente in trincea profonda e in galleria artificiale e comprende una nuova stazione in località S. Spirito. E' prevista velocità di 200 Km/h. Successivamente, essendo il progetto della tratta a nord non coperto da finanziamenti, l'iter autorizzativo è stato sospeso dal MIT. Nell'Aggiornamento 2018-2019 del CdP 17-21 è stato finanziato il PFTE relativo alla nuova soluzione in variante. C) quadruplicamento Bologna-Castelbolognese: realizzazione di un nuovo doppio binario in variante prevalentemente in viadotto e un nuovo collegamento sulla linea Castelbolognese Ravenna nonché un nuovo posto di movimento a Castel S. Pietro utile a gestire precedenza; D) ulteriori lotti da definire con il MIT e gli EE.LL.

Puglia, Emilia-Romagna, Marche, Molise e Abruzzo

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

A) Nodo di Bari Sud «Nuova Linea Bari C.le – Bari Torre a Mare»: è in corso la fase realizzativa; Opera anticipata «variante ANAS»: in corso lavori di completamento; «Sottovia S. Anna, canali e viabilità di ricucitura»: in corso la fase realizzativa. Modifiche impianti Trenitalia/FSE per delocalizzazione delle attività manutentive FSE: in corso di realizzazione. B) Nodo di Bari Nord. Avviato a marzo 2024 l'iter autorizzativo sul progetto definitivo e concluso ad aprile 2025. L'avvio delle procedure negoziali sono vincolate al recepimento della completa copertura finanziaria dell'intervento. C) Quadruplicamento Bologna-Castelbolognese. Concluso il DocFAP e il dibattito pubblico; di prossimo avvio il PFTE.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

A) Migliore interoperabilità tra la rete RFI e le ferrovie concesse (FSE); Incremento della capacità complessiva delle linee RFI e FSE con il quadruplicamento tra Bari C.le e Bari Executive (da 10 treni/h a 20 treni/h); Maggiore accessibilità al sistema ferroviario con le nuove fermate di Bari Executive, Bari Campus e Triggiano; Opportunità di riqualificazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse. B) Possibilità di riqualificazione urbanistica per le aree corrispondenti al sedime ferroviario dismesso; Maggiore regolarità dell'esercizio ferroviario; Risoluzione delle interferenze con la viabilità stradale. C) Il progetto di quadruplicamento Bologna-Castelbolognese tenderà a migliorare le performance, in termini di puntualità e regolarità dei servizi viaggiatori e merci, ad oggi limitate dalla rilevante eterotachia. Al completamento di tutti gli interventi previsti, il progetto consentirà: Incremento della capacità teorica pari a 10 treni/ora della tratta in oggetto e introduzione nuovi servizi SFM (sfruttando in sinergia gli altri interventi previsti); conformità agli standard prestazionali previsti per la rete centrale merci TEN-T in termini di peso assiale e lunghezza treno nonché codifica di trasporto combinato per semirimorchi ed autostrada viaggiante; riduzione dei tempi di percorrenza sulla tratta Bologna-Rimini di 5' per servizi a lunga percorrenza.

Progetto P262A: Velocizzazione e potenziamento linea ferroviaria Adriatica 1^ fase

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Quadruplicamento Bologna-Castelbolognese	3.500,00	3.500,00	0,00	3.386,90	113,10	5,72	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3.499,87
Bari Sud: Variante Bari C.le-Bari Torre a Mare	458,78	457,78	1,00	199,30	259,48	298,05	148,25	92,48	7,11	9,63	5,48	13,73	10,14	308,04
Bari Nord: Variante Bari S.Spirito - Palese	1.003,00	20,00	983,00	907,09	95,91	10,13	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	5,00	994,42
Altri interventi Adriatica	1.112,74	555,30	557,44	0,00	1.112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.112,74
	6.074,52	4.533,08	1.541,44	4.493,29	1.581,23	313,91	154,19	92,48	7,11	9,63	5,48	20,36	24,39	5.915,07

[illegible]

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025
Progetto P262B: Velocizzazione e potenziamento linea ferroviaria Adriatica 2^ fase

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

La dorsale Adriatica è una direttrice fondamentale che collega le più importanti città ed aree produttive dell'Italia centro-meridionale con il nord del paese. La linea ferroviaria è per la maggior parte a doppio binario, ad esclusione della tratta Termoli-Lesina, interamente elettrificata e gestita in telecomando. Inoltre a seguito dei recenti interventi infrastrutturali per l'adeguamento a codifica di trasporto combinato P/C80, la linea consente il trasporto intermodale di semirimorchi e autostrada viaggiante. Sulla linea sono in corso una serie di interventi finalizzati a ridurre fino ad ulteriori 30 minuti le percorrenze tra Bologna e Lecce. Sono in valutazione interventi sia per il potenziamento del trasporto merci che passeggeri mediante lo studio di una nuova linea a doppio binario con caratteristiche AV/AC.

Gli interventi di 2^ fase comprendono ulteriori lotti da definire con il MIT e gli EE.LL. ad esito del DocFAP.

Emilia Romagna/Puglia

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

In corso il Documento di fattibilità delle alternative progettuali.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Ulteriore riduzione della percorrenza Bologna - Lecce, rispetto al recupero ottenuto dagli interventi in corso, per i servizi di lungo percorso; Maggiore regolarità dell'esercizio ferroviario; Sviluppo di nuove opportunità di servizio passeggeri e merci.

	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficiamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Emilia Romagna
Marche
Abruzzo
Molise
Puglia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Velocizzazione CastelBolognese-Rimini											x			x							

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Progetto P262B: Velocizzazione e potenziamento linea ferroviaria Adriatica 2^ fase

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
4.050,00						4.050,00

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrig	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
0,00		4,00				4,00	Rimodulazione risorse da 1° fase (P262A) per consentire avvio attività.

CRONOPROGRAMMA

[illegible]

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi di Potenziamento Infrastrutturale prevedono ad oggi il raddoppio selettivo di alcune tratte della linea trasversale appenninica Orte – Falconara. Il progetto si articola nei seguenti macro-interventi: Raddoppio Spoleto-Campello (regione Umbria) per un'estesa di circa 10 km, dei quali circa 6 km in affiancamento, a partire dalla stazione di Spoleto, e circa 4 in variante in galleria artificiale, fino al ricongiungimento con l'attuale sede raddoppiata in corrispondenza della stazione di Campello. E' prevista inoltre la realizzazione di una nuova SSE e di un nuovo ACC a Spoleto. Raddoppio Fabriano-Posto di Movimento (P.M.) 228 (regione Marche) per un'estesa di circa 4 Km di cui circa 1,9 in galleria. Raddoppio Castelplanio-Montecarotto (regione Marche) per un'estesa di circa 6 km parte in affiancamento e parte in variante (circa il 50%).

L'intervento di raddoppio Spoleto - Campello (8,5 Km), che ricade nel Comune di Spoleto, si sviluppa su una fascia collinare prevalentemente extraurbano agrario. L'opera è costituita per i primi 5 km da un raddoppio in affiancamento al binario esistente mentre per i restanti 3,5 km è costituita prevalentemente da una galleria artificiale in variante di tracciato. L'intervento di raddoppio Castelplanio - Montecarotto (6 Km), che ricade nella Provincia di Ancona, si sviluppa nella valle del fiume Esino in un ambito prevalentemente extraurbano agrario con densità abitative scarse. L'opera è costituita da un raddoppio parte in affiancamento al binario esistente e parte in variante di tracciato.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Raddoppio Spoleto-Campello: In data 30/12/2020 è stato attivato l'esercizio a singolo binario sulla nuova sede (futuro nuovo binario dispari) della tratta Spoleto – Campello con contestuale dismissione del tracciato storico e soppressione di n. 4 PL e attivazione della nuova galleria S. Giacomo. Al momento, è in corso la realizzazione dell'ACC di Spoleto e delle Opere Civili sulla tratta nonché gli interventi di Bonifica ordigni esplosivi relativi all'appalto di armamento, TE e IS necessari al completamento del raddoppio. Per la SSE di Spoleto avviati i lavori di realizzazione relativi alla Bonifica ordigni esplosivi. Raddoppio Castelplanio-Montecarotto: intervento attivato in data 10.06.2018. Raddoppio della tratta Fabriano-PM 228: opere attivate in data 20.12.2009

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Unitamente ad altri interventi programmati sulla direttrice Orte-Falconara il progetto mira al miglioramento dei collegamenti passeggeri tra le regioni tirreniche e quelle del versante adriatico e alla creazione di un itinerario alternativo merci per i collegamenti nord-sud. Incremento della capacità sulle tratte oggetto di raddoppio (da 4 treni/h nei due sensi di marcia a 10 treni/h per senso di marcia). Creazione delle condizioni per un potenziamento dei servizi extraurbani veloci Ancona - Roma al fine di garantire opportunità di interscambio anche con i servizi della Regione Umbria. Migliore livello di regolarità della linea Riduzione dei tempi di percorrenza, grazie al miglioramento prestazionale in termini di velocità di tracciato fino a 30 minuti sulla relazione Roma-Ancona per alcuni servizi e fino a 15 minuti tra Roma e Perugia, in relazione al modello di esercizio



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Umbria

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0119: Potenziamento infrastrutturale Orte-Falconara

	Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change	Adeguamento a standard tecnici	Sviluppo tecnologico	Sistemi regionali e metropolitani	Potenziamento connessioni merci	Sviluppo corridoi TEN-T	Completamento valichi alpini	Alta Velocità (AV)		Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR
Intervento / Opere funzionali																						
Raddoppio Spoleto-Campello, Castelpianio-Montecarotto e Fabriano-P.M.228; interventi di completamento Orte-Terni																						

QUADRO FINANZIARIO												milioni di euro		
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento			
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR	Altro UE	Altro		Priorità 1	Priorità 2				
					nuovi progetti	(CEF/TEN, PON-FESR)	(EELL, Terzi, autofinanziamento)							
387,65	377,65	di cui:	373,86	2,72	0,00	0,00	1,06	0,00	10,00	0,00	0,00			

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatiIRFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE											
Evoluzione Costo											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025					
373,34			13,00	1,31		387,65	Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari. Inoltre, si registrano maggiori costi relativi ad appalto in corso (ad esempio conferimento terre a discarica e tecnologie).				
Evoluzione coperture finanziarie											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025					
373,34				4,31		377,65	Copertura maggiori costi opere in corso (conferimento e appalto IS) e adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)				

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Spoleto-Campello, Castelpianio-Montecarotto e Fabriano-P.M.228; interventi di completamento Orte-Terni	387,65	377,65	10,00	301,45	86,20	366,82	334,61	305,99	2,86	7,40	5,07	7,34	12,18	49,19
	387,65	377,65	10,00	301,45	86,20	366,82	334,61	305,99	2,86	7,40	5,07	7,34	9,80	49,19

CRONOPROGRAMMA														

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede la realizzazione di una linea a doppio binario tra le stazioni di Terni e Spoleto della lunghezza di circa 22 km, in variante al tracciato attuale, che si svolge quasi interamente in galleria a doppia canna a semplice binario della lunghezza di circa 19 km. L'intervento è incluso nel primo programma delle infrastrutture strategiche di cui alla Deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, nell'ambito dei "Corridoi trasversali e dorsale appenninica - Trasversale ferroviaria Orte-Falconara", nonché nell'intesa generale quadro tra Governo e Regione Umbria, approvata il 24 ottobre 2002 e si avvale delle procedure introdotte dalla legge n. 443/2001 (c.d. Legge Obiettivo).

L'intervento di raddoppio, che ricade nelle provincie di Perugia e Ancona, si sviluppa nella vallata appenninica che congiunge le due località in un ambito prevalentemente extraurbano naturale con densità abitative scarse.. L'opera si sviluppa prevalentemente in variante di tracciato ed in galleria.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

A febbraio 2013 la progettazione definitiva è stata trasmessa da RFI al MIT per l'avvio della procedura approvativa secondo l'iter previsto per i progetti di Legge Obiettivo che non ha avuto tuttavia seguito per la mancanza di finanziamenti. A settembre 2020 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa fra MIT, Regione Marche, Regione Umbria e RFI per la costituzione di un gruppo di lavoro per il potenziamento e lo sviluppo della direttrice Orte-Falconara con lo scopo di sviluppare una project review sui lotti funzionali mancanti al completo raddoppio della Orte-Falconara. E' stata completata la revisione della progettazione. Di prossimo avvio iter autorizzativo.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Unitamente ad altri interventi programmati sulla direttrice Orte-Falconara il progetto mira al miglioramento dei collegamenti passeggeri tra le regioni tirreniche e quelle del versante adriatico e alla creazione di un itinerario alternativo merci per i collegamenti nord-sud. Incremento della capacità sulle tratte oggetto di raddoppio (da 4 treni/h nei due sensi di marcia a 10 treni/h per senso di marcia). creazione delle condizioni per un potenziamento dei servizi extraurbani veloci Ancona - Roma al fine di garantire opportunità di interscambio anche con i servizi della Regione Umbria. migliore livello di regolarità della linea Riduzione dei tempi di percorrenza, grazie al miglioramento prestazionale in termini di velocità di tracciato fino a 30 minuti sulla relazione Roma-Ancona per alcuni servizi e fino a 15 minuti tra Roma e Perugia, in relazione al modello di esercizio



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Umbria

INQUADRAMENTO STRATEGICO**Priorità programmatica**

PNRR	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF
------	------------------------	----------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	---------------------------	----------------------

Obiettivi strategici

Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
--------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0226: Raddoppio Orte-Falconara: tratta Spoleto-Terni

Raddoppio Spoleto-Terni	X	X	X	X
-------------------------	---	---	---	---

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve			
								Priorità 1	Priorità 2		
1.618,04	23,42	di cui:	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,62	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						CdP-I agg.2025	Variazione del costo dovuta ad un maggior valore delle opere ad esito della progettazione per la necessità di recepire sia le variazioni normative intervenute, sia l'adeguamento delle opere del tracciato in galleria e all'aperto a causa della presenza di una cava ancora in esercizio, sia la sostituzione dello scavo con TBM mediante tecnologia tradizionale.
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze		
572,00			1.046,04				

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
23,42						23,42

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	AI 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Spoleto-Terni	1.618,04	23,42	1.594,62	41,84	1.576,21	22,78	19,36	10,83	0,03	0,00	0,00	8,03	5,02	1.595,40
	1.618,04	23,42	1.594,62	41,84	1.576,21	22,78	19,36	10,83	0,03	0,00	0,00	8,03	3,75	1.595,40

CRONOPROGRAMMA														
CUP	Stato attuativo					Iter procedurale								
	Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.	Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità		Inizio	Fine	
	Inizio	Fine	Inizio	Fine		inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			
Raddoppio Spoleto-Terni	J61H02000090008	Iter autorizzativo	-	11-2012	3-2006	11-2025	-	-	12-2025	9-2026	9-2026	11-2034	5-2035	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto completa il più ampio programma di potenziamento della trasversale Orte-Falconara e mira al miglioramento dei collegamenti tra le regioni tirreniche e quelle del versante adriatico. L'intervento è previsto prevalentemente in variante di tracciato e in galleria, per una estesa complessiva di 54 km, di cui solo circa 6 km nel territorio della Regione Marche, dal confine con l'Umbria, situato nella galleria di Fossato di Vico, fino alla stazione di Fabriano.

L'intervento di raddoppio, che ricade nelle provincie di Perugia e Terni, si sviluppa in una vallata dell'Appennino Umbro-Marchigiano in un ambito prevalentemente extraurbano naturale con densità abitative scarse.. L'opera si sviluppa prevalentemente in variante di tracciato ed in galleria.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Il progetto preliminare è stato inviato al MIT nel 2003 secondo le procedure di Legge Obiettivo (legge 443/01), ricevendo l'approvazione, in linea tecnica, con Delibera CIPE Delibera N. 87 del 29.03.2006 pubblicata sulla G.U. del 6 novembre 2006. Attualmente, in esito alle attività del GdL istituito a seguito del protocollo sottoscritto nel 2020, si prevedono interventi di tipo tecnologico finalizzato alla velocizzazione della tratta, sia di tipo infrastrutturale «leggero» attraverso puntuali rettifiche di tracciato, nonché interventi mirati di PRG nelle stazioni di Gualdo Tadino e Nocera. Sono in corso approfondimenti finalizzati al riavvio della progettazione.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Unitamente ad altri interventi programmati sulla direttrice Orte-Falconara il progetto mira al miglioramento dei collegamenti passeggeri tra le regioni tirreniche e quelle del versante adriatico e alla creazione di un itinerario alternativo merci per i collegamenti nord-sud. Incremento della capacità sulle tratte oggetto di raddoppio (da 4 treni/h nei due sensi di marcia a 10 treni/h per senso di marcia). Riduzione dei tempi di percorrenza, grazie al miglioramento prestazionale in termini di velocità di tracciato, fino a 30 minuti sulla relazione Roma-Ancona per alcuni servizi e fino a 15 minuti tra Roma e Perugia, in relazione al modello di esercizio migliore livello di regolarità della linea



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Marche

Umbria

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Raddoppio Foligno-Fabriano		X									X	X		X	

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0296: Raddoppio Orte-Falconara: tratta Foligno-Fabriano

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve			
								Priorità 1	Priorità 2		
1.918,50	0,00	di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,50	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
1.918,50						1.918,50

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
0,00						0,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Foligno-Fabriano	1.918,50	0,00	1.918,50	1.813,99	104,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.918,50
	1.918,50	0,00	1.918,50	1.813,99	104,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,50

CRONOPROGRAMMA														
CUP	Stato attuativo					Iter procedurale								
	Prog.Prel.	Prog.Def.	Prog.Esec.	Attiv.Negoz.	Esecuzione	Funzionalità	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
Raddoppio Foligno-Fabriano	J31J05000030001	Valutazione di fattibilità alternative progettuali	-	-	7-2027	1-2029	-	-	2-2029	1-2030	1-2030	2-2039	7-2039	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto si inserisce nel più ampio programma di potenziamento della trasversale Orte-Falconara e mira al miglioramento dei collegamenti tra le regioni tirreniche e quelle del versante adriatico. Il progetto prevede il raddoppio del collegamento tra il Posto di Movimento al km 228+014 (LS) e la Stazione di Castelplanio per una lunghezza complessiva di circa 21,5 km. All'interno del suo perimetro sono stati individuati tre lotti funzionali: Lotto 1 PM 228 – Genga, Lotto 2 Genga – Serra San Quirico, Lotto 3 Serra San Quirico – Castelplanio. Si sta procedendo prioritariamente con il lotto n. 2 PNRR.

L'intervento di raddoppio, che ricade nella Provincia di Ancona, si sviluppa in una vallata dell'Appennino Umbro-Marchigiano in un ambito prevalentemente extraurbano naturale. L'opera si sviluppa prevalentemente in variante di tracciato ed in galleria.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

LOTTO 1 – PFTE concluso. Di prossimo avvio il Dibattito Pubblico. LOTTO 2 - In corso la fase realizzativa relativa ai lavori delle gallerie, delle opere di realizzazione dei viadotti e delle deviate provvisorie. LOTTO 3 – PFTE concluso. A dicembre 2023 è pervenuto il parere del CS CSLPP. Avviati gli iter autorizzativi (VIA, CdS e archeologia).

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Unitamente ad altri interventi programmati sulla direttrice Orte-Falconara il progetto mira al miglioramento dei collegamenti passeggeri tra le regioni tirreniche e quelle del versante adriatico e alla creazione di un itinerario alternativo merci per i collegamenti nord-sud. Incremento della capacità sulle tratte oggetto di raddoppio (da 4 treni/h nei due sensi di marcia a 10 treni/h per senso di marcia). Creazione delle condizioni per un potenziamento dei servizi extraurbani veloci Ancona - Roma al fine di garantire opportunità di interscambio anche con i servizi della Regione Umbria. Migliore livello di regolarità della linea. Riduzione dei tempi di percorrenza, grazie al miglioramento prestazionale in termini di velocità di tracciato fino a 30 minuti sulla relazione Roma-Ancona per alcuni servizi e fino a 15 minuti tra Roma e Perugia, in relazione al modello di esercizio.



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Marche

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
PM228-Castelplanio Lotto 1: nuovo collegamento PM228 - nuovo Bivio Nord Albacina		X									X	X			X

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0298: Nuovo collegamento PM228 - Castelplanio con by-pass di Albacina

PM228-Castelplanio Lotto 2: Raddoppio Bivio Nord Albacina - Serra San Quirico	X	X		X		X	
PM228-Castelplanio Lotto 3: Raddoppio Serra San Quirico - Castelplanio		X		X		X	

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
1.680,25	663,40	di cui:	359,19	0,00	0,00	304,21	0,00	0,00	13,00	0,00	1.003,85

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo							CdP-I agg.2025	Variazione del costo dovuta ad un maggior valore delle opere ad esito della progettazione, al recepimento degli adeguamenti alle normative di classificazione delle OO.CC richiesti dal CSLP nei lotti 2 e 3 nonché, al riconoscimento a favore dell'appaltatore di un premio di acceleramento sui tempi di esecuzione dei lavori.
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze			
	1.434,00		246,25			1.680,25		

Evoluzione coperture finanziarie							CdP-I agg.2025	Copertura appalto in corso per maggiori costi emersi nel corso della realizzazione e per soccombenze da Collegio Consultivo Tecnico
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni			
	595,88			16,22	51,30	663,40		

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam. AI	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
PM228-Castelplanio Lotto 1: nuovo collegamento PM228 - nuovo Bivio Nord Albacina	532,17	0,00	532,17	202,20	329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	532,17
PM228-Castelplanio Lotto 2: Raddoppio Bivio Nord Albacina - Serra San Quirico	672,48	659,48	13,00	510,00	162,48	478,92	31,55	0,00	0,00	2,62	5,13	4,38	5,00	646,71
PM228-Castelplanio Lotto 3: Raddoppio Serra San Quirico - Castelplanio	475,60	3,92	471,68	217,46	258,14	3,63	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	5,00	474,45
	1.680,25	663,40	1.016,85	929,66	750,59	482,55	31,60	0,00	0,00	2,62	5,13	5,52	13,65	1.653,33

CRONOPROGRAMMA														
	CUP	Stato attuativo				Iter procedurale								
		Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità		
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine			
PM228-Castelplanio Lotto 1: nuovo collegamento PM228 - nuovo Bivio Nord Albacina	J21J05000000001	Progettazione	-	6-2027	-	-	-	-	-	6-2027	11-2027	11-2027	1-2033	5-2033
PM228-Castelplanio Lotto 2: Raddoppio Bivio Nord Albacina - Serra San Quirico	J21J05000000001	Realizzazione	12-2020	3-2027	1-2023	11-2023	-	-	-	-	11-2023	6-2026	12-2026	
PM228-Castelplanio Lotto 3: Raddoppio Serra San Quirico - Castelplanio	J21J05000000001	Iter autorizzativo	-	9-2026	-	-	-	-	-	9-2026	6-2027	6-2027	10-2030	4-2031

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto costituisce il primo lotto funzionale degli interventi di sviluppo dei collegamenti lungo la trasversale appenninica tra la regione Abruzzo, la Capitale e la direttrice Adriatica, in attuazione della Delibera CIPE n.85 del 29/09/02.

Gli interventi prioritari prevedono:- Realizzazione nuovo itinerario nella stazione di Pescara (terzo binario tra Pescara Centrale e Pescara Porta Nuova) (Lotto 0);- Raddoppio Pescara Porta Nuova – San Giovanni Teatino (Lotto 1);- Raddoppio San Giovanni Teatino – Chieti (Lotto 2);- Raddoppio Chieti – Interporto d'Abruzzo (Lotto 3);- PRG e ACC di Chieti (Lotto 4).

Le aree interessate dall'intervento ricadono nella fascia collinare-costiero abruzzese, posta ad Est della catena appenninica. Lotto 1: Raddoppio della tratta Pescara Porta Nuova (e) – P.M. San Giovanni Teatino: il raddoppio della sede viene realizzato per fasi, in parte a destra e in parte a sinistra del binario esistente. E' presente la fermata di San Marco da adeguare a raddoppio e la realizzazione della nuova fermata ferroviaria Aeroporto, con annesso parcheggio e viabilità di collegamento al tessuto urbano esistente. E' previsto il nuovo Posto di Movimento (PM) di San Giovanni Teatino; la sede ferroviaria è costituita da due binari di corsa ed una precedenza. Lotto 2: Raddoppio della tratta P.M. San Giovanni Teatino – Chieti: il raddoppio ferroviario viene realizzato per fasi. In tale tratto sono presenti opere di scavalco dell'Autostrada Adriatica e dello svincolo di uscita dell'Asse Attrezzato Industriale. si realizza un tratto di linea in variante di tracciato (Variante di San Martino) caratterizzato dalla presenza di un viadotto ferroviario a 4 cassoncini (VI06) e da uno in acciaio-calcestruzzo a campata singola (VI07). E' presente la fermata Madonne delle Piane da adeguare a raddoppio. Lotto 3: Raddoppio della tratta Chieti - Interporto Val Pescara: Il raddoppio ferroviario viene realizzato in sede in stretto affiancamento. Dal punto di vista altimetrico il tracciato di progetto ripercorre l'andamento di quello della linea storica. Il raddoppio della sede si sviluppa quasi interamente in rettilineo ad eccezione della curva planimetrica iniziale. Sono presenti due vincoli planimetrici: 1) cavalcaferrovia dell'Asse Attrezzato Industriale e 2) cavalcaferrovia del raccordo di ingresso all'autostrada Roma-Pescara. In quest'ultimo tratto sono state inserite tre curve planimetriche con raggi tali da permettere la velocità di percorrenza di 140 km/h e consentire inserimento del raddoppio preservando l'opera esistente e limitandone il tratto a distanza ridotta dalla linea esistente.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Lotto 0 (III binario Pescara PN-Pescara C.le): E' in corso il completamento delle Opere Civili del raddoppio della tratta Pescara C.le-Pescara P.N. In corso le verifiche tecniche sulla progettazione della sovrastruttura ferroviaria. Lotto 1 (Pescara PN-San Giovanni Teatino) e Lotto 2 (S. Giovanni Teatino-Chieti): A giugno 2024 si è concluso il Dibattito Pubblico. Il PFTE dei primi due lotti è stato ultimato. A gennaio 25 è stato trasmesso il PFTE al CS del CSLLPP per l'emissione del parere. Una volta ottenuto il parere, il progetto verrà inviato al MASE e al MIC nell'ambito del procedimento di VIA e sarà indetta la CdS. Lotto 3 (Chieti-Interporto D'Abruzzo) e Lotto 4 (PRG e ACC di Chieti): Aggiornamento progettuale in corso a seguito delle risultanze del Dibattito Pubblico; Successivamente si darà avvio alla CdS.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Incremento capacità: da 4 treni/h nei due sensi di marcia a 10 treni/h per senso di marcia con possibilità di istituire un servizio cadenzato tra Pescara e l'entroterra e di rendere «metropolitano» il servizio tra Pescara e Chieti, relazione interessata anche da pendolarismo universitario, riducendo il traffico veicolare urbano ed extraurbano.- Miglioramento dei collegamenti con Aeroporto d'Abruzzo.- Incremento prestazionale per i collegamenti tra la direttrice Adriatica, Pescara e l'Interporto d'Abruzzo con possibilità di programmare treni di lunghezza 750 m.



	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	X
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Abruzzo

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0307A: Roma-Pescara - ulteriore fasi

	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR		Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																						
Raddoppio Interporto d'Abruzzo-Chieti-Pescara	X					X				X			X				X					

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatiche di breve				
								Priorità 1	Priorità 2			
1.183,47	33,70	di cui:	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,77		

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE												milioni di euro		
Evoluzione Costo														
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze							CdP-I agg.2025	A seguito delle richieste emerse durante il Dibattito Pubblico e ritenute meritevoli di accoglimento, è emersa la necessità di una nuova progettazione del lotto 1 necessario per prevedere l'interramento del tratto di linea nel comune di San Giovanni Teatino (Loc. San Buceto) non previsto nella originaria soluzione progettuale. Tale progettazione ha prodotto maggiori costi da cui è scaturito un nuovo Quadro Economico comprensivo di adeguamento tariffario nell'ambito degli interventi di realizzazione delle opere del lotto 1, Pescara – S. Giovanni Teatino.	
857,50			325,97									1.183,47		

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
33,70						33,70

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Interporto d'Abruzzo-Chieti-Pescara	1.183,47	33,70	1.149,77	80,46	1.103,02	29,54	15,99	16,50	4,87	1,35	1,37	0,64	10,92	1.154,57
	1.183,47	33,70	1.149,77	80,46	1.103,02	29,54	15,99	16,50	4,87	1,35	1,37	0,64	4,16	1.154,57

CRONOPROGRAMMA														
CUP		Stato attuativo				Iter procedurale								
						Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine			
		Raddoppio Interporto d'Abruzzo-Chieti-Pescara	J31H960000000021	Iter autorizzativo	10-2005	4-2026	10-2017	9-2020	-	-	1-2026	10-2026	9-2026	9-2029

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi del progetto di raddoppio (prevalentemente in sede) della tratta PM 228 – Albacina hanno origine al km 228+705 della linea storica e terminano in corrispondenza dell'entrata in Stazione di Albacina per la quale è previsto un adeguamento dell'intero impianto. Il tracciato si sviluppa, per circa 3,9 km, completamente allo scoperto con tratti alternati in trincea e in rilevato, seguendo il medesimo andamento planimetrico della linea storica. In uscita dalla stazione di Albacina, viene mantenuto il bivio dal quale si diramano due singoli binari che collegano, Castelpianio verso nord e Macerata verso sud.

Marche

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

In esito alle attività del GdL ed a seguito dell'inserimento in PNRR, si è proceduto alla elaborazione del PFTE opportunamente aggiornato ai nuovi input funzionali ed ai nuovi standard infrastrutturali e tecnologici intervenuti nonché alle nuove normative. Ultimata la Progettazione Esecutiva. Avvenuta la consegna dei lavori.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Unitamente ad altri interventi programmati sulla direttrice Orte-Falconara il progetto mira al miglioramento dei collegamenti passeggeri tra le regioni tirreniche e quelle del versante adriatico e alla creazione di un itinerario alternativo merci per i collegamenti nord-sud. Incremento della capacità sulle tratte oggetto di raddoppio (da 4 treni/h nei due sensi di marcia a 10 treni/h per senso di marcia). creazione delle condizioni per un potenziamento dei servizi extraurbani veloci Ancona - Roma al fine di garantire opportunità di interscambio anche con i servizi della Regione Umbria. migliore livello di regolarità della linea Riduzione dei tempi di percorrenza, grazie al miglioramento prestazionale in termini di velocità di tracciato fino a 30 minuti sulla relazione Roma-Ancona per alcuni servizi e fino a 15 minuti tra Roma e Perugia, in relazione al modello di esercizio



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Marche

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Raddoppio PM228-Albacina	X	X				X					X				X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Progetto I175: Raddoppio PM 228-Albacina

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
149,05						149,05

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
149,05						149,05

CRONOPROGRAMMA

CUP	Stato attuativo				Iter procedurale								
	Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità		
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine			
Raddoppio PM228-Albacina	J44D20000060009	Realizzazione	12-2020	1-2024	-	-	-	-	1-2024	3-2025	5-2024	6-2026	12-2026

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi si inquadrano nell'ambito di un programma che mira a creare le condizioni per migliorare gli attuali servizi ferroviari all'interno della Regione Abruzzo e per loro successivi sviluppi, in attuazione dell'Accordo Quadro per l'utilizzo della capacità ferroviaria sottoscritto a novembre 2016. Gli interventi consistono nel ripristino della bretella in ambito stazione di Sulmona per il collegamento diretto tra Pescara e L'Aquila e realizzazione nuove fermata Sulmona S.Rufina.

L'intervento consiste nel ripristino di una bretella pre-esistente, di circa 700 metri, finalizzato a velocizzare i collegamenti ferroviari nelle tratte Pescara – Sulmona – L'Aquila – Terni riducendo i tempi di percorrenza di circa 10 minuti e non costringendo gli utenti ad un cambio treno. Infatti, allo stato attuale il collegamento avviene attraverso le linee esistenti di Pescara – Roma e di Terni – Sulmona collegate in corrispondenza della città di Sulmona che svolge per tali linee la funzione di Stazione di testa. Il progetto comprende anche la realizzazione della fermata di Sulmona - S. Rufina. Per consentire il collegamento tra la fermata di S. Rufina e la S.P. 51 Sagittario verrà realizzata una nuova strada di tipo categoria "F2" Locale Ambito Extraurbano che permetterà inoltre il collegamento veloce del nucleo abitativo, che nel frattempo si è venuto a creare nei pressi della futura fermata, alla S.P.51. Inoltre la stazione di Sulmona verrà potenziata con la realizzazione di un nuovo Apparato di Sicurezza di nuova tecnologia (ACC) e con la messa a piano regolatore generale della stazione.

Abruzzo

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Attivata a dicembre 2024. A seguito dell'attivazione ferroviaria, nel 2025 è previsto il completamento della viabilità stradale.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

- Riduzione del tempo di percorrenza del collegamento Pescara – L'Aquila – Terni fino a 10 minuti.- Maggiore accessibilità al servizio ferroviario.

	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regularità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	X
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficiamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Abruzzo

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Bretella Sulmona					X					X											

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P087A: Ammodernamento e potenziamento rete ferroviaria Regione Abruzzo - Bretella Sulmona

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
12,71	12,71		12,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
12,00				0,71		12,71
Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari						

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
12,00				0,71		12,71
Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)						

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Bretella Sulmona	12,71	12,71	0,00	11,91	0,80	12,41	12,09	0,00	0,01	0,00	1,75	1,97	5,00	1,29
	12,71	12,71	0,00	11,91	0,80	12,41	12,09	0,00	0,01	0,00	1,75	1,97	7,70	1,29

CRONOPROGRAMMA														
CUP	Stato attuativo					Iter procedurale								
	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
Bretella Sulmona	J84J18000000001	Esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	6-2024	12-2021	6-2025	12-2024

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento prevede la verifica e l'eventuale adeguamento dell' infrastruttura per consentire la velocizzazione delle tratte della direttrice conseguente all'upgrade tecnologico della linea Orte-Falconara. Verrà data priorità alle porzioni di linea già a doppio binario dove l'upgrade tecnologico consentirà miglioramenti sull'esercizio. Si darà avvio con le tratte prioritarie previste in PNRR; seguiranno le altre tratte.

Lazio/Marche

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Sono concluse le attività di indagine e verifica sulle opere d'arte esistenti volte a verificare la loro compatibilità con l'aumento di velocità previsto. Si è conclusa la progettazione degli interventi infrastrutturali necessari alla velocizzazione. Sono stati affidati gli appalti integrati degli interventi di adeguamento delle stazioni e della trazione elettrica. E' in corso la progettazione esecutiva relativa all'adeguamento TE e Stazioni

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Unitamente ad altri interventi programmati sulla direttrice Orte-Falconara il progetto mira al miglioramento dei collegamenti passeggeri tra le regioni tirreniche e quelle del versante adriatico e alla creazione di un itinerario alternativo merci per i collegamenti nord-sud. Incremento della capacità sulle tratte oggetto di raddoppio (da 4 treni/h nei due sensi di marcia a 10 treni/h per senso di marcia). creazione delle condizioni per un potenziamento dei servizi extraurbani veloci Ancona - Roma al fine di garantire opportunità di interscambio anche con i servizi della Regione Umbria. migliore livello di regolarità della linea Riduzione dei tempi di percorrenza, grazie al miglioramento prestazionale in termini di velocità di tracciato fino a 30 minuti sulla relazione Roma-Ancona per alcuni servizi e fino a 15 minuti tra Roma e Perugia, in relazione al modello di esercizio



	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Marche
Umbria

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Tecnologie per la velocizzazione tratte prioritarie Orte-Falconara	X	X									X				X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Progetto P239: Velocizzazione tratte Orte-Falconara

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

Evoluzione coperture finanziarie

CRONOPROGRAMMA

CUP	Stato attuativo				Iter procedurale												
					Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità		
					Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine			
Tecnologie per la velocizzazione tratte prioritarie Orte-Falconara			J64E21000110008	Attività negoziali	10-2022	7-2024	-	-	-	-	-	3-2022	5-2023	7-2026	7-2026		

Progetto P240A: Roma-Pescara fasi

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto è relativo ad ulteriori lotti funzionali degli interventi di sviluppo dei collegamenti lungo la trasversale appenninica tra la regione Abruzzo, la Capitale e la direttrice Adriatica, in attuazione della Delibera CIPE n.85 del 29/09/02. Gli interventi consistono nel completamento del programma di velocizzazione della linea Roma-Pescara mediante raddoppi e varianti di tracciato nelle tratte comprese tra Guidonia e Manoppello. Nello specifico il progetto prevede il raddoppio e la velocizzazione delle seguenti tratte:Lotto 1+2: tratte Interporto d'Abruzzo - Manoppello (raddoppio 6,5 km in affiancamento) e Manoppello - Scafa (raddoppio ca. 7 km di cui 5 in variante)Lotto 3: Pratola Peligna - Sulmona (raddoppio ca. 5,4 km di cui 2,4 in variante)Lotto 4: Avezzano - Tagliacozzo (raddoppio ca. 15 km in affiancamento)

Lazio/abruzzo

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•Lotto 1+2: raddoppio Scafa-Manoppello-Interporto d'Abruzzo:A marzo 25 consegnati i lavori di parte "A", di entrambi i lotti ed è in corso di ultimazione la verifica della progettazione esecutiva di parte B.Nel mese di dicembre è stato pubblicato il bando dell'appalto tecnologico dei lotti 1 e 2. •Lotto 3: raddoppio Sulmona-Pratola Peligna:PFTE ultimata. •Lotto 4: raddoppio Tagliacozzo-Avezzano:Progettazione ultimata. In corso valutazioni sul possibile avvio di approfondimenti progettuali volti a definire interventi di velocizzazione.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

A completamento di tutti gli interventi previsti sulla direttrice:- Riduzione tempi di percorrenza: Roma-Pescara in circa 2h rispetto agli attuali 3h 20', con un minor tempo di percorrenza fino a 80' (al completamento dell'intero progetto, oltre il 2027)- Incremento capacità: da 4 treni/h nei due sensi di marcia a 10 treni/h per senso di marcia sulle tratte oggetto di raddoppio, con possibilità di istituire servizi di tipo metropolitano tra Chieti e Pescara- Velocizzazione e sistematizzazione dei collegamenti tra Pescara e L'Aquila, grazie anche ad altri interventi in corso e programmati sulla linea L'Aquila-Sulmona (Bretella Sulmona, Nuova fermata Sulmona S.Rufina) - Adeguamento prestazionale per consentire lo sviluppo del traffico merci.



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	X
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Abruzzo

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Raddoppio Tagliacozzo-Avezzano	X									X		X									
Raddoppio Sulmona-Pratola Peligna	X											X									

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P240A: Roma-Pescara fasi

Raddoppio Scafa-Manoppello-Interporto d'Abruzzo	X	X	X	X
---	---	---	---	---

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
2.324,30	964,32	di cui:	244,32	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,98

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo							
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
2.290,60			33,70			2.324,30	Variazione del costo ad esito della Progettazione.

Evoluzione coperture finanziarie							
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
964,32						964,32	

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	AI 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Tagliacozzo-Avezzano	892,20	3,70	888,50	58,31	833,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	892,20
Raddoppio Sulmona-Pratola Peligna	471,47	0,00	471,47	29,22	442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	471,47
Raddoppio Scafa-Manoppello-Interporto d'Abruzzo	960,62	960,62	0,00	618,28	342,34	517,25	25,62	0,00	0,00	3,55	10,18	3,07	5,00	929,04
	2.324,30	964,32	1.359,98	705,81	1.618,48	517,25	25,62	0,00	0,00	3,55	10,18	3,07	14,78	2.292,72

CRONOPROGRAMMA														
CUP			Stato attuativo				Iter procedurale							
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
Raddoppio Tagliacozzo-Avezzano	J84E21001320008	Progettazione	-	1-2027	-	-	-	-	-	-	-	-	12-2029	
Raddoppio Sulmona-Pratola Peligna	J84E21001320008	Progettazione	-	1-2027	-	-	-	-	-	-	-	-	11-2029	
Raddoppio Scafa-Manoppello-Interporto d'Abruzzo	J84E21001320008	Realizzazione	12-2020	8-2026	10-2022	8-2023	-	-	6-2023	5-2024	5-2024	6-2026	12-2026	

Progetto P240B: Roma-Pescara completamento

	Priorità strategica	Priorità programmatica	Obiettivi strategici
	Coesione sociale e territoriale Accessibilità e qualità stazioni Resilienza al climate change Adeguamento a standard tecnici Sviluppo tecnologico Sistemi regionali e metropolitani Potenziamento connessioni merci Sviluppo corridoi TEN-T Completamento valichi alpini Alta Velocità (AV)	Allegato MIMS al DEF Tavoli tecnici di ascolto Altri Provvedimenti* Cofinanziamenti UE UE - workplan corridoi TEN-T AQ per l'utilizzo della capacità Fondo Sviluppo e Coesione Accordi EE.LL. Accordi Internazionali Interventi commissariati PNRR	X X X
Intervento / Opere funzionali			
Nuova linea Roma-Mandela-Tagliacozzo	X		

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P240B: Roma-Pescara completamento

Varianti Avezzano-Sulmona e Pratola Peligna-Scafa	X	X	X
---	---	---	---

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
12.753,00	3,86	di cui:	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	12.749,14

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo							CdP-I agg.2025	Variazione del costo ad esito del completamento dell'aggiornamento del DOCFAP.
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze			
5.230,00			7.523,00				12.753,00	

Evoluzione coperture finanziarie							CdP-I agg.2025
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni		
3,86							3,86

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	AI 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Nuova linea Roma-Mandela-Tagliacozzo	7.840,00	1,93	7.838,07	7.596,85	243,15	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	7.840,00
Varianti Avezzano-Sulmona e Pratola Peligna-Scafa	4.913,00	1,93	4.911,07	4.760,66	152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4.913,00
	12.753,00	3,86	12.749,14	12.357,50	395,50	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.753,00

CRONOPROGRAMMA														
CUP	Stato attuativo				Iter procedurale									
					Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Nego.		Esecuzione	
					Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine
Nuova linea Roma-Mandela-Tagliacozzo	J84E21001320008	Valutazione di fattibilità alternative progettuali	-	-	9-2025	12-2027	-	-	12-2027	8-2028	8-2028	5-2029	6-2037	
Varianti Avezzano-Sulmona e Pratola Peligna-Scafa	J84E21001320008	Valutazione di fattibilità alternative progettuali	-	-	9-2025	12-2027	-	-	12-2027	8-2028	8-2028	1-2036	6-2036	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento prevede il raddoppio, prevalentemente in variante, per un'estesa di circa 23 Km, la realizzazione della nuova Stazione di Ponte Albanito e della nuova fermata di Bovino, con la contestuale soppressione della Stazione di Troia - Castelluccio dei Sauri e l'eliminazione di 7 passaggi a livello. Il raddoppio prevede una velocità di progetto di 200 Km/h.

L'intervento consiste nella realizzazione di circa 23 km di nuova linea ferroviaria a doppio binario compresa la realizzazione delle stazioni di Ponte Albanito e Bovino. Inoltre è previsto l'attrezzaggiotecnologico della tratta con ACCM e l'eliminazione di tutti i passaggi a livello con la dismissione della linea storica esistente tra Cervaro e Bovino. L'intervento si snoda principalmente nel territorio dei Comuni di Foggia, Troia e Bovino nella provincia di Foggia.

STATO DI ATTUAZIONE


attualità dati: 30/06/2025

Intervento attivato nel 2017.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Unitamente al complesso di interventi sull'intera direttrice Napoli-Bari, l'intervento consentirà: - L'incremento della capacità della linea nei tratti oggetto di raddoppio (da 4 treni/h in entrambi i sensi di marcia a 10 treni/ora per senso di marcia). - La riduzione dei tempi di percorrenza (per i collegamenti Napoli-Bari, un tempo di viaggio di circa 2h; per i collegamenti Roma-Bari, un tempo di viaggio pari a 3 h). - Il miglioramento della regolarità della circolazione. - Una maggiore accessibilità dei territori serviti dalla nuova infrastruttura. - Sulla tratta Napoli-Foggia sarà possibile la circolazione di treni con semirimorchi, con peso per asse fino a 22,5 tonnellate e della lunghezza di 750 metri. Nello specifico il nuovo assetto infrastrutturale ed impiantistico connesso alla realizzazione della prima tratta di raddoppio fra Bovino e Cervaro consente di poter beneficiare di:

- recupero dei tempi di percorrenza di circa 8 minuti e un incremento di velocità della tratta da 80 km/h a 200km/h;- incremento della regolarità della circolazione, grazie alla soppressione dei numerosi passaggi a livello presenti lungo la linea e alla realizzazione dei nuovi sistemi di gestione della circolazione (ACC-M).

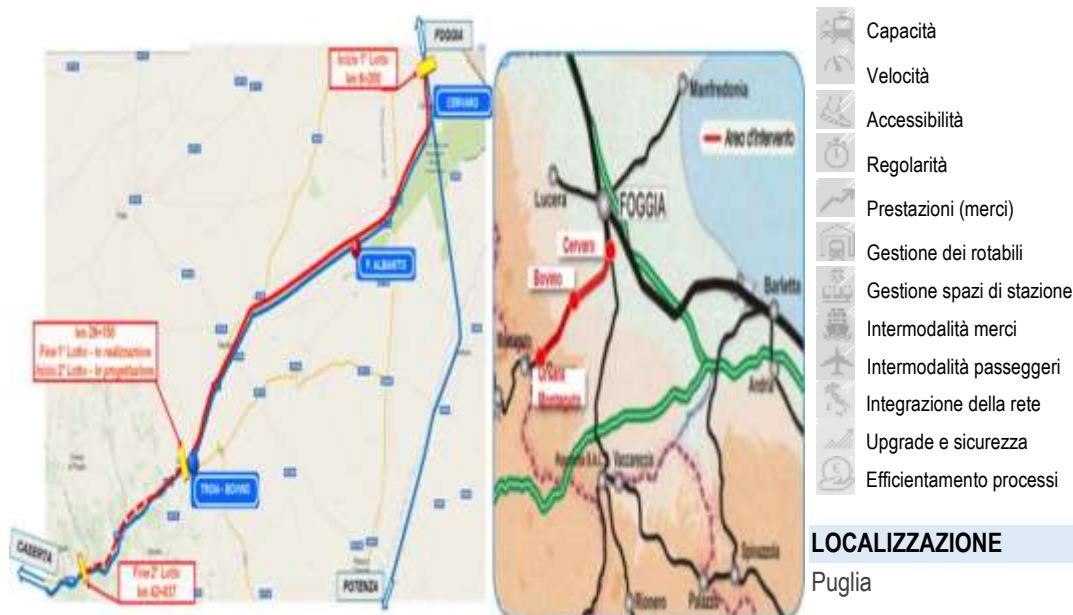**LOCALIZZAZIONE**

Puglia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani
Raddoppio Bovino-Cervaro	X			X		X	X			X	X			X	

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0099A: Itinerario Napoli-Bari: Raddoppio Bovino-Cervaro

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
263,40	263,40		53,45	0,00	76,20	0,00	133,75	0,00	0,00	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
263,40						263,40

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
263,40						263,40

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Bovino-Cervaro	263,40	263,40	0,00	208,91	54,49	260,21	254,16	251,66	2,08	2,88	0,48	1,14	9,32	4,99
	263,40	263,40	0,00	208,91	54,49	260,21	254,16	251,66	2,08	2,88	0,48	1,14	0,17	4,99

CRONOPROGRAMMA

CUP	Stato attuativo				Iter procedurale								
	J41H92000000008	Esercizio	Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
Raddoppio Bovino-Cervaro	J41H92000000008	Esercizio	-	-	2-2014	1-2017	2-2014	11-2017	8-2004	5-2015	10-2005	3-2019	6-2017

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento prevede il raddoppio della tratta Bovino – Orsara per un'estesa di circa 12 km, e si sviluppa sostanzialmente in variante rispetto all'attuale tracciato. E' prevista la dismissione delle due stazioni di Bovino ed Orsara. Nella seduta del 22/12/17 il CIPE (Delibera n.98) ha approvato la rimodulazione della programmazione 2014-2020 del Fondo Sviluppo e Coesione, integrando il finanziamento dell'intervento per ulteriori 501M€. In data 9/6/2018 è stata pubblicata la suddetta Delibera CIPE. La tratta è tutta finanziata.

L'intervento prevede la realizzazione di circa 12 km di nuova linea ferroviaria a doppio binario. Inoltre è previsto l'attrezzaggiotecnologico della tratta con ACCM e l'eliminazione di tutti i passaggi a livello con la dismissione della linea storica esistente tra Orsara e Bovino. L'intervento si snoda principalmente nel territorio dei Comuni di Montaguto (nella provincia di Avellino), Orsara di Puglia e Bovino (nella provincia di Foggia) tra la Regione Campania e la Regione Puglia.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Avviato a luglio 2024 lo scavo della galleria Orsara con la I^a TBM e ad aprile 2025 è stato avviato anche lo scavo con la II^a TBM.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Unitamente al complesso di interventi sull'intera direttrice Napoli-Bari, l'intervento consentirà: - L'incremento della capacità della linea nei tratti oggetto di raddoppio (da 4 treni/h in entrambi i sensi di marcia a 10 treni/ora per senso di marcia).- La riduzione dei tempi di percorrenza (per i collegamenti Napoli-Bari, un tempo di viaggio di circa 2h; per i collegamenti Roma-Bari, un tempo di viaggio pari a 3 h).- Il miglioramento della regolarità della circolazione.- Una maggiore accessibilità dei territori serviti dalla nuova infrastruttura.- Sulla tratta Napoli-Foggia sarà possibile la circolazione di treni con semirimorchi, con peso per asse fino a 22,5 tonnellate e della lunghezza di 750 metri.



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Puglia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici			
	PNRR	Accordi internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Raddoppio Orsara-Bovino	X			X		X				X	X		X	

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0099B: Itinerario Napoli-Bari: Raddoppio Orsara-Bovino

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
579,26	579,26		75,80	2,46	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
577,43				1,84		579,26
						Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
577,43				1,84		579,26
						Copertura di adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Orsara-Bovino	579,26	579,26	0,00	480,45	98,81	493,81	74,27	19,57	0,05	0,02	8,35	38,82	9,36	480,81
	579,26	579,26	0,00	480,45	98,81	493,81	74,27	19,57	0,05	0,02	8,35	38,82	31,64	480,81

CRONOPROGRAMMA														
					Stato attuativo				Iter procedurale					
					CUP	Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Funzionalità
						Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	
Raddoppio Orsara-Bovino	J41H92000000008	Realizzazione	7-2017	3-2018	12-2017	9-2020	-	-	-	-	-	-	-	6-2028

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025
Progetto 0099C: Itinerario Napoli-Bari: Opere di completamento raddoppio Vitulano-Apice

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi hanno rappresentato il primo tassello della realizzazione della nuova linea Alta Capacità Napoli-Bari. Le opere, da tempo ultimate, sono relative al completamento del raddoppio della tratta Vitulano-Benevento-Apice.

L'intervento consiste nella realizzazione di circa 20 km di nuova linea ferroviaria a doppio binario compresa la realizzazione della nuova stazione di Vitulano, Paduli e Apice. Inoltre è realizzato l'attrezzaggio tecnologico della tratta con BCA. L'intervento si snoda principalmente nel territorio dei Comuni di Benevento, Paduli e Apice.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Interventi ultimati

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Gli interventi, già in esercizio da diversi anni, hanno consentito un miglioramento della regolarità della circolazione nel nodo di Benevento.



LOCALIZZAZIONE

Campania

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Interventi di completamento raddoppio Vitulano-Apice		X					X			X		X		X	

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
19,95	19,95	di cui: 19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo

Progetto 0099C: Itinerario Napoli-Bari: Opere di completamento raddoppio Vitulano-Apice

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
19,95						19,95

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
19,95						19,95

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Interventi di completamento raddoppio Vitulano-Apice	19,95	19,95	0,00	19,41	0,53	19,36	18,84	18,84	0,28	0,00	0,00	0,25	5,00	0,58
	19,95	19,95	0,00	19,41	0,53	19,36	18,84	18,84	0,28	0,00	0,00	0,25	0,00	0,58

CRONOPROGRAMMA

CUP	Stato attuativo		Iter procedurale											
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Interventi di completamento raddoppio Vitulano-Apice	J41H920000000008	Esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6-2000	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi consistono nel raddoppio e velocizzazione della linea storica tra Canello e Frasso Telesino per un'estesa di circa 16 Km, sviluppandosi in completa variante tra Canello e Valle di Maddaloni (6 km) e ripercorrendo l'attuale corridoio per la tratta Valle di Maddaloni-Frasso Telesino (9 km). E' inoltre prevista la realizzazione della variante alla linea Roma-Napoli via Cassino nel comune di Maddaloni e il collegamento con l'impianto di Marcanise Scalo.

L'intervento prevede la realizzazione di circa 16 km di nuova linea ferroviaria a doppio binario compresa la realizzazione della nuova stazione di Valle di Maddaloni e Dugenta/Frasso oltre alle interconnessioni ferroviarie per collegare l'interporto di Marcanise/Maddaloni e la linea RM-NA via Cassino. Inoltre è previsto l'attrezzaggio tecnologico della tratta con ACCM e l'eliminazione di tutti i passaggi a livello con la dismissione della linea storica esistente tra Caserta e Dugenta/Frasso. L'intervento si snoda principalmente nel territorio dei Comuni di Maddaloni, Valle di Maddaloni, Sant'Agata dei Goti e Dugenta rientranti all'interno delle Province di Caserta e di Benevento.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Sono in corso le verifiche tecniche propedeutiche all'attivazione con l'ACC-M del binario pari entro settembre 2025 che costituisce una prima fase di attivazione. Inoltre, proseguono i lavori di armamento, trazione elettrica, impianti di segnalamento al fine di traghettare la seconda fase di attivazione.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

BeneficiUnitamente al complesso di interventi sull'intera direttrice Napoli-Bari, l'intervento consentirà: • L'incremento della capacità della linea nei tratti oggetto di raddoppio (da 4 treni/h in entrambi i sensi di marcia a 10 treni/ora per senso di marcia). • La riduzione dei tempi di percorrenza (per i collegamenti Napoli-Bari, un tempo di viaggio di circa 2h; per i collegamenti Roma-Bari, un tempo di viaggio pari a 3 h). • Il miglioramento della regolarità della circolazione. • Una maggiore accessibilità dei territori serviti dalla nuova infrastruttura. • Sulla tratta Napoli-Foggia sarà possibile la circolazione dei treni con semirimorchi, con peso per asse fino a 22,5 tonnellate e della lunghezza di 750 metri. Nello specifico l'intervento consentirà di realizzare un collegamento diretto per le relazioni Napoli – Benevento – Bari con un significativo recupero dei tempi di percorrenza grazie all'eliminazione della rottura di carico nella stazione di Caserta. L'intervento consentirà altresì il miglioramento del collegamento merci tra l'area di Sud-Est e lo scalo di Maddaloni-Marcanise, oggi realizzato tramite la linea Benevento - Caserta e la linea Caserta-Canello, con inversione di marcia dei treni nell'impianto di Caserta.

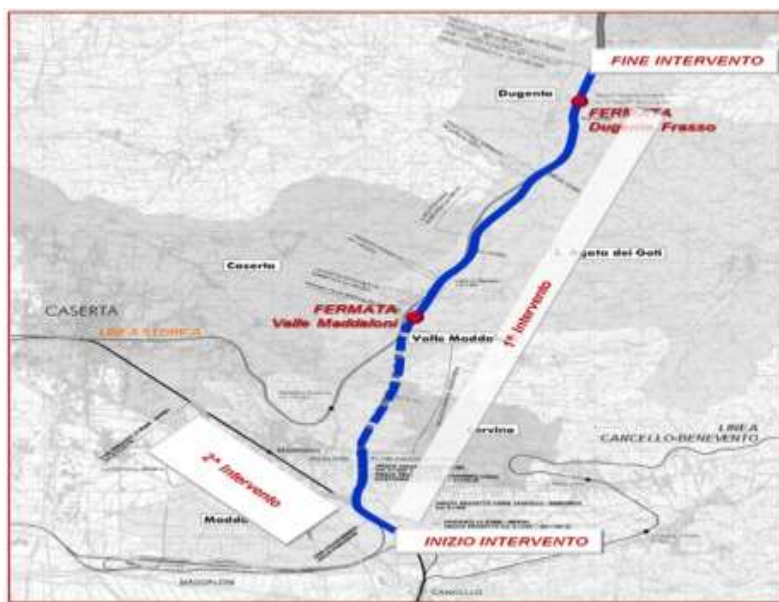

	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Campania

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica					Obiettivi strategici				
PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workshop corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto
									Allegato MIMS al DEF
									Alta Velocità (AV)
									Completamento valichi alpini
									Sviluppo corridoi TEN-T
									Potenziamento connessioni merci
									Sistemi regionali e metropolitani
									Sviluppo tecnologico
									Adeguamento a standard tecnici
									Resilienza al climate change
									Accessibilità e qualità stazioni
									Coesione sociale e territoriale

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0279A: Itinerario Napoli-Bari: Raddoppio e velocizzazione tratta Cancello-Frasso Telesino

Nuovo collegamento Cancello-Frasso Telesino e progettazione preliminare intero itinerario	X	X	X	X	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve			
								Priorità 1	Priorità 2		
767,21	767,21	di cui:	164,86	48,72	305,82	0,00	247,51	0,30	0,00	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
695,33			42,26	29,62		767,21
Variazione del costo dovuta all'incremento costi per fornitura di materiali, varianti in corso d'opera per modifica impalcati, modifica opere provvisoriale e miglioramenti terreni sottofondazioni. Inoltre, si segnala un incremento delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari.						

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
695,33				55,68	16,20	767,21
Copertura appalto in corso per maggiori costi emersi nel corso della realizzazione e per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche) e per soccombenze da Collegio Consultivo Tecnico						

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Nuovo collegamento Cancellò-Frasso Telesino e progettazione preliminare intero itinerario	767,21	767,21	0,00	624,34	142,88	725,71	505,30	104,83	71,62	89,95	115,45	95,80	58,42	140,91
	767,21	767,21	0,00	624,34	142,88	725,71	505,30	104,83	71,62	89,95	115,45	95,80	148,66	140,91

CRONOPROGRAMMA	CUP		Stato attuativo				Iter procedurale							
							Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.	
							Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
							Esecuzione Funzionalità							
Nuovo collegamento Cancello-Frasso Telesino e progettazione preliminare intero itinerario	J41H01000080008	Realizzazione	-	2-2013	12-2014	3-2016	6-2015	6-2021	-	-	1-2018	2-2026	9-2025	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi consistono nel raddoppio e velocizzazione della linea storica tra Frasso Telesino e Vitulano (Benevento), ripercorrendo l'attuale corridoio per un'estesa di circa 30 Km, parte in variante e parte in affiancamento, e la velocizzazione a 180 Km/h in rango P. E' prevista la realizzazione di 4 fermate e 1 stazione e la soppressione di 20 passaggi a livello. La realizzazione dell'intervento è articolata in tre Lotti funzionali: 1° lotto funzionale: Frasso Telesino – Telesse; 2° lotto funzionale: Telesse – S. Lorenzo Maggiore; 3° lotto funzionale: S. Lorenzo Maggiore – Vitulano.

L'intervento prevede la realizzazione di circa 30 km di nuova linea ferroviaria a doppio binario compresa la realizzazione della nuova stazione di Amorosi, Telesse, Solopaca, San Lorenzo Maggiore e Ponte/Casalduni. Inoltre è previsto l'attrezzaggio tecnologico della tratta con ACCM e l'eliminazione di tutti i passaggi a livello con la dismissione della linea storica esistente tra Dugenta/Frasso e Vitulano (Benevento). L'intervento si snoda principalmente nel territorio dei Comuni di Dugenta, Amorosi, Telesse, Solopaca, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, Ponte e Benevento, rientranti all'interno della Provincia di Benevento.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•Raddoppio tratta Frasso Telesino-Telesse: È in corso la realizzazione dell'intervento tra cui le opere relative al cavalcavia alla SP 116, i fabbricati viaggiatori nella tratta, il viadotto sul fiume Calore, la galleria artificiale di Telesse, recentemente attivata, la deviate provvisoria all'uscita della stazione di Frasso Telesino. In corso le attività propedeutiche all'attivazione della deviate provvisoria sul torrente Portella prevista a metà del mese di giugno 2025. •Raddoppio tratte Telesse-S. Lorenzo Maggiore-Vitulano: È in corso la realizzazione dell'intervento tra cui le opere relative alle gallerie Tuoro, S. Lorenzo, Le Forche, Cantone, Limata, Reventa e Ponte nonché i viadotti presenti sulla tratta. Sono in avanzamento tutti i 17 fronti di galleria previsti nel progetto. Completato lo scavo della Galleria Reventa.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Unitamente al complesso di interventi sull'intera direttrice Napoli-Bari, l'intervento consentirà: • L'incremento della capacità della linea nei tratti oggetto di raddoppio (da 4 treni/h in entrambi i sensi di marcia a 10 treni/ora per senso di marcia). • La riduzione dei tempi di percorrenza (per i collegamenti Napoli-Bari, un tempo di viaggio di circa 2h; per i collegamenti Roma-Bari, un tempo di viaggio pari a 3 h). • Il miglioramento della regolarità della circolazione. • Una maggiore accessibilità dei territori serviti dalla nuova infrastruttura. • Sulla tratta Napoli-Foggia sarà possibile la circolazione dei treni con semirimorchi, con peso per asse fino a 22,5 tonnellate e della lunghezza di 750 metri.

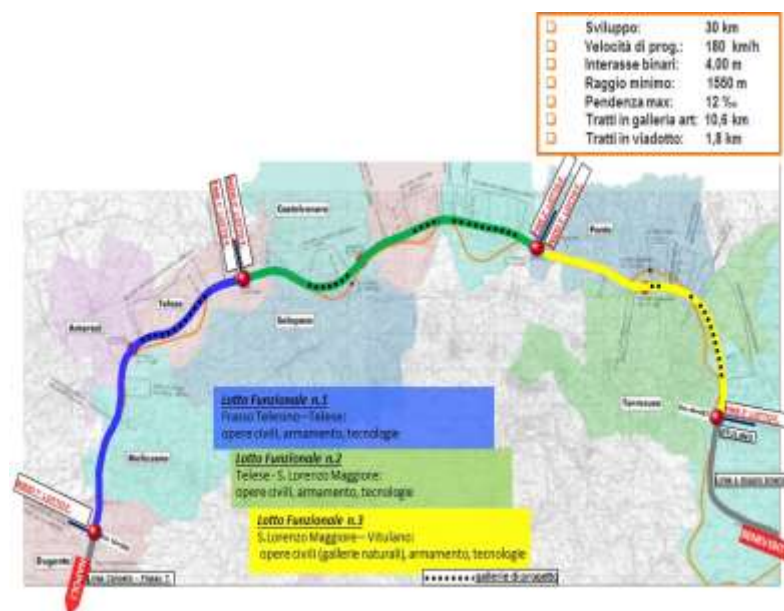

Capacità	X
Velocità	X
Accessibilità	X
Regolarità	X
Prestazioni (merci)	X
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Campania

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica		Obiettivi strategici	
PNRR	Interventi commissariati	Alta Velocità (AV)	Coesione sociale e territoriale
Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Completamento valichi alpini	Accessibilità e qualità stazioni
Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	Sviluppo corridoi TEN-T	Resilienza al climate change
UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Potenziamento connessioni merci	Adeguamento a standard tecnici
Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico
Allegato MIMS al DEF	Altri Provvedimenti*	Sviluppo tecnologico	Sistemi regionali e metropolitani
Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Potenziamento connessioni merci	Potenziamento connessioni merci
Altri Provvedimenti*	Altri Provvedimenti*	Sviluppo corridoi TEN-T	Sviluppo corridoi TEN-T
Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Completamento valichi alpini	Completamento valichi alpini
UE - workplan corridoi TEN-T	Altri Provvedimenti*	Alta Velocità (AV)	Alta Velocità (AV)
AQ per l'utilizzo della capacità	Altri Provvedimenti*		
Fondo Sviluppo e Coesione	Altri Provvedimenti*		
Accordi EE.LL.	Altri Provvedimenti*		
Accordi Internazionali	Altri Provvedimenti*		
Interventi commissariati	Altri Provvedimenti*		
PNRR	Interventi commissariati		

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0279B: Itinerario Napoli-Bari: Raddoppio e velocizzazione tratta Frasso Telesino-Vitulano (Benevento)

Raddoppio Frasso Telesino-Telese	X	X		X		X		X		X
Raddoppio Telese-S.Lorenzo Maggiore-Vitulano	X	X	X	X		X		X		X

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate									Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2		
1.178,09	1.178,09		486,67	83,61	230,18	377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE											milioni di euro
Evoluzione Costo											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025					
1.106,24			15,00	56,85		1.178,09	Variazione del costo dovuta all'incremento costi per fornitura di materiali, varianti in corso d'opera per modifica impalcati, modifica opere provvisionali e miglioramenti terreni sottofondazioni. Inoltre, si segnala un incremento delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari.				
Evoluzione coperture finanziarie											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025					
1.106,24				71,85		1.178,09	Copertura appalto in corso per maggiori costi emersi nel corso della realizzazione, per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche) e per soccombenze da Collegio Consultivo Tecnico				

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Frasso Telesino-Telese	437,07	437,07	0,00	350,64	86,43	362,61	192,64	19,26	4,93	22,44	59,10	67,94	7,64	198,42
Raddoppio Telese-S.Lorenzo Maggiore-Vitulano	741,03	741,03	0,00	631,64	109,39	669,54	228,22	0,00	0,00	2,10	17,11	93,19	5,00	438,33
	1.178,09	1.178,09	0,00	982,28	195,82	1.032,14	420,86	19,26	4,93	24,54	76,21	161,13	255,28	636,75

CRONOPROGRAMMA																	
			Stato attuativo				Iter procedurale										
			CUP			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
						Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine				
Raddoppio Frasso Telesino-Telese			J41H01000080008	Realizzazione	-	6-2019	10-2016	6-2019	-	-	-	-	8-2019	3-2027	8-2026		
Raddoppio Telese-S.Lorenzo Maggiore-Vitulano			J41H01000080008	Realizzazione	-	-	-	-	12-2020	12-2021	-	-	-	-	12-2026		

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il Progetto costituisce il primo segmento dell'itinerario Napoli Bari e concretizza, inserendosi nella nuova stazione di Napoli Afragola, l'integrazione delle linee storiche con il sistema di alta velocità. Gli interventi consistono nella realizzazione di una variante all'attuale linea Napoli-Cancello per un'estesa complessiva di 15,5 km con velocità di 130 Km/h, la riallocazione della fermata di Casalnuovo (punto di interscambio con la linea Circumvesuviana) e della stazione di Acerra (con l'innesto del raccordo ferroviario di Pomigliano), la realizzazione di una nuova fermata a servizio del Polo Commerciale «Le Porte di Napoli», e l'attivazione di nuovi binari nella stazione di Napoli Afragola per interscambio con il sistema AV/AC e rete Circumvesuviana e un nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione, con Posto Centrale a Napoli, permettendo, fra l'altro, di sopprimere tutti i 12 passaggi a livello presenti lungo la tratta storica, con un miglioramento complessivo della viabilità dell'area.

L'intervento prevede la realizzazione di circa 15,5 km di nuova linea ferroviaria a doppio binario compresa la realizzazione della nuova stazione di Acerra e di due nuove fermate di Casalnuovo e Marziasepe. Inoltre è previsto l'attrezzaggio tecnologico della tratta con ACCM e l'eliminazione di tutti i passaggi a livello con la dismissione della linea storica esistente. L'intervento si snoda principalmente nel territorio dei Comuni di Casoria, Casalnuovo, Afragola, Acerra e Cancello rientranti all'interno della Città Metropolitana di Napoli.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

In corso la realizzazione delle opere inerenti viadotti, la galleria artificiale di Casalnuovo, rilevati e trincee, armamento, impianti di segnalamento, trazione elettrica, barriere antirumore.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Unitamente al complesso di interventi sull'intera direttrice Napoli-Bari, l'intervento consentirà: • L'incremento della capacità della linea nei tratti oggetto di raddoppio (da 4 treni/h in entrambi i sensi di marcia a 10 treni/ora per senso di marcia). • La riduzione dei tempi di percorrenza (per i collegamenti Napoli-Bari, un tempo di viaggio di circa 2h; per i collegamenti Roma-Bari, un tempo di viaggio pari a 3 h). • Il miglioramento della regolarità della circolazione. • Una maggiore accessibilità dei territori serviti dalla nuova infrastruttura. • Sulla tratta Napoli-Foggia sarà possibile la circolazione dei treni con semirimorchi, con peso per asse fino a 22,5 tonnellate e della lunghezza di 750 metri. Nello specifico l'intervento garantisce l'integrazione della linea convenzionale con la linea AV/AC Roma - Napoli/Reggio Calabria e una migliore accessibilità dei comuni limitrofi alla città di Napoli.



Capacità	X
Velocità	X
Accessibilità	X
Regolarità	X
Prestazioni (merci)	X
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Campania

INQUADRAMENTO STRATEGICO**Priorità programmatica**

PNRR	Allegato MIMS al DEF
Interventi commissariati	Tavoli tecnici di ascolto
Accordi internazionali	Altri Provvedimenti*
Accordi EE.LL.	Cofinanziamenti UE
Fondo Sviluppo e Coesione	UE - workplan corridoi TEN-T
Accordi internazionali	AQ per l'utilizzo della capacità

Obiettivi strategici

Alta Velocità (AV)	Coesione sociale e territoriale
Completamento valichi alpini	Accessibilità e qualità stazioni
Sviluppo corridoi TEN-T	Resilienza al climate change
Potenziamento connessioni merci	Adeguamento a standard tecnici
Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico

QUADRO FINANZIARIO												milioni di euro
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2		
1.044,36	1.044,36	di cui:	166,21	48,47	506,00	44,15	278,73	0,80	0,00	0,00	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo							CdP-I agg.2025	
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze			
966,76			48,89	28,71			1.044,36	Variazione del costo dovuta ad adeguamenti tariffari. Inoltre, si registrano maggiori costi per ulteriori spese sostenute per il trasporto delle terre e rocce da scavo a seguito di determina CCT e per la ridefinizione del premio di acceleramento a seguito dell'incremento dell'importo contrattuale conseguente a varianti.

Evoluzione coperture finanziarie							CdP-I agg.2025	
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni			
966,76				63,71	13,89		1.044,36	Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche) e per soccombenze da Collegio Consultivo Tecnico

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Variante Napoli-Cancellò	1.044,36	1.044,36	0,00	740,67	303,69	956,18	671,19	263,34	68,50	74,53	89,41	122,48	66,11	286,83
	1.044,36	1.044,36	0,00	740,67	303,69	956,18	671,19	263,34	68,50	74,53	89,41	122,48	139,28	286,83

CRONOPROGRAMMA														
CUP	Stato attuativo					Iter procedurale								
	Realizzazione	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Prog.Prel.			Prog.Def.			Prog.Esec.		
						Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio
Variante Napoli-Cancellò	J61H94000000011	4-2007	2-2013	12-2014	3-2016	6-2015	11-2015	7-2016	2-2017	1-2018	11-2026	1-2026		

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto ha come obiettivo il collegamento della città di Matera all'infrastruttura ferroviaria nazionale attraverso la realizzazione di una nuova linea elettrificata di 20 km a semplice binario che si allaccia alla stazione di Ferrandina sulla linea Potenza - Metaponto. Le opere consistono nell'adeguamento e completamento delle opere civili fino ad ora realizzate, nell'attrezzaggio tecnologico della linea e della stazione di Matera La Martella e nella realizzazione di una lunetta a nord di Ferrandina per garantire il collegamento diretto verso Potenza ("Lunetta Ferrandina"). Il progetto consentirà di istituire relazioni ferroviarie di lunga percorrenza per collegare Matera con il sistema AV e potenziare l'offerta di trasporto pubblico locale sul territorio in termini di frequenza e qualità.

Nell'ambito di un primo stralcio costruttivo sono state realizzate la stazione di Matera La Martella (parzialmente), le opere d'arte del nuovo collegamento, la galleria Miglionico (6,5 km) e la bretella di collegamento (in rilevato) con la linea Battipaglia – Potenza – Metaponto lato Metaponto, oltre all'adeguamento del piano del ferro e dell'apparto della stazione di Ferrandina. La seconda fase d'intervento prevede: - risanamento strutturale della già realizzata galleria Miglionico, adeguamento alle specifiche tecniche di interoperabilità e adeguamento sicurezza in galleria; - elettrificazione della linea e realizzazione SSE; - realizzazione dell'armamento ferroviario lungo tutta la linea; - realizzazione degli apparati tecnologici della linea (telefonia, segnalamento, telecomunicazioni); - completamento della stazione di Matera La Martella; - nuova bretella di collegamento con la linea Battipaglia – Potenza – Metaponto lato Potenza.

Gli interventi prevedono il completamento della nuova tratta Ferrandina – Matera L.M. a semplice binario elettrificata per uno sviluppo di circa 20 km. La nuova linea si dirama dalla esistente stazione di Ferrandina (linea Potenza-Metaponto) e termina nella nuova stazione di Matera L.M. Il territorio dove si realizza l'opera è in parte pianeggiante e in parte montuoso. L'intervento prevede l'attraversamento di aree poco urbanizzate. La sede è stata completata con precedenti apporti e sono state eseguite tutte le opere civili compresa la Galleria Miglionico di circa 6,5 km ed il ponte metallico sul fiume Bradano; sono inoltre presenti, oltre ad un'alternanza di rilevati e trincee per circa 8,5 km, anche 5 km circa di viadotti. L'intervento prevede anche opere di sistemazione delle suddette opere civili.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Completati con precedente investimento i lavori di parte delle opere civili. Avviati a marzo 2024 i lavori di fase A (Opere propedeutiche alla realizzazione della finestra di emergenza della Galleria Miglionico), tali lavori sono in via di completamento. Avviati a dicembre 2024 i lavori della fase B1 (interventi alla Galleria Miglionico). Per la Fase B2 (costituita dagli interventi di adeguamento strutturale del Viadotto sul Fiume Basento) in corso la PE.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Il principale obiettivo del progetto è quello di dotare la città di Matera di un collegamento alla rete ferroviaria nazionale con la possibilità di istituire servizi di Lungo Percorso con Roma e TPL con Potenza e Taranto.



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Basilicata

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0136: Nuova Linea Ferrandina-Matera La Martella

	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF		Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																						
PRG e ACEI Ferrandina (interventi pregressi)	X	X				X											X					
Completamento nuova linea Ferrandina-Matera, elettrificazione e bretella Ferrandina-Potenza	X	X			X	X											X					

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
525,45	525,45	di cui: 389,50	2,61	10,00	123,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE											milioni di euro
Evoluzione Costo											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025					
429,24			96,21			525,45	Variazione del costo per le maggiori lavorazioni scaturite ad esito della Progettazione Esecutiva per effetto di modifiche recepite rispetto alla Progettazione definitiva posta a base gara.				

Evoluzione coperture finanziarie											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025					
429,24				96,21		525,45	Copertura appalto in corso per maggiori costi emersi ad esito della PE, di cui quota parte a copertura fabbisogni precedentemente coperti mediante attivazione della clausola di flessibilità art. 1 comma 5				

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
PRG e ACEI Ferrandina (interventi pregressi)	32,50	32,50	0,00	26,08	6,42	32,50	30,97	32,49	0,00	0,00	0,01	0,00	5,00	0,00
Completamento nuova linea Ferrandina-Matera, elettrificazione e bretella Ferrandina-Potenza	492,95	492,96	0,00	447,44	45,51	379,94	14,91	12,99	0,09	0,26	0,55	0,06	6,03	477,55
	525,45	525,45	0,00	473,52	51,93	412,43	45,88	45,48	0,09	0,26	0,55	0,06	1,46	477,55

CRONOPROGRAMMA															
				Stato attuativo				Iter procedurale							
								CUP		Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.	
										Attiv.Nego.		Esecuzione		Funzionalità	
										Inizio		Fine		Inizio	
										Inizio		Fine			
PRG e ACEI Ferrandina (interventi pregressi)	J61H92000020001	Esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-2004	6-2006	12-2005	
Completamento nuova linea Ferrandina-Matera, elettrificazione e bretella Ferrandina-Potenza	J61H92000020001	Realizzazione	5-2017	1-2018	7-2004	7-2022	10-2005	7-2006	-	-	-	-	-	12-2026	

Progetto P126: Velocizzazione direttrice Salerno-Taranto

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P126: Velocizzazione direttrice Salerno-Taranto

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve		
									Priorità 1	Priorità 2	
128,26	128,26		72,71	0,26	0,00	55,29	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo							CdP-I agg.2025	Variazione di costo dovuta ad adeguamenti tariffari. Si registra, inoltre, un aumento del costo dei materiali e maggiori costi per interferenze esterne.
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze			
90,00			38,00	0,26		128,26		

Evoluzione coperture finanziarie							CdP-I agg.2025	Copertura appalto in corso per maggiori costi emersi nel corso della realizzazione e per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni			
70,00				58,26		128,26		

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	AI 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Velocizzazione impianti linea Battipaglia-Potenza	128,26	128,26	0,00	122,21	6,05	83,12	50,27	9,41	2,15	2,41	4,67	9,87	9,79	79,68
	128,26	128,26	0,00	122,21	6,05	83,12	50,27	9,41	2,15	2,41	4,67	9,87	20,07	79,68

CRONOPROGRAMMA														
CUP	Stato attuativo						Iter procedurale							
	Realizzazione	Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità		
		Inicio	Fine	Inicio	Fine	Inicio	Fine	inizio	Fine	Inicio	Fine			
Velocizzazione impianti linea Battipaglia-Potenza	J64H17000230001	Realizzazione	-	-	12-2017	12-2020	-	-	-	-	-	-	-	6-2026

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede, nella tratta Potenza-Metaponto, il potenziamento della linea con interventi prioritari di velocizzazione della tratta Grassano – Bernalda ed il PRG di Salandra e Bernalda. Tali interventi sono previsti in PNRR.

L'intervento si sviluppa nelle regioni Campania e Basilicata

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Conclusa la progettazione esecutiva ad inizio aprile, è stata avviata la fase realizzativa.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Miglioramento della regolarità. Unitamente al completamento dei lavori del lotto 1a della Nuova Linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria e agli ulteriori interventi sono previsti sulla direttrice recupero dei tempi di percorrenza sull'itinerario Taranto-Napoli di circa 20'. A regime ulteriori possibilità di sviluppo dei traffici sull'itinerario.



	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Basilicata

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi E.E.L.L.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	Cofinanziamenti UE	UE - workshop corridoi TEN-T	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Velocizzazione Grassano-Metaponto	X	X									X	X			X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
416,35	416,09	di cui: 349,67	0,00	0,00	66,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,26

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P238A: Battipaglia - Potenza - Metaponto - Taranto 1^ fase

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
396,35			20,00			416,35	Variazione di costo per la risoluzione interferenze emerse durante le attività.

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
396,35				19,74		416,09	Copertura appalto in corso per maggiori costi emersi per la risoluzione dei sottoservizi

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Velocizzazione Grassano-Metaponto	416,35	416,09	0,26	353,44	62,91	334,66	20,51	0,00	0,00	1,66	5,72	1,82	5,00	394,91
	416,35	416,09	0,26	353,44	62,91	334,66	20,51	0,00	0,00	1,66	5,72	1,82	12,24	394,91

CRONOPROGRAMMA

			Stato attuativo				Iter procedurale										
			CUP														
						Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Nego.		Esecuzione		Funzionalità	
						Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Velocizzazione Grassano-Metaponto	J94E21000070009	Realizzazione	1-2021	5-2025	-	5-2025	-	-	-	-	-	1-2024	6-2026	12-2026			

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P238B: Battipaglia - Potenza - Metaponto - Taranto completamento

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Nella seconda fase saranno previsti interventi nelle seguenti tratte: Tito – Potenza;Potenza - Grassano;Metaponto – P.M. Cagioni; Bivio/P.C. Metaponto - Taranto.

L'intervento si sviluppa nelle regioni Basilicata e Puglia

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Intervento non finanziato

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Miglioramento della regolarità.Unitamente al completamento dei lavori del lotto 1a della Nuova Linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria e agli ulteriori interventi sono previsti sulla direttrice recupero dei tempi di percorrenza sull'itinerario Taranto-Napoli di circa 20'.A regime ulteriori possibilità di sviluppo dei traffici sull'itinerario.



	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Puglia
Basilicata

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica								Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Altri Provvedimenti*	Allegato MINS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini
Velocizzazione e adeguamento prestazionale Romagnano - Taranto ulteriori fasi	X								X			X	X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
1.320,06	0,00	di cui: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.320,06

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

Progetto P238B: Battipaglia - Potenza - Metaponto - Taranto completamento

milioni di euro

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
1.320,06						1.320,06

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
0,00						0,00

[illegible][illegible]

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi consistono nella realizzazione di una nuova linea con caratteristiche AV/AC per il prolungamento della rete Alta Velocità da Napoli verso Salerno. La nuova infrastruttura si sviluppa per un'estesa pari a circa 32 km a monte del Vesuvio da Bivio Casoria, sulla linea AV/AC Roma-Napoli, sino a Bivio Salerno, da cui si dirama l'interconnessione con la linea costiera Napoli-Salerno. Nell'ambito del progetto sono altresì previsti gli interventi di adeguamento della galleria Somma Vesuviana alle misure di sicurezza di cui al decreto del Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti del 28/10/2005 «sicurezza nelle gallerie ferroviarie».

L'intervento consiste nella realizzazione di circa 32 km di nuova linea ferroviaria a doppio binario compresa la realizzazione del nuovo impianto di PC Vesuvio. Inoltre è previsto l'attrezzaggio tecnologico della tratta con BAB 2/2. L'intervento si snoda principalmente nel territorio dei Comuni di Volla, Casalnuovo, Casoria, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Nola, Ottaviano, San Gennaro Vesuviano, Palma Campania, Poggiomarino, Striano, San Valentino Torio e Nocera Inferiore.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

La nuova linea è in esercizio dal 2008. I lavori di completamento, relativi all'adeguamento alle misure di sicurezza della galleria Somma Vesuviana, sono stati ultimati nel 2017.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

• Separazione dei diversi flussi di traffico (lungo percorso, regionale/metropolitano, merci) • Velocizzazione degli itinerari; • Integrazione della linea storica Napoli – Salerno con i traffici da e per la linea del Passante Ferroviario. La nuova infrastruttura ha consentito di utilizzare la linea costiera Napoli - Torre Annunziata - Salerno per l'esclusivo servizio metropolitano e ha consentito altresì di creare un itinerario specializzato per le merci tramite la bretella di collegamento con la linea Cancelli - Sarno – Avellino.

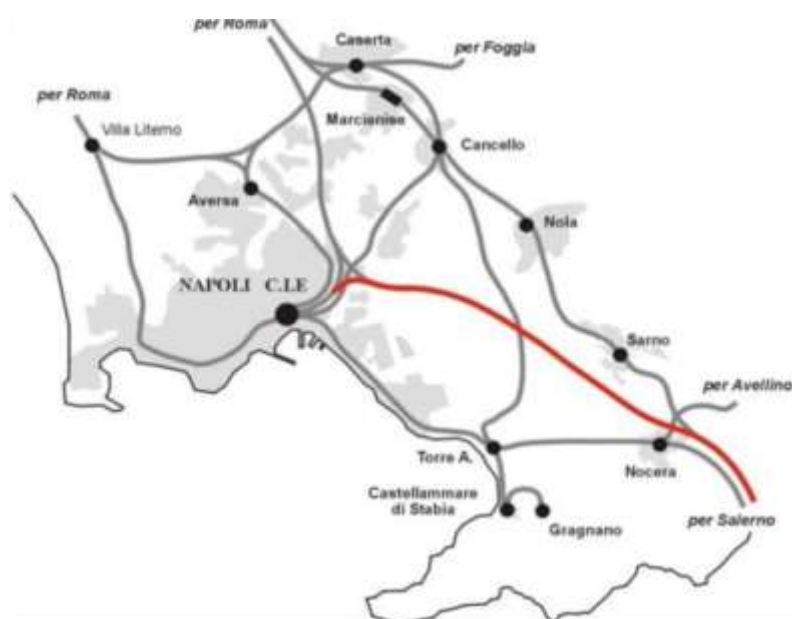

	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Campania

INQUADRAMENTO STRATEGICO

	Priorità programmatica	Obiettivi strategici
	Allegato MMS al DEF	Coesione sociale e territoriale
	Tavoli tecnici di ascolto	Accessibilità e qualità stazioni
	Altri Provvedimenti*	Resilienza al climate change
	Cofinanziamenti UE	Adeguamento a standard tecnici
	UE - workplan corridoi TEN-T	Sviluppo tecnologico
	AQ per l'utilizzo della capacità	Sistemi regionali e metropolitani
	Fondo Sviluppo e Coesione	Potenziamento connessioni merci
	Accordi EE.LL.	Sviluppo corridoi TEN-T
	Accordi Internazionali	Completamento valichi alpini
	Interventi commissariati	Alta Velocità (AV)
	PNRR	
Intervento / Opere funzionali		
Nuova linea a monte del Vesuvio (tratta bivio Casoria - bivio Sarno)		X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Progetto 0013A: Nuova linea a monte del Vesuvio

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

Evoluzione coperture finanziarie

CRONOPROGRAMMA

	CUP	Stato attuativo	Iter procedurale										
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
Nuova linea a monte del Vesuvio (tratta bivio Casoria - bivio Sarno)	J61H94000000001	Esercizio	3-2011	10-2013	11-2011	10-2013	4-2010	12-2004	5-2005	7-2008	11-1997	12-2011	12-2007

Progetto 0013B: Fermata Vesuvio Est Linea a monte del Vesuvio

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento prevede la realizzazione di una stazione di interscambio tra la linea ferroviaria a monte del Vesuvio e la linea Regionale Circumvesuviana nel Comune di Striano (NA).

attualità dati: 30/06/2025

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

The map shows the Campania region with the city of Naples (Napoli C.LE) at the center. A red line indicates the route of the Naples-Capri Airport, extending from the city towards the coast. Other locations marked include Villa Literno, Aversa, Marcianise, Caserta, Cancello, Nola, Sarno, Torre A., Castellammare di Stabia, Gragnano, and Nocera. Roads are labeled with directions: per Roma, per Caserta, per Foggia, per Salerno, and per Avellino.

- Capacità
- Velocità
- Accessibilità
- Regolarità
- Prestazioni (merci)
- Gestione dei rotabili
- Gestione spazi di stazione
- Intermodalità merci
- Intermodalità passeggeri
- Integrazione della rete
- Upgrade e sicurezza
- Efficientamento processi

LOCALIZZAZIONE

Campania

INQUADRAMENTO STRATEGICO

	Priorità programmatica	Obiettivi strategici
	Allegato MIMS al DEF Tavoli tecnici di ascolto Altri Provvedimenti* Cofinanziamenti UE UE - workplan corridoi TEN-T AQ per l'utilizzo della capacità Fondo Sviluppo e Coesione Accordi EE.LL. Accordi Internazionali Interventi commissariati PNRR	Coesione sociale e territoriale Accessibilità e qualità stazioni Resilienza al climate change Adeguamento a standard tecnici Sviluppo tecnologico Sistemi regionali e metropolitani Potenziamento connessioni merci Sviluppo corridoi TEN-T Completamento valichi alpini Alta Velocità (AV)
Intervento / Opere funzionali		
Fermata Vesuvio Est	X	X

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate							Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/ITEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve			
								Priorità 1	Priorità 2		
60.90	1.83	di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	59.07

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0013B: Fermata Vesuvio Est Linea a monte del Vesuvio

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
60,90						60,90

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
1,83						1,83

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Fermata Vesuvio Est	60,90	1,83	59,07	7,63	53,27	0,43	0,40	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	60,47
	60,90	1,83	59,07	7,63	53,27	0,43	0,40	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47

CRONOPROGRAMMA

CUP		Stato attuativo				Iter procedurale							
		Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Nego.		Esecuzione		Funzionalità	
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Fermata Vesuvio Est	J61H94000000001	Progettazione	12-2008	6-2009	1-2026	3-2026	-	-	-	-	-	3-2027	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto, che si inserisce nel programma di realizzazione della nuova linea Alta Capacità Palermo - Catania - Messina consiste nel raddoppio in variante della tratta Giampilieri - Fiumefreddo per un'estesa di circa 42 km, di cui gran parte in galleria. Il progetto è articolato in due fasi funzionali distinte: raddoppio tratta Fiumefreddo – Letojanni; raddoppio tratta Letojanni – Giampilieri, che completerà il raddoppio della linea Catania - Messina. Verrà mantenuta in esercizio l'interconnessione per Letojanni che assumerà la funzione di linea diramata. Nell'ambito del progetto saranno realizzate le nuove località di servizio di Fiumefreddo – Calatabiano, Alcantara-Giardini Naxos, Taormina, S. Alessio-S. Teresa, Nizza-Ali e Itala-Scaletta.

Il tratto ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo, che interessa la Regione Sicilia nelle provincie di Catania e Messina, attraversa i comuni di Fiumefreddo e Calatabiano (CT), e i comuni di Messina, Scaletta Zanclea, Itala, Ali Terme, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Pagliara, Furci Siculo, Santa Teresa a Riva, Savoca, Sant'Alessio Siculo, Forza d'Agrò, Letojanni, Taormina, Gallodoro e Castelmola (ME). Il percorso della nuova linea si sviluppa prevalentemente in galleria e, rispetto alla linea esistente, a maggior distanza dalla costa.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•Lotto 1: Fiumefreddo-Taormina: Fase realizzativa in corso con interventi per la realizzazione delle seguenti opere: Galleria artificiale Fiumefreddo, Galleria naturale Taormina, Ponte sul Torrente Minissiale, Viadotto Alcantara. •Lotto 2: Taormina - Giampilieri: Fase realizzativa in corso con interventi sulle gallerie: Scaletta, Ali, Forza D'Agrò e Taormina; e sui viadotti: Itala, Fiumara D'Agrò, Fondaco Parrino, Letojanni.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

•Incremento di capacità (da 4 treni/h nei due sensi di marcia a 10 treni/h per direzione) •Riduzione dei tempi di percorrenza sulla relazione Messina – Catania di circa 20' •Miglioramento della regolarità della circolazione •Miglioramento dell'accessibilità, grazie alla realizzazione delle nuove località di servizio e sviluppo di servizi di collegamento veloce fra i maggiori centri abitati e servizi di tipo metropolitano verso il nodo di Catania, con realizzazione delle nuove località di servizio Fiumefreddo – Calatabiano, Alcantara-Giardini Naxos, Taormina, S. Alessio-S. Teresa, Nizza-Ali e Itala-Scaletta. •adeguamento prestazionale dell'intera infrastruttura interessata dal progetto Palermo-Catania-Messina



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Sicilia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici			
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T
Raddoppio Giampilieri-Taormina	X	X				X	X			X		X		X

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve				
								Priorità 1	Priorità 2			
2.563,96	2.458,26	di cui:	1.972,89	24,30	0,00	461,07	0,00	0,00	0,00	105,70	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE											milioni di euro
Evoluzione Costo											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025					
2.364,70			174,97	24,30		2.563,96	Variazione del costo per: esigenze legate all'aggiornamento del Quadro Economico a valle dell'approvazione del progetto esecutivo; maggiori esigenze per l'acquisizione delle aree; adeguamento dei compensi CTA e CCT; intervenuta necessità di realizzare opere (pista provvisoria di cantiere. stabilizzazione versante di Taormina) non previste nella progettazione di gara inderogabili per l'attivazione all'esercizio ferroviario della Stazione ferroviaria di Taormi; attività di bonifica materiali con concentrazione di arsenico ritenuti rifiuti pericolosi provenienti dallo scavo delle gallerie. Inoltre, si registra un incremento delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari.				

Evoluzione coperture finanziarie											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025					
2.324,27				115,29	18,70	2.458,26	Copertura degli incrementi di costo dell'appalto in corso. Copertura di adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)				

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Altre
Raddoppio Giampilieri-Taormina	1.546,70	1.441,00	105,70	1.294,30	252,41	1.175,31	108,74	0,00	0,00	0,01	23,26	43,98	5,00	1.403,77
Raddoppio Letojanni-Taormina-Fiumefreddo	1.017,26	1.017,26	0,00	804,24	213,02	835,06	105,30	38,22	3,27	1,91	12,04	21,15	5,11	902,00
	2.563,96	2.458,26	105,70	2.098,54	465,42	2.010,37	214,04	38,22	3,27	1,92	35,30	65,13	114,35	2.305,78

CRONOPROGRAMMA														
CUP					Stato attuativo									
					Iter procedurale									
					Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione	
					Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
Raddoppio Giampilieri-Taormina					J11H02000070008	Realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	5-2030
Raddoppio Letojanni-Taormina-Fiumefreddo					J11H02000070008	Realizzazione	12-2002	7-2014	9-2016	9-2020	-	-	7-2022	9-2024

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea Battipaglia-Reggio C. hanno lo scopo di elevare gli standard prestazionali della linea. Gli interventi programmati in ambito Regione Campania (n. 3) comprendono: - adeguamento a sagoma PC 45;- costruzione sottopassaggio nella stazione di Policastro;- costruzione della galleria subalvea Fiumicello. Ogni singolo intervento è stato progettato in modo da poter essere eseguito ed attivato in maniera autonoma e da apportare immediati benefici. Gli interventi programmati in ambito Regione Calabria (n. 10) comprendono: - Ricostruzione della Galleria "Coreca" - Ricostruzione ponte Petrace fra le stazioni di Gioia Tauro e Palmi e modifica P.R.G. stazione di Gioia T. e inserimento C.T.C. - Velocizzazione degli itinerari di stazione e costruzione S.S.E. di Vibo Pizzo con annessa linea primaria di alimentazione- Riclassamento a 150 kV della SSE di Sambiase e della linea primaria FS Feroletto - Sambiase- Potenziamento della SSE di Reggio Calabria Gallico;- Realizzazione PRG ed ACC di Lamezia Terme Centrale;- Completamento realizzazione DCO unico di Reggio Calabria;- Adeguamento del PRG nelle stazioni Praja, Scalea e Diamante;- Adeguamento del PRG nelle stazioni Eccellente e Vibo-Pizzo;- Adeguamento sagoma gallerie della Calabria. Ogni singolo intervento è stato progettato in modo da poter essere eseguito ed attivato in maniera autonoma e da apportare immediati benefici.

Il progetto è articolato in opere funzionali ed ogni singolo intervento è stato progettato in modo da poter essere eseguito ed attivato in maniera autonoma e da apportare immediati benefici.

Il progetto ricade all'interno delle regioni Campania, Basilicata e Calabria, sulla linea Battipaglia - Reggio Calabria e riguarda interventi sia di carattere tecnologico che infrastrutturale (sia in galleria che in viadotto).

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

In ambito Regione Campania, tutti gli interventi sono stati attivati. Sono in corso i lavori di ultimazione le attività accessorie di completamento (lavori di consolidamento della galleria subalvea torrente Fiumicello binario dispari). In ambito Regione Basilicata le opere sono state ultimate tra il 2014-2015. In ambito Regione Calabria, tutti gli interventi sono stati attivati.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Aumento delle prestazioni dell'intera linea, della regolarità della circolazione e dell'affidabilità dell'infrastruttura, sia come sede ed opere d'arte che come impianti tecnologici, adeguandola, dove possibile, agli standard di esercizio più recenti.



	Capacità	
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Campania
Calabria

INQUADRAMENTO STRATEGICO**Priorità programmatica**

Allegato MIMS al DEF
Tavoli tecnici di ascolto
Altri Provvedimenti*
Cofinanziamenti UE
UE - workplan corridoi TEN-T
AQ per l'utilizzo della capacità
Fondo Sviluppo e Coesione
Accordi EE.LL.
Accordi internazionali
Interventi commissariati
PNRR

Obiettivi strategici

Coesione sociale e territoriale
Accessibilità e qualità stazioni
Resilienza al climate change
Adeguamento a standard tecnici
Sviluppo tecnologico
Sistemi regionali e metropolitani
Potenziamento connessioni merci
Sviluppo corridoi TEN-T
Completamento valichi alpini
Alta Velocità (AV)

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0263: Adeguamento tecnologico e infrastrutturale linea Battipaglia-Reggio Calabria

Ricostruzione galleria Coreca e Fiumicello; Ricostruzione ponti Petrace e Sorcio; modifiche PRG Gioia Tauro, Lamezia Terme, Praja, Scalea, Diamante, Eccellente, Vibo e Pizzo; SSE Vibo Pizzo, Sambiase, Reggio Calabria Gallico; Sottopassaggio Policastro; Ad	X	X	X	X		X	X	X
---	---	---	---	---	--	---	---	---

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
230,00	230,00	di cui:	38,54	0,00	0,00	0,00	191,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
230,00						230,00

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
230,00						230,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Ricostruzione galleria Coreca e Fiumicello; Ricostruzione ponti Petrace e Sorcio; modifiche PRG Gioia Tauro, Lamezia Terme, Praja, Scalea, Diamante, Eccellente, Vibo e Pizzo; SSE Vibo Pizzo, Sambiase, Reggio Calabria Gallico; Sottopassaggio Policastro; Ad	230,00	230,00	0,00	219,79	10,21	228,38	227,23	222,42	2,88	0,28	1,28	0,91	11,09	2,08
	230,00	230,00	0,00	219,79	10,21	228,38	227,23	222,42	2,88	0,28	1,28	0,91	0,16	2,08

CRONOPROGRAMMA

CUP	Stato attuativo	Iter procedurale											
		Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Ricostruzione galleria Coreca e Fiumicello; Ricostruzione ponti Petrace e Sorcio; modifiche PRG Gioia Tauro, Lamezia Terme, Praja, Scalea, Diamante, Eccellente, Vibo e Pizzo; SSE Vibo Pizzo, Sambiase, Reggio Calabria Gallico; Sottopassaggio Policastro; Ad	J61H03000100001 Esercizio	11-2007	1-2010	7-2007	8-2016	-	-	5-2008	11-2020	7-2008	9-2025	12-2018	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi sono finalizzati al miglioramento dell'accessibilità al servizio, nell'ambito di un più ampio piano di riqualificazione e ricucitura urbana nel nodo e sono articolati in due fasi: interrimento della linea ferroviaria antistante la pista dell'aeroporto per il prolungamento della pista dell'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania Fontanarossa (intervento finanziato da PO Infrastrutture FSC 2014-2020 e inserito nel perimetro per la stretta correlazione con l'intervento di fase 2); interrimento della stazione di Catania C.le e realizzazione di un nuovo tracciato a doppio binario (4,8 km circa), prevalentemente in galleria, tra quest'ultima e la stazione di Catania Acquicella, nonché realizzazione delle nuove fermate Porto/Duomo e Santa Maria Goretti. Il progetto si presenta complesso per le interferenze, archeologia e geologia.

Il progetto approvato dal CIPE nel 2004 prevedeva due fasi funzionali: - raddoppio Bivio Zurria – Catania Acquicella binario utilizzando l'attuale viadotto denominato "archi della marina" con una nuova galleria a semplice binario in affiancamento all'attuale in esercizio per un'estesa di circa 1 km e realizzazione della nuova fermata "Duomo/Castello Ursino" ubicata nel centro storico; - interrimento della stazione di Catania Centrale con raddoppio tra le stazioni di Catania C.le e Catania Acquicella, trasferimento a Bicocca di impianti ora ubicati nella zona di Acquicella, con il recupero di aree di proprietà RFI e la ristrutturazione della stazione di Acquicella, la riorganizzazione del polo manutentore e dello scalo merci di Bicocca, la realizzazione della bretella di raccordo con la linea ferroviaria Palermo – Catania, nonché la realizzazione delle fermate di Fontanarossa, Aci castello e Acireale. Successivamente il perimetro di intervento è stato esteso con l'intervento di interrimento della linea in fregio all'aeroporto V. Bellini di Catania-Fontanarossa al fine di consentire il prolungamento della pista. Tale intervento è indipendente sotto il profilo realizzativo, risulta però opportuno prevedere un attestamento treni che tenga conto della diversa collocazione della stazione di Bicocca notevolmente spostata lato Siracusa.

L'area connessa al progetto si colloca all'interno della zona urbana della città di Catania, in prossimità della costa ionica centrale. Il tracciato si sviluppa per circa 7.31 km in direzione NE-SW e impegna un settore di territorio caratterizzato da quote variabili tra 0.0 m s.l.m. e 28.5 m circa s.l.m., mentre l'intera area di studio si sviluppa a quote comprese tra il livello del mare e i 94.9 m circa s.l.m.. Le principali interferenze della infrastruttura sono con il fiume Amenano, in zona portuale, ed il torrente Acquicella, nella omonima zona. Dall'analisi degli strumenti urbanistici comunali emerge che il tracciato, nelle parti a cielo aperto, transita quasi interamente su aree e ambiti industriali-portuali-ferroviari che ne garantiscono la conformità. Dall'analisi del sistema vincolistico non emergono particolari situazioni di criticità relative al rapporto tra l'opera in esame, la tipologia e la distribuzione dei vincoli, anche in considerazione della particolarità del tracciato di progetto che si sviluppa quasi interamente in sotterraneo. Anche con riferimento ai beni paesaggistici non vi sono particolari interferenze tra le opere in progetto e le aree vincolate; questo perché, quando anche il tracciato interferisce con il bene paesaggistico denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area del centro abitato di Catania", le interazioni tra opera e vincolo avvengono unicamente per le parti di tracciato in trincea tra le pk 0+000 e 0+600 e nuovamente tra le pk 1+050 e 1+400, in ambiti già ampiamente caratterizzati dal paesaggio infrastrutturale che si frappono percettivamente tra la città e il suo mare. Infine, per quanto riguarda le interferenze con le "Aree tutelate per legge", si evidenzia che il tracciato di progetto attraversa due corsi d'acqua, il torrente Acquicella (vincolato da Pk 4+200 a Pk 4+900 binario pari) e il Canalone Forcile (vincolato da Pk 5+650 a Pk 6+350 binario pari), in un contesto fortemente antropizzato, non determinando modifiche di rilievo.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

• Interrimento Catania C.le e raddoppio Catania C.le-Acquicella: Concluso lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico economico, da avviare il dibattito pubblico. • Collegamento aeroporto Catania Fontanarossa: Fermata di Catania Fontanarossa: intervento attivato nel 2020. Trasformazione della fermata di Catania Fontanarossa in stazione: lavori in corso per le opere civili e attività negoziali in corso per gli interventi tecnologici. • Interrimento tratta Acquicella-Bicocca: Conclusa la progettazione esecutiva; sono in corso i lavori per le opere civili. Per gli interventi tecnologici a fine maggio è stata aggiudicata la gara.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

• Aumento di capacità con l'eliminazione del «collo di bottiglia» rappresentato dal s.b. • Miglioramento regolarità della circolazione e del servizio metropolitano nel Nodo ferroviario di Catania C.le • Miglioramenti urbanistici-territoriali dovuti alla liberazione delle aree di superficie fronte-mare attualmente occupate dai binari della stazione di Catania C.le • Possibilità di nuovi servizi di tipo metropolitano nelle nuove fermate di Porto/Duomo e Santa Maria Goretti.

Progetto 0270: Sistemazione nodo di Catania



	Capacità	X
	Velocità	
	Accessibilità	X
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Sicilia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica								Obiettivi strategici				
	PNRR	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change
Interramento stazione Catania c.le completamento del doppio binario tra Catania C.le e Catania Acquicella	X				X	X						X	X
Interramento Catania Acquicella-Bicocca	X			X	X	X						X	X
Collegamento ferroviario aeroporto di Catania: fermata su linea esistente					X	X			X			X	

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR	Altro UE	Altro		Priorità 1	Priorità 2	
1.607,82	613,70	di cui: 255,69	11,61	235,00	0,00	0,00	111,40		0,00	0,00	994,12

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo							CdP-I agg.2025	Variazione del costo a causa dell'incremento degli oneri della sicurezza a esito della verifica sulla documentazione presentata da parte dell'appaltatore, all'adeguamento degli imprevisti e dei compensi CTA e CCT.
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze			
1.576,57			31,25				1.607,82	
Evoluzione coperture finanziarie							CdP-I agg.2025	Copertura di interventi connessi con allungamento pista aeroporto con risorse PR FESR Sicilia 2021-2027
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni			
571,70				111,40	-69,40		613,70	

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025															
Progetto 0270: Sistemazione nodo di Catania															
	quadro finanziario ed economico					CCV		Produzione							
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre	
Interramento stazione Catania c.le completamento del doppio binario tra Catania C.le e Catania Acquicella	1.021,47	27,36	994,12	980,53	40,94	9,61	6,32	4,88	1,11	1,04	2,47	0,10	5,05	1.011,87	
Interramento Catania Acquicella-Bicocca	567,60	567,60	0,00	476,03	91,58	383,29	19,71	1,35	1,62	0,72	0,11	6,99	5,01	547,25	
Collegamento ferroviario aeroporto di Catania: fermata su linea esistente	18,74	18,74	0,00	16,45	2,29	9,50	5,79	0,96	3,92	0,73	0,05	0,32	5,89	12,74	
	1.607,82	613,70	994,12	1.473,01	134,81	402,40	31,83	7,19	6,65	2,49	2,63	7,41	9,59	1.571,86	

CRONOPROGRAMMA

	CUP	Stato attuativo	Iter procedurale										
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	
Interramento stazione Catania c.le completamento del doppio binario tra Catania C.le e Catania Acquicella	J11H03000140008	Progettazione	12-2002	6-2026	2-2012	3-2026	-	-	6-2026	3-2027	3-2027	8-2028	12-2028
Interramento Catania Acquicella-Bicocca	J11H03000140008	Realizzazione	-	-	12-2017	11-2023	-	-	11-2022	1-2024	-	-	2-2027
Collegamento ferroviario aeroporto di Catania: fermata su linea esistente	J34H17000230001	Esercizio	-	-	7-2022	-	-	-	11-2022	1-2024	1-2019	4-2021	12-2020

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

La realizzazione del nuovo collegamento Palermo-Catania, prevede il doppio binario nelle tratte Bicocca - Catenanuova e Fiumetorto – Lercara Diramazione e la realizzazione di un nuovo semplice binario velocizzato nella tratta Lercara D.ne – Catenanuova, con cunicoli di sicurezza paralleli alle lunghe gallerie di sezione allargata. L'intervento è articolato nei seguenti lotti: •LOTTO 1+2 «Fiumetorto-Montemaggiore-Lercara» •LOTTO 3 «Lercara-Caltanissetta Xirbi» •LOTTO 4a «Caltanissetta Xirbi-Enna» •LOTTO 4b «Enna-Dittaino» •LOTTO 5 «Dittaino-Catenanuova» •LOTTO 6 «Catenanuova-Bicocca»

Gli interventi della 1^a macrofase sono articolati in lotti funzionali. La prima fase di intervento consiste nella realizzazione del raddoppio nella tratta Catenanuova - Bicocca (LOTTO 6).

La relazione Palermo (pk 0+000) – Catania (pk 240+714) si sviluppa per un primo tratto, di 43,2 km circa, a doppio binario sulla direttrice Palermo – Messina fino all'impianto di Fiumetorto (pk 43+219), che è stazione di diramazione per la linea a semplice binario Fiumetorto – Lercara. Dall'impianto di Fiumetorto si procede fino all'impianto di Lercara (pk 76+764) per un'estesa di 33,5 km circa a semplice binario. Da Lercara (attuale stazione di diramazione per la relazione Palermo – Agrigento) si prosegue sempre a semplice binario per un'estesa di 49 km circa fino all'impianto di Caltanissetta Xirbi (pk 125+773). Da Caltanissetta Xirbi fino a Catania Centrale (pk 240+714) la linea ha un'estesa complessiva di 115 km circa, a singolo binario ad eccezione della tratta Bicocca (pk 233+407) – Catania Acquicella (pk 237+832) a doppio binario (4,5 km circa). Dunque, le tratte che costituiscono l'attuale collegamento Palermo – Catania presentano caratteristiche infrastrutturali ed impiantistiche differenti, con valori di velocità e pendenze che, in taluni tratti, rappresentano elementi fortemente penalizzanti per l'esercizio.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•Lotto 1+2 "Fiumetorto-Montemaggiore-Lercara": In corso la verifica della progettazione esecutiva della parte B e avviata la fase realizzativa della parte A. •Lotto 3 "Lercara-Caltanissetta Xirbi": In corso la verifica della progettazione esecutiva della parte B e avviata la fase realizzativa della parte A, con interventi ai rilevati e trincee, e interventi propedeutici alla realizzazione delle gallerie Santa Catena, Marianopoli e Xirbi. •Lotto 4a "Caltanissetta Xirbi-Enna": In corso la verifica della progettazione esecutiva della parte B e avviata la fase realizzativa della parte A, con interventi propedeutici alle gallerie Santa Catena, Trinacria e Montestretto. •Lotto 4b "Enna-Dittaino": In corso la fase realizzativa, con le opere propedeutiche per la realizzazione delle gallerie e dei viadotti. Realizzate le opere di imbocco della galleria Sicani, lato CT, e montate le due TBM per lo scavo della galleria di linea e del cunicolo. •Lotto 5 "Dittaino-Catenanuova": Fase realizzativa in corso con interventi ai viadotti, alle gallerie, alla sede e ai ponti. •Lotto 6 "Catenanuova-Bicocca": In corso la fase realizzativa. Le opere civili per attivazione sono quasi tutte ultimate, così come l'armamento. In corso di posizionamento la Linea di Contatto e l'ultimazione delle sottostazioni elettriche. In corso di completamento anche gli attrezzaggi degli impianti di circolazione e sicurezza ferroviaria.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Al completamento degli interventi previsti: -Riduzione dei tempi di viaggio tra Palermo e Catania, con un tempo di percorrenza stimato in circa 2h. -Incremento della capacità e delle prestazioni (la nuova infrastruttura sarà adeguata alle Specifiche Tecniche per l'Interoperabilità ferroviaria) -Miglioramento dell'accessibilità ai servizi ferroviari grazie alla realizzazione delle nuove località di servizio di Valle del Tordo, Nuova Enna e all'adeguamento delle stazioni principali. -Sviluppo di un nuovo modello di offerta che preveda collegamenti veloci tra i maggiori centri abitati e collegamenti capillari fra le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Catania



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Sicilia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0275A: Nuovo collegamento Palermo-Catania 1^ macrofase

	Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change	Adeguamento a standard tecnici	Sviluppo tecnologico	Sistemi regionali e metropolitani	Potenziamento connessioni merci	Sviluppo corridoi TEN-T	Completamento valichi alpini	Alta Velocità (AV)		Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR
Intervento / Opere funzionali																						
1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 1+2 Fiumetorto-Montemaggiore-Lercara										X		X			X	X	X	X			X	
1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 3 Lercara-Caltanissetta Xirbi										X		X				X	X	X			X	
1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 4a Caltanissetta Xirbi-Enna																X	X	X			X	
1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 4b Enna-Dittaino																X	X	X			X	X
1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 5 Dittaino-Catenanuova										X		X					X	X	X		X	
1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 6 Catenanuova-Bicocca																X	X	X	X		X	X

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR	Altro UE	Altro	programmatorie di breve		finanziari a
						nuovi progetti	(CEF/TEN, PON-FESR)	(EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	completamento
8.513,99	7.742,04	di cui:	5.606,55	53,14	1.716,00	162,95	203,41	0,00	771,94	0,01	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE							milioni di euro
Evoluzione Costo							
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
8.037,99			451,28	24,72		8.513,99	Variazione del costo a causa dell'incremento del valore delle opere ad esito della Progettazione Esecutiva consegnata dall'Appaltatore e all'adeguamento alle nuove tariffe del progetto definitivo dell'appalto tecnologico. Inoltre, si registra un incremento delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari.

Evoluzione coperture finanziarie							
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
7.555,66				179,75	6,63	7.742,04	Copertura appalto in corso per maggiori costi emersi ad esito della PE, per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche) e per soccombenze da Collegio Consultivo Tecnico

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 1+2 Fiumetorto-Montemaggiore-Lercara	2.031,59	1.930,10	101,48	1.768,84	262,75	1.445,68	59,44	33,60	5,78	1,42	4,18	10,53	15,88	1.959,26
1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 3 Lercara-Caltanissetta Xirbi	2.424,01	1.997,53	426,48	2.170,57	253,45	1.778,77	74,83	9,61	7,34	8,88	1,13	17,42	14,61	2.329,78
1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 4a Caltanissetta Xirbi-Enna	1.772,19	1.528,21	243,99	1.589,29	182,90	1.304,14	58,03	7,57	5,14	5,30	1,27	15,87	12,57	1.698,37
1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 4b Enna-Dittaino	841,24	841,24	0,00	732,44	108,80	718,88	47,98	4,20	3,32	2,20	1,34	13,16	9,20	782,42
1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 5 Dittaino-Catenanuova	809,13	809,13	0,00	683,18	125,95	623,57	57,35	15,13	-0,09	1,22	5,76	14,54	5,01	751,10
1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 6 Catenanuova-Bicocca	635,82	635,82	0,00	537,33	98,50	526,50	370,92	58,15	39,01	39,86	58,90	112,39	31,36	203,45
	8.513,99	7.742,04	771,95	7.481,65	1.032,33	6.397,53	668,55	128,25	60,49	58,87	72,58	183,91	285,49	7.724,38

CRONOPROGRAMMA

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0275A: Nuovo collegamento Palermo-Catania 1^ macrofase

	CUP	Stato attuativo	Iter procedurale											
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 1+2 Fiumetorto-Montemaggiore-Lercara	J11H03000180001	Realizzazione	1-2011	7-2025	12-2017	7-2025	7-2022	-	12-2022	3-2024	6-2023	5-2029	1-2030	
1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 3 Lercara-Caltanissetta Xirbi	J11H03000180001	Realizzazione	-	-	5-2019	10-2022	-	-	10-2022	10-2023	5-2023	10-2026	7-2027	
1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 4a Caltanissetta Xirbi-Enna	J11H03000180001	Realizzazione	-	-	12-2019	9-2022	-	-	11-2022	2-2024	5-2023	11-2026	7-2027	
1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 4b Enna-Dittaino	J11H03000180001	Realizzazione	-	-	12-2019	12-2021	-	-	6-2022	6-2023	11-2022	6-2026	11-2026	
1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 5 Dittaino-Catenanuova	J11H03000180001	Realizzazione	-	-	12-2014	3-2022	5-2015	10-2015	-	-	-	-	6-2026	
1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 6 Catenanuova-Bicocca	J11H03000180001	Realizzazione	-	-	12-2014	5-2021	5-2015	10-2015	11-2019	12-2019	2-2018	4-2025	6-2025	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

La relazione Palermo (pk 0+000) – Catania (pk 240+714) si sviluppa per un primo tratto, di 43,2 km circa, a doppio binario sulla direttrice Palermo – Messina fino all'impianto di Fiumetorto (pk 43+219), che è stazione di diramazione per la linea a semplice binario Fiumetorto – Lercara. Dall'impianto di Fiumetorto si procede fino all'impianto di Lercara (pk 76+764) per un'estesa di 33,5 km circa a semplice binario. Da Lercara (attuale stazione di diramazione per la relazione Palermo – Agrigento) si prosegue sempre a semplice binario per un'estesa di 49 km circa fino all'impianto di Caltanissetta Xirbi (pk 125+773). Da Caltanissetta Xirbi fino a Catania Centrale (pk 240+714) la linea ha un'estesa complessiva di 115 km circa, a singolo binario ad eccezione della tratta Bicocca (pk 233+407) – Catania Acquicella (pk 237+832) a doppio binario (4,5 km circa). Dunque, le tratte che costituiscono l'attuale collegamento Palermo – Catania presentano caratteristiche infrastrutturali ed impiantistiche differenti, con valori di velocità e pendenze che, in taluni tratti, rappresentano elementi fortemente penalizzanti per l'esercizio.

attualità dati: 30/06/2025

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

A map of Sicily, Italy, showing the Sicilian Ring road (SS9) highlighted in blue. The road connects major cities in a clockwise loop. A red oval highlights a specific area in the central-eastern part of the island, encompassing the towns of Enna, Caltanissetta, and Catania. Various other towns and geographical features are labeled on the map, including Palermo, Messina, and the Etna volcano.

	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

Sicilia

Priorità programmatica

- Allegato MIMS al DEF
- Tavoli tecnici di ascolto
- Altri Provvedimenti*
- Cofinanziamenti UE
- UE - workplan corridoi TEN-T
- AQ per l'utilizzo della capacità
- Fondo Sviluppo e Coesione
- Accordi EEL.
- Accordi Internazionali
- Interventi commissariati
- PNRR

Obiettivi strategici

- Coesione sociale e territoriale
- Accessibilità e qualità stazioni
- Resilienza al climate change
- Adeguamento a standard tecnici
- Sviluppo tecnologico
- Sistemi regionali e metropolitani
- Potenziamento connessioni merci
- Sviluppo corridoi TEN-T
- Completamento valichi alpini
- Alta Velocità (AV)

2^a macrofase Palermo – Catania: Tratti di raddoppio e varianti alla linea storica tratta Lercara Diramazione- Nuova Enna

Progetto 0275B: Nuovo collegamento Palermo-Catania 2^ macrofase

milioni di euro

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

Evoluzione coperture finanziarie

PIANO DELLA SPESA

[illegible]

CRONOPROGRAMMA

[illegible]

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A1008: Velocizzazione attraversamento dinamico Stretto di Messina

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il programma prevede iniziative volte al rinnovo e upgrading della flotta per garantire la continuità territoriale dei servizi ferroviari. I servizi marittimi per la Sicilia sono assicurati con quattro navi ferroviarie ad uso esclusivo dei treni passeggeri e merci. Recentemente la flotta si è “ringiovanita” con l’entrata in esercizio delle navi traghetto di ultima generazione Iginia (inaugurata nel 2022) e Messina (in servizio dal 2013), a cui si aggiungono le navi ferroviarie Villa e Scilla e le navi passeggeri della controllata Blufferries: Sikania (inaugurata nel 2021), Trinacria, Enotria, Fata Morgana e Riace. Il collegamento con la Sardegna, dedicato esclusivamente a trasporti ferroviari, viene svolto solo su domanda delle Imprese ferroviarie.

Nell’ambito del programma è previsto l’acquisto di una nuova nave ferroviaria standard ibrida e l’ibridizzazione delle navi Iginia e Messina, nonché l’acquisto di tre navi veloci per il trasporto passeggeri.

Gli interventi sono funzionali a garantire la continuità territoriale dei servizi ferroviari verso la Sicilia, assicurato continuativamente tramite il traghettamento dei treni passeggeri e merci tra Villa San Giovanni e Messina, e verso la Sardegna, svolto esclusivamente su richiesta delle Imprese ferroviarie per treni merci o trasporti di servizio

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Gli interventi relativi all’ibridizzazione della nave Iginia sono stati ultimati nel luglio 2023, con la relativi messa in esercizio della nave. Nel corso del 2024 sono stati avviati gli iter di gara per l’ibridizzazione della nave traghetto Messina (intervento di circa 3M€) e per l’implementazione elettrica dei moli di Messina «Cold Ironing» (intervento complementare all’ibridizzazione delle suddette NN/T per valore di circa 1M€). E’ in corso l’iter per l’avvio delle gare di fornitura di una nuova nave Nave Traghetto ibrida e di un mezzo veloce.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Miglioramento della continuità e regolarità del servizio.



- Capacità
- Velocità
- Accessibilità
- Regolarità
- Prestazioni (merci)
- Gestione dei rotabili
- Gestione spazi di stazione
- Intermodalità merci
- Intermodalità passeggeri
- Integrazione della rete
- Upgrade e sicurezza
- Efficientamento processi

X

LOCALIZZAZIONE

Sicilia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.II.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Sviluppo e upgrading flotta navale e infrastrutture di terra per la continuità territoriale	X										X		X		

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma A1008: Velocizzazione attraversamento dinamico Stretto di Messina

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse								programmatorie di breve		
		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2		
312,31	165,80	di cui:	165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	144,16

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo							CdP-I agg.2025	La variazione di costo è dovuta all'acquisto/fornitura di una nuova nave. Considerando che dovrà essere dotata di innovativi sistemi tecnologici e – in accordo alle recenti normative europee – di sistemi atti ad abbattere le emissioni inquinanti, valutati gli incrementi degli ultimi anni sia per le materie prime e che per il costo dell'energia, è stato stimato l'importo da finanziare in analogia a navi similari di recente costruzione, e specificatamente è stata presa a riferimento una nave con le medesime caratteristiche (dimensioni e tipologia di propulsione) aggiudicata nel 2025 dalla Regione Sicilia. Variazione di costo relativa allo spostamento in tabella C dei progetti ultimati.
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze			
245,00	-6,00		73,31					

Evoluzione coperture finanziarie							CdP-I agg.2025	Riduzione delle risorse del Piano Nazionale Complementare di competenza del MIT per il rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni			
221,80	-6,00		-50,00					

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						Oltre
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Sviluppo e upgrading flotta navale e infrastrutture di terra per la continuità territoriale	312,31	165,80	146,51	142,18	170,12	60,18	59,71	25,85	6,18	21,40	2,21	3,91	30,85	252,47
	312,31	165,80	146,51	142,18	170,12	60,18	59,71	25,85	6,18	21,40	2,21	3,91	0,28	252,47

AVANZAMENTO PROGRAMMA			CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Sviluppo flotta Navale			J20B18000000001	165,81	165,80	100%	60,14	36%	Realizzazione
Acquisto navi bidirezionali				146,50	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Sviluppo e upgrading flotta navale e infrastrutture di terra per la continuità territoriale				312,31	165,80	53%	60,14	36%	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede la realizzazione della nuova linea AV Salerno – Reggio Calabria che garantirà la continuità di un itinerario strategico per la connessione tra il sud e il nord. La nuova direttrice consentirà d'incrementare i livelli d'accessibilità alla rete AV e creare le condizioni per nuove opportunità commerciali (passeggeri e merci) per zone a elevata valenza territoriale come il Cilento, la costa Jonica, l'alto e il basso Cosentino, l'area del Porto di Gioia Tauro e il Reggino, nonché offrire una velocizzazione dei collegamenti per la Sicilia attraverso l'interconnessione a Villa S. Giovanni. L'itinerario complessivamente avrà uno sviluppo compreso tra i 450 km e i 520 km (a seconda delle configurazioni infrastrutturali) suddiviso in lotti funzionali, realizzabili per fasi in funzione dei finanziamenti disponibili. Inoltre, lungo l'intero itinerario è ipotizzata la realizzazione di alcune nuove fermate AV. Tali fermate, così come eventuali interconnessioni, saranno oggetto di approfondimenti successivi, dati dal confronto con gli Enti interessati, in coerenza con le esigenze ferroviarie. Nello Scenario Prioritario ipotizzato ad oggi sono ricompresi i seguenti lotti: Lotto 1, Lotto 2 e il "Raddoppio Paola – Cosenza" (Nuova galleria Santomaro), anche per il significativo contributo fornito al potenziamento dell'itinerario merci Gioia T. – Paola – Bari. La priorità è basata sull'ottimizzazione di una diffusa riduzione delle percorrenze, sulla realizzazione d'itinerari merci e al contempo sulla massimizzazione dell'accessibilità al sistema ferroviario anche in termini di intermodalità. È, inoltre, previsto lo sviluppo del PFTE dei lotti non prioritari relativi al completamento dell'itinerario SA-RC.

Il lotto 1a Battipaglia-Praja ha uno sviluppo complessivo di circa 127 km. Più in particolare, il Lotto 1a Battipaglia – Romagnano è individuato come prioritario ed è stato inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nei pressi di Romagnano è prevista la realizzazione dell'interconnessione dispari che consente il collegamento con l'attuale linea Battipaglia – Potenza – Metaponto – Taranto. Il Lotto 1b Romagnano-Fermata Intermedia prosegue da Romagnano in direzione sud fino ad una nuova fermata intermedia, e prevede l'interconnessione pari con la linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto. Il Lotto 1c Fermata Intermedia-Praja rappresenta il tratto finale del progetto Battipaglia-Praja. Si estende dalla fermata intermedia verso la zona costiera dove si affianca alla linea tirrenica esistente e termina in corrispondenza di Praja A.T., in territorio calabrese. Il tracciato del Lotto 2 è in corso di sviluppo, in considerazione delle complessità del quadro idrogeologico ed ambientale del territorio attraversato. L'intervento del raddoppio della linea esistente Paola – Cosenza (Nuova Galleria Santomaro) è finalizzato anche al potenziamento del traffico merci proveniente dalla linea Tirrenica in direzione Metaponto/Taranto. L'intervento si sviluppa per una estensione di circa 22.2 km, di cui circa 17 km in sotterraneo (galleria Santomaro) mentre i restanti 5.2 km sono relativi a tratte all'aperto. È previsto inoltre il raddoppio del tratto compreso fra la nuova galleria e la stazione di Castiglione Cosentino, su cui insisterà una nuova fermata per servizio viaggiatori.

La Salerno-Reggio Calabria riveste un'importanza strategica a tutti i livelli. In particolare: a livello europeo fa parte del corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete TEN-T; a livello nazionale fa parte della rete SNIT di primo livello ed è necessaria per ridurre il gap infrastrutturale fra nord e sud del Paese; a livello locale rappresenta un progetto strategico per collegare le regioni interessate con la parte centro-settentrionale del paese. Le province interessate sono: Campania: - Salerno Basilicata: - Potenza - Matera Calabria: - Cosenza - Catanzaro - Vibo Valentia - Reggio Calabria. L'intervento insiste su un vastissimo territorio attraversando aree, orograficamente complesse, con prevalenza di promontori collinari-montuosi, alternati da limitate pianure o altopiani.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Lotto 1a «Battipaglia-Romagnano»: - In completamento: le opere di imbocco delle gallerie in scavo meccanizzato; la cantierizzazione e attività propedeutiche relative alle Restanti Opere; - In realizzazione: diaframmi per le gallerie artificiali; opere di fondazione, gallerie artificiali, centina e calotte per le gallerie in scavo meccanizzato; - Concluso il montaggio della TBM 2 per lo scavo della galleria Saginara e completata la fase di avvio dello stesso. - In fase di montaggio la TBM 1 per avvio scavo della galleria Serra Lunga; - in fase di montaggio la TBM 3 per avvio scavo della galleria Piano Grasso; - in fase di montaggio la TBM 4, per avvio dello scavo della galleria Caterina. Lotto 1b e 1c «Romagnano-Praja»: In corso l'iter autorizzativo sul PFTE; a fine maggio 2025 è stato pubblicato il provvedimento di compatibilità ambientale VIA comprensivo di autorizzazione paesaggistica. L'attività negoziale del Lotto 1B, in funzione della conclusione dell'iter autorizzativo, è prevista nel 2025 mentre l'avvio dell'attività negoziale del Lotto 1C risulta condizionata dalla completa disponibilità delle risorse finanziarie. Lotto 2: Consegnato il DOCFAP a dicembre 2024, in corso approfondimenti progettuali. Per la galleria Santomaro, il progetto di fattibilità tecnico economica con le integrazioni richieste dal CSLLPP è stato inviato al CSLLPP stesso, il quale ha emesso parere positivo ad agosto 2022. A settembre 2022 si è concluso il Dibattito Pubblico. Ultimata la Conferenza dei Servizi, sono in corso le attività negoziali.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Lotto 1 e 2: - Unitamente agli interventi previsti sulla direttrice Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto, riduzione dei tempi di percorrenza tra Roma e il Sud; recupero dei tempi di percorrenza di circa 20' minuti sull'itinerario Taranto-Napoli; - Interscambio con la linea Tirrenica in corrispondenza della stazione di Praja; - Potenziamento degli itinerari per il trasporto merci in coerenza con gli interventi in corso di realizzazione e programmati. - Miglioramento dei collegamenti di rete non AV da e verso Potenza/Taranto. Raddoppio Paola – Cosenza (Nuova Galleria Santomaro); - Miglioramento dell'accessibilità al servizio ferroviario unitamente alla realizzazione della prevista fermata di «Settimo di Rende – Montalto Uffugo» - Nuove opportunità di servizi regionali Cosenza – Paola - Potenziamento degli itinerari per il trasporto merci in coerenza con gli interventi in corso di realizzazione e programmati (potenziamento del corridoio Adriatico); - Potenziamento del collegamento tra le linee tirrenica-jonica.

Progetto I107A: AV-AC Salerno - Reggio Calabria



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

Campania
Basilicata
Calabria

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica											Obiettivi strategici									
	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
AV Salerno-Reggio Calabria: Lotto 1a Battipaglia - Romagnano e progettazione di fattibilità tecnico-economica intero itinerario					X					X	X	X			X						
AV Salerno-Reggio Calabria: Lotti 1b+1c Romagnano - Praia					X				X			X			X						
AV Salerno-Reggio Calabria: Raddoppio Galleria Santomarco					X				X			X			X						
AV Salerno-Reggio Calabria: Lotto 2 Praia-Paola					X					X		X			X						

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/ITEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatiche di breve				
								Priorità 1	Priorità 2			
17.486,68	12.116,57	di cui:	11.572,40	0,00	0,00	532,33	0,00	11,83	0,00	1.016,24	4.353,88	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE						milioni di euro
Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
17.486,69						17.486,68
Evoluzione coperture finanziarie						

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto I107A: AV-AC Salerno - Reggio Calabria

CdP-I
agg.2024

Opere
ultimate

Riclassifiche
ed errata
corrige

Riduzioni

Incrementi

Rimodulazioni

CdP-I
agg.2025

12.089,74

26,83

12.116,57

Incremento di risorse previsto da DL Infrastrutture riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi alla realizzazione del lotto 1a Battipaglia-Romagnano e da convenzione con ANAS su svincolo A2 di Eboli

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	AI 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
AV Salerno-Reggio Calabria: Lotto 1a Battipaglia - Romagnano e progettazione di fattibilità tecnico-economica intero itinerario	2.912,36	2.912,36	0,00	2.420,04	492,32	2.300,86	103,75	0,00	0,00	3,76	6,30	40,77	5,00	2.806,68
AV Salerno-Reggio Calabria: Lotti 1b+1c Romagnano - Praia	8.070,05	7.053,81	1.016,24	7.320,04	750,01	26,75	22,03	0,00	0,00	2,86	5,77	8,23	5,00	8.047,95
AV Salerno-Reggio Calabria: Raddoppio Galleria Santomarco	2.126,90	2.126,90	0,00	2.019,45	107,45	11,94	7,27	0,00	0,00	0,96	3,90	1,68	5,00	2.118,98
AV Salerno-Reggio Calabria: Lotto 2 Praia-Paola	4.377,38	23,50	4.353,88	4.218,87	158,50	7,79	2,75	0,00	0,00	2,59	0,00	0,05	5,00	4.374,61
	17.486,68	12.116,57	5.370,12	15.978,40	1.508,28	2.347,35	135,79	0,00	0,00	10,17	15,97	50,74	61,59	17.348,22

CRONOPROGRAMMA														
CUP			Stato attuativo				Iter procedurale							
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
AV Salerno-Reggio Calabria: Lotto 1a Battipaglia - Romagnano e progettazione di fattibilità tecnico-economica intero itinerario	J71J20000110008	Realizzazione	1-2021	9-2025	6-2024	3-2025	-	-	-	-	6-2023	12-2026	12-2026	
AV Salerno-Reggio Calabria: Lotti 1b+1c Romagnano - Praia	J71J20000110008	Iter autorizzativo	6-2021	5-2025	-	2-2024	-	-	6-2025	3-2026	3-2026	2-2033	12-2034	
AV Salerno-Reggio Calabria: Raddoppio Galleria Santomarco	J71J20000110008	Attività negoziali	6-2021	12-2024	-	12-2024	-	-	12-2024	8-2025	8-2025	12-2032	12-2032	
AV Salerno-Reggio Calabria: Lotto 2 Praia-Paola	J71J20000110008	Valutazione di fattibilità alternative progettuali	6-2021	4-2027	-	4-2027	-	-	5-2027	2-2028	2-2028	1-2038	8-2038	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede la realizzazione della nuova linea AV Salerno – Reggio Calabria che garantirà la continuità di un itinerario strategico per la connessione tra il sud e il nord. La nuova direttrice consentirà d'incrementare i livelli d'accessibilità alla rete AV e creare le condizioni per nuove opportunità commerciali (passeggeri e merci) per zone a elevata valenza territoriale come il Cilento, la costa Jonica, l'alto e il basso Cosentino, l'area del Porto di Gioia Tauro e il Reggino, nonché offrire una velocizzazione dei collegamenti per la Sicilia attraverso l'interconnessione a Villa S. Giovanni. L'itinerario complessivamente avrà uno sviluppo compreso tra i 450 km e i 520 km (a seconda delle configurazioni infrastrutturali) suddiviso in lotti funzionali, realizzabili per fasi in funzione dei finanziamenti disponibili. Inoltre, lungo l'intero itinerario è ipotizzata la realizzazione di alcune nuove fermate AV. Tali fermate, così come eventuali interconnessioni, saranno oggetto di approfondimenti successivi, dati dal confronto con gli Enti interessati, in coerenza con le esigenze ferroviarie. È previsto lo sviluppo del PFTE dei lotti non prioritari relativi al completamento dell'itinerario SA-RC.

Lotto 0 Salerno - Battipaglia: Nell'ambito dello sviluppo del progetto Salerno – Reggio Calabria, la configurazione funzionale della tratta Salerno – Battipaglia è stata puntualmente rivisitata per realizzare una semplificazione complessiva dell'opera ed un'ottimizzazione del collegamento con il territorio esistente, fortemente antropizzato. Altri lotti di completamento da definire a valle della progettazione.

La Salerno-Reggio Calabria riveste un'importanza strategica a tutti i livelli. In particolare: a livello europeo fa parte del corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete TEN-T; a livello nazionale fa parte della rete SNIT di primo livello ed è necessaria per ridurre il gap infrastrutturale fra nord e sud del Paese; a livello locale rappresenta un progetto strategico per collegare le regioni interessate con la parte centro-settentrionale del paese. Le province interessate sono: Campania: - Salerno Basilicata: - Potenza - Matera Calabria: - Cosenza - Catanzaro - Vibo Valentia - Reggio Calabria. L'intervento insiste su un vastissimo territorio attraversando aree, orograficamente complesse, con prevalenza di promontori collinari-montuosi, alternati da limitate pianure o altopiani.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

In corso l'aggiornamento del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) prima della successiva condivisione al MIT.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Al completamento di tutta l'opera: - Riduzione dei tempi di percorrenza: il tempo di percorrenza Roma-Reggio Calabria sarà riducibile sino a 4 ore in relazione al modello di esercizio; - Riduzione dei tempi per il collegamento con i servizi di traghetti a Villa S. Giovanni; - Miglioramento prestazioni della linea: modulo, sagoma, peso assiale; - Miglioramento dell'accessibilità grazie alla realizzazione di interconnessioni con la rete esistente che consentiranno di creare nuovi servizi Long-Haul e di sviluppare l'attuale offerta a servizio sia dei principali centri urbani, sia delle località turistiche litoranee; - Valorizzazione dei collegamenti di bacino con aree ad alta valenza territoriale/turistica; - Sviluppo di nuove opportunità di servizio (passeggeri e merci) a beneficio anche dei collegamenti da e per la Sicilia; - Incremento del traffico merci in adduzione al porto di Gioia Tauro.



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	X
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	X
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Campania

Calabria

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto I107B: AV-AC Salerno - Reggio Calabria completamento

	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR	Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change	Adeguamento a standard tecnici	Sviluppo tecnologico	Sistemi regionali e metropolitani	Potenziamento connessioni merci	Sviluppo corridoi TEN-T	Completamento valichi alpini	Alta Velocità (AV)
Intervento / Opere funzionali																					
AV Salerno-Reggio Calabria: Lotti di completamento (Collegamento linea a monte del Vesuvio – Battipaglia e tratte Paola - Lamezia, Lamezia - Gioia Tauro, Gioia Tauro - Villa S.Giovanni / Reggio Calabria) e progettazioni pregresse					X															X	
Variante Rosarno					X															X	

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve				
								Priorità 1	Priorità 2			
12.865,00	11,74	di cui:	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.853,26		

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatIRFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE							milioni di euro
Evoluzione Costo							
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
12.865,00						12.865,00	
Evoluzione coperture finanziarie							
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
11,74						11,74	

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
AV Salerno-Reggio Calabria: Lotti di completamento (Collegamento linea a monte del Vesuvio – Battipaglia e tratte Paola - Lamezia, Lamezia - Gioia Tauro, Gioia Tauro - Villa S.Giovanni / Reggio Calabria) e progettazioni pregresse	12.865,00	11,74	12.853,26	1,91	12.863,10	11,74	11,20	11,67	0,00	0,07	0,01	0,00	5,00	12.853,26
	12.865,00	11,74	12.853,26	1,91	12.863,10	11,74	11,20	11,67	0,00	0,07	0,01	0,00	0,00	12.853,26

CRONOPROGRAMMA													
CUP	Stato attuativo	Iter procedurale											
		Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
AV Salerno-Reggio Calabria: Lotti di completamento (Collegamento linea a monte del Vesuvio – Battipaglia e tratte Paola - Lamezia, Lamezia - Gioia Tauro, Gioia Tauro - Villa S.Giovanni / Reggio Calabria) e progettazioni pregresse	Valutazione di fattibilità alternative progettuali	-	8-2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede: modifiche agli impianti tecnologici, con upgrade del sistema di distanziamento per implementazione del quinto codice sul blocco automatico a correnti codificate (BACC da 4 a 5 codici) nella tratta Campora S. Giovanni – Lamezia Terme – Rosarno); rettificazione del tracciato di alcune curve ed interventi tecnologici, finalizzati all'aumento della velocità di linea con rango P in alcune tratte della linea Salerno-Reggio C. (tratta Campora – Rosarno); l'istituzione del rango C su alcune tratte della linea Jonica (tratte Sibari- Crotone – Catanzaro L. e Catanzaro L. – Lamezia T. C.le).

L'intervento si sviluppa sulla linea nelle tratte Campora – Lamezia - Rosarno e Lamezia-Catanzaro-Sibari, ed è suddiviso in interventi tecnologici e modifiche di tracciato, finalizzato al miglioramento delle prestazioni delle linee.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Completati interventi tecnologici propedeutici all'istituzione del Rango C sulla tratta Sibari – Crotone – Catanzaro L. e Catanzaro L. – Lamezia T. C.le; Completato l'upgrading del BACC Tratta Campora S. Giovanni – Lamezia T. – Rosarno, attivato a settembre 2023. Rettifica di alcune curve nella tratta Campora – Rosarno: progettazione definitiva sospesa, in corso opportuni approfondimenti sui benefici

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Unitamente agli altri interventi tecnologici in corso sulla direttrice Salerno-Reggio Calabria, l'intervento consentirà di migliorare le prestazioni della linea e la regolarità della circolazione.



Capacità	
Velocità	X
Accessibilità	
Regolarità	X
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Calabria

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica											Obiettivi strategici									
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Upgrading tecnologico e prestazionale Tirrenica sud 1 ^a fase e linee afferenti																					X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
80,00	44,90	di cui:	4,90	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	30,60

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P073: Upgrading tecnologico e prestazionale Tirrenica sud 1^ fase

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
80,00						80,00

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
44,90						44,90

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Upgrading tecnologico e prestazionale Tirrenica sud 1^ fase e linee afferenti	80,00	44,90	35,10	38,11	41,89	33,77	32,26	30,54	1,77	0,33	-0,15	0,05	5,44	47,18
	80,00	44,90	35,10	38,11	41,89	33,77	32,26	30,54	1,77	0,33	-0,15	0,05	0,27	47,18

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Asse Salerno - Reggio Calabria - velocizzazione delle principali linee (upgrading) interventi accessori	J94F12000010001	70,00	34,90	50%	22,90	66%	Realizzazione
Asse Salerno - Reggio Calabria - velocizzazione delle principali linee (upgrading)	J94F12000000001	10,00	10,00	100%	9,92	99%	In ultimazione
Upgrading tecnologico e prestazionale Tirrenica sud 1^ fase e linee affidenti		80,00	44,90	56%	32,82	73%	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento, articolato per fasi funzionali, consiste nell'upgrade dei sistemi di segnalamento con tecnologie innovative tra Campora e Rosarno (84 km circa), in sinergia con altro progetto di investimento, e tra Maratea e Scalea (23 km circa). Contestualmente sono previsti interventi diffusi sul piano del ferro in diverse tratte della linea, nonché il mantenimento/adeguamento degli standard qualitativi della linea aerea lungo l'intera tratta, finalizzati a garantire la velocità massima di 200 km/h nelle tratte interessate. Fase 1° - Upgrading sistemi segnalamento Campora – Nocera; Nocera – Falerna e Mileto – Rosarno (binario dispari); attività di rinnovo armamento in tratti saltuari e modifiche plano-altimetriche del binario; verifica delle opere d'arte e della sede. Fase 2° - Upgrading sistemi segnalamento : Maratea – Scalea ; Lamezia – San Pietro a Maida; San Pietro a Maida – Eccellente; Vibo Pizzo – Mileto; Mileto – Rosarno (binario pari); verifica delle opere d'arte e della sede; attività di rinnovo armamento in tratti saltuari e modifiche plano-altimetriche del binario. Verifiche alla sede necessarie per la certificazione della linea a 200 km/h.

Fase 1° - Upgrading sistemi segnalamento Campora – Nocera; Nocera – Falerna e Mileto – Rosarno (binario dispari); attività di rinnovo armamento in tratti saltuari e modifiche plano-altimetriche del binario; verifica delle opere d'arte e della sede. Fase 2° - Upgrading sistemi segnalamento : Maratea – Scalea ; Lamezia – San Pietro a Maida; San Pietro a Maida – Eccellente; Vibo Pizzo – Mileto; Mileto – Rosarno (binario pari); verifica delle opere d'arte e della sede; attività di rinnovo armamento in tratti saltuari e modifiche plano-altimetriche del binario. Verifiche alla sede necessarie per la certificazione della linea a 200 km/h.

Campania/Calabria

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Fase 1° - Interventi tecnologici completati e attivati; attività di armamento ultimate e verifiche opere d'arte concluse. L'attivazione è stata effettuata per fasi dal 2019 al 2023 (riferito alla Fase 1° di cui sopra, senza 5° codice e conseguente aumento di velocità). Fase 2° - Interventi tecnologici in corso; attività di rinnovo armamento in tratti saltuari e modifiche plano – altimetriche concluse a meno di attività accessorie e di completamento; verifica opere d'arte concluse nella tratta Campora – Rosarno a seguito delle quali è emersa la necessità ulteriori interventi alla sede necessari alla certificazione della linea a 200 km/h, per i quali occorrono ulteriori finanziamenti. In corso attività relativa al Sistema Controllo Marcia Treni sulla linea Battipaglia – Reggio Calabria

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Per i treni del Servizio Universale, incremento di puntualità per i treni che percorrono la relazione Catanzaro Lido – Sibari. L'intervento crea le condizioni per una maggiore regolarità ed una riduzione dei tempi di percorrenza sulla relazione Salerno – Reggio Calabria.

Velocizzazione linea Battipaglia – Reggio Calabria Centrale Rango P
Binario PARI Binario DISPARI



	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Calabria

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma P140: Upgrading tecnologico e prestazionale Tirrenica sud 2^ fase

	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR		Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																						
Upgrading tecnologico e prestazionale Tirrenica sud 2^ fase					X	X								X								

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2			
100,00	100,00	di cui:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE												milioni di euro		
Evoluzione Costo														
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze						CdP-I agg.2025			
100,00											100,00			
Evoluzione coperture finanziarie														
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni						CdP-I agg.2025			
100,00											100,00			

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Upgrading tecnologico e prestazionale Tirrenica sud 2^ fase	100,00	100,00	0,00	97,41	2,59	92,97	85,38	77,92	4,46	-1,56	0,87	1,50	11,85	14,55
	100,00	100,00	0,00	97,41	2,59	92,97	85,38	77,92	4,46	-1,56	0,87	1,50	2,25	14,55

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Interventi di Ammodernamento e Potenziamento della rete ferroviaria della Calabria	J54H16000780001	100,00	100,00	100%	85,82	86%	Realizzazione
Upgrading tecnologico e prestazionale Tirrenica sud 2^ fase		100,00	100,00	100%	85,82	86%	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento prevede la realizzazione delle opere ferroviarie di accesso al realizzando ponte sullo stretto di Messina sponda calabra e sponda siciliana. I collegamenti sulle due sponde sono necessari a garantire la funzionalità del Ponte sullo Stretto e oltre a ridurre i tempi di percorrenza verso l'isola siciliana, consentiranno di realizzare il servizio all'area conurbata dello Stretto. In particolare:- sulla sponda calabra si prevede di realizzare una variante alla LS per circa 2,2 km tutta all'aperto per realizzare il collegamento verso Villa S. Giovanni (Nord) e Reggio Calabria (Sud) dei binari in uscita dal Ponte. Tale collegamento avverrà con la realizzazione di due coppie di nuovi binari, che sfoccheranno a partire dal limite di intervento delle opere di competenza della Stretto di Messina SpA; il collegamento verso sud avrà uno sviluppo complessivo di circa 1,6 km, di cui 650 m in galleria naturale, il collegamento verso nord avrà uno sviluppo complessivo di circa 6,7 km, di cui 3 km in galleria naturale.- sulla sponda siciliana, per consentire la connessione ferroviaria fra il Ponte sullo Stretto di Messina e la rete esistente, si realizzerà un nuovo assetto del nodo di Messina, con la dismissione dell'attuale stazione di testa di Messina Centrale, la realizzazione di una nuova stazione passante in zona "Gazzi" e la dismissione dell'impianto di manutenzione e riduzione del fascio merci di Contesse. In questo modo verranno realizzati i nuovi collegamenti diretti da/verso la Penisola da/verso Catania e Palermo. In totale verranno progettati circa 8 km di nuove coppie di binari prevalentemente all'aperto; le opere d'arte principali presenti in progetto sono alcuni viadotti, per un totale di circa 80m, e la galleria artificiale verso la linea Palermo – Messina di circa 135m.

Sicilia/Calabria

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Completato l'aggiornamento della progettazione preliminare. Di prossimo invio il progetto al CSLLPP.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

-miglioramento accessibilità e coesione- completamento rete TEN-T, in particolare corridoio multimodale Scandinavo-Mediterraneo- riduzione dei tempi di percorrenza- riduzione della CO2 e degli altri gas climalteranti rispetto alle attuali modalità di attraversamento.



	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	X
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Calabria

Sicilia

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Opere di collegamento al Ponte sullo stretto di Messina - sponda calabra e siciliana									X		X		X	X	X	X					X

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P270: Opere di collegamento al Ponte sullo stretto di Messina - sponda calabra e siciliana

Opere di collegamento al Ponte sullo stretto di Messina - sponda calabra

Opere di collegamento al Ponte sullo stretto di Messina - sponda sicialiana

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamente
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
1.766,00	40,00	di cui:	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatiRFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.li tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
1.100,00			666,00			1.766,00
						Variazione del costo ad esito della Progettazione.

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
10,00					30,00	40,00
						Copertura necessaria per avvio progettazione definitiva

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Opere di collegamento al Ponte sullo stretto di Messina - sponda calabra	1.058,00	23,97	1.034,03	1.000,00	58,00	2,39	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.056,46
Opere di collegamento al Ponte sullo stretto di Messina - sponda sicialiana	708,00	16,03	691,97	685,27	22,73	0,88	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	708,00
	1.766,00	40,00	1.726,00	1.685,27	80,73	3,27	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	1.764,46

CRONOPROGRAMMA														
CUP		Stato attuativo	Iter procedurale											
			Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
			Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Opere di collegamento al Ponte sullo stretto di Messina - sponda calabra e siciliana		Progettazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opere di collegamento al Ponte sullo stretto di Messina - sponda calabra	J51G24000010001	Progettazione	2-2024	6-2025	3-2025	5-2026	-	-	-	-	-	-	-	5-2033
Opere di collegamento al Ponte sullo stretto di Messina - sponda sicialiana	J61G24000030001	Progettazione	2-2024	7-2025	7-2025	7-2026	-	-	-	-	-	-	-	5-2033

Tabella A09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede nella fase prioritaria la realizzazione della variante di tracciato nei pressi della località di Bauladu (in un perimetro iniziale, includeva anche la variante di Bonorva, poi stralciata a seguito del giudizio negativo di compatibilità ambientale da parte del MITE), nell'ambito delle 8 varianti individuate dallo studio di fattibilità approvato dal CIPE nel 2004. La variante di tracciato di Bauladu si innesterà al km 107+558 della linea Cagliari – Golfo Aranci lato sud e al km 117+491 lato nord ed ha una lunghezza di ca. 8,5 km, di cui ca. 3,8 in galleria. Con l'attivazione del nuovo tratto si procederà alla dismissione del tratto interessato dalla variante e della stazione di Bauladu (la quale già attualmente non effettua servizio viaggiatori). La velocità di rango C dell'attuale tracciato è di 85 km/h, mentre quella del nuovo tratto sarà di 155 km/h.

Gli interventi consistono sostanzialmente nella realizzazione delle seguenti varianti di tracciato: 1 "Bauladu" di estesa pari a circa 6,5 km 4 "Bonorva-Terralba" di estesa pari a circa 5,9 km

L'intervento di Bauladu prevede una variante di tracciato di circa 7 km a singolo binario non elettrificato, predisposto per elettrificazione, con adeguamento e riconfigurazione dell'attrezzaggio tecnologico esistente, con conseguente eliminazione dei passaggi a livello con la dismissione della tratta della linea esistente. L'intervento di Bonorva-Terralba prevede una variante di tracciato di circa 5,6 km a singolo binario non elettrificato, predisposto per elettrificazione, con adeguamento e riconfigurazione dell'attrezzaggio tecnologico esistente, con conseguente eliminazione dei passaggi a livello con la dismissione della tratta della linea esistente.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

L'appalto Multidisciplinare è stato suddiviso in Fase A e Fase B. Per la Fase A inerente le opere propedeutiche per la realizzazione dell'imbocco della galleria Bauladu, in corso i lavori. In corso la progettazione esecutiva della Fase B inerente la realizzazione della galleria. Interventi tecnologici: in corso il PFTE. Viabilità di accesso al piazzale della finestra della galleria Bauladu: in corso i lavori.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

• Riduzione dei tempi di viaggio (lungo la direttrice Nord-Sud) • Miglioramento della regolarità della circolazione

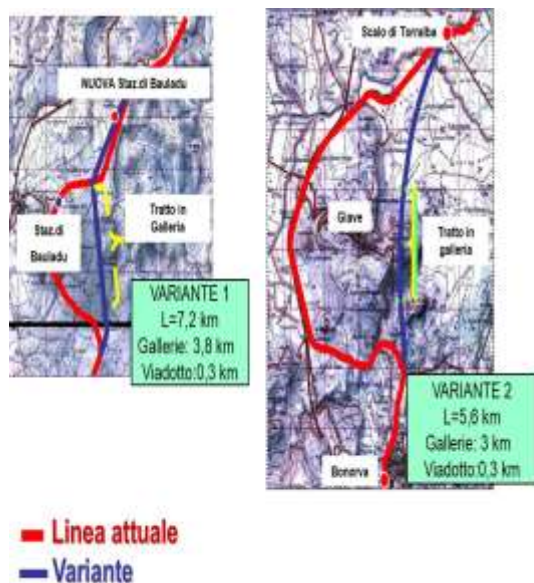

Capacità	
Velocità	X
Accessibilità	
Regolarità	X
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Sardegna

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici		
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini
Varianti Bauladu													

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0313A: Velocizzazione S. Gavino-Sassari-Olbia fasi prioritarie

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
152,70	140,20		16,20	0,00	70,80	0,00	0,00	53,20	12,50	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
126,20			26,50			152,70
Variazione del costo per incremento del valore delle opere ad esito della Progettazione Esecutiva.						

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
126,20				14,00		140,20
Copertura appalto in corso per maggiori costi emersi ad esito della PE						

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Variante Bauladu	152,70	140,20	12,50	125,37	27,33	101,32	6,46	4,25	0,02	0,04	0,01	3,26	5,28	144,60
	152,70	140,20	12,50	125,37	27,33	101,32	6,46	4,25	0,02	0,04	0,01	3,26	0,53	144,60

CRONOPROGRAMMA														
CUP					Stato attuativo									
					Iter procedurale									
					Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione	
					Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
Variante Bauladu					J24F05000010001	Realizzazione	11-2005	3-2007	10-2017	5-2025	1-2026	7-2026	3-2023	1-2026 7-2023 6-2027 3-2027

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede la realizzazione di quattro varianti: Varianti Macomer I e Macomer II, che si sviluppano per un'estesa complessiva pari a circa 16,5 km. Variante Campomela -Sassari, si sviluppa per un'estesa pari a circa 9,9 km; Variante Bonorva-Torralba.

Varianti di tracciato di diverse estensioni a singolo binario non elettrificato, predisposto per elettrificazione, con adeguamento e riconfigurazione dell'attrezzaggio tecnologico esistente, con conseguente eliminazione dei passaggi a livello con la dismissione delle rispettive tratte interessate dalle varianti di tracciato.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Nel 2004 il CIPE ha approvato lo studio di fattibilità, consentendo d'individuare otto varianti di tracciato per la linea San Gavino - Sassari/Olbia. RFI ha sviluppato il PP delle otto varianti individuate: Bauladu, Abbasanta, Macomer I, Macomer II, Bonorva – Torralba, Ardara Ploaghe, Campomela – Sassari e Monti – Olbia. A seguito dell'approvazione dello SdF è stato sviluppato il Progetto Preliminare delle otto varianti. Tuttavia in considerazione del notevole impatto finanziario che avrebbe avuto la realizzazione degli interventi, il progetto è stato sottoposto ad un processo di Value Engineering combinato ad una ottimizzazione tecnico – economica che ha portato alla ripermimetrazione del progetto stesso, individuando le 5 sottoelencate varianti, ritenute prioritarie ai fini della velocizzazione della linea con riduzione dell'itinerario Cagliari-Sassari di circa 15 km e un recupero di tempi di percorrenza di circa 18 minuti: Variante Bauladu (oggetto degli interventi della fase prioritaria); Variante Macomer I; Variante Macomer II; Variante Bonorva – Torralba; Variante Campomela – Sassari. Le attività per le varianti Macomer I, Macomer II, Bonorva – Torralba e Variante Campomela – Sassari, sono al momento sospese per mancanza di finanziamento.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Riduzione dei tempi di viaggio, permettendo un cadenzamento giornaliero per la lunga percorrenza Cagliari–Olbia, Cagliari–Sassari e Olbia–Sassari.



Capacità	
Velocità	X
Accessibilità	
Regolarità	X
Prestazioni (merci)	
Gestione dei rotabili	
Gestione spazi di stazione	
Intermodalità merci	
Intermodalità passeggeri	
Integrazione della rete	
Upgrade e sicurezza	
Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Sardegna

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici										
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Varianti Bonorva-Torralba, Macomer I, Macomer II e Campomela-Sassari					X						X		X			X					

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 0313B: Velocizzazione S. Gavino-Sassari-Olbia completamento

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatorie di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
666,80	3,20		0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,60

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
666,80						666,80

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
3,20						3,20

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Varianti Bonorva-Torralba, Macomer I, Macomer II e Campomela-Sassari	666,80	3,20	663,60	554,59	112,21	2,66	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	665,00
	666,80	3,20	663,60	554,59	112,21	2,66	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00

CRONOPROGRAMMA														
CUP	Stato attuativo				Iter procedurale									
	Progettazione	Prog.Prel.		Progettazione	Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
		Inizio	Fine		Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
Varianti Bonorva-Torralba, Macomer I, Macomer II e Campomela-Sassari	J24F05000010001	-	-	10-2017	5-2037	-	-	-	5-2030	6-2034	3-2031	7-2037	8-2037	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi sono finalizzati alla riduzione dei tempi di percorrenza sulle tratte ferroviarie a nord di Oristano e al miglioramento degli standard di sicurezza nei casi di soppressione dei PL e Dissesto Idrogeologico. I progetti sono: soppressione di alcuni passaggi a livello a nord di Oristano, interventi di velocizzazione degli itinerari e sottopassaggi nelle stazioni di Solarussa e Paulilatino, istituzione Rango "C" nella intera tratta Cagliari – Sassari – Olbia, rettifiche di tracciato tra Bauladu e Abbasanta e l'adeguamento degli attraversamenti e/o parallelismi della linea ferroviaria Chilivani - Porto Torres, tra il km 40+000 e il km 45+000 ca.

Intervento 1. – Soppressioni di PL (con opere sostitutive CVF o sottovia) PL km 227 e km 233 tratta Chilivani-Olbia, PL km 100+008 (Simaxis) tratta Oristano-Chilivani, PL. km 9+703 (Ardara), Km 45+718 Km 40+149 e Km 40+355 (Sassari) tratta Chilivani – Sassari. Intervento 2. – Istituzione rango C e velocizzazione L'intervento consiste nella realizzazione del rango C sulle tratte Oristano-Sassari-Olbia, velocizzazione attraverso correzioni di curve tratta Bauladu-Abbasanta, velocizzazione degli itinerari (60km/h) e sottopassaggi nelle stazioni di Solarussa e Paulilatino. Intervento 3 – Dissesto Idrogeologico Linea Chilivani - Porto Torres: Opere per la difesa della sede ferroviaria dei fenomeni di dissesto idrogeologico - Mitigazione del rischio da esondazione rio Calamasciu.

Sardegna

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Intervento 1 - Sono stati stralciati per motivi tecnici gli interventi PL km 9+703, km45+718, km 40+149, km 40+355. Sono conclusi gli interventi di soppressione PL km 227 e 233. Da completare l'intervento di soppressione del PL al km 100+008 (Simaxis), interrotto a causa di un contenzioso con la Ditta appaltatrice; l'intervento è stato riappaltato a dicembre 2019 e, per la necessità di aggiornare il progetto alle nuove normative, oltre ai maggiori costi rispetto al pianificato, si prevede la sua conclusione nel 2025. L'intervento 2 - La realizzazione del rango C sulle tratte Oristano-Sassari-Olbia, è stato attivato. L'intervento 3 - su dissesto idrogeologico è stato stralciato di concerto con la Regione Sardegna, in quanto sono rimaste irrisolte le problematiche autorizzative relative alla approvazione dello Studio di Compatibilità Idraulica.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Riduzione dei tempi di viaggio, permettendo un cadenzamento giornaliero per la lunga percorrenza Cagliari – Olbia, Cagliari – Sassari e Olbia – Sassari, miglioramento della sicurezza e regolarità dell'esercizio per soppressioni PL.



	Capacità
	Velocità
	Accessibilità
	Regolarità
	Prestazioni (merci)
	Gestione dei rotabili
	Gestione spazi di stazione
	Intermodalità merci
	Intermodalità passeggeri
	Integrazione della rete
	Upgrade e sicurezza
	Efficientamento processi

X

LOCALIZZAZIONE

Sardegna

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica										Obiettivi strategici				
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci
Soppressione passaggi a livello a nord di Oristano,															

X

X

X

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 1524: Interventi di ammodernamento e velocizzazione della tratta ferroviaria Oristano-Sassari-Olbia

istituzione Rango C linee Cagliari-Sassari/Olbia e rettifiche di
tracciato tra Bauladu e Abbasanta

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON- FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatorie di breve			
								Priorità 1	Priorità 2		
19,63	19,63	di cui:	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE							milioni di euro
Evoluzione Costo							
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
19,63						19,63	
Evoluzione coperture finanziarie							
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
19,63						19,63	

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Soppressione passaggi a livello a nord di Oristano, istituzione Rango C linee Cagliari-Sassari/Olbia e rettifiche di tracciato tra Bauladu e Abbasanta	19,63	19,63	0,00	15,76	3,87	19,38	19,01	15,78	-0,01	0,33	1,77	1,09	5,11	0,61
	19,63	19,63	0,00	15,76	3,87	19,38	19,01	15,78	-0,01	0,33	1,77	1,09	0,05	0,61

CRONOPROGRAMMA															

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi consistono in ammodernamenti tecnologici e velocizzazioni della rete sarda RFI, attraverso l'upgrade degli impianti di sicurezza del sottosistema di terra SSC con SCMT, sulle tratte Oristano – Chilivani - Olbia - G. Aranci, Chilivani – Sassari – P. Torres e San Gavino – Oristano; velocizzazione delle tratte a nord di Oristano con l'introduzione del rango P. I finanziamenti per l'SCMT e il rango P (circa 20 M€) sono regolati da un'unica convenzione con la Regione Sardegna. (Conv. Rep. N.22 del 12 nov. 2018) Realizzazione di una nuova stazione nella città di Olbia attraverso l'arretramento della stazione attuale. I finanziamenti per la nuova stazione di Olbia sono in parte erogati dalla regione Sardegna (13 M€, NPP 1670) in parte RFI (7 M€, NPP 0568 e 1 M€ 1898).

Intervento 1. – SCMT. Consiste nella realizzazione del SST-SCMT su tutte le tratte a nord di Oristano e sulla tratta S. Gavino-Oristano. L'intervento è anche condizione necessaria per l'istituzione del rango P. Intervento 2 – Rango P. Consiste nella istituzione del rango P sulle tratte a nord di Oristano delle rete sarda RFI. Il rango P serve per consentire ai treni CAF (ATR 365 e ATR 465), o eventuali altri treni ad assetto variabile, di sfruttare al meglio le potenzialità di velocità con il sistema di pendolamento attivo. Intervento 3 - Nuova stazione di Olbia. La nuova stazione di Olbia, ubicata in corrispondenza del vecchio scalo merci della attuale stazione, consiste di un nuovo FV con due binari tronchi per i servizi attestati da Ozieri/Chilivani e da un binario passante per il collegamento con Golfo Aranci.

Sardegna

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Intervento 1. SCMT. La realizzazione di SCMT si è conclusa il 26/09/2021 su tutte le tratte finanziate dalla Convenzione con la Regione Sardegna, in particolare tutte le tratte della rete sarda a nord di Oristano, compresa la tratta a sud Oristano San Gavino (e) – Pabillonis-Uras-Marrubiu- Sant'Anna-Oristano (e). Intervento 2 – Rango P. Sono state attivate al rango P le tratte: Oristano-Chilivani nel 2019 e la tratta Chilivani Porto-Torres nel 2022 e la tratta Chilivani-G. Aranci nel 2023. Intervento 3 – Nuova stazione di Olbia. E' stata attivata il 26/09/2021.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

•Il rango P consente la riduzione dei tempi di viaggio con i treni ad assetto variabile. •L'SCMT porta miglioramenti sulla sicurezza e regolarità.

•La Nuova stazione di Olbia porta miglioramenti sulla circolazione ferroviaria con il modello di esercizio delle relazioni da/per Ozieri-Chilivani e Golfo Aranci, miglioramenti degli standard qualitativi nel rispetto delle STI della ricettività dei passeggeri e miglioramenti della viabilità stradale della città di Olbia.



	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Sardegna

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto 1670: Upgrading infrastrutturale e tecnologico rete sarda 1^ fase

	Coesione sociale e territoriale	Accessibilità e qualità stazioni	Resilienza al climate change	Adeguamento a standard tecnici	Sviluppo tecnologico	Sistemi regionali e metropolitani	Potenziamento connessioni merci	Sviluppo corridoi TEN-T	Completamento valichi alpini	Alta Velocità (AV)		Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T	AQ per l'utilizzo della capacità	Fondo Sviluppo e Coesione	Accordi EE.LL.	Accordi Internazionali	Interventi commissariati	PNRR
Intervento / Opere funzionali																						
SCMT e istituzione rango P tratte a nord di Oristano e linee Decimomannu-Iglesias/Villamassargia; Opere connesse all'arretramento della stazione di Olbia																		X				

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento	
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2			
32,97	32,97	di cui:	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	32,91	0,00	0,00	0,00	

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE											milioni di euro
Evoluzione Costo											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze						CdP-I agg.2025
32,97											32,97
Evoluzione coperture finanziarie											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni						CdP-I agg.2025
32,97											32,97

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione							
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	AI 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre	
SCMT e istituzione rango P tratte a nord di Oristano e linee Decimomannu-Iglesias/Villamassargia; Opere connesse all'arretramento della stazione di Olbia	32,97	32,97	0,00	31,31	1,67	32,44	29,46	16,42	5,13	3,95	3,81	1,60	10,47	1,35	
	32,97	32,97	0,00	31,31	1,67	32,44	29,46	16,42	5,13	3,95	3,81	1,60	0,72	1,35	

CRONOPROGRAMMA															
				Stato attuativo				Iter procedurale							
				CUP				Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.	
								Prog.Prel.	Prog.Def.	Prog.Esec.	Attiv.Negoz.	Esecuzione	Funzionalità		
								Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
SCMT e istituzione rango P tratte a nord di Oristano e linee Decimomannu-Iglesias/Villamassargia; Opere connesse all'arretramento della stazione di Olbia	J79B12000030001	Esercizio	-	-	-	-	-	9-2015	-	-	-	9-2015	6-2021	7-2019	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto prevede: -velocizzazioni sulle tratte tortuose a nord di Oristano, attraverso modifiche del tracciato e piccole varianti;-potenziamenti tecnologici sulla tratta Cagliari – Oristano: ACCM Cagliari-S. Gavino con SCMT da cabina +BACC con emulazione di codice e integrazione della codifica di stazione ove mancante + RTB.-Interventi per la soppressione del PL pubblici e privati.

Intervento 1 –Velocizzazione Oristano-Chilivani-Sassari/Olbia - Costo 31 M€ E' costituito da interventi sul binario quali piccoli spostamenti e/o modifiche dei raggi di curva e/o sopraelevazione e anche da piccole varianti che consentono la velocizzazione della linea. Connessi con tali modifiche vi sono interventi alla sede ferroviaria (rinnovi, corpo stradale, trincee, rilevati e scarpate).Intervento 2 – Potenziamento tecnologico Cagliari-Oristano – Costo 50 M€ L'intervento consiste in potenziamenti tecnologici della tratta Cagliari – Oristano, quali: ACCM Cagliari-Decimomannu-S.Gavino, con SCMT da cabina+BACC con emulazione di codice e integrazione della codifica di stazione ove mancante + RTB, realizzazione del nuovo Posto Centrale di Cagliari. Intervento 3 - Interventi diffusi di soppressioni passaggi a livello pubblici e privati – Costo 20 M€Consiste in una serie di interventi di soppressione di passaggi a livello pubblici e privati, derivanti da accordi con i Comuni e/o proprietari nel caso di PL privati; alcuni soppressi con opere sostitutive (CVF, sottovia) strade alternative, sistemi tecnologici per la gestione di alcuni PLP.

Sardegna

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Intervento 1 - L'intervento è in corso di esecuzione. L'attivazione è avvenuta a dicembre 2024 dell'intervento V1 ed è prevista nel 2025 per quanto concerne l'intervento V9.Intervento 2 - L'intervento è in corso di esecuzione. L'attivazione del Nuovo Posto Centrale di Cagliari è avvenuta nel corso del 2021; l'attivazione dell'ACCM Cagliari – Decimomannu e interventi connessi, SCMT, BACC, RTB, nuovo Posto Centrale è avvenuto ad aprile 2022. L'ACCM Decimomannu – S. Gavino è stato attivato in data 10/12/2023 come da CT 06/2023. il SCMT Decimomannu – Villamassargia è stato attivato in data 23/12/2024. In corso la realizzazione dell'Upgrade ACC-M.Intervento 3 - L'intervento è in corso di esecuzione con previsione di conclusione nel 2026 con i sottopassaggi di Oristano per la soppressione dei PL via Laconi al km 93+065 e via Ozieri km 93+539, e Sassari (km 49+758). In data 23/12/2024 è stata sottoscritta la convenzione tra RFI e la Regione Autonoma Sardegna con la quale viene concordata con l'Amministrazione regionale l'erogazione del finanziamento di ulteriori 6,2M€.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Riduzione dei tempi di viaggio, permettendo un cadenzamento giornaliero per la lunga percorrenza Cagliari – Olbia, Cagliari – Sassari e Olbia – Sassari. Maggiore Regolarità e Sicurezza della circolazione, dovuti sia agli interventi di miglioramento tecnologico, sia alla soppressione dei PL pubblici e privati.



	Capacità	
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Sardegna

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P083: Upgrading infrastrutturale e tecnologico rete sarda 2^ fase

	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF		Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																						
Rete sarda: Potenziamento e interventi diffusi per la messa in sicurezza	X																X					
Rete sarda: Upgrade tecnologico tratte a sud di Oristano	X																X					

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
110,05	110,05	di cui: 100,00	3,85	0,00	0,00	0,00	6,20		0,00	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE											milioni di euro
Evoluzione Costo											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025					
101,33			6,20	2,53		110,05	Variazione delle stime di costo dovuta alla soppressione dei passaggi a livello di Oristano al km 93+065 e km 93+539 e di Sassari al km 49+758 nonché ad adeguamenti tariffari.				
Evoluzione coperture finanziarie											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025					
101,33				8,73		110,05	Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche) e per impegni con EELL				

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Rete sarda: Potenziamento e interventi diffusi per la messa in sicurezza	60,02	60,02	0,00	49,71	10,31	52,25	39,85	10,47	1,87	5,04	6,18	6,55	8,80	21,30
Rete sarda: Upgrade tecnologico tratte a sud di Oristano	50,03	50,03	0,00	48,22	1,81	48,35	46,53	10,75	2,54	9,28	9,97	9,97	5,22	4,18
	110,05	110,05	0,00	97,93	12,13	100,60	86,38	21,22	4,40	14,32	16,15	16,52	11,96	25,48

CRONOPROGRAMMA														
CUP	Stato attuativo					Iter procedurale								
	Realizzazione	-	-	-	-	Prog.Prel.			Prog.Def.			Prog.Esec.		
						Inizio	Fine	-	Inizio	Fine	-	Inizio	Fine	-
Rete sarda: Potenziamento e interventi diffusi per la messa in sicurezza	J74H16000590001	Realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11-2016	12-2016	2-2027
Rete sarda: Upgrade tecnologico tratte a sud di Oristano	J77B16000290001	Realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-2019	11-2020	12-2024

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

L'intervento di Elettrificazione della tratta Cagliari – Oristano, rappresenta il primo intervento di elettrificazione della rete sarda RFI; si pone come obiettivo principe la sostenibilità in relazione ad un minore impatto ambientale con un beneficio sociale in termine di riduzione dei costi esterni del sistema di trasporto ferroviario. La tecnologia adottata prevede l'elettrificazione con tensione di 3 kV in corrente continua e alimentazione attraverso 6 sottostazioni. L'intervento è stato finanziato con un importo complessivo di 95,8 M€ che trova copertura, in parte con fondi del Patto Sardegna PSC - FSC 2014-2020 per 46,8 M€ e per i restanti 49 M€ con risorse statali CdP-I MIMS sul Contratto di Programma RFI.

Si articola nelle seguenti fasi: 1° fase funzionale Cagliari – Serramanna NPP 3530 S01 La 1a fase è coperta dal finanziamento RFI di 49 M€ di cui alla Delibera dell'AD RFI del 29/12/2022. 2° fase funzionale Serramanna – Oristano La 2a fase sarà coperta dal finanziamento di 46,8 M€ dei fondi del Patto Sardegna PSC - FSC 2014-2020, in attesa di Delibera a seguito della stipula delle Convenzione RFI-RAS.

Sardegna

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

E' stato redatto il Progetto Definitivo con incarico alla Società ITALFERR e sono state consegnate le prestazioni di Progettazione Esecutiva dell'appalto integrato PE + realizzazione. Sono state intraprese le azioni amministrative con le società elettriche per la definizione degli accordi per le forniture di energia alle sottostazioni. E' stata conclusa la gara dalla Direzione Acquisti di RFI con l'aggiudicazione definitiva avvenuta nel mese di giugno 2023 rispettando l'OGV. E' stata stipulata la Convenzione tra RFI e la Regione Sardegna Rep. N. 9 del 14/03/2023 che regola l'erogazione del finanziamento a valere sui fondi del Patto Sardegna PSC - FSC 2014-2020 per 46,8 M€. L'avvio dei lavori è avvenuto ad aprile 2024 con conclusione e attivazione previste nel 2026.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Sostenibilità ambientale con forte riduzione delle emissioni carboniche dovuta alla tipologia di veicoli ferroviari con progressivo abbandono della trazione Diesel. Vantaggi derivanti dall'impiego dei treni elettrici che consentono maggiori prestazioni in termini di capacità di trazione, velocità e rendimenti energetici, oltre alla maggiore offerta del mercato sulle tipologie di treni elettrici rispetto ai Diesel, in particolare, anche di treni ad assetto variabile già omologati su rete RFI. Utilizzo in modalità elettrica dei nuovi treni ibridi «Blues» della società Trenitalia già in esercizio sulla rete sarda RFI.



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Sardegna

INQUADRAMENTO STRATEGICO**Priorità programmatica**

Allegato MIMS al DEF
Tavoli tecnici di ascolto
Altri Provvedimenti*
Cofinanziamenti UE
UE - workplan corridoi TEN-T
AQ per l'utilizzo della capacità
Fondo Sviluppo e Coesione
Accordi EE.II.
Accordi Internazionali
Interventi commissariati
PNRR

Obiettivi strategici

Coesione sociale e territoriale
Accessibilità e qualità stazioni
Resilienza ai climate change
Adeguamento a standard tecnici
Sviluppo tecnologico
Sistemi regionali e metropolitani
Potenziamento connessioni merci
Sviluppo corridoi TEN-T
Completamento valichi alpini
Alta Velocità (AV)

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto P254A: Elettrificazione Cagliari-Oristano

Elettrificazione Cagliari-Oristano

X X

X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamente
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
106,60	106,60	di cui:	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatiRFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l’affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell’investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all’art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrig	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
106,60						106,60

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrig	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
106,60						106,60

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Elettrificazione Cagliari-Oristano	106,60	106,60	0,00	85,11	21,49	72,57	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	5,00	85,59
	106,60	106,60	0,00	85,11	21,49	72,57	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	14,94	85,59

CRONOPROGRAMMA														
CUP	Stato attuativo					Iter procedurale								
	Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.	Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità		Inizio	Fine	
	Inizio	Fine	Inizio	Fine		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine			
Elettrificazione Cagliari-Oristano	J74J22000170001	Realizzazione	-	-	-	-	-	-	-	1-2022	10-2021	12-2025	-	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il fondo rappresenta le esigenze finanziarie connesse a:- primi step progettuali dei nuovi interventi di sviluppo infrastrutturale- mancata esigibilità di risorse comunitarie, statali, regionali o comunali previste in specifici atti o convenzioni di sovvenzione, da riassegnare a specifici progetti al fine di garantire la funzionalità delle opere in corso di realizzazione- stime dei costi connessi al funzionamento e alle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico, ove eccedenti le somme già previste allo scopo nei quadri economici dei singoli progetti. In particolare il fondo studi finanzia lo sviluppo dei Quadri Esigenziali (QE) e dei Documenti di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DocFAP) funzionali alle valutazioni ex ante finalizzate all'inserimento dei nuovi interventi negli strumenti programmatici e finanziari.

Nell'ambito del programma è prevista la progettazione degli interventi di potenziamento della direttrice passeggeri Gottardo, oggetto di specifico MOU con la Confederazione Elvetica. In territorio italiano l'accordo prevede la realizzazione, per fasi, di: terzo binario tra Cantù e Camnago; binari di precedenza a Seregno; scavalco Bivio Rosales; nuova stazione di incrocio sulla diramazione Porto Ceresio; adeguamento di un impianto per precedenza viaggiatori sulla linea Sempione.

Gli interventi interessano l'intero territorio nazionale

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Per la pianificazione dei principali studi e progetti di fattibilità si rimanda ad apposita appendice contrattuale

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

non applicabile



- Capacità
- Velocità
- Accessibilità
- Regolarità
- Prestazioni (merci)
- Gestione dei rotabili
- Gestione spazi di stazione
- Intermodalità merci
- Intermodalità passeggeri
- Integrazione della rete
- Upgrade e sicurezza
- Efficientamento processi

LOCALIZZAZIONE

Territorio Nazionale

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica					Obiettivi strategici				
	PNRR	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)
Fondo Progettazioni	X		X			X				
Fondo salvaguardia interventi cofinanziati da UE e EE.LL. e continuità opere in corso			X							
Fondo Collegio Consultivo Tecnico			X							

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Programma NA026: Fondo Progettazioni, Collegio Consultivo Tecnico e salvaguardia interventi cofinanziati da UE e EE.LL.

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	di cui:	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
3.169,83	700,82		660,78	22,00	7,23	2,92	1,92	5,97	720,00	339,15	1.409,86

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo							Variazione di costo relativa ad una diversa attribuzione degli oggetti tra righe del contratto (spostato CUP J91B21000410009 in riga P060) e stima fabbisogni per perdita risorse EE.LL. e comunitarie.
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
1.929,86		-1,00	1.240,97			3.169,83	

Evoluzione coperture finanziarie							Copertura dei fabbisogni indifferibili per eventuali soccombenze da Collegi Consultivi Tecnici e per nuove progettazioni da avviare; rimodulazione a favore di interventi operativi per soccombenze già accertate da Collegi Consultivi Tecnici (0275A, 0279A, 0281, 0284, 0336, 0361, 0417, A1006) e per impiego del Fondo di salvaguardia per interventi cofinanziati UE ed EELL (A2011, P055_A, P080, P234, P237)
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
1.096,93		-0,94		69,81	-464,98	700,82	

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Altre
Fondo salvaguardia interventi cofinanziati da UE e EE.LL. e continuità opere in corso	1.603,16	103,83	1.499,34	0,00	1.603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.603,16
Fondo Collegio Consultivo Tecnico	1.129,10	419,71	709,39	0,00	1.129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.129,10
Fondo Progettazioni	437,56	177,28	260,28	24,66	412,91	43,47	30,06	5,97	0,30	1,99	6,09	8,02	5,14	405,66
	3.169,83	700,82	2.469,01	24,66	3.145,17	43,47	30,06	5,97	0,30	1,99	6,09	8,02	9,53	3.137,93

AVANZAMENTO PROGRAMMA	CUP rif.	Costo	Risorse	%Finanz.	Contab.	%Contab.	Stato attuativo
Oneri determinazioni CCT		1.129,10	419,71	37%	0,00	0%	Progettazione
Fondo Collegio Consultivo Tecnico		1.129,10	419,71	37%	0,00	0%	
Fondo studi di fattibilità e progettazioni		342,32	78,87	23%	0,00	0%	Progettazione
Studi di fattibilità e progettazioni	J52J20000130001	40,00	40,41	100%	14,86	37%	Realizzazione
Potenziamento Linea Milano - Chiasso		22,00	22,00	100%	0,00	0%	Progettazione
Progettazioni per riqualificazione e potenziamento di City - Hub e Linee Metropolitane	J52C21001910001	18,12	18,98	100%	12,00	63%	Realizzazione
Progettazione del raddoppio linea Torino - Pinerolo	J77I09000010002	6,70	6,70	100%	4,40	66%	Realizzazione
Progettazione delle opere per la permeabilità della linea storica Torino - Genova, nell'ambito della realizzazione del terzo valico dei Giovi	J81J04000000001	3,00	3,00	100%	0,57	19%	Realizzazione
Collegamento Savona Parco Doria con Savona Marittima e realizzazione di una fermata a Savona Marittima		1,60	0,00	0%	0,00	0%	Progettazione
Potenziamento linee di accesso sud al Valico del Sempione - raddoppio Laveno - Luino	J31H03000510001	0,87	0,87	100%	0,84	96%	In ultimazione
Venafrò-Termoli	J34F05000010001	0,80	0,80	100%	0,00	0%	Progettazione
Analisi trasportistiche e valutazione di capacità della rete ferroviaria	J52F14000080001	0,80	0,80	100%	0,41	51%	Realizzazione
PRG Golfo Aranci	J74E21001710008	0,70	1,70	100%	0,38	23%	Realizzazione
Elettrificazione Oristano - Macomer	J74E21001700008	0,25	1,75	100%	0,00	0%	Progettazione
Analisi di pre-fattibilità della nuova fermata AV nel frusinate	J42F20000840001	0,20	0,20	100%	0,17	83%	Realizzazione
PRG Chilivani	J74E21001720008	0,20	1,20	100%	0,20	17%	In ultimazione
Fondo Progettazioni		437,56	177,28	41%	33,83	19%	
Fondo salvaguardia interventi cofinanziati da UE e EE.LL.		1.603,16	103,83	6%	0,00	0%	Progettazione
Fondo salvaguardia interventi cofinanziati da UE e EE.LL. e continuità opere in corso		1.603,16	103,83	6%	0,00	0%	

Progetto_x_lotti 0325: Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Treviglio-Brescia

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

58,2 km di nuova linea, di cui- 39,6 km con caratteristiche AV/AC (in sostanziale affiancamento all'autostrada Brebemi) e 11,7 km di Interconnessione Brescia Ovest; tali tratte, di competenza del GC, sono state attivate all'esercizio a dicembre 2016.- 6,7 km di Ingresso Urbano in Brescia (in affiancamento alla linea storica Milano-Venezia) realizzata da RFI anche con appalti integrati, attivata all'esercizio a dicembre 2018.L'intera tratta presenta le seguenti caratteristiche:- 20 comuni attraversati nelle province di Milano, Bergamo e Brescia- 52,2 km di rilevati- 1,1 km di trincee- 4,1 km di viadotti- 0,8 km di gallerie artificiali

attualità dati: 30/06/2025

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

The map shows the proposed high-speed rail route from Milan to Verona. The legend indicates four types of track segments:

- Tratta attivata**: Solid dark blue line.
- Lavori in corso**: Dashed blue line.
- Tratta con progettazione definitiva da completare**: Dashed pink line.
- Tratta con progettazione preliminare approvata da completare**: Dashed green line.

Key locations and features on the map include:

- Cities**: Milano, Bergamo, Brescia, Verona, Pavia, Cremona, Mantova.
- Lakes**: Lago d'Iso, Lago di Garda.
- Other locations**: Asso, Verona, Calotzio, Molino, Poma S. Pietro, Cazzago San Martino, Pieve, Pescantina, Ca' di S. Pietro, Buttapietra, Isola della S., Nogara, Roncan, Ostiglia, Bressana, Arena Po, Biondi, Castel San Giovanni, Codogno, Casalpusterlengo, Cimonetta, Mantova, Roverbella, Mozzecane, Dossobuono.

	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

Lombardia

Priorità programmatica

- Allegato MIMS al DEF
- Tavoli tecnici di ascolto
- Altri Provvedimenti*
- Cofinanziamenti UE
- UE - workplan corridoi TEN-T
- AQ, per l'utilizzo della capacità
- Fondo Sviluppo e Coesione
- Accordi EE.LL.
- Accordi Internazionali
- Interventi commissariati
- PNRR

- Coesione sociale e territoriale
- Accessibilità e qualità stazioni
- Resilienza al climate change
- Adeguamento a standard tecnici
- Sviluppo tecnologico
- Sistemi regionali e metropolitani
- Potenziamento connessioni merci
- Sviluppo corridoi TEN-T
- Completamento valichi alpini
- Alta Velocità (AV)

Tratta AV Treviglio-Brescia (1° e 2° lotto costruttivo) e nodo

X X

X

X

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto_x_lotti 0325: Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Treviglio-Brescia

di Brescia (PRG e ACC)

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
1.990,00	2.050,00	di cui: 510,48	1.314,44	99,90	0,00	125,17	0,00		0,00	0,00	-60,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE											milioni di euro
Evoluzione Costo											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025					
2.050,00			-60,00			1.990,00	Aggiornamento del Quadro Economico per l'intervento attivato all'esercizio nel 2016 per cui risultano ancora in corso lavori residuali.				
Evoluzione coperture finanziarie											
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025					
2.050,00						2.050,00					

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV				Produzione				
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Tratta AV Treviglio-Brescia (1° e 2° lotto costruttivo) e nodo di Brescia (PRG e ACC)	1.990,00	2.050,00	-60,00	1.884,42	105,58	1.942,70	1.742,63	1.873,07	10,84	21,47	7,48	10,23	26,57	63,64
	1.990,00	2.050,00	-60,00	1.884,42	105,58	1.942,70	1.742,63	1.873,07	10,84	21,47	7,48	10,23	3,27	63,64

CRONOPROGRAMMA													

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto è finalizzato all'estensione del sistema AV/AC lungo l'asse orizzontale Torino-Venezia e allo sviluppo del Corridoio transeuropeo TEN-T «Mediterraneo» che collega la penisola iberica al confine ucraino ed è articolato come segue: 1° Lotto Funzionale – Brescia Est - Verona (escluso Nodo di Verona Ovest); 2° Lotto Funzionale – Quadruplicamento in uscita Est da Brescia; Il 1° lotto (affidamento GC) prevede la realizzazione di una nuova linea con caratteristiche AV/AC di lunghezza pari a 47,6 km nelle regioni Lombardia e Veneto; in particolare, nella Provincia di Verona, il tracciato interessa i Comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Sona, Sommacampagna e Verona. Il 2° lotto (affidamento GC) prevede la realizzazione di un quadruplicamento in uscita dalla stazione di Brescia fino all'interconnessione Brescia est per un'estesa di circa 10,7 km nei Comuni di Brescia, Rezzato e Mazzano. Nodo AV/AC di Verona: ingresso Ovest Gli interventi del Nodo di Verona: ingresso Ovest (gara a cura di RFI) prevedono la realizzazione di 3,6 km di nuova linea AV/AC, 4,2 km di nuova Linea Storica e 3,3 km di linea indipendente merci oltre alla sistemazione del PRG di Verona P.N..

lombardia/veneto


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•Tratta Brescia Est-Verona: In data 06/06/2018 il Consorzio Cepav Due/ENI e RFI hanno sottoscritto il 2° Atto Integrativo per la realizzazione della Tratta AV/AC Brescia Est-Verona, con contestuale avvio dei lavori di realizzazione del 1° Lotto Costruttivo. In data 17/04/2020 sono stati avviati anche i lavori relativi al suddetto 2° Lotto Costruttivo (contrattualizzato con il GC). In data 06/05/2024, è stata attivata la fase 3.1 del PRG di Sommacampagna con cui è stato traslato il binario dispari della linea storica per liberare la sede dei futuri binari della linea AV/AC. In data 27/05/2024 è stata attivata la fase 3.2 del PRG di Sommacampagna consistente nello spostamento del binario pari. In data 09.12.2024 è stata attivata la Fase 1 di Bivio Mazzano di collegamento tra la linea storica e la futura tratta AV. In data 18.12.2024 è stato abbattuto il diaframma della galleria San Giorgio, l'ultima delle quattro gallerie naturali della tratta, completando così lo scavo delle gallerie presenti sul tracciato AV/AC. •Nodo di Verona: Ingresso Ovest: In data 05.09.2023, sono state consegnate le prestazioni della Progettazione Esecutiva all'Appaltatore. È stata ultimata la verifica della Progettazione Esecutiva a cura dell'Appaltatore, sono in corso le attività propedeutiche alla consegna dei lavori. A Giugno 2024 sono state avviate le attività propedeutiche della fase realizzativa. •Quadruplicamento Brescia-Brescia Est: È in corso la Progettazione Definitiva a cura del GC Cepav Due.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Riduzione dei tempi di percorrenza tra Milano e Venezia S.Lucia (con recuperi fino a 10'); Incremento della capacità e della regolarità della circolazione grazie alla specializzazione dei servizi, tradizionale e AV; Miglioramento del sistema di trasporto regionale grazie alla liberazione di capacità della linea storica.

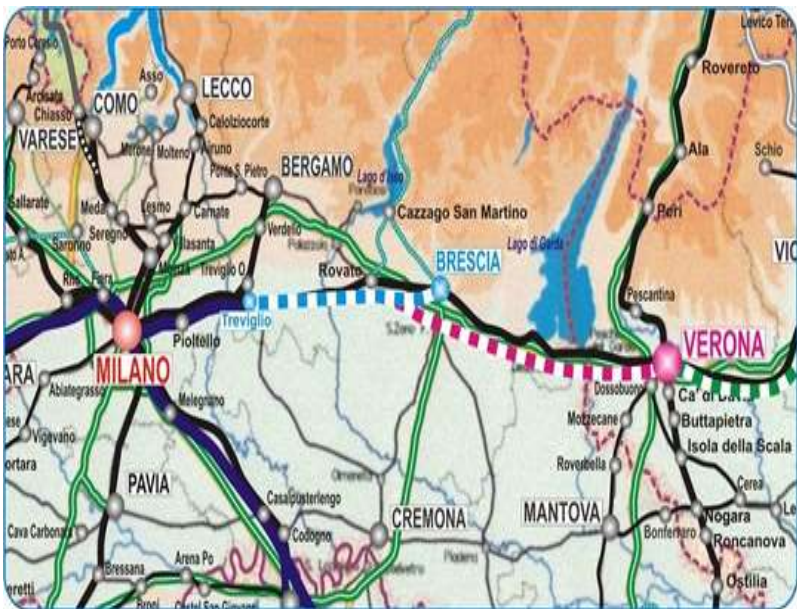

	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Lombardia
Veneto

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto è finalizzato all'estensione del sistema AV/AC lungo l'asse orizzontale Torino-Venezia e allo sviluppo del Corridoio transeuropeo TEN-T «Mediterraneo» che collega la penisola iberica al confine ucraino e costituisce il 1° lotto funzionale della linea AV/AC Verona-Padova, di lunghezza complessiva di 77 km, che è articolata in 3 lotti funzionali: 1° lotto funzionale "Verona-Bivio Vicenza"; 2° lotto funzionale "Attraversamento di Vicenza"; 3° lotto funzionale "Vicenza-Padova". La tratta "Verona-Bivio Vicenza" è suddivisa in due lotti costruttivi e prevede la realizzazione, tra la stazione di Verona Porta Vescovo ed il Comune di Altavilla Vicentina, di circa 44,25 km di nuova linea AV/AC, oltre il rifacimento di circa 7 km di linea storica. La nuova linea ad alta velocità, a meno di brevi tratti in galleria artificiale di lunghezza complessiva di circa 2 km, si sviluppa in superficie prevalentemente in rilevato o trincea. Gli interventi del Nodo di Verona: ingresso Est (gara a cura di RFI) riguardano interventi funzionali all'ingresso a Verona della tratta Verona – Padova con la realizzazione di circa 6,6 Km di nuova linea AV/AC, una nuova stazione elementare a Verona Porta Nuova e un nuovo fascio merci di tre binari collegato alla linea merci realizzata nel nodo Ovest.

La Tratta AV/AC Verona-Bivio Vicenza, collocata interamente in Regione Veneto, interessa n.12 comuni ricadenti nelle Province di Verona e Vicenza, si sviluppa per il 75 % in rilevato, il 4% in trincea, il 5 % in galleria artificiale ed il 15% in viadotto. La nuova linea si pone in stretto affiancamento a sud della linea ferroviaria esistente per oltre il 50% del suo complessivo sviluppo. Il progetto del Nodo di Verona Est si sviluppa interamente in Comune di Verona, con la nuova linea posta prevalentemente in affiancamento a sud della linea esistente, prevalentemente in rilevato, ad eccezione del nuovo ponte per l'attraversamento del fiume Adige e del viadotto.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•Tratta Verona-Bivio Vicenza: In data 06.08.2020 è stato sottoscritto l'Atto Integrativo con il General Contractor Iricav Due. L'avvio della realizzazione del 1° Lotto Costruttivo è avvenuto in data 20.09.2020, mentre per il 2° Lotto Costruttivo in data 19.05.2021. Sono in corso di realizzazione i lavori di entrambi i lotti costruttivi. In data 21/08/2024 sono state attivate due varianti di tracciato tra Verona Porta Nuova e San Martin Buon Albergo per 1,2 Km e tra Montebello Vicentino e Montecchi Maggiore per 5,8 Km. Ad aprile 2025 è stata attivata all'esercizio la nuova SSE di Montebello Vicentino. •Nodo Verona: Ingresso Est: Il Progetto Definitivo risulta ultimato a febbraio 2022, per lo stesso è stato avviato l'iter autorizzativo a giugno 2022 e tale procedimento è attualmente in corso.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Riduzione dei tempi di percorrenza tra Milano e Venezia S.Lucia (con recuperi fino a 5' a della realizzazione della tratta Verona-Vicenza e del nodo di Vicenza); Incremento della capacità e della regolarità della circolazione grazie alla specializzazione dei servizi, tradizionale e AV; Miglioramento del sistema di trasporto regionale grazie alla liberazione di capacità della linea storica.

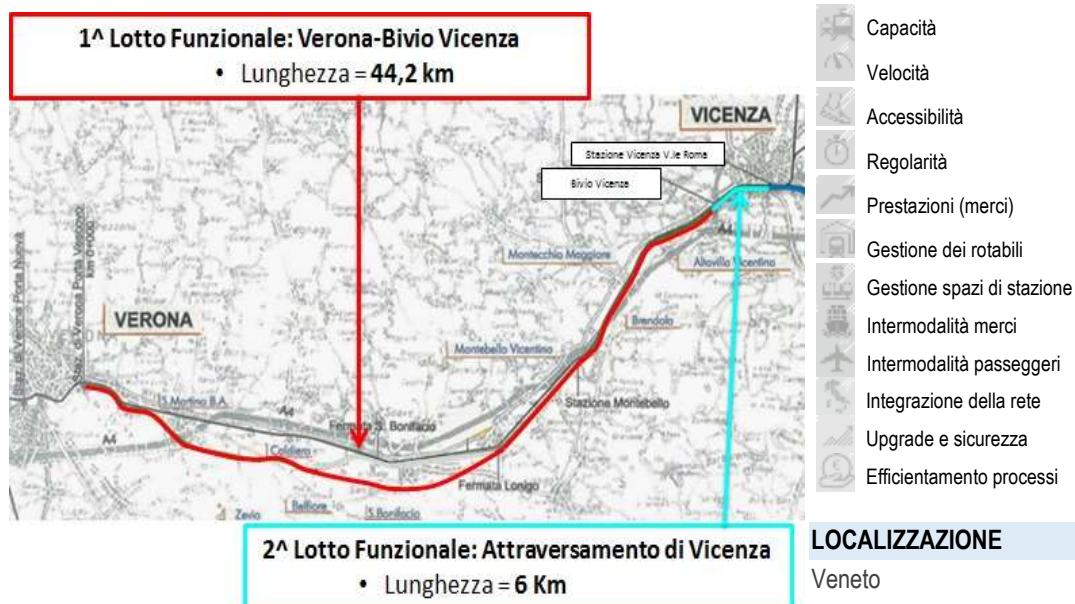**LOCALIZZAZIONE**

Veneto

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica

Obiettivi strategici

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto_x_lotti 0362A: Linea AV/AC Verona-Padova 1° lotto funzionale: Tratta Verona-bivio Vicenza

	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF		Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini	Sviluppo corridoi TEN-T	Potenziamento connessioni merci	Sistemi regionali e metropolitani	Sviluppo tecnologico	Adeguamento a standard tecnici	Resilienza al climate change	Accessibilità e qualità stazioni	Coesione sociale e territoriale
Intervento / Opere funzionali																						
Tratta AV Verona-Bivio Vicenza (1° e 2° lotto costruttivo)	X	X					X		X		X		X			X						
Nodo di Verona est		X					X		X		X		X			X						

QUADRO FINANZIARIO												milioni di euro	
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento		
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	programmatiche di breve					
								Priorità 1	Priorità 2				
3.857,86	3.687,82	di cui:	1.401,91	435,91	0,00	1.849,99	0,00	0,00	0,00	170,04	0,00		

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE												milioni di euro		
Evoluzione Costo														
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Variazioni costo/perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze							CdP-I agg.2025		
3.810,92			21,03	25,91								3.857,86	Variazione delle stime di costo dovuta ad adeguamenti tariffari	

Evoluzione coperture finanziarie														
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni							CdP-I agg.2025		
3.586,96			-67,84	168,69								3.687,82	Copertura appalto in corso per maggiori costi emersi nel corso della realizzazione e per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche e DL Aiuti)	

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Tratta AV Verona-Bivio Vicenza (1° e 2° lotto costruttivo)	3.307,86	3.307,86	0,00	3.153,43	154,42	3.060,55	1.437,00	30,77	49,79	269,38	373,41	472,90	5,26	1.510,93
Nodo di Verona est	550,00	379,96	170,04	524,35	25,65	9,78	5,17	0,00	0,00	4,10	3,21	1,78	5,00	540,90
	3.857,86	3.687,82	170,04	3.677,78	180,08	3.070,33	1.442,17	30,77	49,79	273,47	376,62	474,68	600,69	2.051,83

CRONOPROGRAMMA														
CUP					Stato attuativo				Iter procedurale					
					Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione	
					Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine
Tratta AV Verona-Bivio Vicenza (1° e 2° lotto costruttivo)	J41E91000000009	Realizzazione	-	-	-	7-2018	-	-	-	-	8-2020	9-2020	11-2026	12-2026
Nodo di Verona est	J14D20000010001	Iter autorizzativo	4-2016	5-2020	9-2020	6-2026	-	-	6-2026	1-2027	1-2027	11-2030	12-2030	

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto è finalizzato all'estensione del sistema AV/AC lungo l'asse orizzontale Torino-Venezia e allo sviluppo del Corridoio transeuropeo TEN-T «Mediterraneo» che collega la penisola iberica al confine ucraino e costituisce il 1° lotto funzionale della linea AV/AC Verona-Padova, di lunghezza complessiva di 77 km, che è articolata in 3 lotti funzionali: 1° lotto funzionale "Verona-Bivio Vicenza"; 2° lotto funzionale "Attraversamento di Vicenza"; 3° lotto funzionale "Vicenza-Padova". Il progetto comprende la realizzazione della nuova linea AV/AC per una estensione di circa 6,2 km, con tracciato in superficie in affiancamento alla linea esistente, tra il km 44+250 ed il km 49+827 (detta progressiva costituisce il limite d'intervento delle opere civili. Da questo punto fino al km 50+457 sono previsti interventi di tipo tecnologico), la rilocalizzazione verso nord di 4,8 km dell'esistente linea Milano-Venezia, il riassetto del PRG di Vicenza inclusa la realizzazione di una nuova stazione elementare AV/AC (4 binari), nonché l'inserimento al km 46+377 della nuova fermata Fiera, a servizio sia della linea storica che dell'alta velocità.

La nuova linea attraversa i Comuni di Altavilla Vicentina e Vicenza, con tracciato in rilevato (ad eccezione dell'1% del tracciato che corre in viadotto). Sono inoltre interessati dal progetto, il Comune di Sovizzo in cui verrà realizzata una cassa di espansione sul torrente Onte, ed il Comune di Torri di Quartesolo sede di una nuova SSE. Infine, per i soli aspetti legati alle mitigazioni acustiche, è interessato il Comune di Creazzo. La nuova linea, è interamente posta in stretto affiancamento a sud della linea ferroviaria esistente.


STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Tratta "Attraversamento di Vicenza": con Delibera n. 6/2023 del 29.03.2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 25.05.2023, il CIPESS ha autorizzato il nuovo limite di spesa pari a circa 2.180 M€. Con Ordinanza n. 15 del 13.07.2023 del Commissario straordinario di Governo, Ing. Vincenzo Macello, è stato approvato il Progetto Definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In data 27.07.2023 è stato sottoscritto il Secondo Atto Integrativo con il Consorzio Iricav Due. L'avvio della realizzazione del 1° Lotto Costruttivo è intervenuto in data 10.09.2023. Con Ordinanza n. 16 del 22.12.2023, il Commissario ha autorizzato RFI S.p.A. ad avviare i lavori del 2° Lotto Costruttivo. La consegna dei lavori del 2° Lotto Costruttivo è avvenuta in data 26.01.2024. E' in corso la realizzazione di entrambi i lotti.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Riduzione dei tempi di percorrenza tra Milano e Venezia S.Lucia (con recuperi fino a 5' a della realizzazione della tratta Verona-Vicenza e del nodo di Vicenza). Incremento della capacità e della regolarità della circolazione grazie alla specializzazione dei servizi, tradizionale e AV. Miglioramento del sistema di trasporto regionale grazie alla liberazione di capacità della linea storica.

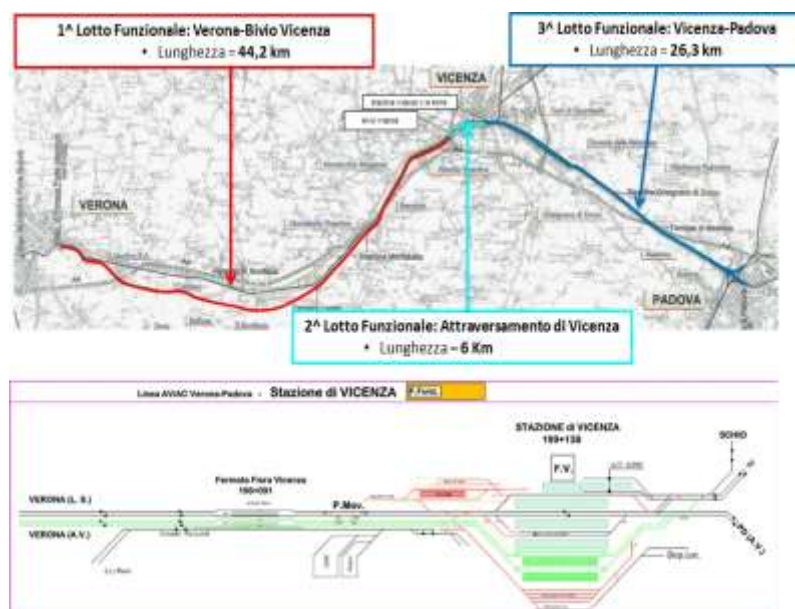

	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Veneto

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica					Obiettivi strategici				
PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	Allegato MIMS al DEF	Tavoli tecnici di ascolto	Altri Provvedimenti*	Cofinanziamenti UE	UE - workplan corridoi TEN-T
									AQ per l'utilizzo della capacità
									Alta Velocità (AV)
									Completamento valichi alpini
									Sviluppo corridoi TEN-T
									Potenziamento connessioni merci
									Sistemi regionali e metropolitani
									Sviluppo tecnologico
									Adeguamento a standard tecnici
									Resilienza al climate change
									Accessibilità e qualità stazioni
									Coesione sociale e territoriale

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto_x_lotti 0362B: Linea AV/AC Verona-Padova 2° lotto funzionale: Attraversamento di Vicenza

Attraversamento di Vicenza (1° e 2° lotto costruttivo)	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
2.179,84	2.179,84	di cui: 2.179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati.RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

milioni di euro

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE						
Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
2.179,84						2.179,84
Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrige	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
2.179,84						2.179,84

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Attraversamento di Vicenza (1° e 2° lotto costruttivo)	2.179,84	2.179,84	0,00	2.038,92	140,92	1.913,86	317,29	2,26	0,00	0,00	1,43	164,87	5,47	1.776,72
	2.179,84	2.179,84	0,00	2.038,92	140,92	1.913,86	317,29	2,26	0,00	0,00	1,43	164,87	234,56	1.776,72

CRONOPROGRAMMA														

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025
Progetto_x_lotti I135: Linea AV/AC Verona-Padova 3° lotto funzionale: Tratta Vicenza-Padova

Tabella B09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Il progetto è finalizzato all'estensione del sistema AV/AC lungo l'asse orizzontale Torino-Venezia e allo sviluppo del Corridoio transeuropeo TEN-T «Mediterraneo» che collega la penisola iberica al confine ucraino e costituisce il 3° e ultimo lotto funzionale della linea AV/AC Verona-Padova, di lunghezza complessiva di 77 km, che è articolata in 3 lotti funzionali: 1° lotto funzionale "Verona-Bivio Vicenza" 2° lotto funzionale "Attraversamento di Vicenza" 3° lotto funzionale "Vicenza-Padova". Il progetto prevede la realizzazione di una nuova linea con caratteristiche AV/AC per una estensione di complessivi 26 km compresi tra la stazione di Vicenza (esclusa) e la stazione di Padova Centrale (esclusa), oltre il rifacimento di circa 9,8 km di linea storica.

Nel tratto compreso tra la radice Est di Vicenza e la diramazione per le linee Schio/Treviso i treni AV/AC correranno sui binari dell'esistente linea storica Milano-Venezia. A valle di questa diramazione si realizzano due nuovi binari AV/AC che corrono in affiancamento a sud della linea storica MI-VE fino alla fermata di Lerino. A partire dalla fermata di Lerino, la nuova linea AV/AC si porta a Nord della storica e corre in affiancamento a quest'ultima fino alla stazione di Padova C.Le. Inoltre, al km 74 è prevista la diramazione dei binari dell'interconnessione merci di Padova, che consente il collegamento con la linea Padova-Bassano.

La tratta Vicenza - Padova si sviluppa nel territorio veneto per complessivi 26 km compresi tra la stazione di Vicenza (esclusa) e la stazione di Padova Centrale (esclusa). La linea costituisce quadruplicamento in affiancamento a quella esistente.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Attualmente è in corso a cura del General Contractor (Iricav Due) lo sviluppo della progettazione definitiva dell'intervento. Per il tratto di linea tra Vicenza e Grisignano di Zocco il General Contractor ha sviluppato uno Studio di Fattibilità da cui sono emerse tre differenti soluzioni progettuali per l'uscita ad est di Vicenza, attualmente in corso di valutazione da parte degli Enti territoriali, mentre per il tratto compreso tra Grisignano di Zocco e Padova è stata sviluppata una prima stesura del Progetto Definitivo.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Riduzione dei tempi di percorrenza tra Milano e Venezia S.Lucia. Incremento della capacità e della regolarità della circolazione grazie alla specializzazione dei servizi, tradizionale e AV. Miglioramento del sistema di trasporto regionale grazie alla liberazione di capacità della linea storica.



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Veneto

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica		Obiettivi strategici	
PNRR	Accordi Internazionali	Allegato MINS al DEF	Coesione sociale e territoriale
Interventi commissariati	Accordi EE.II.	Tavoli tecnici di ascolto	Accessibilità e qualità stazioni
	Fondo Sviluppo e Coesione	Altri Provvedimenti*	Resilienza al climate change
	AQ per l'utilizzo della capacità	Cofinanziamenti UE	Adeguamento a standard tecnici
		UE - workplan corridoi TEN-T	Sviluppo tecnologico
			Sistemi regionali e metropolitani
			Potenziamento connessioni merci
			Sviluppo corridoi TEN-T
			Completamento valichi alpini
			Alta Velocità (AV)

Intervento / Opere funzionali

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto_x_lotti I135: Linea AV/AC Verona-Padova 3° lotto funzionale: Tratta Vicenza-Padova

Tratta AV Vicenza-Padova	X	X	X	X	X
--------------------------	---	---	---	---	---

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse	MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
3.000,00	25,00	di cui: 25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.975,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025
1.500,00			1.500,00			3.000,00
Variazione del costo dovuta all'aggiornamento del quadro economico ad esito della Progettazione Definitiva.						

Evoluzione coperture finanziarie						
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025
25,00						25,00

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Tratta AV Vicenza-Padova	3.000,00	25,00	2.975,00	1.475,08	1.524,92	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,30	0,02	5,00	2.999,65
	3.000,00	25,00	2.975,00	1.475,08	1.524,92	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,30	0,02	0,03	2.999,65

CRONOPROGRAMMA														
Stato attuativo					Iter procedurale									
CUP					Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione	
					Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
Tratta AV Vicenza-Padova	J11J20000100008	Progettazione	-	-	12-2021	-	-	-	-	-	7-2026	7-2026	8-2026	5-2029

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

La Galleria di Base del Brennero si sviluppa da Fortezza (BZ) a Innsbruck (Austria) per una lunghezza di 55 km (di cui 24 km in Italia) ad una quota di 794 m s.l.m. sotto al valico del Brennero (h: 1.371 m). L'opera consiste in un sistema di gallerie destinato esclusivamente al trasporto ferroviario di passeggeri e merci, ed è composta da due canne principali. In ogni canna verrà collocato un binario singolo. Tra le due gallerie principali, ad una quota più bassa di circa 12 metri, viene realizzato un cunicolo esplorativo la cui funzione principale è quella di caratterizzare in modo ottimale l'ammasso roccioso. In prossimità di Innsbruck la galleria di base sarà collegata all'esistente circonvallazione, anch'essa oggetto di un intervento da parte di BBT SE, raggiungendo complessivamente una lunghezza di 64 km, rendendola il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo del mondo. Una volta completata la galleria di base del Brennero, i tempi di percorrenza dei treni passeggeri da Innsbruck a Fortezza saranno ridotti dagli 80 minuti attuali a 25. Il soggetto promotore ed attuatore dei lavori è la società Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE, partecipata pariteticamente dall'Italia e dall'Austria. RFI è il maggiore azionista di parte italiana di BBT SE. Il costo complessivo della Galleria di Base del Brennero è finanziato dallo Stato austriaco e dallo Stato italiano in maniera paritetica, cioè tutte le opere realizzate ed i servizi e le forniture prestati, aventi luogo in territorio italiano, austriaco o transfrontalieri, vengono finanziati al 50% dall'Italia ed al 50% dall'Austria, al netto del cofinanziamento dell'Unione Europea. L'UE supporta infatti il progetto in maniera decisiva tramite il budget per le Reti TEN-T. La quota di cofinanziamento della Galleria di Base del Brennero nel programma CEF 2014-2020 varia tra il 40 ed il 50% dei costi sostenuti. Nell'ambito del programma CEF 2021-2027 la Commissione Europea ha assegnato al BBT un contributo pari a 700 milioni di Euro a copertura del 50% di tutti i costi di investimento dichiarati fino al 31/12/2025.

LOTTO "STUDI E OPERE GEOGNOSTICHE" \Italia: lotto Aica-Mules; lotto Mules Periadriatica (cunicolo esplorativo); \Austria: preparazione di cantiere Sillschlucht, Tulfes, Ampass e Ahrental; lotto Innsbruck-Ahrental; lotto Wolf 1. PRIMO LOTTO COSTRUTTIVO \Italia: lotto Mules Periadriatica (gallerie di linea); lotto H71 sottoattraversamento Isarco (interventi preliminari); lotto V81 Rio Riol; lotto H81 opere zona di Fortezza (demolizioni, bonifiche, opere civili interferenti); opere di compensazione ambientale; \Austria: lotto Ampass; lotto Wolf 2; lotto H33 Tulfes-Pfons (opere circonvallazione di Innsbruck). SECONDO LOTTO COSTRUTTIVO \Italia: lotto H71 sottoattraversamento Isarco (gallerie di linea e di interconnessione); \Austria: lotto H33 Tulfes-Pfons (gallerie di linea e di interconnessione, fermata di emergenza, cunicolo esplorativo). TERZO LOTTO COSTRUTTIVO \Italia: lotto H61 Mules 2-3; \Austria: lotto H11 zona stazione di Innsbruck; lotto H21 gola della Sill. QUARTO LOTTO COSTRUTTIVO \Italia: lotto H81 opere zona di Fortezza (adeguamento PRG e nuovo ACC); \Austria: lotto H41 gola della Sill - Pfons; lotto H51 Pfons-Brennero; lotto H52 Hochstegen; lotto H53 Pfons-Brennero. \Intera tratta: Progettazione attrezzaggio ferroviario. QUINTO LOTTO COSTRUTTIVO Nel Quinto Lotto Costruttivo sono incluse le attività necessarie all'eventuale adeguamento delle opere civili a seguito degli esiti dell'aggiornamento della progettazione dell'attrezzaggio. Il Quinto Lotto Costruttivo prevede inoltre la realizzazione della centrale di controllo operativo di Innsbruck ed i lavori in sotterraneo da realizzarsi nel posto di incrocio presso il nodo di Aldrans, in Austria. Si tratta di lavori in sotterraneo originariamente previsti nell'ambito dell'attrezzaggio (Sesto lotto Costruttivo) ma anticipati temporalmente, e quindi spostati nel Quinto lotto Costruttivo, per ragioni logistiche. Tra le attività a completamento del Quinto Lotto Costruttivo sono inclusi anche gli interventi aggiuntivi di mitigazione e compensazione ambientale, nonché interventi necessari per la conclusione del progetto e misure per rispettare le prescrizioni impartite dalle autorità. SESTO LOTTO COSTRUTTIVO Nell'ambito del Sesto Lotto Costruttivo, a conclusione delle attività di progettazione e degli ulteriori interventi autorizzativi, verranno pubblicate le gare di appalto per la realizzazione dell'attrezzaggio ferroviario e tecnologico. Nel Sesto Lotto Costruttivo sono altresì incluse le attività connesse alla messa in esercizio dell'opera.

La galleria di base del Brennero si estende, in Italia, sui territori dei seguenti Comuni della Provincia Autonoma di Bolzano: Brennero; Val di Vizze; Campo di Trens; Rio Pusteria; Fortezza; Naz Scaives; Varna. L'opera si estende anche sul territorio della Repubblica d'Austria.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

Al 31/05/2025 sono stati scavati 196 Km di gallerie, parte di questi in territorio italiano e in parte in territorio austriaco. LAVORI IN CORSO LATO ITALIA: •Lotto H61 «Mules 2-3»: è terminato lo scavo in tradizionale di entrambe le gallerie di linea in direzione sud e quello in meccanizzato in direzione nord del cunicolo esplorativo e della galleria di linea est, con il raggiungimento del confine di stato sotto il passo del Brennero avvenuto a marzo 2023. In data 02/05/2025 è terminato anche lo scavo in meccanizzato verso nord della galleria di linea ovest. Al 31/05/2025 sono stati scavati ca. 64,6 km di gallerie (40,0 km linea, 14,8 km cunicolo esplorativo e 9,8 km logistiche) dei circa 65 km previsti. •Lotto H71 «Sottoattraversamento del fiume Isarco»: sono terminate tutte le attività di scavo e di rivestimento delle gallerie (6,4 km complessivi) e sono stati anche completati i lavori di rinaturalizzazione e rinverdimento delle aree di cantiere. Attualmente sono in fase di conclusione le ultime attività marginali di chiusura cantiere e collaudo. •Lotto H81: «Stazione di Fortezza»: sono conclusi i lavori di adeguamento della radice nord del PRG, proseguono quelli della radice sud e del nuovo ACC della linea esistente. Il contratto per il sublotto 'Nuova viabilità nella zona del Rio Riol' è stato stipulato in data 09/12/2024, con consegna dei lavori datata 30/01/2025. La gara di appalto per il sublotto 'Prolungamento sottovia ciclopedonale via Riol' andata una prima volta deserta, è stata pubblicata nuovamente in data 15 maggio 2025 mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 158, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 36-2023 e s.m.i. LAVORI IN CORSO LATO AUSTRIA: •Lotto H21 «Gola del Sill»: i lavori di tale lotto, riguardanti il collegamento tra la galleria di base del Brennero e la stazione centrale di Innsbruck, inclusa la costruzione del portale nord del BBT, sono terminati a dicembre 2024. •Lotto H41 «Gola del Sill - Pfons»: in direzione nord (scavo in tradizionale), a settembre 2024 è stato completato lo scavo della galleria di linea est. Per quanto riguarda la galleria di linea ovest, il 20 maggio 2025 è avvenuto l'abbattimento del diaframma tra questo lotto e il lotto "H21 Gola del Sill". Con questo abbattimento, si concludono gli scavi con metodo tradizionale delle due gallerie principali est e ovest in direzione della Gola del Sill. In direzione sud sono in corso gli scavi in meccanizzato (con fresa/TBM) nelle due gallerie di linea. •Lotto H53 «Pfons - Brennero»: sono in corso i lavori di avanzamento in meccanizzato delle due TBM nelle gallerie di linea in direzione nord. Prosegue anche l'avanzamento in tradizionale in direzione sud (verso il Brennero) del cunicolo esplorativo e delle gallerie di linea.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto_x_lotti A004: Galleria di base del Brennero - quota Italia

•Potenziamento della capacità della linea ferroviaria: obiettivo potenziale 400 treni/giorno in transito al Brennero, a completamento dell'intero quadruplicamento della tratta Fortezza – Verona. •Aumento delle prestazioni del traffico merci (incremento massa rimorchiabile), grazie all'eliminazione dei vincoli della pendenza. •Gestione più efficiente del traffico transfrontaliero Italia – Austria grazie al nuovo assetto infrastrutturale (eliminazione delle soste tecniche al Brennero) •Sensibile riduzione dei tempi di viaggio per i treni viaggiatori a lunga percorrenza.



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	X
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	X
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Trentino Alto Adige

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Intervento / Opere funzionali	Priorità programmatica						Obiettivi strategici					
	PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EE.LL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Altri Provvedimenti*	Tavoli tecnici di ascolto	Allegato MIMS al DEF	Alta Velocità (AV)	Completamento valichi alpini
Galleria di base del Brennero: Opere propedeutiche e progettazioni pregresse		X	X			X	X	X			X	X
Galleria di base del Brennero: 6° lotto costruttivo		X	X			X	X	X			X	X
Galleria di base del Brennero: 5° lotto costruttivo		X	X			X	X	X			X	X
Galleria di base del Brennero: 4° lotto costruttivo		X	X			X	X	X			X	X
Galleria di base del Brennero: 3° lotto costruttivo		X	X			X	X	X			X	X
Galleria di base del Brennero: 2° lotto costruttivo		X	X			X	X	X			X	X
Galleria di base del Brennero: 1° lotto costruttivo		X	X			X	X	X			X	X

QUADRO FINANZIARIO

milioni di euro

Costo	Totale Risorse	Sezione 1 - Opere in corso finanziate							Proiezioni programmatiche di breve		Fabbisogni finanziari a completamento
		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/ITEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)		Priorità 1	Priorità 2	
5.262,09	3.960,44	di cui: 2.350,56	331,59	0,00	0,00	1.152,94	125,35		0,00	1.301,65	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzatori. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE

milioni di euro

Evoluzione Costo

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto_x_lotti A004: Galleria di base del Brennero - quota Italia

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025	
5.267,84			-12,60	6,85		5.262,09	Variazione del costo dovuta alla riduzione della stima dell'adeguamento monetario, parzialmente compensata dall'aumento della quota rischi. Inoltre, si registra un incremento di costo relativo ad adeguamenti tariffari.

Evoluzione coperture finanziarie

CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigé	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
3.905,69		0,05	-0,05	54,75		3.960,44	Copertura dei fabbisogni indifferibili connessi agli extraoneri degli appalti in corso e per l'avvio del 5° lotto costruttivo. Ulteriore variazione connessa alla copertura di adeguamenti tariffari a valere dei fondi previsti dalla normativa vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche)

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Galleria di base del Brennero: Opere propedeutiche e progettazioni pregresse	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
Galleria di base del Brennero: 1° lotto costruttivo	302,37	302,37	0,00	0,00	302,37	302,37	0,00	272,62	5,04	7,91	1,51	0,00	277,62	11,04
Galleria di base del Brennero: 2° lotto costruttivo	417,67	417,67	0,00	0,00	417,67	417,67	0,00	304,15	34,18	22,92	27,00	10,73	309,15	16,27
Galleria di base del Brennero: 3° lotto costruttivo	1.032,64	1.032,64	0,00	0,00	1.032,64	1.032,64	0,00	288,54	99,58	97,42	99,11	44,42	293,54	310,96
Galleria di base del Brennero: 4° lotto costruttivo	1.490,99	1.490,99	0,00	0,00	1.490,99	1.490,99	0,00	88,98	44,46	0,96	105,48	150,78	93,98	887,08
Galleria di base del Brennero: 5° lotto costruttivo	456,77	456,77	0,00	0,00	456,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	456,77
Galleria di base del Brennero: 6° lotto costruttivo	1.301,65	0,00	1.301,65	0,00	1.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.301,65
	5.262,09	3.960,44	1.301,65	0,00	5.262,09	3.503,67	0,00	1.214,29	183,25	129,21	233,10	205,93	312,54	2.983,77

CRONOPROGRAMMA

CUP		Stato attuativo				Iter procedurale							
		Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.		Esecuzione		Funzionalità	
		Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	inizio	Fine	Inizio	Fine		
Galleria di base del Brennero: Opere propedeutiche e progettazioni pregresse	Realizzazione	-	-	-	7-2009	-	-	-	-	12-2004	12-2014	10-2032	
Galleria di base del Brennero: 1° lotto costruttivo	Realizzazione	-	-	-	7-2009	-	-	-	-	7-2011	2-2027	10-2032	
Galleria di base del Brennero: 2° lotto costruttivo	Realizzazione	-	-	-	7-2009	-	-	-	-	11-2014	8-2024	10-2032	
Galleria di base del Brennero: 3° lotto costruttivo	Realizzazione	-	-	-	7-2009	-	-	-	-	9-2016	5-2027	10-2032	
Galleria di base del Brennero: 4° lotto costruttivo	Realizzazione	-	-	-	7-2009	-	-	-	-	7-2016	12-2029	10-2032	
Galleria di base del Brennero: 5° lotto costruttivo	Progettazione	-	-	-	7-2009	-	-	-	-	12-2025	12-2031	10-2032	
Galleria di base del Brennero: 6° lotto costruttivo	Progettazione	-	-	-	7-2009	-	-	-	-	10-2027	10-2032	10-2032	

Tabella B09-Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI GENERALI

Gli interventi consistono nella realizzazione di una linea con caratteristiche Alta Capacità tra Apice e Orsara di Puglia che si sviluppa completamente in variante rispetto alla linea esistente per un'estesa di circa 47 km, di cui circa l'80% in galleria. Nell'ambito del progetto è prevista la realizzazione di una nuova stazione a servizio dell'Irpinia. Verranno realizzate 2 nuove stazioni e 1 fermata e soppressi 5 passaggi a livello.

Il progetto è articolato in due opere funzionali:- tratta Apice - Hirpinia- tratta Hirpinia - Orsara

L'intervento prevede la realizzazione di circa 47 km di nuova linea ferroviaria a doppio binario compresa la realizzazione della nuova stazione di Apice e Hirpinia nel primo lotto funzionale Apice-Hirpinia e della nuova stazione di Orsara di Puglia nel secondo lotto funzionale Hirpinia-Orsara. Inoltre è previsto l'attrezzaggio tecnologico della tratta con ACCM e predisposizione ERTMS e l'eliminazione di tutti i passaggi a livello con la dismissione della linea storica esistente tra Apice ed Orsara di Puglia. L'intervento si snoda principalmente nel territorio dei Comuni di Apice, Sant'Arcangelo Trimonte, Melito Irpino, Flumeri, Grottaminarda, Ariano Irpino, Villanova del Battista nella Regione Campania ed Orsara di Puglia e Panni nella Regione Puglia.

STATO DI ATTUAZIONE

attualità dati: 30/06/2025

•Raddoppio tratta Apice-HirpiniaSono in corso i lavori per la realizzazione: del fabbricato viaggiatori della nuova stazione di Hirpinia, dei viadotti Hirpinia e Apice, e delle gallerie Rocchetta e Grottaminarda. Per quest'ultima nel mese di settembre 2024 è stato completato lo scavo. •Raddoppio tratta Hirpinia-OrsaraSono in corso i lavori inerenti: le opere propedeutiche per la realizzazione della galleria Hirpinia (con arrivo in cantiere entro l'anno di tutte le 4 TBM), la finestra di emergenza, e la SSE di Ariano Irpino.

BENEFICI ASSOCIATI ALL'INVESTIMENTO

Unitamente al complesso di interventi sull'intera direttrice Napoli-Bari, l'intervento consentirà: • L'incremento della capacità della linea nei tratti oggetto di raddoppio (da 4 treni/h in entrambi i sensi di marcia a 10 treni/ora per senso di marcia). • La riduzione dei tempi di percorrenza (per i collegamenti Napoli-Bari, un tempo di viaggio di circa 2h; per i collegamenti Roma-Bari, un tempo di viaggio pari a 3 h). • Il miglioramento della regolarità della circolazione. • Una maggiore accessibilità dei territori serviti dalla nuova infrastruttura. • Sulla tratta Napoli-Foggia sarà possibile la circolazione dei treni con semirimorchi, con peso per asse fino a 22,5 tonnellate e della lunghezza di 750 metri.



	Capacità	X
	Velocità	X
	Accessibilità	X
	Regolarità	X
	Prestazioni (merci)	X
	Gestione dei rotabili	
	Gestione spazi di stazione	
	Intermodalità merci	
	Intermodalità passeggeri	
	Integrazione della rete	
	Upgrade e sicurezza	
	Efficientamento processi	

LOCALIZZAZIONE

Campania

INQUADRAMENTO STRATEGICO

Priorità programmatica				Obiettivi strategici			
PNRR	Interventi commissariati	Accordi Internazionali	Accordi EELL.	Fondo Sviluppo e Coesione	AQ per l'utilizzo della capacità	UE - workplan corridoi TEN-T	Cofinanziamenti UE
							Altri Provvedimenti*
							Tavoli tecnici di ascolto
							Allegato MIMS al DEF
							Alta Velocità (AV)
							Completamento valichi alpini
							Sviluppo corridoi TEN-T
							Potenziamento connessioni merci
							Sistemi regionali e metropolitani
							Sviluppo tecnologico
							Adeguamento a standard tecnici
							Resilienza al climate change
							Accessibilità e qualità stazioni
							Coesione sociale e territoriale

Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2022-2026 aggiornamento 2025

Progetto_x_lotti 0281: Itinerario Napoli-Bari: raddoppio tratta Apice-Orsara

Raddoppio Apice-Hirpinia	X	X	X	X	X	X
Raddoppio Hirpinia-Orsara	X		X	X	X	X

QUADRO FINANZIARIO											milioni di euro
Costo	Sezione 1 - Opere in corso finanziate								Proiezioni		Fabbisogni finanziari a completamento
	Totale Risorse		MEF	MIT	FSC/PAC	PNRR nuovi progetti	Altro UE (CEF/TEN, PON-FESR)	Altro (EELL, Terzi, autofinanziamento)	Priorità 1	Priorità 2	
2.509,95	2.509,95	di cui:	2.135,89	73,41	47,00	253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota bene: le stime di costo degli interventi non ancora avviati a realizzazione, e i relativi fabbisogni finanziari, sono indicativi e dovranno essere consolidati ad esito della progettazione e degli iter autorizzati. RFI è autorizzata ad avviare le procedure negoziali per l'affidamento di lavori solo in presenza della integrale copertura finanziaria dell'investimento. Si rappresenta che, nei casi in cui non sarà possibile attivare le clausole di flessibilità previste all'art.1 o in assenza di risorse aggiuntive a quelle iscritte nel presente Contratto a copertura dei maggiori oneri connessi ai sopra citati adeguamenti tariffari, RFI non potrà avviare le procedure negoziali pianificate per gli interventi PNRR e per le altre opere che nel Contratto risultano finanziate.

EVOLUZIONE COSTI E COPERTURE FINANZIARIE										milioni di euro
Evoluzione Costo										
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigere	Variazioni costo/ perimetro	Adeg.ti tariffari	Nuove esigenze	CdP-I agg.2025				
2.459,55			4,35	46,05		2.509,95	Variazione del costo dovuta ad adeguamenti tariffari. Inoltre, si registrano maggiori costi per ulteriori spese sostenute per il trasporto delle terre e rocce da scavo a seguito di determina CCT.			

Evoluzione coperture finanziarie							
CdP-I agg.2024	Opere ultimate	Riclassifiche ed errata corrigi	Riduzioni	Incrementi	Rimodulazioni	CdP-I agg.2025	
2.459,55				46,05	4,35	2.509,95	Copertura per adeguamenti tariffari a valere sui fondi previsti dalla legislazione vigente (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche) e per soccombenze da Collegio Consultivo Tecnico

PIANO DELLA SPESA	Quadro finanziario ed economico					OGV		Produzione						
	Costo	Risorse	Fabbis.	Lavori	S.a.D.	Impegni	Pagam.	Al 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Oltre
Raddoppio Apice-Hirpinia	1.045,00	1.045,01	0,00	916,99	128,01	873,75	431,60	30,63	13,34	41,42	115,27	151,50	6,91	529,48
Raddoppio Hirpinia-Orsara	1.464,94	1.464,94	0,00	1.298,46	166,49	1.247,75	62,40	19,98	3,41	0,03	5,87	26,79	11,25	1.392,60
	2.509,95	2.509,95	0,00	2.215,45	294,50	2.121,50	494,00	50,61	16,75	41,45	121,14	178,29	179,63	1.922,07

CRONOPROGRAMMA															
CUP				Stato attuativo				Iter procedurale							
								Prog.Prel.		Prog.Def.		Prog.Esec.		Attiv.Negoz.	
				Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine	Inizio	Fine
Raddoppio Apice-Hirpinia	J77104000000009	Realizzazione		9-2006	12-2016	11-2016	4-2018	-	-	-	-	-	-	8-2019	2-2030
Raddoppio Hirpinia-Orsara	J77104000000009	Realizzazione		-	-	2-2018	11-2020	-	-	12-2022	9-2024	7-2021	12-2029	12-2028	
